Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento

Regional: RJ

Projeto: Elevato Nova Iguaçu – RBX1

Data Comitê: 06/10/2025

Atualizações após comitê (12/09/2025)

➢ **APROVAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA NA PREFEITURA**

- No dia 11/09/2025, foi obtida a **aprovação do projeto de arquitetura** junto à Prefeitura, restando apenas a análise e aprovação dos projetos complementares.

➢ **ASSINATURA DO ACORDO COM OS OCUPANTES DO TERRENO**

- No dia 02/10/2025, os ocupantes do imóvel **assinaram o acordo** que formaliza a desocupação do terreno no momento da escritura, bem como o cancelamento do processo de usucapião. O documento já foi validado pelos proprietários tabulares, que deverão proceder à assinatura ao longo desta semana.

➢ **FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DA DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL**

- No dia 23/09/2025, após diversas tentativas de negociação e flexibilização das condições de pagamento, o Banco do Brasil formalizou a proposta de acordo para a renegociação da dívida vinculada ao terreno. O valor acordado é de **R$ 605.000,00**, incluindo honorários advocatícios. O pagamento deverá ser realizado à vista, **condicionado à validação pelo comitê**.

➢ **TERRENO COMO GARANTIA**

- No aditivo firmado com os proprietários tabulares, ficou estabelecido que será feita **uma alienação fiduciária em garantia do imóvel** em favor da Tenda, assegurando a restituição dos valores referentes ao acordo com o Banco do Brasil e eventuais despesas e antecipações de dívidas. Tal garantia permanecerá vigente até a outorga da escritura definitiva de compra e venda.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMDUR.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO E LICENÇA DE CONSTRUÇÃO

Nº 370/2025

*Pelo presente certificado, expedido de acordo com o solicitado através do processo n.º 2025/049711, autuado aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, em que **FÁBRICA DE TECIDOS CAXAMBI LTDA é proprietário do s/nº(que será dado na vistoria) localizado na Rua Otávio Tarquino,** anotado na ficha 211-B(Planilha) - ordem 1.920, Bairro Centro, URG I-Centro, no Município de Nova Iguaçu, fica concedida a **APROVAÇÃO DE PROJETO E LICENÇA DE CONSTRUÇÃO**, (Uso Residencial) – destinado ao Programa "Minha Casa, Minha Vida" – Faixas 2 e 3, **com uma área total de 26.781,66m²**; aprovada e licenciada aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, pelo referido processo, com prazo de doze(12) meses, válido de 11/09/2025 até 11/09/2026, devendo atender obrigatoriamente, o que preconiza a Lei nº 049 de 28 de dezembro de 2015 (Código de Obras).*

Responsável pelo Projeto/ Execução de Obra/ Hidrossanitária:

- *Adriana de Miranda Santos – RRT 15815988;*
- *Antonio Vitor de Oliveira Carvalho – ART 2020250211370.*

Nova Iguaçu, 11 de Setembro de 2025.

Paulo Sérgio Alves de Aguiar

One Page – Elevato Nova Iguaçu

[1]

Cidade	Nova Iguaçu	Mancha de demanda	RJ - RBX1 - Nova Iguaçu
Regional	RJ	Cluster MPR	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	Tipo de Aprovação	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Investimento	Versão da VF	Versão 1.0: Out

[2]

Unidades (Fases)	606 (1)	CA Máx | Proj	6,0 | 4,3
Unidades com Vaga (%)	60 (10%)	Escritura | Lançamento	jan/27 | fev/27
Unidades com Varandas (%)	303 (50%)	Tipologia	F2E - Concreto

[3]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	8.629 (6,1%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
Cash (Correção)	4.055 (IPCA)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	3,2% (53,0%)
Valor R$/m²	1.403	VAR (%VGV)	605 (0,4%)

[4]

Custo Construção (%VGV)	61.847 (43,7%)	Indireto Unit.	18.264
Prazo da Obra (meses)	20	Torre Unit.	56.918
Custo Total Unit. (LPU):	102.058 (94)	Infra Unit.	16.222
Início de Obra	ago-27	Fundação Unit.	6.960

Preço Nominal Unit.	233.407	VSO	34
Preço Raso Unit.	212.734	Referência	Vision
Avaliação Unit.	243.589	Renda (% em RET 1%)	3.873 (13,7%)

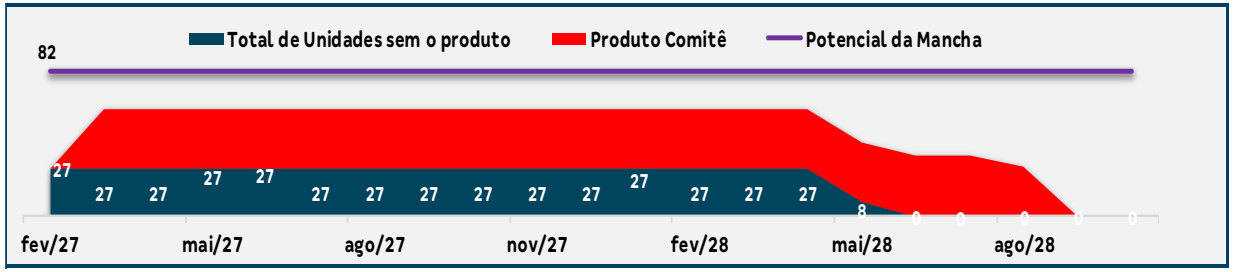

[6]

LI (Régua):	20,0% (20,0%)	Margem Bruta Econômica:	40,7%
LI Resiliência:	12,8% (N/A)	Margem Rasa Econômica:	34,3%
Margem Bruta REF:	44,0%	Margem Contribuição Econômica:	28,8%
Margem Rasa REF:	38,5%	Exposição (% VGV):	21.879 (14,6%)
TIR:	88,6%	VGV Total:	141.445
Payback Contingente (21 m) :	20 m/ (-1 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(679)
Payback Consolidado:	20	Ger. Caixa 24 meses (R$):	(14.261)

Destaques

[1] O imóvel está localizado na mancha RBX1, que representa o município de Nova Iguaçu. Situado na Rua Otávio Tarquino, no bairro do Centro, o terreno está inserido em uma região estratégica da cidade, posicionado entre as duas principais vias conectoras — a Via Light e a Rodovia Presidente Dutra — o que garante excelente mobilidade e fácil acesso tanto para deslocamentos internos quanto para conexões metropolitanas. Além disso, encontra-se logo atrás do tradicional Country Club de Nova Iguaçu, referência de lazer e valorização na região. O entorno imediato é marcado por ampla oferta de serviços, comércio e equipamentos, compondo um ambiente urbano completo e consolidado. O lançamento do projeto proposto é entendido como uma nova entrada na mancha RBX1, endereçando uma renda mais alta do que hoje a Tenda pratica na região.

[2] Projeto trabalha com tipologia T+18, sendo o primeiro projeto vertical em Nova Iguaçu. **Contará com 50% das unidades com varanda, piscina e quadra de areia**.

[3] R$ 8.629.449,90, sendo R$ 4.055.000,00 em dinheiro (R$605.000,00 em outubro/2025 para o pagamento da dívida do terreno com o Banco do Brasil (desde que seja assinado o acordo com a posseira e o aditivo com os proprietários) e o restante, R$3.450.000,00, no momento da escritura, referentes à quitação da dívida de IPTU do terreno – R$1.300.000,00 + acordo para a desocupação do imóvel por parte da posseira – R$2.000.000,00 + sinal para os proprietários tabulares do imóvel – R$150.000,00) + R$ 4.574.449,90 (3,23% do VGV) em permuta financeira) – com mínimo garantido da permuta de R$4.450.000,00 sem correção.

[4] O preço médio proposto (R$ 233.407) e o VSO de 34 conversam com um projeto vertical em uma região de renda mais alta, similar ao produto de entrada da Zona Norte do Rio de Janeiro, com menor concorrência.

[6] A baixa está vinculada à assinatura do acordo com a Posseira, à assinatura do aditivo com os proprietários tabulares e ao pagamento do valor renegociado da dívida do Banco do Brasil.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Farol Pareceres

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Due diligence concluída em 07/2025, com os seguintes pontos de atenção e pendências: **(i) Penhora matrícula:** Consta registrada na matrícula do imóvel penhora em favor do Banco do Brasil datada de 14/07/2000, em razão de dívida no valor de R$ 2.000.000,00 à época. Será necessária a assinatura de aditivo a PCV, autorizando a Tenda a negociar e formalizar acordo com o banco, já ajustado informalmente no valor de R$ 605.000,00, a ser integralmente suportado pela Tenda e posteriormente abatido da participação devida à Vendedora, caso a Tenda venha a adquirir o imóvel **(a assinatura do aditivo é ponto para baixa de landbank)**. Considerando que as tratativas com o Banco do Brasil já estão em andamento, o pagamento será realizado após a aprovação do acordo pelo comitê. Após a concretização do acordo, bem como o cancelamento da penhora na matrícula, será assinada uma AF em favor da Tenda, tendo como objeto o referido imóvel, conferindo-lhe o direito de executar a garantia para assegurar a restituição do valor desembolsado, caso a Tenda decida não prosseguir com o negócio. Importante destacar que, em caso de rescisão do negócio, a ação de usucapião tem preferência em relação à alienação fiduciária. Além do aditivo, será necessária assinatura de procuração pública outorgando poderes à Tenda para assinar a AF em nome da Vendedora. Para fins de escritura, será necessário o encerramento definitivo da referida ação, bem como o cancelamento da penhora em matrícula; **(ii) Ação de Usucapião:** O imóvel encontra-se ocupado por terceiros, que ajuizaram ação de usucapião em face da Permutante. Deverá ser celebrado acordo na ação visando o encerramento da mesma. O acordo prevê que a Tenda pagará R$ 2.000.000,00 à ocupante na data da assinatura da ECV (dos quais R$ 1.300.000,00 devem ser descontados da permuta), e, em contrapartida, a ocupante desocupará o imóvel nesta mesma data. O acordo será celebrado neste momento, sendo solicitada a suspensão do processo, até a assinatura da ECV ou a desistência da aquisição do terreno. **(A assinatura do acordo por todas as partes e suspensão do processo são pontos para baixa de landbank); (iii) Regularização Societária:** A Permutante era uma fábrica que se encontrava inativa há anos, já tendo reativado sua inscrição na Receita Federal e na Junta Comercial. Será necessário regularizar os atos societários, de modo a viabilizar a ata de deliberação do sócio remanescente (diante do falecimento dos demais) e retirratificar a alteração do Contrato Social (Ponto para baixa de landbank); **(iv) Débitos de IPTU:** O imóvel possui débitos de IPTU no montante de R$ 1,3MM relativos ao exercício de 1998, 2000 a 2025, que poderão ser pagos pela Tenda e descontados da Participação, conforme previsto em contrato. A PCV possui todas as resolutivas de saída e foi assinada em 10/02/2025. **O Aditamento e o Termo de acordo com a posseira estão pendentes de assinatura, contudo, o Termo de acordo já foi assinado pelos ocupantes (ainda será necessário reconhecer firma nas assinaturas), restando pendente apenas a assinatura da Fábrica**.	Ok com ressalvas	
Legalização	Consta penhora na matrícula e dívidas de IPTU. Para emissão das licenças, será necessário baixar as penhoras e quitar as dívidas; Existe uma diferença entre tamanho real do lote e matrícula superior a 5%. Essa diferença pode ser acrescida ao lote por meio de retificação de metragem futura. Projeto e VF consideram a menor poligonal (conforme área da matrícula).	Ok com ressalvas	
Produto	Ok	Ok	
GETEC	Não há.	Ok	
Logística	Nenhum risco associado	Ok	
Contratação	Preencher	Com ressalvas	
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Vision como factível, com ressalvas para VSO.	Ok com ressalvas	
Comercial/Ciclo	Ciclo avalia o Preço Vision como factível, com ressalvas para VSO.	Ok com ressalvas	
Estudos Econômicos	Nenhum risco associado, nesse projeto não há pênalti de LI uma vez que somente 50% do produto têm atributos.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- NOV – Nova Iguaçu

LandBank

1. Vale das Aguas
2. Elevato Nova Iguaçu

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 3 - Verde

Região

Metropolitana

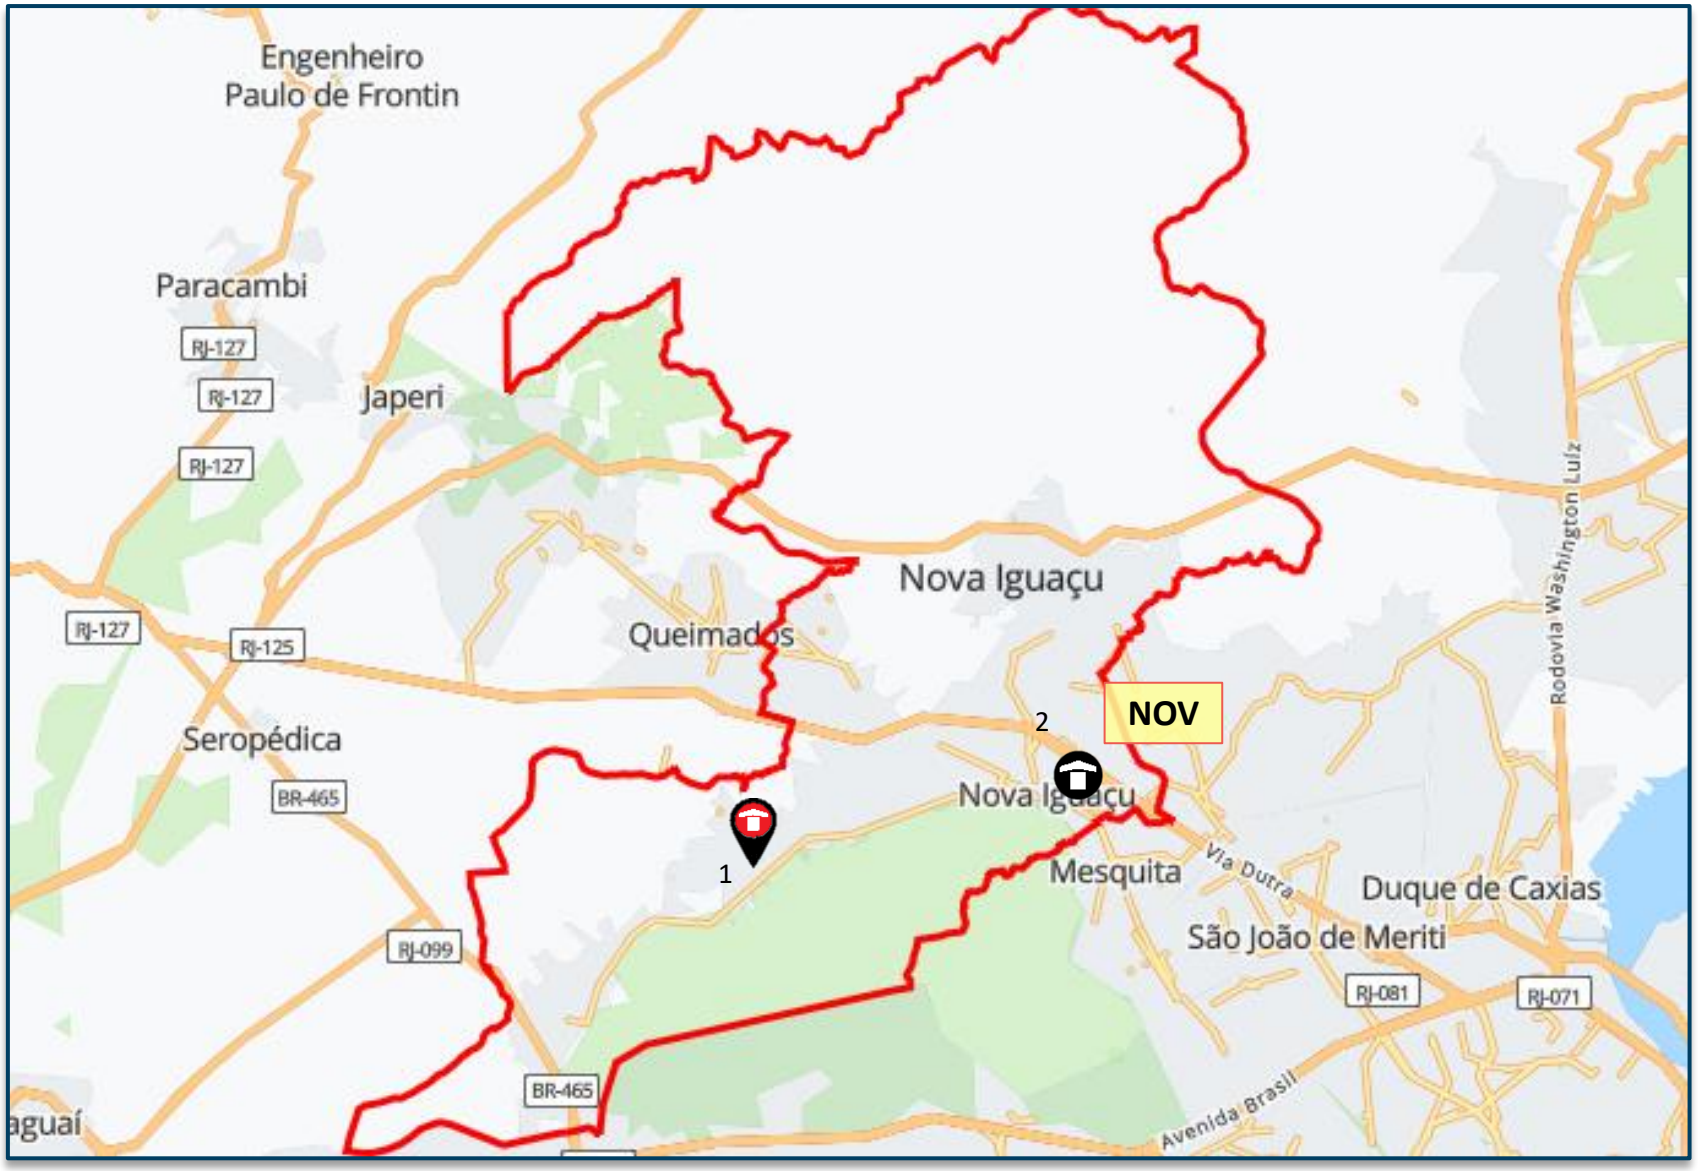

Lançados *LandBank* *Comitê*

Localização x Serviços

PRODUTO

Empreendimento Elevato Nova Iguaçu
Investimento

Informações Gerais – Condomínio Único		
Terreno	Área terreno	6.935,05m²
	Menor poligonal	6.313,43m²
	APP/FNA	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento viário	Sim – 10m do eixo da via
	Área liquida	6.151,32m²
	Zoneamento	ED-3
	Ca máximo	6,00
	Ca projetado	4,23
	Gabarito máximo	153,84 m
Geral	Total UH	606
	Total de vagas	60 (10% veículos) + 5 (motos)+100 (bicicletas)
Tipologia	Tipologia	Modular com elevador
	Gabarito	T+18
	Lâmina	02 -16PP
	Área privativa	34,10m²
Condomínio	Unidade UA	19 (3%)
	Unidade lazer| técnica	00|02
	Torre	02
	Fase	Única
Lazer	Lazer coberto	Espaço office, brinquedoteca, salão de festas c/ churrasq. e churrasq. gourmet
	Lazer descoberto	Piscina, play kids, play baby, quadra areia, fitness externo ,play pet, praça do samba e praça dos jogos

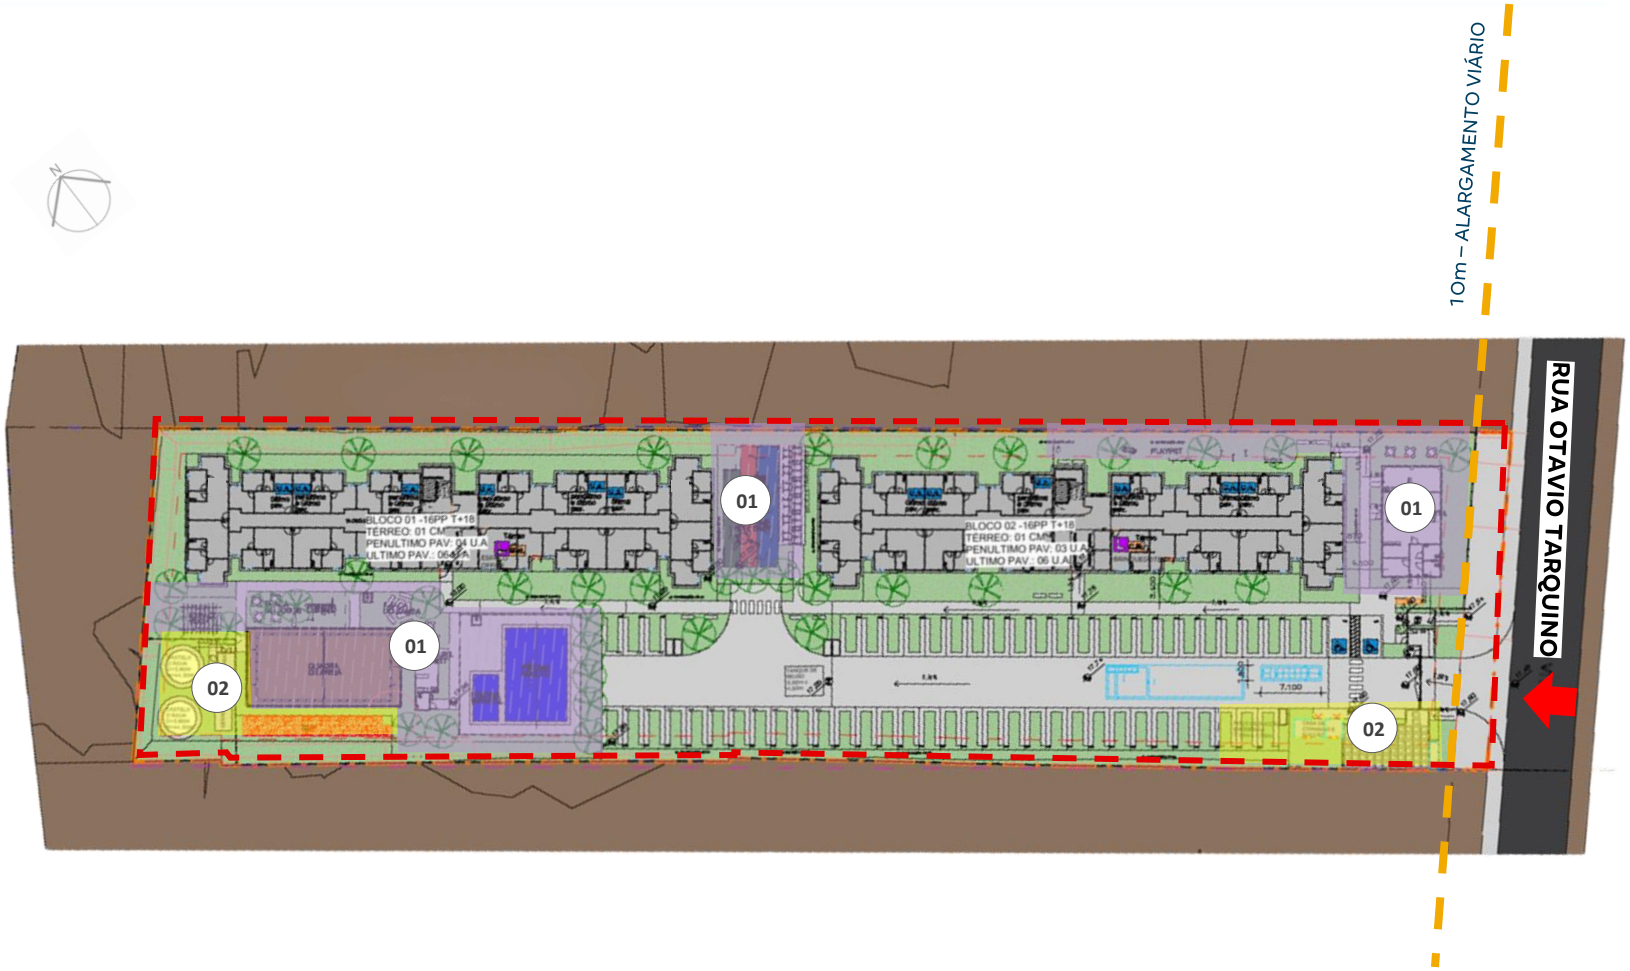

LEGENDA:

- Área de lazer 01
- Área técnica 02

PRODUTO

Empreendimento Elevato Nova Iguaçu
Investimento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	**Limite supercondomínio**		
	Acesso		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Atributos Infra**	Sim	Piscina e quadra de areia
	Atributos Torre	Sim	50% Varanda com vista para as montanhas
	Edifício Garagem	Não	-

Perspectiva

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Condições do Negócio

➢ **VALOR DO NEGÓCIO – R$ 8.629.449,90 (6,1% do VGV)**

- R$ 605.000,00 em dinheiro à vista após a passagem no comitê (0,43% do VGV), para a quitação da dívida do Banco do Brasil.
- R$ 3.450.000,00 em dinheiro à vista na escritura (2,30% do VGV), divididos da seguinte forma:
  - R$150.000,00 - referente ao sinal dos proprietários tabulares;
  - R$1.300.000,00 – referente ao pagamento da dívida de IPTU;
  - R$2.000.000,00 – referente ao pagamento da indenização destinada à desocupação do imóvel pelos ocupantes;
- R$ 4.574.449,90, equivalente a 3,23% do VGV, a serem pagos em permuta financeira para os proprietários tabulares.

➢ **PRAZOS CONTRATUAIS**

- PCV assinada em 10/02/25 com vencimento em 12 meses prorrogáveis por mais 6. Para cumprir o lançamento em fevereiro/2027 será necessário aditar o contrato por mais 6 meses.

➢ **GARANTIAS**

- Para Vendedores: Aval CONSTRUTORA TENDA;
- Para Tenda: Uma alienação fiduciária em garantia do imóvel em favor da Tenda.

➢ **CORRETAGEM**

- 5% (cinco por cento) do valor da ECV, em favor da empresa F JANDRE FERREIRA CORRETAGEM DE IMÓVEIS, a ser pago em até 30 (trinta) dias após a assinatura da ECV.

Condições do Negócio

➢ **CONDIÇÕES CONTRATUAIS**

- Há uma ação de usucapião que tramita sobre o imóvel e precisa ser extinta. Por se tratar de justiça, o prazo é uma variável sensível. Nossa PCV prevê a suspensão dos prazos contratuais caso a ação não seja solucionada. Visto isso, elaboramos um acordo com a posseira, com as condições já previstas na viabilidade e no aditivo com os proprietários tabulares.

- O imóvel possui um débito de IPTU de aproximadamente R$1.300.000,00. Apesar da previsão dos vendedores quitarem o valor, já foi considerado na VF a antecipação dessa despesa com o referido desconto da permuta.

- O imóvel está gravado com uma penhora de um processo com o Banco do Brasil de aproximadamente R$2.000.000,00 com data base do ano 2000. Já foi considerado na VF o pagamento de R$500.000,00, conforme possibilidade de acordo negociada entre o Banco do Brasil e os proprietários. Sendo certo que todo e qualquer valor do referido acordo será descontado da permuta dos proprietários.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Custo de Construção

	ELEVATO NOVA IGUAÇU CEN02 | REV02	ELEVATO NOVA IGUAÇU CEN02 | REV01	SILVA VALE COND.01 CEN01 | REV00
Torres	2	2	2
Unidades Construídas	608	608	496
Unidades Vendidas	606	606	494
Total Unidades Vendidas	606	606	494
Condomínios (qta.)	1	1	1
Cidade	Nova Iguaçu - RJ	Nova Iguaçu - RJ	Rio de Janeiro - RJ
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	2 Torres | T+18 | 16PP | CE1B	2 Torres | T+18 | 16PP | CE1B	1 Torre | T+15 | 16PP | LE3B
Tipologia	-	-	1 Torre | T+14 | 16PP | LE3B
Varandas	288	288	-
Projeto Infra	AP	AP	AP
Projeto Torre	AP	AP	AP
Atributos	Piscina | Quadra	Piscina | Quadra	Piscina | Quadra
Mês Base	agosto-25	julho-25	junho-25
Incc	1.210,471	1.199,509	1.184,462
LVS	junho-25	maio-25	abril-25
Indiretos	junho-25	maio-25	abril-25
Base de Preço	LPU 94	LPU 92	LPU 91
Takt	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	20	20	19
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 100.486	R$ / UND R$ 100.335	R$ / UND R$ 95.093
Indireto	R$ 18.264	R$ 18.062	R$ 18.461
Torre	R$ 56.918	R$ 57.834	R$ 57.332
Infra	R$ 16.222	R$ 15.071	R$ 15.012
Fundação	R$ 6.960	R$ 6.847	R$ 3.535
EEE	R$ 194	R$ 194	
ETE	R$ 1.138	R$ 1.138	
Contenção	R$ 5	R$ 5	R$ 348
Terraplenagem	R$ 785	R$ 1.184	R$ 404
CUSTO TOTAL II	R$ 1.572	R$ 601	R$ 1.311
Urbanização			R$ 485
Drenagem	R$ 436	R$ 436	R$ 422
Extensão de Rede Elétrica	R$ 572	R$ 165	R$ 51
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 565	NÃO CONSIDERADO	R$ 353
CUSTO TOTAL III			
Incorridos			
CUSTO TOTAL IV			
Aprendizado			
CUSTO TOTAL V		R$ 922	R$ 2.117
Atualização por INCC		R$ 922	R$ 2.117
CUSTO TOTAL I+II	R$ 102.058	R$ 100.936	R$ 96.404
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 102.058	R$ 101.859	R$ 98.521

Custo de Construção

	ELEVATO NOVA IGUAÇU CEN02 | REV02	ELEVATO NOVA IGUAÇU CEN02 | REV01	
Torres	2	2	
Unidades Construídas	608	608	
Unidades Vendidas	606	606	
Total Unidades Vendidas	606	606	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Nova Iguaçu - RJ	Nova Iguaçu - RJ	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	2 Torres | T+18 | 16PP | CE1B	2 Torres | T+18 | 16PP | CE1B	
Tipologia	-	-	
Varandas	288	288	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Atributos	Piscina | Quadra	Piscina | Quadra	
Mês Base	agosto-25	julho-25	
Incc	1210,471	1200	
LVS	junho-25	maio-25	
Indiretos	junho-25	maio-25	
Base de Preço	LPU 94	LPU 92	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	20	20	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 100.486	R$ / UND R$ 100.335	DIF R$ 150
Indireto	R$ 18.264	R$ 18.062	R$ 202
Torre	R$ 56.918	R$ 57.834	-R$ 916
Infra	R$ 16.222	R$ 15.071	R$ 1.151
Fundação	R$ 6.960	R$ 6.847	R$ 113
EEE	R$ 194	R$ 194	R$ 0
ETE	R$ 1.138	R$ 1.138	R$ 0
Contenção	R$ 5	R$ 5	R$ 0
Terrapplenagem	R$ 785	R$ 1.184	-R$ 400
CUSTO TOTAL II	R$ 1.572	R$ 601	R$ 972
Urbanização	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Drenagem	R$ 436	R$ 436	R$ 0
Extensão de Rede Eletrica	R$ 572	R$ 165	R$ 407
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 565	NÃO CONSIDERADO	R$ 565
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 922	-R$ 922
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 922	-R$ 922
CUSTO TOTAL	R$ 102.058	R$ 101.859	R$ 199

INDIRETOS
+102 | GR16 Equipamentos - Preço

TORRE
-984 | Esquadria de Alumínio – Laudo acústico não aponta necessidade de classe 3.

INFRA
+1.186 | Reservatório Metálico
R01: 2 Castelos Ø 3,80 – 44,30 m (2 dias de reserva)
R02: 3 Castelos Ø 3,80 – 46 m (3 dias de reserva)

FUNDAÇÃO
+113 | Preço
R01
Lajão: 1.931,04 R$/m³
Fundação
Estaca hélice Ø 40,Ø 50,Ø 60 e Ø 70 – 12m (811 R$/m)
R02:
Lajão: 1.963,12 R$/m³
Fundação: Estaca hélice Ø 40,Ø 50,Ø 60 e Ø 70 – 12m (798 R$/m)

TERRAPLENAGEM
-400 | Preço – Não foi necessário bota fora especial conforme relatório confirmatório.

CUSTO II
+407 | Extensão de elétrica – Conforme diretriz
+565 | Extensão de Hidráulica – Conforme a DPA recebida
R01 – Não foi considerado.
R02 – Água 220 m de extensão de água, instalação de 2 registros e hidrante público

Custo de Construção

	ELEVATO NOVA IGUAÇU CEN02 | REV02	SILVA VALE COND.01 CEN01 | REV00	
Torres	2	2	
Unidades Construídas	608	496	
Unidades Vendidas	606	494	
Total Unidades Vendidas	606	494	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Nova Iguaçu - RJ	Rio de Janeiro - RJ	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	2 Torres | T+18 | 16PP | CE1B	1 Torre | T+15 | 16PP | LE3B	
Tipologia	-	1 Torre | T+14 | 16PP | LE3B	
Varandas	288	-	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Atributos	Piscina | Quadra	Piscina | Quadra	
Mês Base	agosto-25	junho-25	
Incc	1210,471	1184,462	
LVS	junho-25	abril-25	
Indiretos	junho-25	abril-25	
Base de Preço	LPU 94	LPU 91	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	20	19	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 100.486	R$ / UND R$ 95.093	DIF R$ 5.393
Indireto	R$ 18.264	R$ 18.461	-R$ 197
Torre	R$ 56.918	R$ 57.332	-R$ 414
Infra	R$ 16.222	R$ 15.012	R$ 1.209
Fundação	R$ 6.960	R$ 3.535	R$ 3.425
EEE	R$ 194	R$ 0	R$ 194
ETE	R$ 1.138	R$ 0	R$ 1.138
Contenção	R$ 5	R$ 348	-R$ 343
Terrapplenagem	R$ 785	R$ 404	R$ 381
CUSTO TOTAL II	R$ 1.572	R$ 1.311	R$ 261
Urbanização	R$ 0	R$ 485	-R$ 485
Drenagem	R$ 436	R$ 422	R$ 14
Extensão de Rede Eletrica	R$ 572	R$ 51	R$ 520
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 565	R$ 353	R$ 565
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 2.117	-R$ 2.117
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 2.117	-R$ 2.117
CUSTO TOTAL	R$ 102.058	R$ 98.521	R$ 3.537

INDIRETOS

-282 | GR11 – Serviços Técnicos -Diluição
-312 | GR14 – Administração - Diluição
+502 | GR96 – Impostos

TORRE

+330 | Vertical - Jun/25 (com varanda) x Abr/25 (Sem varanda)
+484 | Aço – Taxa: 55 kg/m³ x 50 kg/m³
-1.212 | Elevador
Elevato Nova Iguaçu: 4.921 R$/uh
16PP T+18 - 2+2 elev./torre – Veloc. 1,75 m/s +2,5 m/s
Silva vale 1: 6.051 R$/uh
16PP T+14 -4 elev. /torre – Veloc. 1,50m/s
16PP T+15 - 4 elev. /torre – Veloc. 1,50m/s

INFRA

+354 | Outros Revestimentos de Piso – Projeto (Elevato:10% de vagas e Silva 2% de vagas)
+922 | Reservatório Metálico - Projeto
Elevato Nova Iguaçu: altura de 46,m - Ø 3.80 – 3 unid.
Silva Vale 1: altura de 38,65m - Ø 3.80 – 2 unid.

FUNDAÇÃO

+3.425 | Projeto
Elevato Nova Iguaçu: Estaca hélice Ø 40,Ø 50,Ø 60 e Ø 70 – 12m
Silva Vale 1: Radier com troca de solo

TERRAPLENAGEM

+381 | Projeto
Elevato Nova Iguaçu– Aterro: 5.274,76 m³
Silva Vale 1- Corte – 10.049,14 m³ | Aterro com importe: 4.113,68m³

Operações

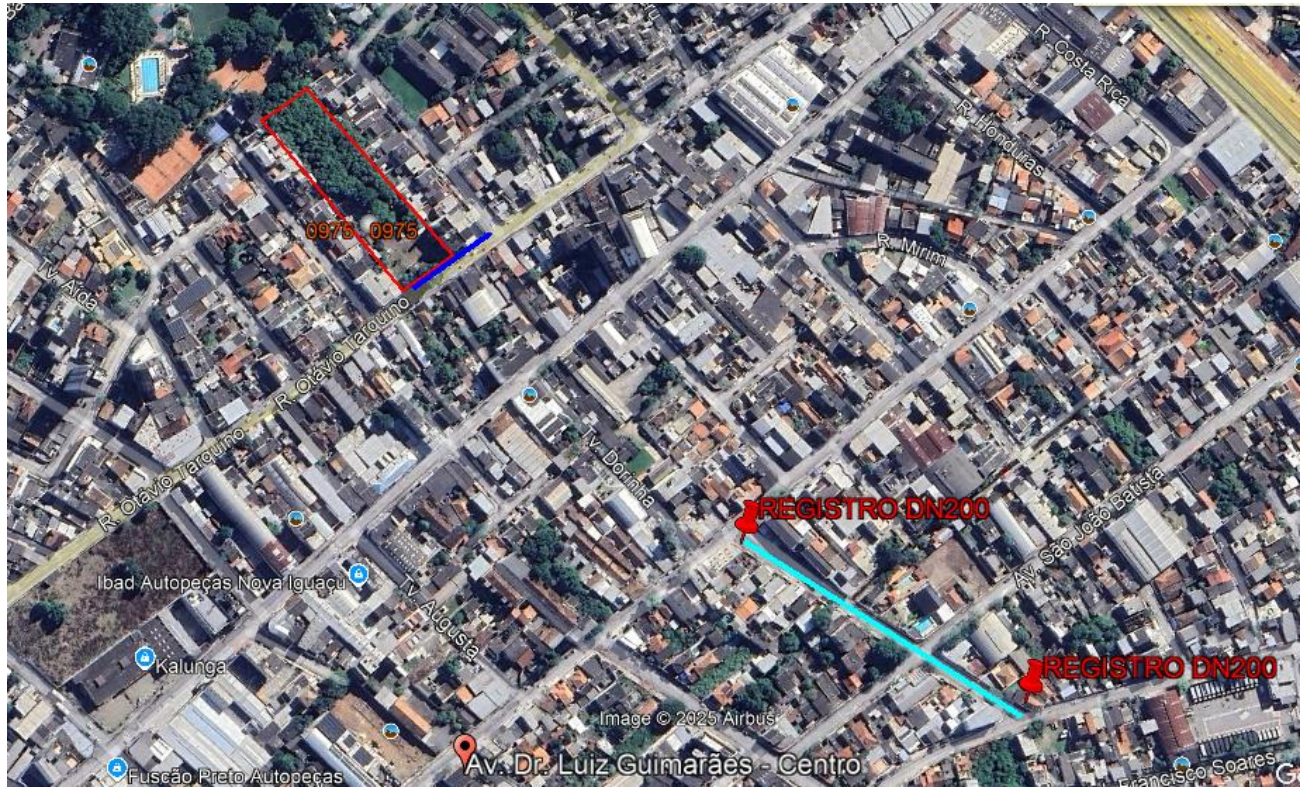

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Assentamento de aproximadamente 220 m, partindo do tubo existente na rua Frederico castro Pereira e interligando na rua Av. Dr. Luiz Guimarães
Instalar 2 registros DN200mm
Instalação Hidrante Público

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Viabilidade existente. Considerado estação de tratamento de esgoto.

SISTEMA DE DRENAGEM
Extensão de 71m até o PV existente na esquina da rua Casemiro pinto gama.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Viabilidade existente. Considerado deslocamento de poste conforme solicitação de logística e extensão de 200 conforme diretriz.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado calçada e grama.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	Nível 3
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	Nível 5

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida 07/25, com validade até 07/27.

Esgoto:
- Viabilidade emitida 07/25, com validade até 07/27.

Drenagem:
- Considerado conforme relatório técnico..

Elétrica:
- Viabilidade existente . Considerado deslocamento do poste conforme solicitação de logística e extensão de 200m conforme diretriz.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado calçada e grama conforme anteprojeto.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem à percussão contemplando 13 furos.
- Considerada Estaca hélice, com diâmetros de 40,50,60 e 70 e profundidade de 12m.

Logística

OTAVIO TARQUINO - RJ

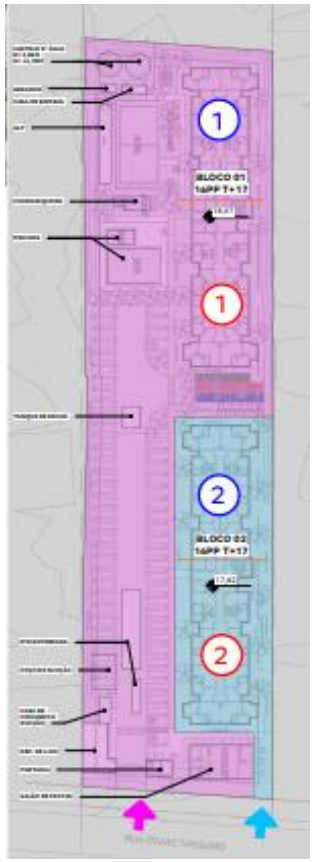

LOG_VIVÊNCIA - CONTAINERS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
CONTAINER ALMOXARIFADO (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41 X 6,10 H	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA	
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO COM SANITÁRIO E CATRACA	2,41 X 4,90 H	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	DEFINITIVA	DEFINITIVA	UNICA	
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 H	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-	UNICA	
CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 H	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	-	TODO PERÍODO	UNICA	
CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER (EQUIPE VERTICAL)	2,41 X 6,10 H	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	-	UNICA	
CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	CONSIDERAR 14 MÓDULOS COM 2 ESCADAS (7 MÓDULOS NO PAV. T & 7 MÓDULOS NO PAV SUPERIOR)	2,41 X 6,10 H	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA	

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA	
BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	UNICA	
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_R01	1 EQUIP PARA O BLOCO 1 E 2	-	-	-	TODO PERÍODO	-	UNICA	
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA	
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-	UNICA	
CREMALHEIRA PCT (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB DE CREMALHEIRA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB DE CREMALHEIRA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA	
MINIGRUA (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-	UNICA	
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIP	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO	-	-	UNICA	

LOG_TENDAS_PERÍODOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	4,00	6,00	-	TODO PERÍODO	-	UNICA	
GAIOLA DE INFLAMÁVEIS (LOG)	1	3,00	4,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA	
TENDA ARMADOR (LOG)	2	4,00	7,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA	
TENDA LAZER (LOG)	1	5,00	6,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA	
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	3,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA	

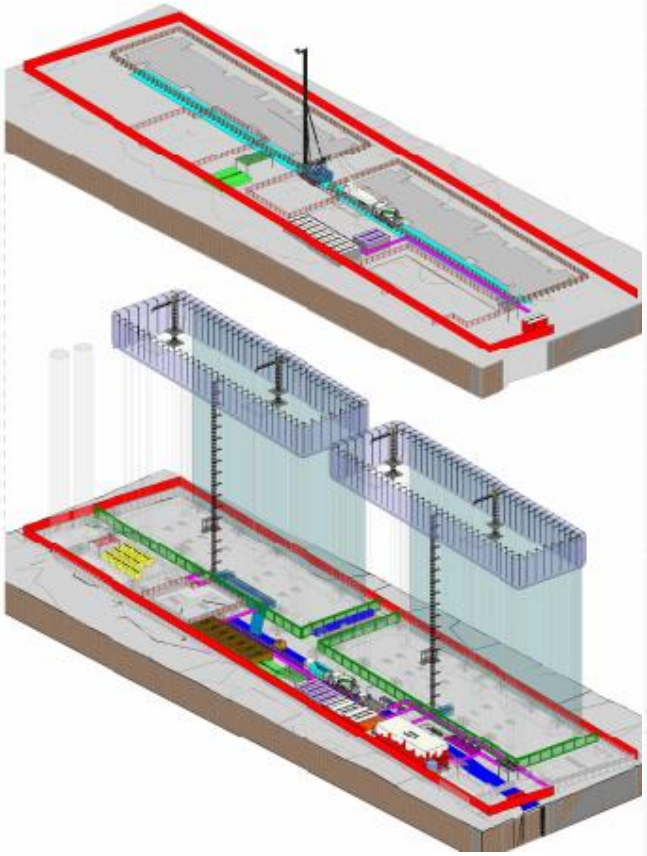

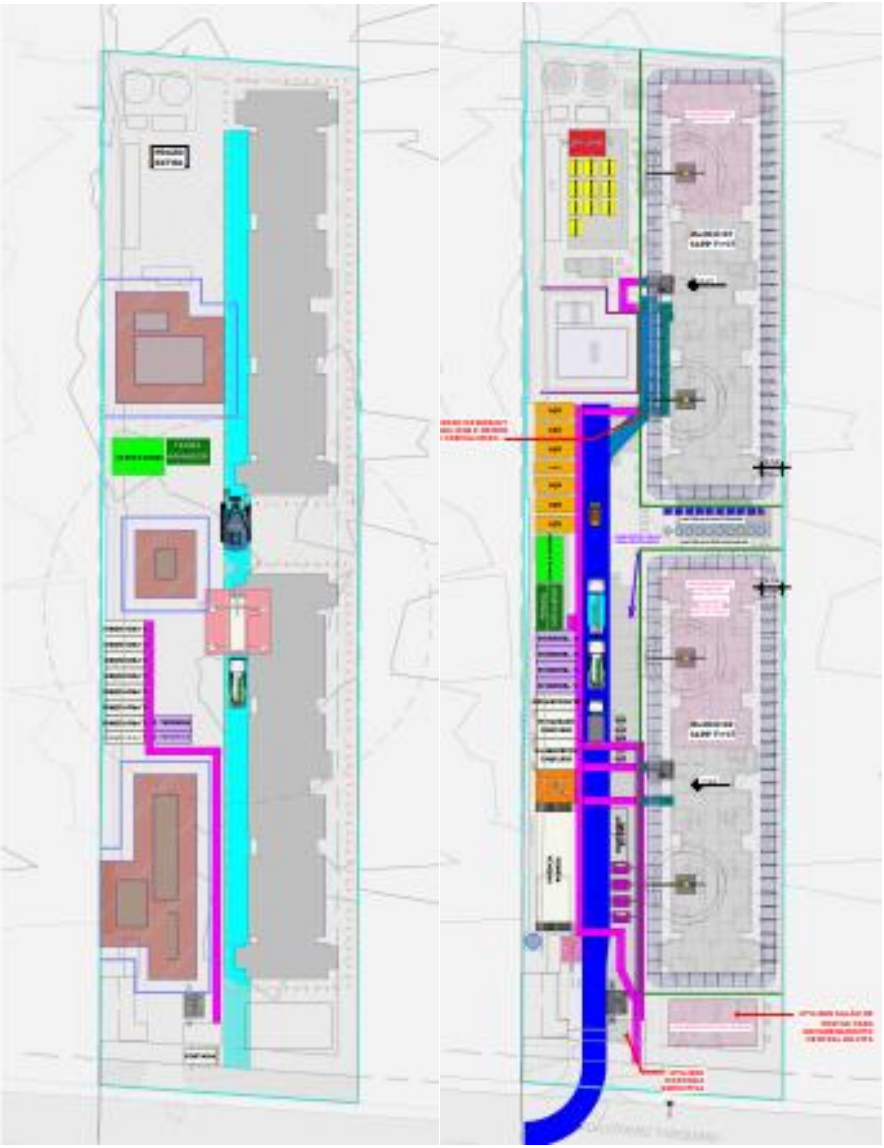

Logística

OTAVIO TARQUINO – RJ

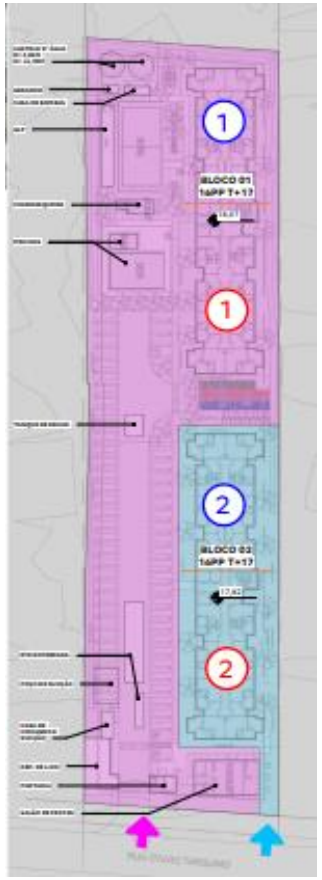

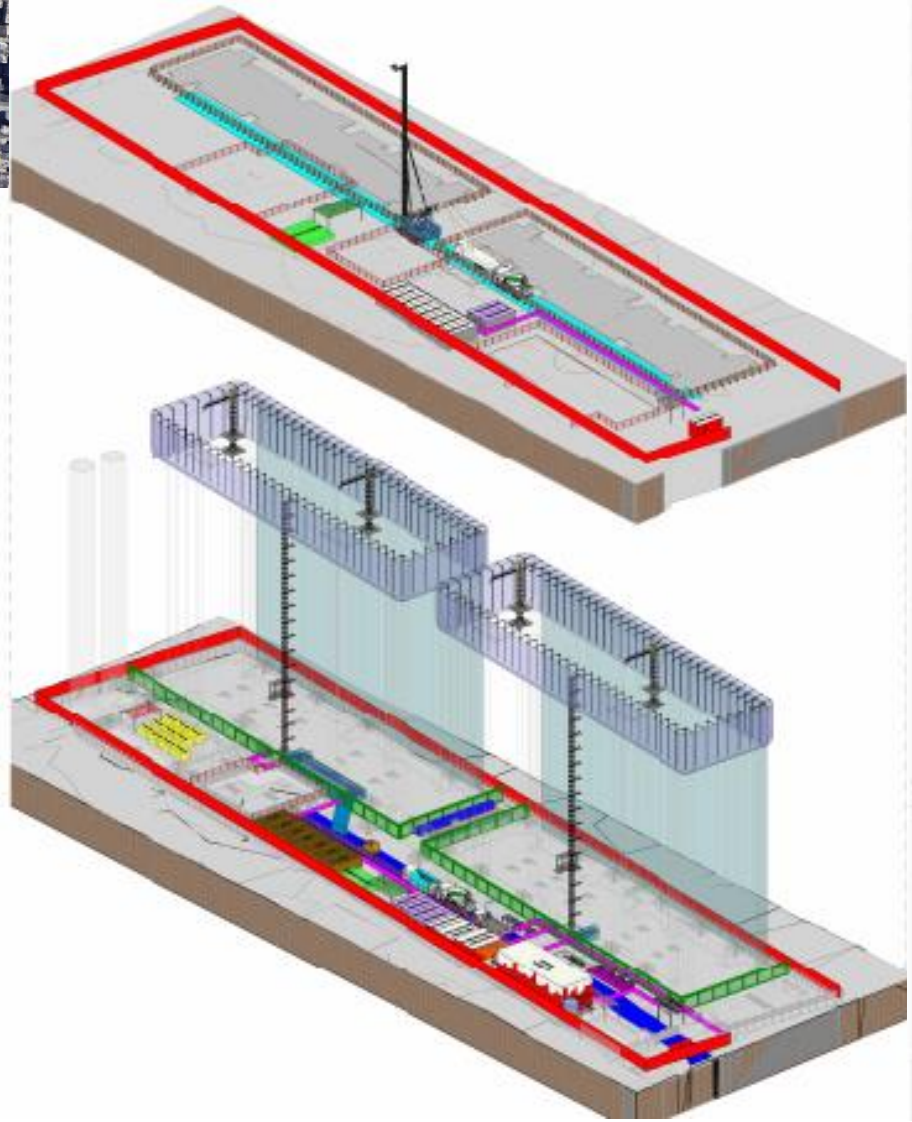

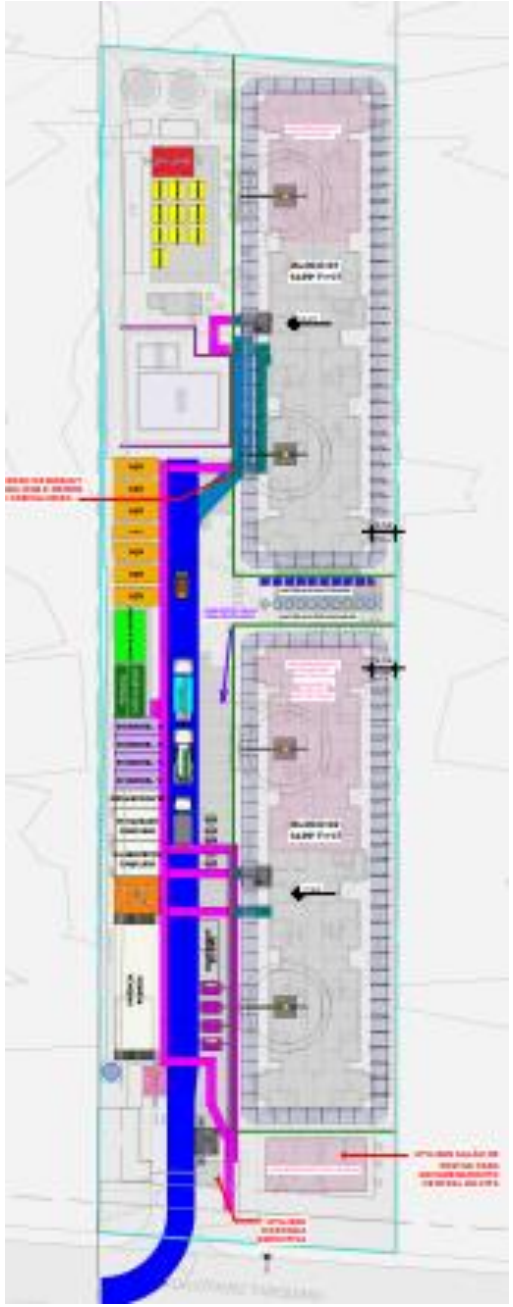

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **LEGALIZAÇÃO**	DEVERÁ SER SOLICITADA A REMOÇÃO DO POSTE LOCADO NA TESTADA DO TERRENO, POIS ELE INTERFERE COM O ACESSO DE OBRA.
➢ **PRAZO DE OBRA**	ACRESCENTAR 1 MÊS DE PRAZO PARA ETE E CASTELO D' ÁGUA

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Nova Iguaçu	NOV	40%	923	77	1.107	92

Empreendimento	Renda	Lançamento	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28	jul/28	ago/28
Vale Das Águas II F1	2.499	dez-26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	8			
Elevato Nova Iguaçu	**3.873**	**fev-27**		**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**28**
Total de Vendas Lançados			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**27**	**61**	**61**	**61**	**61**	**61**	**61**	**61**	**61**	**61**	**61**	**61**	**61**	**61**	**61**	**42**	**34**	**34**	**28**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Elevato Nova Iguaçu | Mapa Concorrência

		Elevato Nova Iguaçu	Mirante Da Luz	Vale Do Sol - Fase 1	Conceito Califórnia	Sky
		TENDA	MRV	MRV	Jeronimo da Veiga	Riva
	Distância Tenda (km)		2,77Km	4,88Km	2,21Km	1,4km
Região 1 Km	População	25.952	27.766	17.052	29.472	26.220
	Dens. Demográfica	8.314	8.895	5.463	9.442	8.400
	Renda (R$)	6.513	7.273	4.751	5.856	10.228
	Classe Social	C1 (2.7k a 4.6k)	C2 (1.5k a 2.7k)	C2 (1.5k a 2.7k)	C2 (1.5k a 2.7k)	C1 (2.7k a 4.6k)
	PEA Dia	38.012	11.429	5.941	16.801	36.405
Quantitativo	Lançamento	fev/27	06/2024	02/2023	07/2024	ago/25
	Unidades	606	216	320	900	488
	Estoque	606	74	44	161	238
	VSO	34	11	9	57	250*
	Stockout	18	7	5	3	-
Qualitativo	Condomínios	1	1	1	1	1
	Torres	2	1	8	6	2
	Gabarito	T+18	T+18	T+4 - Com elevador	T+15	T+18
	Plantas (m²)	34,1m²	35,1 a 70,1 m²	40,8 a 57,9 m²	45,64m² e 46m²	52m² a 62m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms	2 e 3 Dorms
	Opções	Não	Garden	Garden	Garden	Garden e Suíte
	Varanda	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
	Vagas	10%	Com vaga	Com vaga	Com vaga	104%
	Lazer	Piscina, Quadra, Churrasqueiras, Espaço Fitness, Play Baby, Play Kids E Play Pet.	Tem Sacada, Tem Suítes, Tem Garden, Bosque, Fireplace, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Sacada, Sala de Reuniões / Treinamentos, Salão de Jogos,	Tem Garden, Bosque, Fireplace, Piscina, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Quadra de Tênis, Salão de Jogos,	Complexo aquático, Quadra poliesportiva, Quadra Beach Tennis, Espaço Fitness, Fitness Externo, Salão de Festas, Churrasqueira coberta, Churrasqueira americana, Mini Mercado, Pet Place, Car Wash, Playground Baby, Playground Kids, Horta, Redário, Edifício Garagem.	Piscina com Raia de 25m Deck Molhado e Bangalôs, Piscina Infantil com Acquaplay, Pool Bar, Pool Lounge Interno, Pool Lounge Externo, Minimercado, Coworking, Espaço Delivery, Pet Care, Playground, Brinquedoteca, Wine Bar Churrasqueira Gourmet, Spa, Espaço Massagem, Sauna e Repouso, Fitness, Bike Indoor, Fitness Externo, Espaço Yoga, Sky Bar, Espaço Jogos, Espaço Beleza Sky Party, Lounge Party, Espaço Aventura, Espaço Gourmet.

Diagnóstico Concorrência

- Os produtos da MRV apresentam dificuldades de performance na região, mesmo considerando o uso da Encash, o que faz a concorrência capturar rendas menores que a nossa. Observamos que, apesar de praticarem preços acima do estimado para o produto Tenda, registram baixo volume de vendas.
- Por outro lado, o projeto Conceito Califórnia, destaque-se como ponto positivo na região. O mesmo vem operando em faixa de preço e renda superiores, com bom desempenho de vendas.
- O projeto "Sky", atingiu um VSO de lançamento de 250 UH, vale destacar que o mesmo tem forte perfil investidor, com tabela direta. (49%)

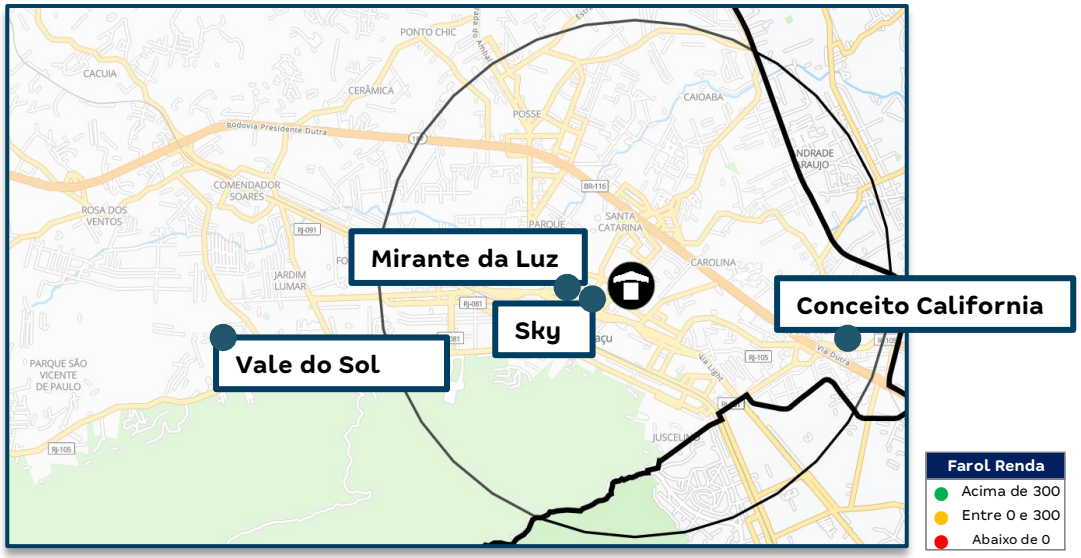

-	Elevato Nova Iguaçu					Mirante Da Luz						Vale Do Sol - Fase 1						Conceito Califórnia					Sky					
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol
Uh Tipo	240.000	225.894	182.092	3.608	45%	245.000	245.026	196.020	3.800	42%	●	220.000	230.136	184.109	3.150	19%	●	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Com vaga	250.000	246.226	196.193	4.539	5%	-	-	-	-	-	-	240.000	243.427	194.742	4.200	69%	●	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Varanda	245.000	236.950	190.763	3.897	45%	259.800	256.865	205.492	4.000	51%	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Varanda | Vg Carro	257.000	256.709	205.846	5.399	5%	283.900	285.890	228.712	4.700	1%	●	-	-	-	-	-	-	286.000	228.800	5.650	94%	●	502.265	468.154	374.524	14.500	96%	●
Uh Tipo | Vg Carro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Garden | Vg Carro	-	-	-	-	-	340.100	336.306	269.045	5.675	6%	-	272.793	266.153	212.922	4.650	12%	-	332.000	265.600	6.600	6%	-	579.096	596.162	476.930	18.400	4%	-

Mapa de Calor

A análise do mapa de calor evidencia que a região do Elevato Nova Iguaçu - Tenda e Sky - Riva se destaca por apresentar maior acessibilidade e atratividade em relação aos demais concorrentes.
Esses fatores reforçam o posicionamento estratégico do projeto na região, consolidando seu diferencial competitivo.

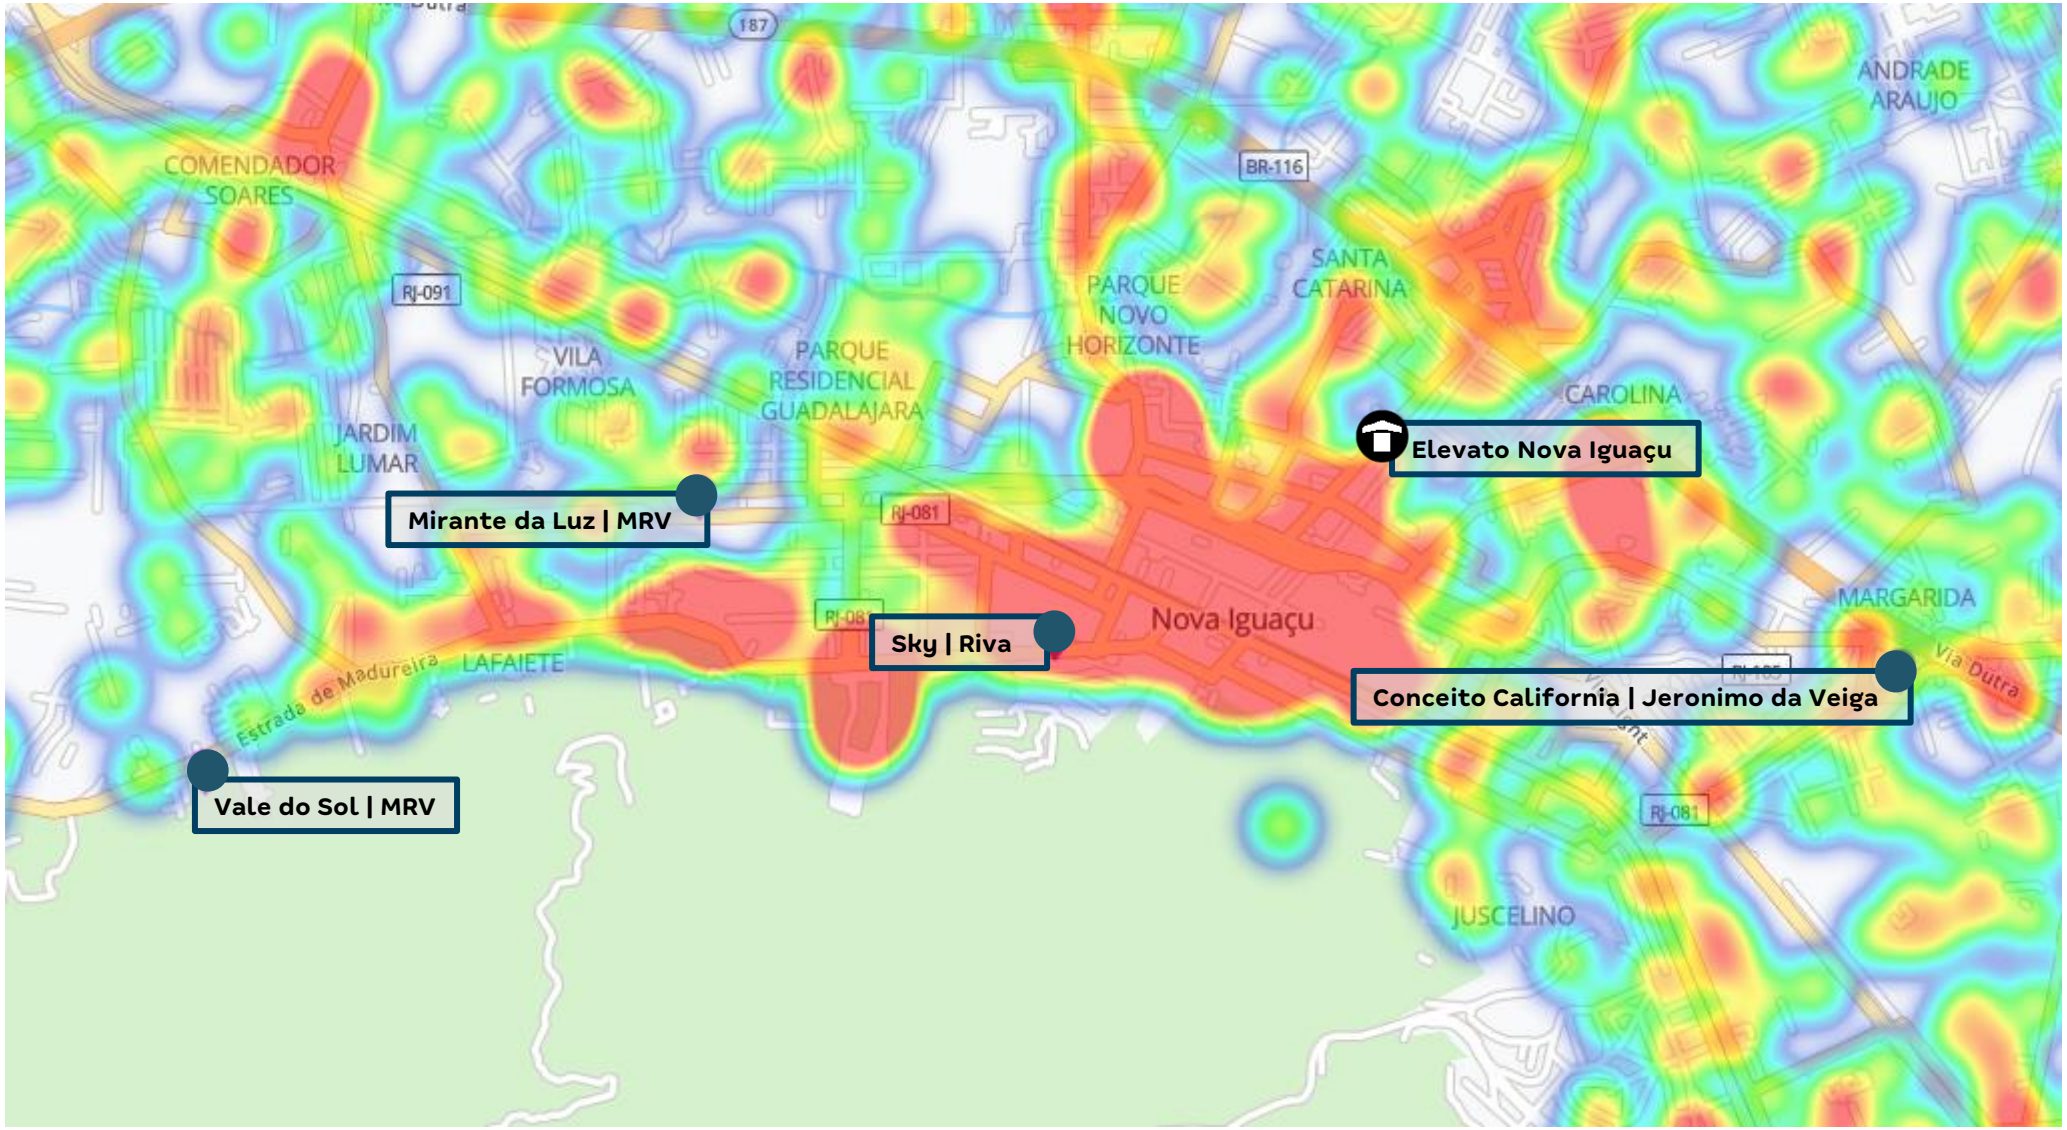

Informações Viabilidade

Projeto:	Elevato Nova Iguaçu							
Tipo:	**Uh Tipo**		**Com vaga**		**Varanda**		**Varanda | Vg Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	240.000		250.000		245.000		257.000	
Renda Inicial (VF)	3.608		4.539		3.897		5.399	
Renda Final*	-		-		-		-	
% RET1	25%		0%		0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,45	1.632	0,51	2.332	0,62	2.432	0,54	2.937
FGTS	0,49	1.759	0,61	2.759	0,60	2.355	0,53	2.870
Financiamento	97,81%	176.756	98,20%	193.434	97,58%	184.969	98,84%	202.976
Subsídio	148,77%	3.577	0,00%	0	166,59%	3.438	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25	25	25	25	25
Pró-Soluto	65,39%	21.432	65,39%	26.962	65,39%	23.148	55,71%	27.319
Preço Raso (RS)	205.155	205.155	225.487	225.487	216.343	216.343	236.102	236.102
TCD	57,02%	20.739	45,33%	20.739	52,46%	20.607	37,87%	20.607
VSO	15	15	2	2	15	15	2	2
Preço de Venda	**225.894**	**225.894**	**246.226**	**246.226**	**236.950**	**236.950**	**256.709**	**256.709**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**225.894**	**225.894**	**246.226**	**246.226**	**236.950**	**236.950**	**256.709**	**256.709**
Preço Raso (R$)	**205.155**		**225.487**		**216.343**		**236.102**	
% de Raso	**90,82%**		**91,58%**		**91,30%**		**91,97%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**		**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**		**-**		**-**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Elevato Nova Iguaçu
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	243.589
Renda Inicial (VF)	3.873
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,54	2.092
FGTS	0,55	2.132
Financiamento	97,78%	182.580
Subsídio	142,07%	3.160
Prazo de Pró-soluto	25	25
Pró-Soluto	64,91%	22.770
Preço Raso (RS)	212.734	212.734
TCD	53,44%	20.673
VSO	34	34
Preço de Venda	**233.407**	**233.407**
Elasticidade	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**233.407**	**233.407**
Preço Raso (R$)	**212.734**	
% de Raso	**91,14%**	
Raso Todas as Fases	**212.734**	
Nominal Todas as Fases	**233.407**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível, com ressalvas para o VSO**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, com ressalvas ao volume de vendas, uma vez que analisando a concorrência da região os produtos mais semelhantes ao produto Tenda (MRV), não tem obtido uma boa performance de VSO.

O projeto Elevato Nova Iguaçu está inserido em uma região com ótimos indicadores sociodemográficos, como renda e PEA/Dia, além de se posicionar em uma área mais central quando comparado ao Vale das Águas. A localização também é favorecida pela proximidade a pontos de interesse relevantes, como hospital, escolas, shopping e estação de trem.

Os atributos piscina e varanda contribuem com o ganho de preço médio do projeto. Apesar do alto volume de vendas, entendemos que o projeto tem potencial para capturar clientes para essa região.

Conforme demonstrado no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes na região praticam preços acima do produto Tenda, porém apresentam baixo VSO, o que reforça os desafios comerciais a serem enfrentados.

	Preço Real					Preço Normalizado (25m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Vale das Águas (BP25)	192.000	165.020	2.499	34	23	1.210	166.230
Elevato Nova Iguaçu	243.589	212.734	3.873	34	25	-	212.734

Análise de Riscos	Farol Ciclo
Ciclo avalia o Preço Vision como **factível, com ressalvas para o VSO**.	

1) Lançamos o Vale das Águas que fica localizado em uma região bem periférica que não é base para comparação.

2) A MRV lançou o Mirante da Luz onde tem entregue 245k médio com 10 vendas neste ano de 2025, este produto fica a 3,1 km distante. Também sabemos que a MRV esta com problema de performance em toda sua operação comercial.

3) A Riva lançou o Sky Mario Guimaraes neste mês tendo feito 290 vendas em preço médio de R$ 500 k, o produto fica localizado a 2,1 km do nosso empreendimento. O produto da Riva e a localização são superiores mas mostra que a Região tem um apetite para compra.

4) Nova Iguaçu é uma cidade que devemos apostar por que abre uma outra possibilidade de mancha na Baixada Fluminense

5) A ressalva se explica por que temos apenas 2 produtos base para comparação e nunca operamos um produto vertical em Nova Iguaçu.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Informações Gerais – Consolidado

Elevato Nova Iguaçu – RJ – Região Metropolitana > 100mil RJ

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	fev-25							
Sem Varanda e Sem Vaga		fev-27	ago-27	abr-29	6 meses	20 meses	fev-30	36 meses
Com Varanda e Sem Vaga		fev-27	ago-27	abr-29	6 meses	20 meses	fev-30	36 meses
Sem Varanda e Com Vaga		fev-27	ago-27	abr-29	6 meses	20 meses	fev-30	36 meses
Com Varanda e Com Vaga		fev-27	ago-27	abr-29	6 meses	20 meses	fev-30	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	8,63 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	6.935 m²
Cash:	4,06 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	2	**Custo de terreno m²:**	1.244,3
Permuta Financeira:	4,57 MM (3,23%)			**VaR 25 (R$ mil):**	605
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	605
Ato / %VGV:	4,06 MM / 2,9%			**Incorrido de Construção:**	0,00 MM

Área Líquida do Terreno:	6.151 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	1.402,9
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	6,1% / 49,8%
CA Máx/Proj.	6,0 / 4,3
Incorridos de Incorporação:	0,00 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Sem Varanda e Sem Vaga	T+18	205.155	273	225.894	240.000	97,8%	65,4%	57,0%
Com Varanda e Sem Vaga	T+18	216.343	273	236.950	245.000	97,6%	65,4%	52,5%
Sem Varanda e Com Vaga	T+18	225.487	30	246.226	250.000	98,2%	65,4%	45,3%
Com Varanda e Com Vaga	T+18	236.102	30	256.709	257.000	98,8%	55,7%	37,9%

Unidades Totais:	606	**Preço Médio:**	233.407	**Renda Média:**	3.873	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.461
Unidades Tenda:	606	**Avaliação Média:**	243.589	**Ato:**	2.081 (0,54 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	16.091
VSO:	34 Unidades	**VGV Total:**	141.444.544	**FGTS:**	2.123 (0,55 Salários)	**Preço Raso Médio:**	212.734
RET Médio:	3,6%	**VGV Tenda:**	141.444.544	**% em RET 1%:**	14%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	1.391

Construção

Custo Total Unit.:	102.058	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	34,10	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**17.451.550**	**LI:**	**20,02%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**21.878.523**	**Margem Bruta Econômica:**	**40,70%**
TIR:	**88,55%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(679.251)**	**Margem Bruta REF:**	**43,98%**
Exposição de Caixa:	**14,56%**	**Δ LI:**	**0,02%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(14.261.276)**	**Margem Rasa Econômica:**	**34,26%**
Payback Contingente (21 m):	**20 m/ (-1 m)**	**LI Resiliência:**	**12,81%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**39.999.428**	**Margem Rasa REF:**	**38,54%**
Payback Consolidado:	**20 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**28,79%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Elevato Nova Iguaçu		Sem Varanda e Sem Vaga		Com Varanda e Sem Vaga		Sem Varanda e Com Vaga		Com Varanda e Com Vaga	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	150.284	100,0%	65.570	100,0%	68.685	100,0%	7.845	100,0%	8.183	100,0%
PIS/COFINS	(2.956)	2,0%	(1.167)	1,8%	(1.504)	2,2%	(140)	1,8%	(146)	1,8%
Custo Total	(87.368)	59,3%	(39.253)	60,9%	(39.361)	58,6%	(4.371)	56,7%	(4.383)	54,5%
Custo Terreno	(8.734)	5,9%	(3.864)	6,0%	(3.967)	5,9%	(446)	5,8%	(457)	5,7%
Custo Relacionados a Terreno	(1.183)	0,8%	(530)	0,8%	(535)	0,8%	(59)	0,8%	(60)	0,7%
Custos de Incorporação	(3.515)	2,4%	(1.552)	2,4%	(1.552)	2,3%	(206)	2,7%	(206)	2,6%
Custo de Construção	(73.937)	50,2%	(33.308)	51,7%	(33.308)	49,6%	(3.660)	47,5%	(3.660)	45,5%
Lucro Bruto Econômico	59.959	40,7%	25.151	39,1%	27.819	41,4%	3.335	43,3%	3.655	45,5%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	59.959	40,7%	25.151	39,1%	27.819	41,4%	3.335	43,3%	3.655	45,5%
Despesas de Selling	(14.085)	9,6%	(6.059)	9,4%	(6.325)	9,4%	(715)	9,3%	(986)	12,3%
Contingência	(3.457)	2,3%	(1.508)	2,3%	(1.580)	2,4%	(180)	2,3%	(188)	2,3%
Margem de Contribuição	42.418	28,8%	17.583	27,3%	19.914	29,6%	2.440	31,7%	2.481	30,9%
IR e CSLL	(2.418)	1,6%	(955)	1,5%	(1.231)	1,8%	(114)	1,5%	(119)	1,5%
Margem Líquida	39.999	27,1%	16.628	25,8%	18.684	27,8%	2.325	30,2%	2.362	29,4%
Lucro Bruto REF Unit.	111.951	44,0%	104.109	42,2%	115.774	44,8%	124.728	46,6%	135.736	48,6%
Lucro Raso REF Unit.	89.431	38,5%	81.508	36,4%	93.319	39,5%	102.218	41,7%	113.370	44,2%

R$ Mil - VPL - Compra	Elevato Nova Iguaçu		Sem Varanda e Sem Vaga		Com Varanda e Sem Vaga		Sem Varanda e Com Vaga		Com Varanda e Com Vaga	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	87.173	100,0%	37.955	100,0%	39.875	100,0%	4.567	100,0%	4.776	100,0%
PIS/COFINS	(1.689)	1,9%	(665)	1,8%	(860)	2,2%	(80)	1,8%	(84)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(68.033)	78,0%	(30.283)	79,8%	(30.712)	77,0%	(3.421)	74,9%	(3.618)	75,8%
Custo Terreno	(6.149)	7,1%	(2.729)	7,2%	(2.789)	7,0%	(312)	6,8%	(319)	6,7%
Custo Relacionados a Terreno	(933)	1,1%	(418)	1,1%	(422)	1,1%	(47)	1,0%	(47)	1,0%
Custos de Incorporação	(2.537)	2,9%	(1.120)	3,0%	(1.120)	2,8%	(149)	3,3%	(149)	3,1%
Custo de Construção	(46.258)	53,1%	(20.839)	54,9%	(20.839)	52,3%	(2.290)	50,1%	(2.290)	48,0%
Despesas de Selling	(9.718)	11,1%	(4.172)	11,0%	(4.355)	10,9%	(502)	11,0%	(688)	14,4%
Contingência	(1.058)	1,2%	(462)	1,2%	(484)	1,2%	(55)	1,2%	(58)	1,2%
IR e CSLL	(1.382)	1,6%	(544)	1,4%	(704)	1,8%	(65)	1,4%	(68)	1,4%
Lucro Imobiliário	17.452	20,0%	7.008	18,5%	8.304	20,8%	1.067	23,4%	1.074	22,5%

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Anterior	Atual	Atual vs Anterior	Δ%
Data Estudo:	agosto-25	outubro-25	2 Meses	N/A
Lançamento:	fevereiro-27	fevereiro-27	0 Meses	N/A
Uhs:	606	606	-	0,0%
Preço Nominal:	233.407	233.407	-	0,0%
Preço Raso:	212.734	212.734	-	0,0%
Preço Nominal Inflacionado:	257.430	254.543	(2.887)	-1,1%
Preço Raso Inflacionado:	234.655	232.024	(2.631)	-1,1%
Renda Média:	3.873	3.873	-	0,0%
RET Médio:	3,32%	3,59%	0,3 p.p.	7,9%
% em RET 1%:	22,52%	13,74%	-8,8 p.p.	-39,0%
VSO:	34	34	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	5.253	5.194	(59)	-1,1%
Avaliação:	243.589	243.589	-	0,0%
Prazo construção F1:	20	20	-	0,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	25	25	-	0,0%
Custo Total Inf (Unit):	145.339	144.172	(1.166)	-0,8%
Custo Construção (Unit):	102.058	102.058	(0)	0,0%
Fração de construção:	43,7%	43,7%	0,0 p.p.	0,0%
INCC Folha Rosto:	1.199,51	1.216,71	17	1,4%
Custo Terreno Inf:	8.673.048	8.733.506	60.458	0,7%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	2.113	1.952	(160)	-7,6%
Fração do Terreno[1]:	6,1% / 49,8%	6,1% / 49,8%	0,0 p.p.	0,0%
Custo de Incorp. por uh:	5.530	5.800	270	4,9%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	3.183.494	3.147.797	(35.697)	-1,1%
Custo do Ciclo (Unit):	16.091	16.091	-	0,0%
LI Resiliência:	7,8%	12,8%	5,0 p.p.	63,9%
Lucro Imobiliário:	20,5%	20,0%	-0,5 p.p.	-2,3%
Penalty Varandas :	N/A	N/A	N/A	-
LI Ajustada:	N/A	N/A	N/A	-
LI Resiliência:	7,8%	12,8%	5,0 p.p.	63,9%
Exposição de caixa:	14,5%	14,6%	0,1 p.p.	0,5%
TIR:	91,1%	88,6%	-2,5 p.p.	-2,7%
Margem Bruta REF:	44,1%	44,0%	-0,1 p.p.	-0,2%
Margem Bruta Econômica:	41,0%	40,7%	-0,3 p.p.	-0,7%
Margem Rasa REF:	38,6%	38,5%	-0,1 p.p.	-0,2%
Margem Rasa Econômica:	34,6%	34,3%	-0,3 p.p.	-0,9%
Margem Contribuição Econômica:	29,1%	28,8%	-0,3 p.p.	-1,0%
Payback Contingente (Régua 21 m):	20 m/ (-1 m)	20 m/ (-1 m)	0	0,0%
Payback Consolidado:	20 Meses	20 Meses	0 Meses	0,0%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Anexos

Questionamentos Comitê 01/09/2025

Nome	Elevato Nova Iguaçu - Investimento	Observação - Elevato Nova Iguaçu
Fabricio Quesiti Arrivabene	Discutir em comitê	Ponto de preocupação com VSO
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	Importante trabalhar o desenvolvimento do projeto e preparação de lançamento, quando chegar a hora, porque abriria uma linha nova de oferta de produto numa região de alto potencial de demanda.
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	Ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Reprovado	O BB fez acordo para reduzir a divida de R$2 m para apenas 500 mil?
Renan Barbosa Sanches	Discutir em comitê	Esclarecer quais os documentos teremos para nos dar conforto na baixa nas situações de risco que estão apresentadas no comitê jurídico
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	Ok
Rodrigo Osmo	Discutir em comitê	1.Projeto parece ter risco de prazo, pois depende de variáveis externas (posseiro,...). Por outro lado, tem um desembolso de R$500K na cabeça. Como a LI seria impactada em um cenário conservador de atraso no lançamento?; 2. Duvida com relação ao color code da p. 24: projeto Mirante da Luz tem renda muito parecida com o nosso, mas farol está “verde”. Verde não seria para distancias maiores de R$400 de renda?; 3. Queria ter a discussão do VSO x preço no Comite (voice over) pois não parece confortável; 4. Qual foi a mágica da Direcional para vender 250 unidades no lançamento com preço de quase R$500K?

Fabricio Quesiti Arrivabene: *Ponto de preocupação com VSO.*

Resposta: Entendemos que até então só atuamos na borda de Nova Iguaçu, com menor renda e muito menos atratividade para o cliente.

Na região desse projeto teremos renda bem melhor (vide mapa ao lado, região similar a do Sky – Riva) e todos os atributos, se mostrando um bom candidato para trazermos a torre com o preço mínimo para viabilizar um vertical nesse município com alta densidade populacional e renda, permanecendo ainda assim com o menor valor que seria praticado na região frente aos concorrentes (MRV, Jeronimo da Veiga e Riva).

No desenvolvimento do projeto poderemos aprofundar na precificação de cada atributo (através dos lançamentos que já estão na prateleira), calibrando a dispersão atual, se necessário, além de já iniciarmos os levantamentos na região (PDV, EVs, direcionamento das campanhas) mirando no cliente ideal para esse produto na região.

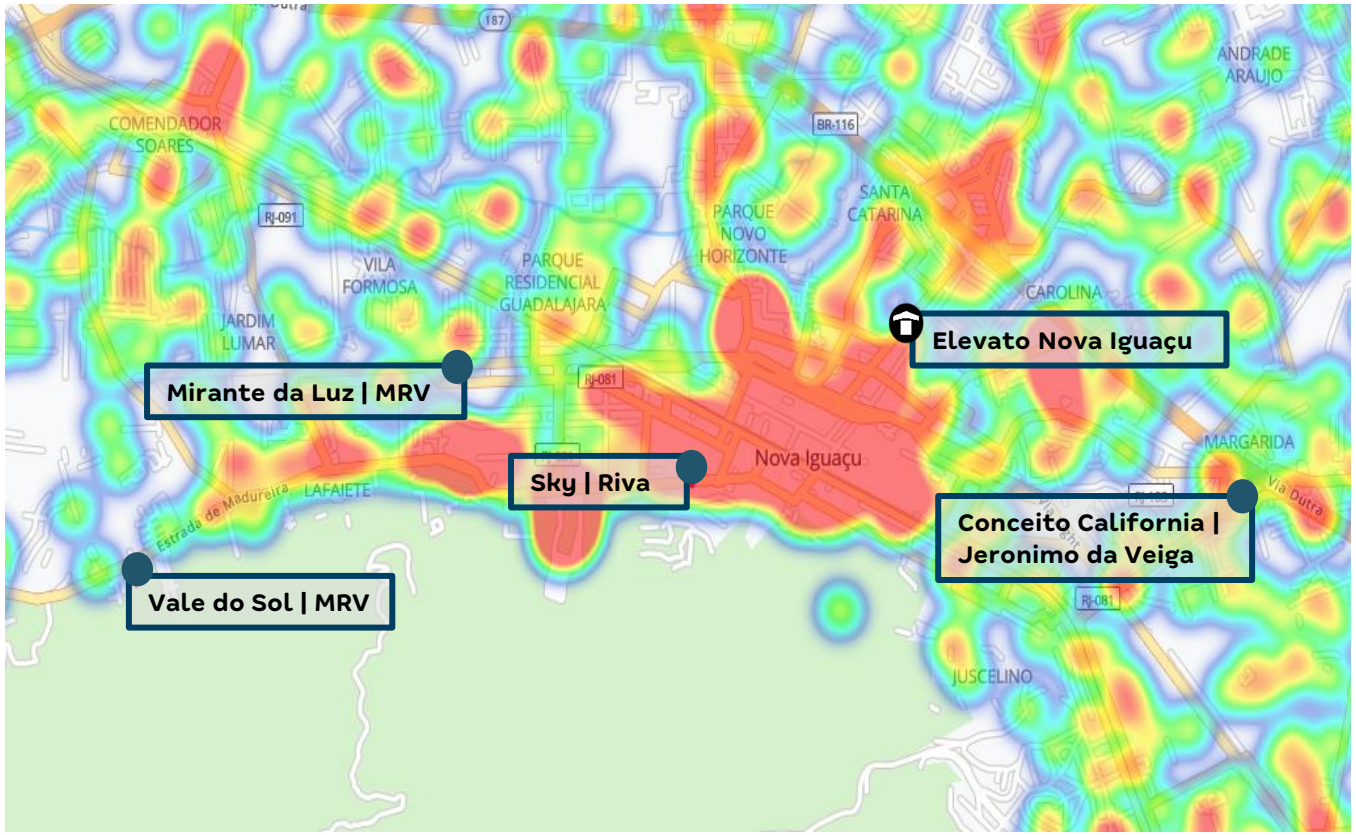

Luiz Mauricio de Garcia Paula: *O BB fez acordo para reduzir a divida de R$2 m para apenas 500 mil?*

Resposta: Ao longo da negociação do terreno, a advogada dos proprietários tabulares manteve contatos telefônicos com o Banco do Brasil para tratar da renegociação da dívida vinculada ao imóvel. Em 2024, houve uma sinalização verbal de que a dívida poderia ser quitada por R$ 1.000.000,00 (época em que quase venderam o terreno). Posteriormente, em abril de 2025 (quando nossa negociação avançou), em nova conversa, foi informado que o valor poderia ser renegociado para R$ 500.000,00. Diante disso, solicitamos aos advogados dos proprietários uma formalização dessas tratativas. Eles esclareceram, entretanto, que não havia qualquer registro documental ou troca de e-mails com o Banco, uma vez que todas as conversas ocorreram exclusivamente por telefone. Informaram ainda que, para que o Banco formalize a renegociação, seria necessário haver a confirmação da compra do terreno, o que somente ocorrerá após a deliberação do comitê. Assim, essa questão permanece como uma das pendências a serem solucionadas para viabilizar a baixa da dívida renegociada. É importante ressaltar que no contrato aditivo com os proprietários está sinalizado que qualquer valor acima de R$500.000,00 será debitado da permuta dos proprietários tabulares.

Renan Barbosa Sanches: *Esclarecer quais os documentos teremos para nos dar conforto na baixa nas situações de risco que estão apresentadas no comitê jurídico.*

Resposta: Para segurança da baixa, serão necessários os seguintes pontos: 1) Aditivo à PCV – assinatura do aditivo que autoriza a Tenda a negociar e formalizar acordo com o banco, com a obrigação de arcar com valor de até R$ 500.000,00 (já previsto em viabilidade e sem garantia de devolução). 2) Acordo com a posseira – assinatura do acordo visando ao encerramento da ação de usucapião, mediante o pagamento de R$ 2.000.000,00 aos ocupantes na data da assinatura da ECV, dos quais R$ 1.300.000,00 deverão ser descontados da permuta. Nesse caso, além da formalização do acordo, será necessária a decisão determinando a suspensão do processo. 3) Regularização societária da Fábrica (permutante) – adequação dos atos societários para viabilizar a ata de deliberação do sócio remanescente (em razão do falecimento dos demais e necessidade de apuração de haveres) e retirratificação da alteração do Contrato Social. Todos esses atos já se encontram em tratativas avançadas, tanto com a Fábrica quanto com a posseira. No que se refere ao Banco do Brasil, é necessária a aprovação prévia em comitê para que seja iniciada a negociação. A Fábrica não pretende provocar o banco sem a segurança do pagamento pela Tenda, a fim de evitar qualquer prejuízo ao andamento processual.

Rodrigo Osmo: 1. *Projeto parece ter risco de prazo, pois depende de variáveis externas (posseiro,...). Por outro lado, tem um desembolso de R$500K na cabeça. Como a LI seria impactada em um cenário conservador de atraso no lançamento?;*

Resposta: Não vemos risco de prazo dado que o status das variáveis externas está mapeado (resposta Renan no slide anterior). Hoje o lançamento já está considerando um prazo 12+6+6 (a contar de fev.25) e, uma vez o lançamento sendo postergado por conta de alguma variável, a escritura também será e consequentemente os gastos atrelados à ela também. A exposição de caixa será os R$500.000,00.

2. *Duvida com relação ao color code da p. 24: projeto Mirante da Luz tem renda muito parecida com o nosso, mas farol está "verde". Verde não seria para distancias maiores de R$400 de renda?;*

Resposta: Tem razão, corrigido.

3. *Queria ter a discussão do VSO x preço no Comite (voice over) pois não parece confortável;*

Resposta: Incluímos algumas considerações na resposta ao Fabricio para contribuir com o voice over.

4. *Qual foi a mágica da Direcional para vender 250 unidades no lançamento com preço de quase R$500K?*

Resposta: O produto esta em região muito boa, com oferta de produtos maiores (+100 m²). Pelo que pudemos apurar o lançamento da Riva trouxe um produto compacto que parece ter atingido uma demanda reprimida de famílias menores e ticket de entrada. Lançaram com um Stand bacana e bom represamento, gerando um excelente resultado na largada.

Obrigado
