Tenda

sua próxima conquista

Book de Lançamento

Regional: BA

Projeto: Encanto Piatã – F3

Data Comitê: 02/03/2026

One Page – Encanto Piatã F3 - Aprovação

[1]

Cidade	Salvador	**Mancha de demanda**	BA - Salvador - Alta
Regional	BA	**Cluster MPR**	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Encanto Piatã F2	**Aprovação Fase Anterior**	Consolidado
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Fev

Unidades (Fases)	379 (1)	**CA Máx | Proj**	3,0 | 2,4
Unidades com Vaga (%)	91 (24%)	**Escritura | Lançamento**	mai/24 | mar/26
Unidades com Varandas (%)	0 (0%)	**Tipologia**	F2E - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	6.624 (6,3%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	6.624 (INCC)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	425	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[2]

Custo Construção (%VGV)	36.597 (34,6%)	**Indireto Unit.**	16.308
Prazo da Obra (meses)	18	**Torre Unit.**	60.803
Custo Total Unit. (LPU):	96.561 (99)	**Infra Unit.**	10.700
Início de Obra	set-26	**Fundação Unit.**	7.763

[3]

Preço Nominal Unit.	279.141	**VSO**	21
Preço Raso Unit.	245.636	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	266.898	**Renda (% em RET 1%)**	4.291 (0,0%)



LI (Régua):	**32,9% (30,6%)**	**Margem Bruta Econômica:**	52,6%
LI Marginal:	38,5%	**Margem Rasa Econômica:**	45,1%
Margem Bruta REF:	55,0%	**Margem Contribuição Econômica:**	42,5%
Margem Rasa REF:	**48,9%**	**Exposição (% VGV):**	11.316 (10,7%)
TIR:	101,5%	**VGV Total:**	**105.795**
Payback Contingente (21 m) :	**18 m/ (-3 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(7.595)
Payback Consolidado:	18	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	26.242

[1] Destaques

- Lançamos o Encanto Piatã F1 em jun/24 e a F2 em mai/25, ambos com uma performance de vendas acima do esperado. Estamos antecipando o Lançamento da Fase 3 em relação ao BP (abr/25), devido ao esgotamento do estoque das fases anteriores.

[2] Custo e Preço

- Como demonstrado na tabela abaixo, os indicadores deste comitê são superiores aos aprovados no comitê anterior. O avanço se justifica pelo desempenho real de vendas da Fase 02, com ganho de preço de quase 9% em relação ao previsto, e ocorre apesar do incremento de R$ 6 mil/UH no custo em relação ao comitê anterior.

Laçto Mai/2025	Consolidado	Encanto Piatã F3
LI da Fase	30,4%	28,60%
folga consolidada	10,4%	10,4%
LI (tirando a folga)		18,2%
Régua	20,0%	20,0%
Distância régua anterior:		-1,80%
Lançamento Atual:		
LI atual:		32,93%
Régua atual:		22,00%
Distância régua atual:		10,93%
Distância Entre Réguas		12,73%

One Page – Encanto Piatã F3 - Real

Cidade	Salvador	**Mancha de demanda**	BA - Salvador - Alta
Regional	BA	**Cluster MPR**	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Encanto Piatã F2	**Aprovação Fase Anterior**	Consolidado
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Fev

Unidades (Fases)	379 (1)	**CA Máx | Proj**	3,0 | 2,4
Unidades com Vaga (%)	91 (24%)	**Escritura | Lançamento**	mai/24 | mar/26
Unidades com Varandas (%)	0 (0%)	**Tipologia**	F2E - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	6.624 (6,4%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	6.624 (INCC)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	425	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	36.597 (35,3%)	**Indireto Unit.**	16.308
Prazo da Obra (meses)	18	**Torre Unit.**	60.803
Custo Total Unit. (LPU):	96.561 (99)	**Infra Unit.**	10.700
[1] **Início de Obra**	out-26	**Fundação Unit.**	7.763

Preço Nominal Unit.	273.488	**VSO**	47
Preço Raso Unit.	240.662	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	266.898	**Renda (% em RET 1%)**	4.291 (0,0%)

Fase de Lançamento - Margens Novas Vendas		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	242.810
Preço Inf. Médio Unit.	275.855	**Margem Bruta REF (%)**	53,4%
Custo Inf. Médio Unit.	128.560	**Margem Rasa REF (%)**	47,1%



LI (Régua):	**33,7% (22,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	52,1%
LI Marginal:	39,2%	**Margem Rasa Econômica:**	44,6%
Margem Bruta REF:	53,4%	**Margem Contribuição Econômica:**	42,3%
Margem Rasa REF:	**47,1%**	**Exposição (% VGV):**	8.234 (7,9%)
TIR:	118,4%	**VGV Total:**	**103.652**
Payback Contingente (21 m) :	**13 m/ (-8 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(1.542)
Payback Consolidado:	13	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	28.410

[1] Cenário considerando data de IO conforme PCP 173.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Farol Pareceres – Encanto Piatã F3

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	**Lavratura da escritura de venda e compra**: 23/05/2024; **Registro da escritura de venda e compra**: 12/06/2024; **Registro de Incorporação**: 21/06/2024; **Averbação do patrimônio de afetaçã**o: 21/06/2024. Resta pendente a instituição de **servidão de passagem de rede de esgoto e servidão administrativa de uma galeria de drenagem**. Constamos no Memorial de Incorporação, na Convenção de Condomínio e nos Contratos PF e PJ a previsão de instituição de futuras servidões.	Ok	
Legalização	**Licenças emitidas:** Alvará de Construção - Emitida em 14/06/2024 - Válida até 14/06/2028; Autorização de Supressão Vegetal - Emitida em 27/10/2023 - Válida até 27/10/2025; Licença Ambiental - Emitida em 25/03/2024 - Válida até 25/03/2029; Inexigibilidade da COMAER - Emitida em 28/04/2022; Autorização do IPHAN - Emitida em 19/03/2024; Licença para Terraplanagem - Emitida em 05/08/2024 - Válida até 05/08/2026; Licença para Demolição do Pórtico - Emitida em 22/05/2025 - Válida até 22/05/2027; Autorização de Supressão Vegetal do Talude - Emitida em 28/07/2025 - Válida até 28/07/2027; Obra em Logradouro Público de Drenagem - Emitida em 18/11/2024 - Válida até 18/05/2025; Obra em Logradouro Público de Esgoto - Emitida em 07/05/2025 - Válida até 28/10/2025; Obra em Logradouro Público de Água - Emitida em 30/09/2025 - Válida até 21/03/2026. **Licenças a serem emitidas para inicio de obras:** - Autorização de Supressão Vegetal da Calçada - Protocolado 17/11/2025 - Previsão de emissão em 27/02/2026;	Ok com ressalvas	
Produto	Sem riscos	Ok	
GETEC	A verba de R$ 500.000,00 referente à cobrança da concessionária Coelba não foi considerada, pois, em experiências anteriores, a concessionária já aplicou taxas elevadas em obras semelhantes, sendo possível reverter integralmente a cobrança após negociações.	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos	Ok	
Contratação	**Laudo de engenharia**: Em andamento, demos entrada no protocolo de análise definitiva em 13/02/2026 com previsão de emissão em 13/03/2026. **Risco**: Pendente - emissão LAE; **Jurídico**: Ok	Ok com ressalvas	
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	O parecer do ciclo é favorável	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos associados.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA
SSA – Salvador

Lançamento

1. Farol de Itapuã | Ponta Humaitá | Lagoa Abaeté
2. Jardim Armação Prime
3. Vivenda Real (Morada Real)
4. Morada das Estações
5. Encanto Piatã
6. Vale dos Lírios

LandBank

7. Vale das Orquídeas
8. Jaguaribe Prime
9. Solar de Itapagipe
10. Vila Laura Prime
11. Mirante Verona (Veneza)
12. Vista Serena
13. Vale das Tulipas
14. Portal de Salvador
15. Solar Patamares
16. Paralela Sun Prime
17. Privilege Salvador Norte

Cluster MPR – (Comitê)
Cluster 4 - Azul
Região
Capital

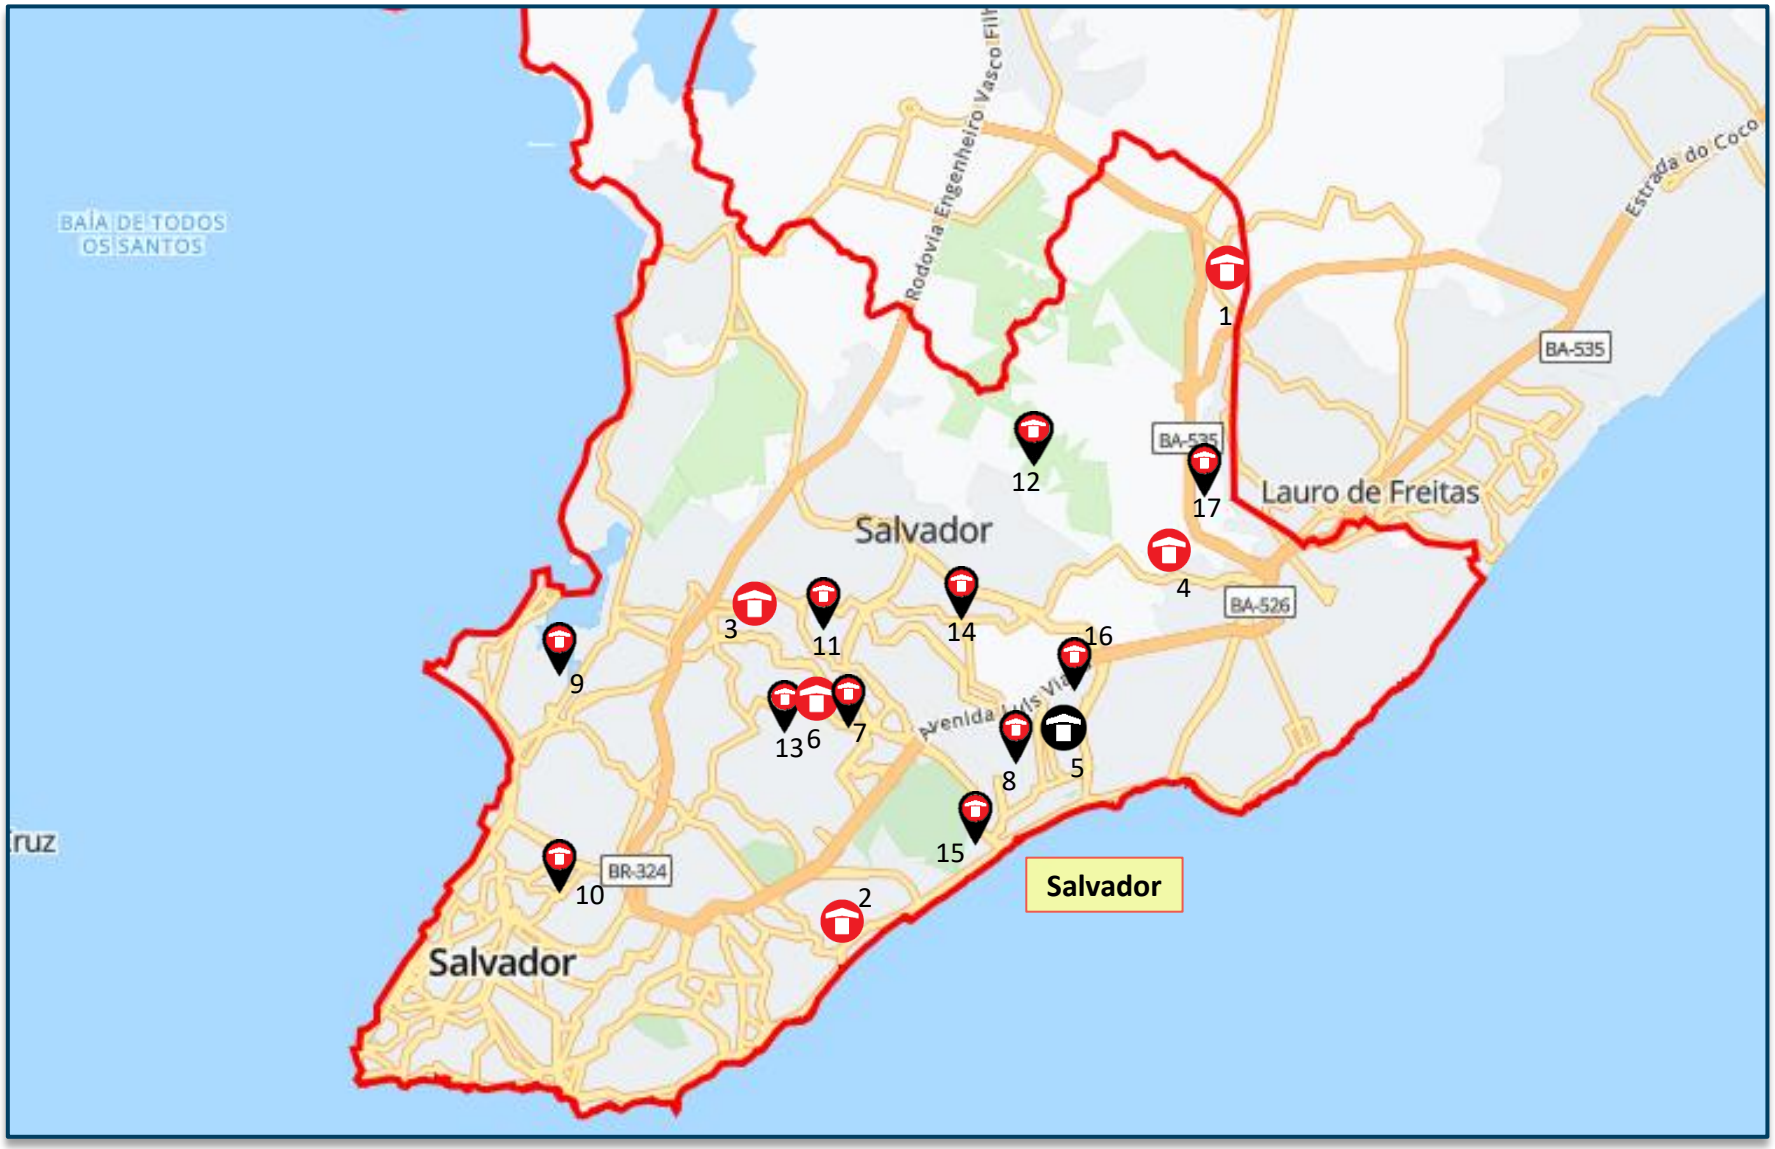

Lançados LandBank Comitê

PRODUTO

Empreendimento Encanto Piatã
Descritivo - Lançamento

Informações Gerais		
Terreno	Área terreno	24.061,27m²
	Menor poligonal	24.002,19m²
	App/fna	Não | Não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim: 59.08m² | Não
	Área liquida	24.002,19m²
	Zoneamento	ZPR-3
	Ca básico	1,50
	Ca máximo	3,00
	Ca projetado	2,36
	Ca líquido	2,49
	Gabarito máximo	N/A
Geral	Total uh	1611
	Total de vagas	425, sendo 17 PCD e 98 motos (26,38%)

Informações Gerais		
Tipologia	Tipologia	Modular com elevador
	Gabarito	T+15
	Lâmina	05 14pp, 01 12pp e 02 10pp
	Área privativa	38,54m², 38,70 e 38,73m²
Condomínio	Unidade pcd	81
	Unidade lazer|técnica	21 | 08
	Torre	08
	Fase	3
Lazer	Lazer Interno	01-Salão de festas, 02-Brinquedoteca, 03-Espaço Delivery, 04-Espaço Oficina, 05-Espaço Teen, 06-Espaço Office, 07 Espaço saúde, 08-Fitness e 09-Sport Bar
	Lazer Externo	10-Salão de festas externo, 11- Quadra Coberta P, 12-Quadra Coberta M, 13- Play Kids, 14-Play Baby, 15-Play Pet, 16-Fitness externo, 17- Praça de Jogos, 18-Espaço Cultivo, 19- Praça dos sabores e 20-Espaço relax

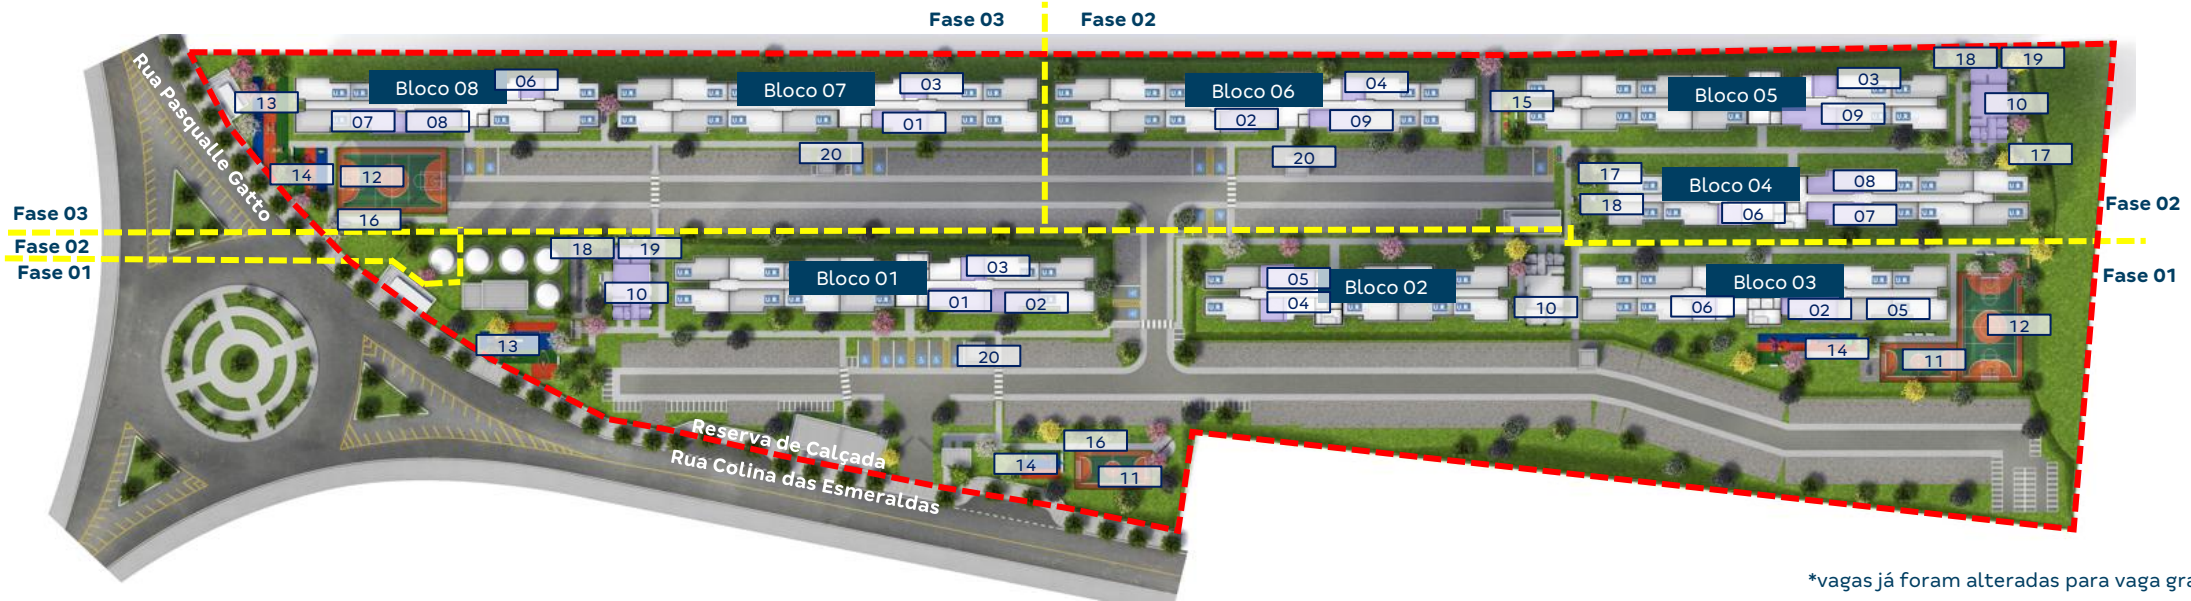

*vagas já foram alteradas para vaga gramada com plaqueado

PRODUTO

Empreendimento Encanto Piatã
Atributos de produto - Lançamento

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Faixa de renda**	02	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Sim	1611uhs (Fase 01: 568uh, fase 02: 664uh, fase03: 379uh)
	Atributos Infra	Sim	Vaga de carro compartilhado, 03 Salões de festas externo, 02 Quadras Coberta P, 02 Quadras Coberta M, 02 Plays Kids, 02 Plays Baby, 01 Play Pet, 02 Fitness externo, 02 Praças de Jogos, 03 Espaços Cultivo, 02 Praça dos sabores e 04 Espaços relax
	Atributos Torre	Não	
	Edifício Garagem	Não	

Perspectiva

Quadra Coberta

Vaga de carro compartilhado – Sugestão de uso

PRODUTO

Empreendimento Encanto Piatã
Modulação - Lançamento

Fase 3: 379uh (sendo 19U.R) - 91 vagas (Sendo 4 PCD e 2 de moto)				
módulo	Blocos	UH	Vagas	Parecer
Módulo 07	02 Blocos (T+15)	379Uh (Sendo 19U.R)	91 vagas (Sendo 04PCD e 02 Moto)	Dos Lazeres, esta contemplado no módulo 07 o Espaço Relax, o Play baby, play kids, fitness externo e quadra coberta

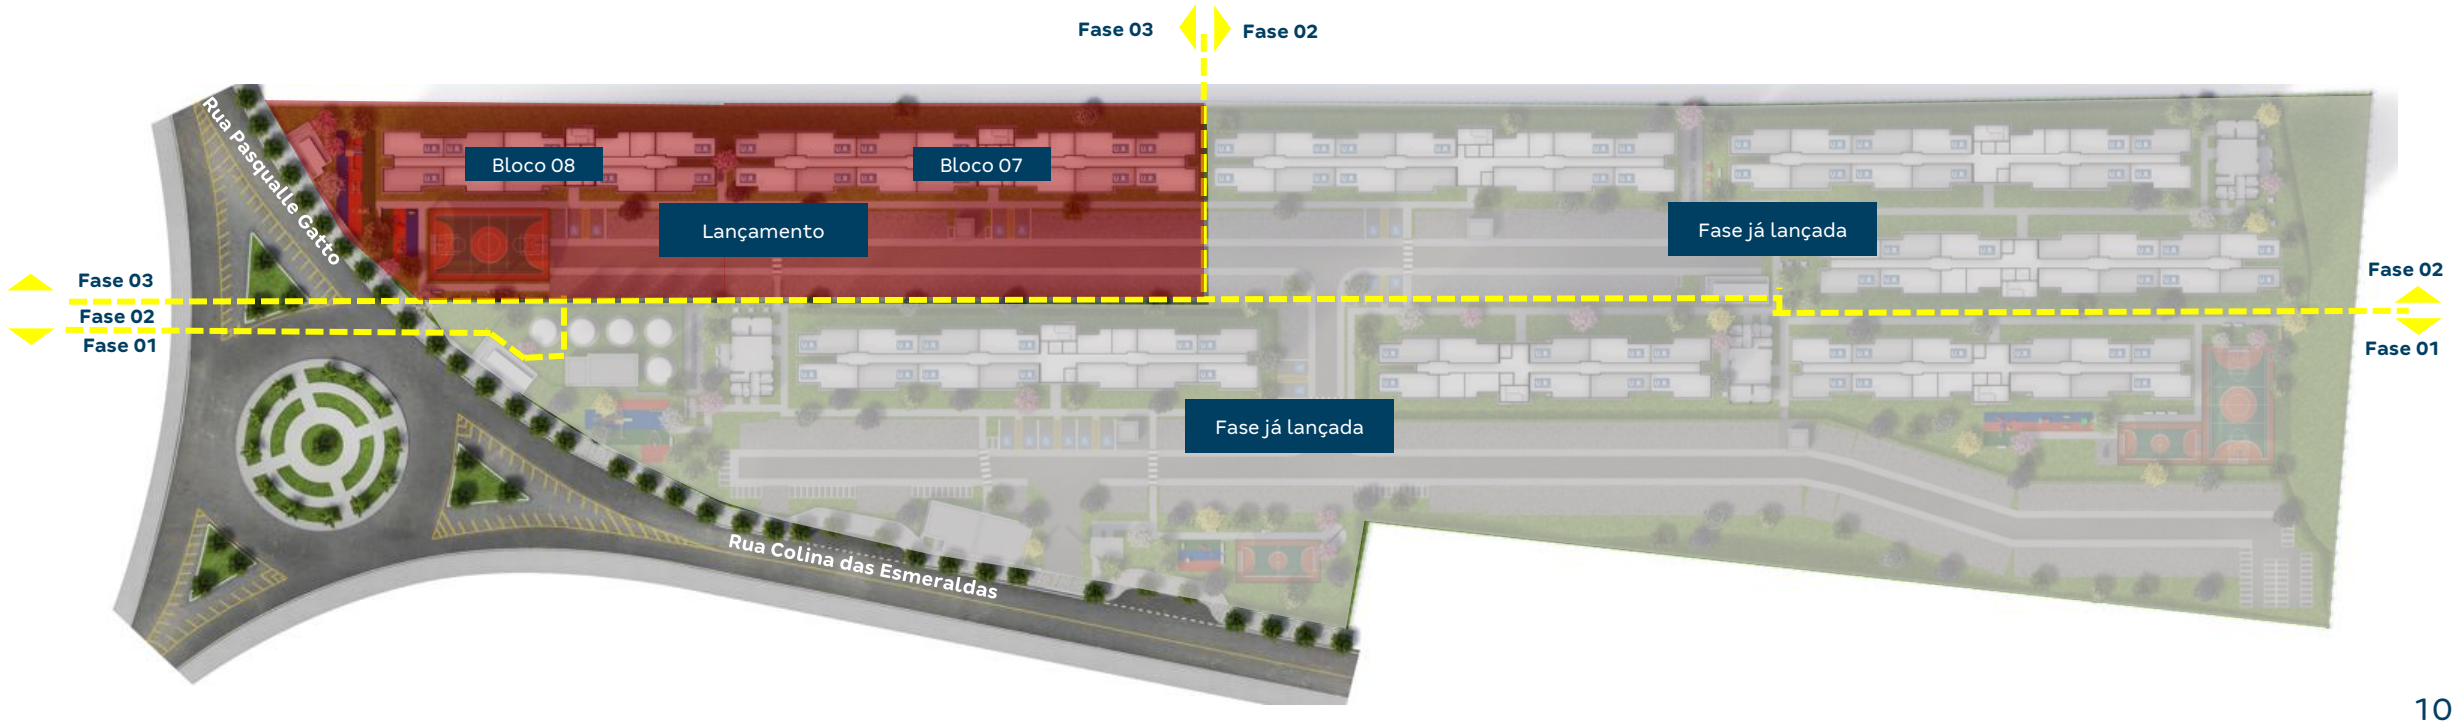

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Custo de Construção

	R07 ENCANTO PIATÃ FASE 3	R06 ENCANTO PIATÃ FASE 3	BP26 ENCANTO PIATÃ FASE 3	LVS ENCANTO PIATÃ F1	LVS ENCANTO PIATÃ F2
Torres	2	2	2	3	3
Unidades Construídas	384	384	384	576	664
Unidades Vendidas	379	379	379	568	664
Condomínios (qta.)	1	1	1	1	1
Cidade	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	1 Torre | T+15 | 14PP | C2A	1 Torre | T+15 | 14PP | C2A	1 Torre | T+15 | 14PP | C2A	1 Torre | T+15 | 14PP | C2A	3 Torres | T+15 | 14PP | C2A
Tipologia	1 Torre | T+15 | 10PP | C1A	1 Torre | T+15 | 12PP | C2A	1 Torre | T+15 | 10PP | C1A	1 Torre | T+15 | 12PP | C2A	
Tipologia	-	-	-	1 Torre | T+15 | 10PP | C1A	
Projeto Infra	LO	LO	EP		
Projeto Torre	LO	LO	LO		
Mês Base	fevereiro-26	maio-25	setembro-25		
Incc	1.228,160	1.178,386	1.218,747		
LVS	novembro-25	março-25	setembro-25		
Indiretos	novembro-25	março-25	setembro-25	dezembro-25	dezembro-25
Base de Preço	LPU 99	LPU 89			
Takt	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	18	17	18	21	21
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 95.712	R$ / UND R$ 89.995	R$ / UND R$ 90.194	R$ / UND R$ 104.766	R$ / UND R$ 87.183
Indireto	R$ 16.308	R$ 14.046	R$ 14.302	R$ 18.861	R$ 13.659
Torre	R$ 60.803	R$ 57.627	R$ 57.627	R$ 58.633	R$ 57.276
Infra	R$ 10.700	R$ 10.522	R$ 10.522	R$ 17.390	R$ 9.303
Fundação	R$ 7.763	R$ 7.705	R$ 7.648	R$ 8.316	R$ 6.686
EEE					
ETE					
Contenção				R$ 172	
Terraplenagem	R$ 137	R$ 95	R$ 95	R$ 1.395	R$ 258
CUSTO TOTAL II	R$ 849	R$ 595	R$ 593	R$ 849	R$ 849
Urbanização	R$ 62	R$ 60	R$ 62	R$ 62	R$ 62
Drenagem					
Extensão de Rede Elétrica					
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 787	R$ 535	R$ 531	R$ 787	R$ 787
CUSTO TOTAL III					
Incorridos					
CUSTO TOTAL IV		R$ 3.826	R$ 701		
Atualização por INCC		R$ 3.826	R$ 701		
CUSTO TOTAL I+II	R$ 96.561	R$ 90.590	R$ 90.787	R$ 105.615	R$ 88.032
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 96.561	R$ 94.416	R$ 91.488	R$ 105.615	R$ 88.032

Custo de Construção

	R07 ENCANTO PIATÃ FASE 3	BP26 ENCANTO PIATÃ FASE 3	
Torres	2	2	
Unidades Construídas	384	384	
Unidades Vendidas	379	379	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Salvador - BA	Salvador - BA	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	1 Torre | T+15 | 14PP | C2A	1 Torre | T+15 | 14PP | C2A	
Projeto Infra	LO	EP	
Projeto Torre	LO	LO	
Mês Base	fevereiro-26	setembro-25	
Incc	1228,160	1218,747	
LVS	novembro-25	setembro-25	
Indiretos	novembro-25	setembro-25	
Base de Preço	LPU 99	0	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	18	18	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 95.712	R$ / UND R$ 90.194	DIF R$ 5.518
Indireto	R$ 16.308	R$ 14.302	R$ 2.006
Torre	R$ 60.803	R$ 57.627	R$ 3.176
Infra	R$ 10.700	R$ 10.522	R$ 179
Fundação	R$ 7.763	R$ 7.648	R$ 115
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Terraplenagem	R$ 137	R$ 95	R$ 42
CUSTO TOTAL II	R$ 849	R$ 593	R$ 256
Urbanização	R$ 62	R$ 62	R$ 0
Drenagem	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Elétrica	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 787	R$ 531	R$ 256
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 701	-R$ 701
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 701	-R$ 701
CUSTO TOTAL	R$ 96.561	R$ 91.488	R$ 5.073

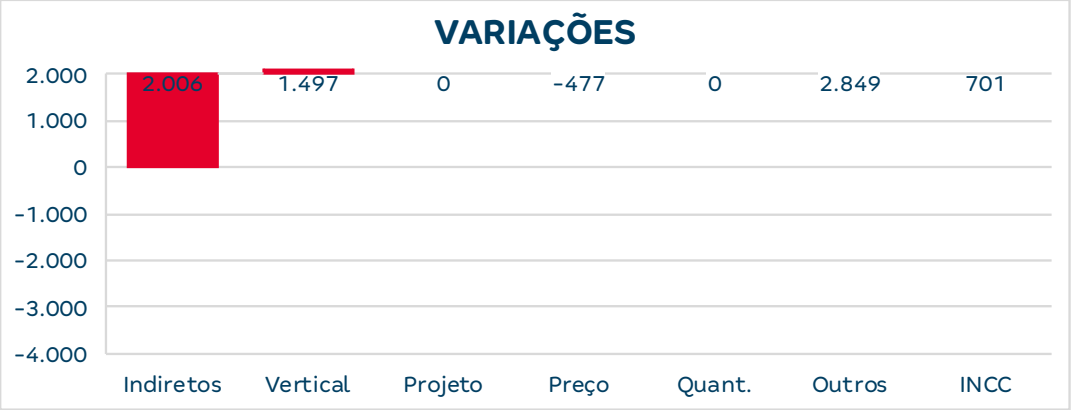

INDIRETOS
+1559 | Pessoal Permanente (rev)
+535 | Implantação de canteiro (fases)

VERTICAL
+1497 | Retroalimentação

PREÇO
-951 | Elevador (Contratação Vivenda Real)
-419 | Armação torre
+302 | Gesso Acartonado
+297 | Estrutura de concreto
+220 | Pintura
+115 | Fundação (cotação)

OUTROS
+2411 | Instalações Torre
+182 | Instalações Infra

+256 | Extensão (LVS)

INCC
701

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Considerado de acordo com projeto, extensão de aproximadamente 80m até PV na rua do empreendimento.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
F1 e F2 jogando no PV provisoriamente na rotatória. Na F3 será feita uma extensão até a rotatória de 60m e criado no novo PV, que receberá todas as fases e haverá uma nova rede paralela a existente de DN400 com 190m até o PV córrego existente.

SISTEMA DE DRENAGEM
Não se aplica.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Não se aplica.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Há viabilidade.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Não se aplica.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 2
Esgoto	Nível 4
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 1
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Projeto aprovado 10/2024.

Esgoto:
- Solicitado desvio da extensão, aguardando envio da viabilidade por parte da Embasa.

Drenagem:
- Não se aplica.

Elétrica:
- Projeto aprovado 09/2024. .

Gás:
- Não se aplica.

Urbanização:
- Não se aplica.

Logística

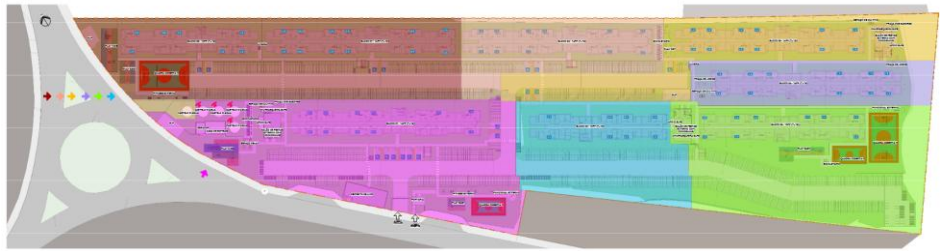

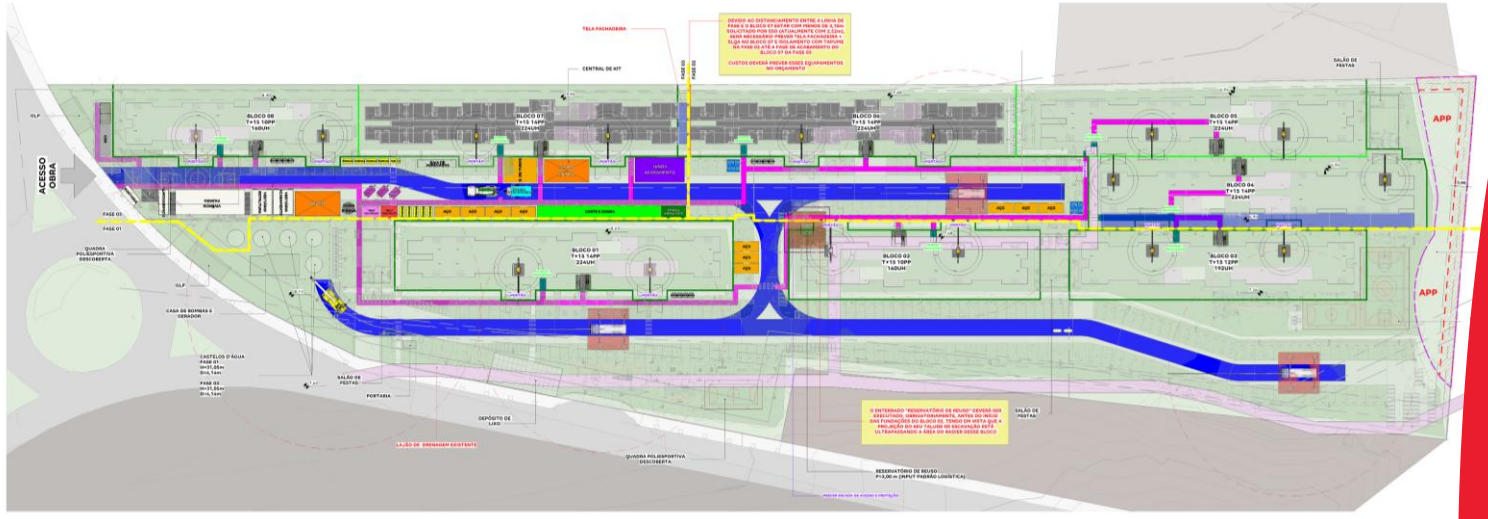

VIVÊNCIA - CONTAINERS								
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MODULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41m X 4,90m	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	
CONTAINER SALA DO MESTRE (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
CONTAINER VESTIÁRIO (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	7 MÓDULOS DE CONTAINER EMBAIXO, 7 MÓDULOS EM CIMA	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)	1 EQUIPAMENTO	-	-	-	TODO PERÍODO	-	
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-	
ESCAVADEIRA (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOB	1 DESMOB	CONSIDERAR DURANTE O PERÍODO DE TERRAPLENAGEM	-	-	
MINIGRUA (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-	
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-	
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	
CREMALHEIRA PCT_BA (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB DE CREMALHEIRA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB DE CREMALHEIRA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	

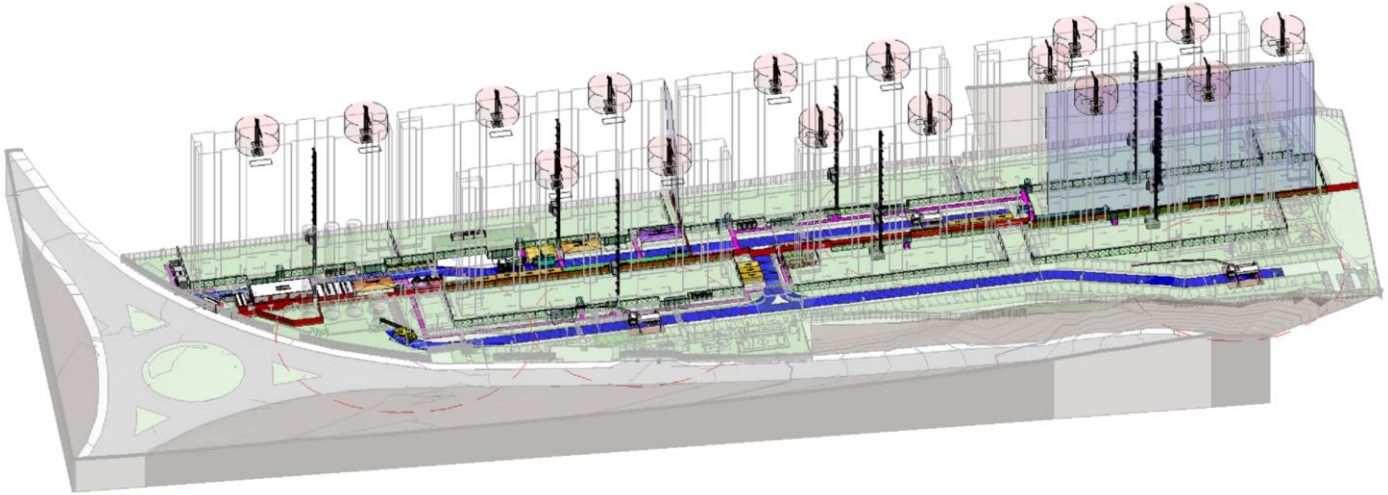

Logística

CONDIÇÕES DETERMINANTES:

- **LEGALIZAÇÃO / OBRA / CUSTOS** ***LEGALIZAÇÃO DEVERÁ SOLICITAR LICENÇA PARA FAIXA DE INTERVENÇÃO EM APP (3,00m)***
  RECOMENDAMOS QUE O FECHAMENTO SEJA EXECUTADO DURANTE A FASE 01.
- **SSO / GETEC/ OBRA / CUSTOS** DEVIDO AO DISTANCIAMENTO ENTRE A LINHA DE FASE E O BLOCO 07 ESTAR COM MENOS DE 3,10m SOLICITADO POR SSO (ATUALMENTE COM 2,52m), SERÁ NECESSÁRIO PREVER TELA FACHADEIRA + SLQA NO BLOCO 07 E ISOLAMENTO COM TAPUME NA FASE 02 ATÉ A FASE DE ACABAMENTO DO BLOCO 07 DA FASE 03

  CUSTOS DEVERÁ PREVER ESSES EQUIPAMENTOS NO ORÇAMENTO.
- **OBRA / GETEC (ESTRUTURA)** PREVER CUSTO PARA SECCIONAMENTO DOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS (CASTELOS) EM DUAS PARTES, NÃO MAIORES QUE 20,00m CADA (GABARITO MÁXIMO DA CARRETA DE TRANSPORTE), DEVIDO À ALTURA DOS MESMOS, PARA ACESSO DA CARRETA AO EMPREENDIMENTO. CASO A ALTURA ESTEJA PRÓXIMA A 20,00m, PODERÁ SER VERIFICADO COM O FORNECEDOR O CUSTO DE PRANCHA ALONGADA.
  DIÂMETRO: 4,14m / ALTURA: 31,05m
  ALÉM DISSO, MESMO QUE JÁ TENHA SIDO ALINHADO E VALIDADO COM O FORNECEDOR "DIPAWA RESERVATÓRIOS " O DIÂMETRO DE 4,14m, É IMPRESCÍNDIVEL QUE SEJA AGENDADO COM O MESMO UMA VISITA AO TERRENO, PARA QUE O MESMO VERIFIQUE SE É POSSÍVEL O TRANSPORTE (ACESSOS, FIAÇÃO BAIXA, PEQUENA ÁREA DE MANOBRA, ALTURA MÁXIMAS DE VIADUTOS). CASO SEJA NECESSÁRIA A MONTAGEM IN LOCO, LOGÍSTICA DEVERÁ SER ACIONADA E CUSTOS DEVERÁ VERIFICAR SE É VIAVEL O CUSTO DA MÃO DE OBRA DE MONTAGEM.

SOLUÇÕES TÉCNICAS:

- **OBRA / CUSTOS / SSO** PREVER CUSTO DE SLQA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA, E DE TELA FACHADEIRA DURANTE A EXECUÇÃO DO ACABAMENTO DO BLOCO 04 DA FASE 02 E BLOCO 07 DA FASE 03. SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO ADOTADA EM RAZÃO DO GABARITO, ACIMA DE 60,00m, DEVIDO AO RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS EM PASSEIO, VIÁRIOS, VIZINHOS EXTERNOS, ÁREA DE VIVÊNCIA E CAMINHO SEGURO DEFINITIVO. **ATENÇÃO A EMPREENDIMENTOS FASEADOS, APÓS ENTREGA DA FASE 1, ELA SE TORNA VIZINHO CRÍTICO***
- **CUSTOS / OBRA** PREVER CUSTO PARA PERDA DE CONCRETO DURANTE O PERÍODO ESTRUTURA COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA ESTACIONÁRIA PARA A CONCRETAGEM DE TODOS OS BLOCOS, NECESSÁRIO DEVIDO AO GABARITO (T+15).
- **CUSTOS / PLANEJAMENTO / OBRA / LEGALIZAÇÃO** DEVERÁ SER PRIORIZADA A INSTALAÇÃO DOS CASTELOS D'ÁGUA NA ETAPA DE PRÉ-FORMA, PARA EVITAR SEU ENCLAUSURAMENTO APÓS INÍCIO DA ETAPA DA ESTRUTURA E LOCAÇÃO DA ÁREA DE VIVÊNCIA. CASO CONTRÁRIO, DEVERÁ SER PREVISTO CUSTO E PRAZO PARA SEU IÇAMENTO PELO VIÁRIO EXTERNO.

CONDIÇÕES DETERMINANTES: DETERMINAM A VIABILIDADE DE EXECUÇÃO DA OBRA ,TÉCNICA E FINANCEIRA. SEM O CUMPRIMENTO DELAS, A OBRA NÃO CONSEGUE SER EXECUTADA.
SOLUÇÕES TÉCNICAS: INDICAM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU PROCESSOS PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL.
PONTO DE ATENÇÃO: DEMONSTRA POSSÍVEIS RISCOS À OPERAÇÃO.

PCP 173

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI	Folga Inicio
Encanto Piatã - F1	jun/24	576	2	A	25/09/24	01/04/25	03/04/25		23/09/25	25/09/25		jun/26	3,4
Vale dos Lírios F1	ago/24	448	2	B	11/12/24	25/04/25	27/04/25		05/09/25	08/09/25		jun/26	4,4
Vale dos Lírios F2	mar/25	320	2	B	01/06/25	06/09/25	09/09/25		08/12/25	10/12/25		set/26	2,6
Jardim Armação Prime	dez/24	384	2	A	11/04/25	24/09/25	28/09/25		28/01/26	30/01/26		out/26	3,9
Vivenda Real I	jan/25	576	2	B	22/07/25	09/12/25	11/12/25		12/06/26	15/06/26		mar/27	6,3
Encanto Piatã - F2	mai/25	672	2	A	26/08/25	29/01/26	31/01/26		03/09/26	05/09/26		jun/27	3,4
Morada das Estações	dez/24	686	3	B	30/12/25	13/06/26	16/06/26	01/06/26	21/11/26	24/11/26	01/10/26	ago/27	12,7
Vila Laura Prime	abr/25	544	2	A	29/03/26	04/09/26	06/09/26		27/02/27	01/03/27		nov/27	11,6
V Salvador - Forte Sao Marcelo	dez/25	500	2	C	04/03/26	20/07/26	28/07/26		26/12/26	03/01/27		jun/27	2,7
Vale das Tulipas	set/25	819	2	D	05/05/26	02/10/26	01/11/26		14/07/27	04/07/27		abr/28	7,8
Morada Real	nov/25	443	2	B	29/05/26	22/11/26	25/11/26		14/04/27	17/04/27		jan/28	6,5
Vista da Mangueira	mar/26	416	2	C	05/08/26	27/12/26	04/01/27		07/05/27	15/05/27		out/27	4,8
Encanto Piatã - F3	mar/26	379	2	A	01/10/26	28/02/27	02/03/27		01/07/27	03/07/27		mar/28	6,7
Veneza Prime F1	abr/26	570	2	B	17/10/26	15/04/27	18/04/27		17/10/27	20/10/27		jun/28	6,2
Vila Santiago	mai/26	356	2	C	14/01/27	08/05/27	16/05/27		29/08/27	06/09/27		mai/28	8,2

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lanç + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Salvador	SSA	54%	4.701	392	5.641	470

	Faixas MCMV	Empreendimento	Renda	Lançamento	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
1	Faixa 2	Vale Dos Lírios F1	3.788	ago-24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4												
2	Faixa 1	Morada Das Estações	2.840	dez-24	34	34	14																			
3	Faixa 3	Jardim Armação Prime	9.000	dez-24	5																					
4	Faixa 3	Vila Laura Prime	5.422	abr-25	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	6					
5	Faixa 2	Vale das Tulipas	3.546	set-25	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	30									
6	Faixa 2	Verona Prime F1	3.444	dez-25	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	26						
7	Faixa 2	Vivenda Real Cond II	3.378	jan-26	41	41	41	41	41	41	41	41	41	33												
8	Faixa 1	V Salvador - Forte Sao Marcelo	2.282	jan-26	95	95	95	95	1																	
9	Faixa 3	**Encanto Piatã F3**	**5.231**	**mar-26**		**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**3**												
10	Faixa 3	Jaguaribe F1	4.739	jun-26					32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	27
11	Faixa 1	V Salvador - Parque Da Cidade	2.282	jul-26						95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	13						
12	Faixa 2	Torres De Piraja F1	4.146	ago-26							32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
13	Faixa 2	Paralela Sun Prime - F1	4.286	out-26									30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
14	Faixa 2	Privilege Salvador Norte	3.023	nov-26										33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
15	Faixa 2	Verona Prime F2	4.467	fev-27													32	32	32	32	32	32	32	32	29	
16	Faixa 2	Portal Salvador I F1	2.933	abr-27															30	30	30	30	30	30	30	30
17	Faixa 1	Vale das Orquídeas - F1	2.817	jun-27																	42	42	42	42	42	42
18	Faixa 1	Vista Serena F1	2.030	set-27																				42	42	42
19	Faixa 2	Veneza Prime I F1	4.467	out-27																					32	32
20	Faixa 2	Jaguaribe F2	4.625	nov-27																						16
21	Faixa 3	Patamares Prime	5.000	nov-27																						19

	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
Total de Vendas Lançados	**109**	**104**	**84**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**66**	**66**	**49**	**19**	**19**	**19**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank	**277**	**319**	**299**	**285**	**223**	**317**	**349**	**349**	**379**	**360**	**320**	**320**	**335**	**305**	**335**	**247**	**237**	**231**	**231**	**273**	**302**	**284**
Total Mancha | Faixa 1	*46%*	*40%*	*36%*	*33%*	*0%*	*30%*	*27%*	*27%*	*25%*	*26%*	*30%*	*30%*	*28%*	*31%*	*28%*	*5%*	*18%*	*18%*	*18%*	*31%*	*28%*	*30%*
Total Mancha | Faixa 2	*45%*	*39%*	*41%*	*43%*	*56%*	*39%*	*45%*	*45%*	*49%*	*59%*	*54%*	*54%*	*56%*	*52%*	*56%*	*74%*	*66%*	*68%*	*68%*	*58%*	*62%*	*61%*
Total Mancha | Faixa 3	*9%*	*21%*	*22%*	*23%*	*44%*	*31%*	*28%*	*28%*	*26%*	*15%*	*16%*	*16%*	*15%*	*17%*	*15%*	*21%*	*16%*	*14%*	*14%*	*12%*	*11%*	*16%*
Vendas Produto Comitê	**0**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Sem o Produto Comitê	**277**	**272**	**252**	**238**	**176**	**270**	**302**	**302**	**332**	**357**	**320**	**320**	**335**	**305**	**335**	**247**	**237**	**231**	**231**	**273**	**302**	**284**
Potencial Total da Mancha	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**	**392**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Encanto Piatã F3 | Mapa Concorrência

		Encanto Piatã F3	Cidade Sete Sóis - Spazio Petrópolis
		TENDA	MRV
	Distância Tenda (km)		2,17 km
Região 1 Km	População	28.612	24.246
	Dens. Demográfica	9.164	7.767
	Renda (R$)	5.973	3.046
	Classe Social	B2 (de R$ 5.4K a 9.8K)	C2 (de R$ 1.7K a 3.1K)
	PEA Dia	12.686	9.518
Quantitativo	Lançamento	mar/26	jun/25
	Unidades	379	528
	Estoque	379	96
	VSO	47	62
	Stockout	8	2
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	2	6
	Gabarito	T+15	T+10
	Plantas (m²)	38,66m²	44,36m² - 45,27m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Não
	Varanda	Não	Sim
	Vagas	18%	100%
	Lazer	Carro compartilhado, baia de embarque e desembarque, mini market, 04 Quadras cobertas, 3 salões de festa com churrasqueira, play baby, play kids, play pet, fitness e funcional externo	piscinas adulto e infantil, salão de festas, espaço gourmet, salão de jogos, espaço kids, churrasqueira, playground, espaço fitness, bicicletário e pomar

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência atua com target de preço e renda acima do Encanto Piatã F3.

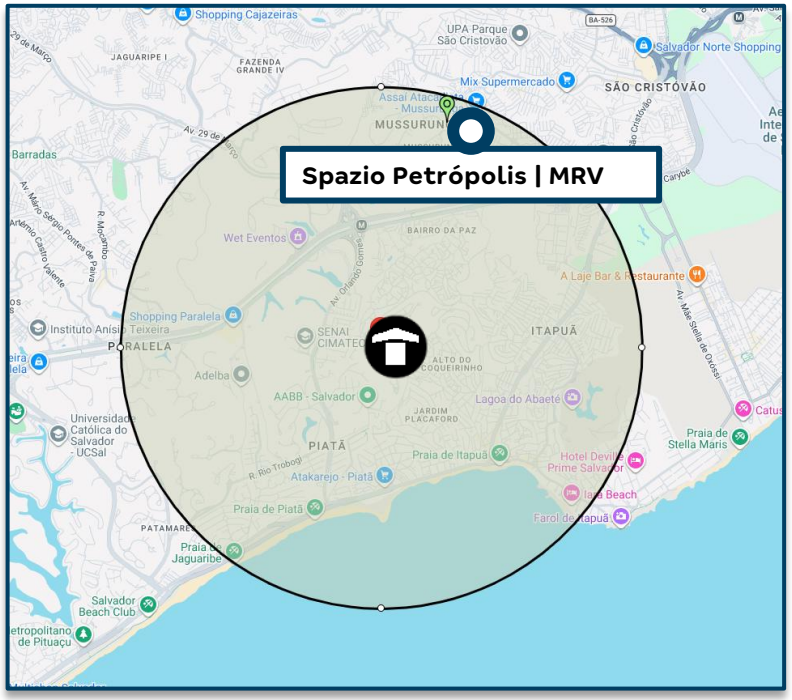

-	Encanto Piatã F3					Cidade Sete Sóis - Spazio Petrópolis					
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	Dif	Farol
Uh Tipo	260.000	265.145	203.067	3.998	72%	-	-	-	-		●
Vg Moto	270.000	269.956	207.128	4.576	6%	-	-	-	-		●
Vg Carro	304.540	320.578	246.030	5.857	22%	-	349.000	279.200	6.753	896	●

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Encanto Piatã F3			
Tipo:	**Uh Tipo**		**Uh Tipo**	
Método	**Ref - Encanto Piatã F2**		**Vision**	
Avaliação	260.000		260.000	
Renda Inicial (VF)	4.500		3.998	
Renda Final*	-		-	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,19	5.450	1,31	5.319
FGTS	0,87	3.969	0,98	3.984
Financiamento	93,44%	196.176	96,11%	195.683
Subsídio	410,07%	3.238	170,74%	3.400
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24
Pró-Soluto	63,36%	24.861	71,52%	24.935
Preço Raso (RS)	233.693	233.693	233.321	233.321
TCD	70,27%	31.876	78,97%	31.825
VSO	34	34	34	34
Preço de Venda	**261.380**	**261.380**	**260.963**	**260.963**
Elasticidade	1,603%	1,603%	1,603%	1,603%
Preço de Venda Final	**265.569**	**265.569**	**265.145**	**265.145**
Preço Raso (R$)	**233.693**		**233.321**	
% de Raso	**88,00%**		**88,00%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Encanto Piatã F3			
Tipo:	**Vg Moto**		**Vg Moto**	
Método	**Ref - Encanto Piatã F2**		**Vision**	
Avaliação	270.000		270.000	
Renda Inicial (VF)	3.992		4.576	
Renda Final*	-		-	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,53	2.168	1,15	5.355
FGTS	0,99	4.018	0,90	4.169
Financiamento	101,56%	206.816	96,01%	202.959
Subsídio	19,25%	384	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24
Pró-Soluto	73,07%	25.436	62,83%	25.070
Preço Raso (RS)	238.822	238.822	237.554	237.554
TCD	80,95%	32.575	70,25%	32.402
VSO	2	2	2	2
Preço de Venda	**267.116**	**267.116**	**265.698**	**265.698**
Elasticidade	1,603%	1,603%	1,603%	1,603%
Preço de Venda Final	**271.397**	**271.397**	**269.956**	**269.956**
Preço Raso (R$)	**238.822**		**237.554**	
% de Raso	**88,00%**		**88,00%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**-**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Encanto Piatã F3			
Tipo:	**Vg Carro**		**Vg Carro**	
Método	**Ref - Encanto Piatã F2**		**Vision**	
Avaliação	304.540		304.540	
Renda Inicial (VF)	7.893		5.857	
Renda Final*	-		-	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,68	5.420	0,97	5.784
FGTS	1,61	12.891	2,10	12.484
Financiamento	93,75%	232.068	95,14%	233.545
Subsídio	0,00%	0	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24
Pró-Soluto	45,78%	31.505	59,30%	30.286
Preço Raso (RS)	281.885	281.885	282.100	282.100
TCD	48,33%	38.449	65,18%	38.478
VSO	11	11	11	11
Preço de Venda	**315.281**	**315.281**	**315.522**	**315.522**
Elasticidade	1,603%	1,603%	1,603%	1,603%
Preço de Venda Final	**320.334**	**320.334**	**320.578**	**320.578**
Preço Raso (R$)	**281.885**		**282.100**	
% de Raso	**88,00%**		**88,00%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**-**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Encanto Piatã F3
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Ref - Encanto Piatã F2**
Avaliação	270.570
Renda Inicial (VF)	5.231
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	1,04	5.253
FGTS	1,04	5.973
Financiamento	93,98%	204.843
Subsídio	295,42%	2.346
Prazo de Pró-soluto	24	24
Pró-Soluto	59,98%	26.385
Preço Raso (RS)	244.799	244.799
TCD	65,97%	33.391
VSO	47	47
Preço de Venda	**273.731**	**273.731**
Elasticidade	1,603%	1,603%
Preço de Venda Final	**278.190**	**278.190**

Preço Raso (R$)	**244.799**
% de Raso	**88,00%**
Raso Todas as Fases	**244.799**
Nominal Todas as Fases	**278.190**

1

Análise de Riscos | Farol IM

IM avalia o Preço Vision como **factível**.

1) I.M está de acordo com o preço Vision, visto que, esse preço reflete a performance da fase anterior ajustando o preço apenas conforme os novos parâmetros da fase atual.

Conforme vimos nos slides de concorrência acima, a concorrência atua com um faixa de preço superior ao encanto Piatã.

	Preço Real					Preço Normalizado (24m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Mediana	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Vale Dos Lírios F1	228.618	202.039	3.145	31	10	17.774	219.813
Morada Das Estações	231.372	215.454	3.176	21	23	1.235	216.689
Jardim Armação Prime	332.879	323.180	8.840	8	13	27.095	350.275
Vivenda Real Cond I	241.375	217.793	3.611	32	19	6.151	223.944
Vale Dos Lirios F2	228.618	202.039	3.145	31	10	17.774	219.813
Vila Laura Prime	261.674	242.104	5.451	17	24	0	242.104
Encanto Piatã F3	270.570	244.799	5.231	47	24	-	244.799

Comentário

Parecer Comercial

Parecer: O parecer do ciclo é favorável, apesar da concorrência. Já estamos consolidados na região e o projeto já é uma referência, e temos a melhor condição de pagamento.

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Encanto Piatã F3					
Tipo:	**Uh Tipo**		**Vg Moto**		**Vg Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	260.000		270.000		304.540	
Renda Inicial (VF)	3.998		4.576		5.857	
Renda Final*	4.739		4.928		5.732	
% RET1	0%		0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,31	5.453	1,15	5.491	0,97	5.930
FGTS	0,98	4.084	0,90	4.275	2,10	12.800
Financiamento	96,13%	200.622	96,18%	208.081	95,14%	239.439
Subsídio	170,74%	3.486	0,00%	0	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	23	23	23	23	23	23
Pró-Soluto	73,33%	24.499	64,41%	24.632	60,80%	29.756
Preço Raso (RS)	238.144	238.144	242.478	242.478	287.925	287.925
TCD	80,60%	32.483	71,70%	33.074	66,52%	39.273
VSO	15	15	1	1	5	5
Preço de Venda	**259.801**	**259.801**	**264.530**	**264.530**	**314.110**	**314.110**
Elasticidade	4,167%	4,167%	4,167%	4,167%	4,167%	4,167%
Preço de Venda Final	**270.626**	**270.626**	**275.552**	**275.552**	**327.198**	**327.198**
Preço Raso (R$)	**238.144**		**242.478**		**287.925**	
% de Raso	**88,00%**		**88,00%**		**88,00%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**0**		**0**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**0**		**0**	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Informações Gerais – Cenário aprovação

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	mai-22							
Encanto Piatã F3		mar-26	set-26	mar-28	6 meses	18 meses	mar-29	36 meses
Encanto Piatã F3 vaga moto		mar-26	set-26	mar-28	6 meses	18 meses	mar-29	36 meses
Encanto Piatã F3 vaga carro		mar-26	set-26	mar-28	6 meses	18 meses	mar-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	6,62 MM	**Incorrido Terreno:**	2,94 MM	**Área do Terreno (100%):**	15.578 m²
Cash:	6,62 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	48	**Custo de terreno m²:**	425,2
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 27 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,06 MM

Área Líquida do Terreno:	15.578 m²		
Custo de terreno m² Área Líquida:	425,2		
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	6,3% / 40,9%		
CA Máx/Proj.	3,0 / 2,4		
Incorridos de Incorporação:	0,71 MM		

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Encanto Piatã F3	T+15	238.144	311	270.626	260.000	96,1%	73,3%	80,6%
Encanto Piatã F3 vaga moto	T+15	242.478	12	275.552	270.000	96,2%	64,4%	71,7%
Encanto Piatã F3 vaga carro	T+15	287.925	56	327.198	304.540	95,1%	60,8%	66,5%

Unidades Totais:	379	**Preço Médio:**	279.141	**Renda Média:**	4.291	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.437
Unidades Tenda:	379	**Avaliação Média:**	266.898	**Ato:**	5.383 (1,25 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	16.955
VSO:	21 Unidades	**VGV Total:**	105.794.530	**FGTS:**	4.905 (1,14 Salários)	**Preço Raso Médio:**	245.636
RET Médio:	4,0%	**VGV Tenda:**	105.794.530	**% em RET 1%:**	0%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	700

Construção

Custo Total Unit.:	96.561	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	38,66	**Gape / Mês Unit.:**	9,42

Resultado

LI (R$):	**25.999.746**	**LI:**	**32,93%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**11.316.018**	**Margem Bruta Econômica:**	**52,55%**
TIR:	**101,54%**	**LI Aprovação:**	**30,60%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(7.594.976)**	**Margem Bruta REF:**	**54,99%**
Exposição de Caixa:	**10,72%**	**Δ LI:**	**2,33%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**26.241.905**	**Margem Rasa Econômica:**	**45,11%**
Payback Contingente (21 m):	**18 m/ (-3 m)**	**LI Marginal:**	**38,50%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**45.696.699**	**Margem Rasa REF:**	**48,86%**
Payback Consolidado:	**18 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**42,49%**

DRE – Cenário aprovação

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Encanto Piatã F3		Encanto Piatã F3		Encanto Piatã F3 vaga moto		Encanto Piatã F3 vaga carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	105.570	100,0%	83.780	100,0%	3.333	100,0%	18.457	100,0%
PIS/COFINS	(2.315)	2,2%	(1.837)	2,2%	(73)	2,2%	(405)	2,2%
Custo Total	(48.994)	47,4%	(40.227)	49,1%	(1.547)	47,5%	(7.219)	40,0%
Custo Terreno	(6.818)	6,6%	(5.594)	6,8%	(216)	6,6%	(1.007)	5,6%
Custo Relacionados a Terreno	(54)	0,1%	(44)	0,1%	(2)	0,1%	(8)	0,0%
Custos de Incorporação	(1.385)	1,3%	(1.160)	1,4%	(40)	1,2%	(185)	1,0%
Custo de Construção	(40.737)	39,5%	(33.428)	40,8%	(1.290)	39,6%	(6.019)	33,3%
Lucro Bruto Econômico	54.262	52,6%	41.716	50,9%	1.713	52,5%	10.833	60,0%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	54.262	52,6%	41.716	50,9%	1.713	52,5%	10.833	60,0%
Despesas de Selling	(8.603)	8,3%	(6.851)	8,4%	(267)	8,2%	(1.485)	8,2%
Contingência	(1.789)	1,7%	(1.420)	1,7%	(56)	1,7%	(313)	1,7%
Margem de Contribuição	43.870	42,5%	33.445	40,8%	1.389	42,6%	9.035	50,0%
IR e CSLL	(1.894)	1,8%	(1.503)	1,8%	(60)	1,8%	(331)	1,8%
Margem Líquida	41.976	40,7%	31.942	39,0%	1.329	40,8%	8.704	48,2%
Lucro Bruto REF Unit.	156.530	55,0%	148.387	53,7%	150.645	54,1%	203.014	61,3%
Lucro Raso REF Unit.	122.395	48,9%	115.223	47,4%	117.283	47,8%	163.323	56,1%

R$ Mil - VPL - Compra	Encanto Piatã F3		Encanto Piatã F3		Encanto Piatã F3 vaga moto		Encanto Piatã F3 vaga carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	78.956	100,0%	62.347	100,0%	2.532	100,0%	14.078	100,0%
PIS/COFINS	(1.708)	2,2%	(1.349)	2,2%	(55)	2,2%	(304)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(51.249)	64,9%	(41.756)	67,0%	(1.625)	64,2%	(7.868)	55,9%
Custo Terreno	(6.714)	8,5%	(5.509)	8,8%	(213)	8,4%	(992)	7,0%
Custo Relacionados a Terreno	(64)	0,1%	(52)	0,1%	(2)	0,1%	(9)	0,1%
Custos de Incorporação	(1.460)	1,8%	(1.220)	2,0%	(42)	1,7%	(198)	1,4%
Custo de Construção	(33.270)	42,1%	(27.301)	43,8%	(1.053)	41,6%	(4.916)	34,9%
Despesas de Selling	(7.564)	9,6%	(5.952)	9,5%	(246)	9,7%	(1.367)	9,7%
Contingência	(779)	1,0%	(618)	1,0%	(25)	1,0%	(136)	1,0%
IR e CSLL	(1.397)	1,8%	(1.103)	1,8%	(45)	1,8%	(249)	1,8%
Lucro Imobiliário	26.000	32,9%	19.242	30,9%	852	33,6%	5.906	42,0%

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Lançamento Anterior	Atual	Atual vs Lançamento Anterior	Δ%
Data Estudo:	maio-25	março-26	10 Meses	N/A
Lançamento:	novembro-26	março-26	-8 Meses	N/A
Uhs:	379	379	-	0,0%
Preço Nominal:	256.042	279.141	23.099	9,0%
Preço Raso:	231.582	245.636	14.055	6,1%
Preço Nominal Inflacionado:	283.821	284.632	811	0,3%
Preço Raso Inflacionado:	256.738	250.498	(6.241)	-2,4%
Renda Média:	4.691	4.291	(400)	-8,5%
RET Médio:	4,00%	4,00%	0,0 p.p.	0,0%
% em RET 1%:	0,00%	0,00%	0,0 p.p.	
VSO:	21	21	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	9.588	4.137	(5.450)	-56,8%
Avaliação:	263.272	266.898	3.626	1,4%
Prazo construção F1:	17	18	1	5,9%
Prazo de Pró-Soluto F1:	22	23	1	4,5%
Custo Total Inf (Unit):	140.059	129.271	(10.788)	-7,7%
Custo Construção (Unit):	90.590	96.561	5.971	6,6%
Fração de construção:	35,4%	34,6%	-0,8 p.p.	-2,2%
INCC Folha Rosto:	1.178,39	1.237,04	59	5,0%
Custo Terreno Inf:	6.447.661	6.817.664	370.002	5,7%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	258	141	(116)	-45,2%
Fração do Terreno[1]:	6,91%	6,3% / 40,9%	-0,6 p.p.	-8,7%
Custo de Incorp. por uh:	13.479	3.655	(9.825)	-72,9%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	3.633.779	1.568.086	(2.065.692)	-56,8%
Custo do Ciclo (Unit):	14.971	16.955	1.984	13,2%
LI Régua:	20,0%	22,0%	2,0 p.p.	10,0%
Lucro Imobiliário:	28,6%	32,9%	4,3 p.p.	15,1%
LI Marginal:	32,7%	38,5%	5,8 p.p.	17,6%
Exposição de caixa:	23,1%	10,7%	-12,4 p.p.	-53,7%
TIR:	76,0%	101,5%	25,5 p.p.	33,6%
Margem Bruta REF:	54,5%	55,0%	0,5 p.p.	0,9%
Margem Bruta Econômica:	47,9%	52,6%	4,7 p.p.	9,8%
Margem Rasa REF:	49,7%	48,9%	-0,8 p.p.	-1,7%
Margem Rasa Econômica:	41,7%	45,1%	3,4 p.p.	8,0%
Margem Contribuição Econômica:	39,1%	42,5%	3,4 p.p.	8,7%
Payback Contingente (Régua 21 m):	17 Meses	18 m/ (-3 m)	1	
Payback Consolidado:	17 Meses	18 Meses	1 Meses	5,9%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Informações Gerais – Cenário Real

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	mai-22							
Encanto Piatã F3		mar-26	out-26	abr-28	7 meses	18 meses	mar-29	36 meses
Encanto Piatã F3 vaga moto		mar-26	out-26	abr-28	7 meses	18 meses	mar-29	36 meses
Encanto Piatã F3 vaga carro		mar-26	out-26	abr-28	7 meses	18 meses	mar-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	6,62 MM	**Incorrido Terreno:**	2,94 MM	**Área do Terreno (100%):**	15.578 m²
Cash:	6,62 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	48	**Custo de terreno m²:**	425,2
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 27 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,06 MM

Área Líquida do Terreno:	15.578 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	425,2
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	6,4% / 41,7%
CA Máx/Proj.	3,0 / 2,4
Incorridos de Incorporação:	0,71 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Encanto Piatã F3	T+15	233.321	311	265.145	260.000	96,1%	71,5%	79,0%
Encanto Piatã F3 vaga moto	T+15	237.554	12	269.956	270.000	96,0%	62,8%	70,2%
Encanto Piatã F3 vaga carro	T+15	282.100	56	320.578	304.540	95,1%	59,3%	65,2%

Unidades Totais:	379	**Preço Médio:**	273.488	**Renda Média:**	4.291	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.437
Unidades Tenda:	379	**Avaliação Média:**	266.898	**Ato:**	5.383 (1,25 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	16.611
VSO:	47 Unidades	**VGV Total:**	103.652.089	**FGTS:**	4.905 (1,14 Salários)	**Preço Raso Médio:**	240.662
RET Médio:	4,0%	**VGV Tenda:**	103.652.089	**% em RET 1%:**	0%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	700

Construção

Custo Total Unit.:	96.561	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	38,66	**Gape / Mês Unit.:**	9,42

Resultado

LI (R$):	**26.853.049**	**LI:**	**33,70%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**8.234.494**	**Margem Bruta Econômica:**	**52,08%**
TIR:	**118,45%**	**LI Aprovação:**	**22,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(1.541.660)**	**Margem Bruta REF:**	**53,40%**
Exposição de Caixa:	**7,85%**	**Δ LI:**	**11,70%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**28.410.435**	**Margem Rasa Econômica:**	**44,56%**
Payback Contingente (21 m):	**13 m/ (-8 m)**	**LI Marginal:**	**39,21%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**45.244.268**	**Margem Rasa REF:**	**47,05%**
Payback Consolidado:	**13 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**42,31%**

DRE – Cenário Real

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Encanto Piatã F3		Encanto Piatã F3		Encanto Piatã F3 vaga moto		Encanto Piatã F3 vaga carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	104.894	100,0%	83.367	100,0%	3.288	100,0%	18.239	100,0%
PIS/COFINS	(2.300)	2,2%	(1.828)	2,2%	(72)	2,2%	(400)	2,2%
Custo Total	(49.167)	47,9%	(40.369)	49,5%	(1.553)	48,3%	(7.245)	40,6%
Custo Terreno	(6.818)	6,6%	(5.594)	6,9%	(216)	6,7%	(1.007)	5,6%
Custo Relacionados a Terreno	(54)	0,1%	(44)	0,1%	(2)	0,1%	(8)	0,0%
Custos de Incorporação	(1.394)	1,4%	(1.168)	1,4%	(40)	1,2%	(186)	1,0%
Custo de Construção	(40.902)	39,9%	(33.563)	41,2%	(1.295)	40,3%	(6.044)	33,9%
Lucro Bruto Econômico	53.427	52,1%	41.170	50,5%	1.664	51,7%	10.594	59,4%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	53.427	52,1%	41.170	50,5%	1.664	51,7%	10.594	59,4%
Despesas de Selling	(8.244)	8,0%	(6.534)	8,0%	(259)	8,1%	(1.451)	8,1%
Contingência	(1.778)	1,7%	(1.413)	1,7%	(56)	1,7%	(309)	1,7%
Margem de Contribuição	43.405	42,3%	33.223	40,7%	1.348	41,9%	8.834	49,5%
IR e CSLL	(1.882)	1,8%	(1.496)	1,8%	(59)	1,8%	(327)	1,8%
Margem Líquida	41.523	40,5%	31.727	38,9%	1.289	40,1%	8.507	47,7%
Lucro Bruto REF Unit.	147.295	53,4%	139.084	52,0%	143.122	52,7%	193.785	60,1%
Lucro Raso REF Unit.	114.250	47,1%	107.015	45,4%	110.606	46,3%	155.213	54,7%

R$ Mil - VPL - Compra	Encanto Piatã F3		Encanto Piatã F3		Encanto Piatã F3 vaga moto		Encanto Piatã F3 vaga carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	79.690	100,0%	63.303	100,0%	2.502	100,0%	13.884	100,0%
PIS/COFINS	(1.723)	2,2%	(1.369)	2,2%	(54)	2,2%	(300)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(51.113)	64,1%	(41.660)	65,8%	(1.616)	64,6%	(7.837)	56,4%
Custo Terreno	(6.714)	8,4%	(5.509)	8,7%	(213)	8,5%	(992)	7,1%
Custo Relacionados a Terreno	(64)	0,1%	(52)	0,1%	(2)	0,1%	(9)	0,1%
Custos de Incorporação	(1.463)	1,8%	(1.223)	1,9%	(42)	1,7%	(198)	1,4%
Custo de Construção	(32.972)	41,4%	(27.056)	42,7%	(1.044)	41,7%	(4.872)	35,1%
Despesas de Selling	(7.726)	9,7%	(6.092)	9,6%	(246)	9,8%	(1.387)	10,0%
Contingência	(764)	1,0%	(607)	1,0%	(24)	1,0%	(133)	1,0%
IR e CSLL	(1.410)	1,8%	(1.120)	1,8%	(44)	1,8%	(246)	1,8%
Lucro Imobiliário	26.853	33,7%	20.274	32,0%	832	33,3%	5.747	41,4%

Obrigada!
