Tenda

sua próxima conquista

Book de Escritura + Lançamento

Regional: GO

Projeto: Estilo Faiçalville

Data Comitê: 24.10.2025

Questionamentos comitê digital 20.10.2025

Nome	Estilo Faiçalville - Escritura + Lançamento	Observação - Estilo Faiçalville
Alejandro Octavio Abiusi	Discutir em comitê	Quando vamos ter o retorno do valor de avaliação da CEF? Gostaria de discutir como podemos condicionar a escritura a uma perspectiva mais clara da escritura, já que o projeto não tem folga de LI em caso de perda de preço por uma avaliação abaixo do esperado.
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	Ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Rodrigo Osmo	Aprovado	N/A
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Discutir em comitê	a referência do delta preço para varanda na MRV está em R$25 mil e no nosso caso apenas R$5 mil. Não temos espaço para melhorar essa precificação?
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	Ok

Pergunta Alejandro

1. Quando vamos ter o retorno do valor de avaliação da CEF? Gostaria de discutir como podemos condicionar a escritura a uma perspectiva mais clara da escritura, já que o projeto não tem folga de LI em caso de perda de preço por uma avaliação abaixo do esperado.

R: O retorno da avaliação da CEF está previsto para 1ª quinzena de novembro. Podemos sim condicionar a escritura à avaliação. No entanto, a partir do case Parque dos Sonhos IV (32m²) x Parque dos Sonhos III (42m²), cuja a redução de área não impactou a performance do produto, mantendo os mesmos valores de venda e, comparando com o produto da concorrência ao lado que possui menos atributos de lazer que o nosso e uma avaliação de partida de R$255K com referência em março/24 (versus uma avaliação máxima alvo do Faiçalville de R$250K), tudo nos leva a crer que obteremos esta avaliação.

-	Faiçalville					Gran Paris					
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol
Sem Vaga	220.000	233.223	178.439	3.346	36%	-	-	-	-	-	-
Varanda	226.000	238.504	182.866	3.486	31%	-	-	-	-	-	-
Moto	228.000	241.444	185.101	3.570	5%	-	-	-	-	-	-
Moto - Varanda	235.000	246.596	189.608	3.750	5%	-	-	-	-	-	-
Carro	243.000	253.875	194.451	3.895	12%	255.000	254.990	201.442	4.100	23%	●
Carro - Varanda	250.000	259.217	195.691	4.295	12%	268.900	280.990	224.792	4.500	74%	●
Garden	-	-	-	-	-	265.000	264.748	211.798	4.325	3%	-

Pergunta Luiz Maurício

1. A referência do delta preço para varanda na MRV está em R$25 mil e no nosso caso apenas R$5 mil. Não temos espaço para melhorar essa precificação?

R: A diferença entre a varanda da MRV e a da Tenda é que a Varanda da MRV adiciona área ao apartamento, aproximadamente 3m² (cerca de 5%), enquanto a nossa tipologia possui varanda interna (plantas no próximo slide), mantendo a mesma área. Considerando que é o primeiro projeto com varanda da regional e esta não acrescenta área a unidade, por conservadorismo estamos adotando neste estudo o valor mínimo de R$5 mil para a varanda em resposta ao custo extra de R$2 mil/UH que possui este atributo. A estratégia é maximizar o preço da unidade com varanda nos testes mês a mês.

-	Faiçalville							Gran Paris						
Tipologias	Tamanho	Avaliação	Avaliação/m²	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Tamanho	Avaliação	Avaliação/m²	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades
Sem Vaga	32	220.000	6.875	233.223	178.439	3.346	36%	-	-	-	-	-	-	-
Varanda	32	226.000	7.063	238.504	182.866	3.486	31%	-	-	-	-	-	-	-
Moto	32	228.000	7.125	241.444	185.101	3.570	5%	-	-	-	-	-	-	-
Moto Varanda	32	235.000	7.344	246.596	189.608	3.750	5%	-	-	-	-	-	-	-
Carro	32	243.000	7.594	253.875	194.451	3.895	12%	42,6	255.000	5.986	254.990	201.442	4.100	23%
Carro Varanda	32	250.000	7.813	259.217	195.691	4.295	12%	44,7	268.900	6.016	280.990	224.792	4.500	74%
Garden	-	-	-	-	-	-	-	48,9	265.000	5.419	264.748	211.798	4.325	3%

Abaixo segue imagem da nossa tipologia com e sem varanda:

One Page – Faiçalville – Aprovação

[1]

Cidade	Goiânia	**Mancha de demanda**	GO - GOS - Goiânia Sul + Aparecida de Goiânia
Regional	GO	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura e Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Out

[2]

Unidades (Fases)	501 (1)	**CA Máx | Proj**	6,0 | 3,0
Unidades com Vaga (%)	167 (33%)	**Escritura | Lançamento**	out/25 | nov/25
Unidades com Varandas (%)	238 (48%)	**Tipologia**	F2E - Concreto

[3]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	12.800 (10,6%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	12.800 (NA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	1.865	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[4]

Custo Construção (%VGV)	48.155 (39,8%)	**Indireto Unit.**	19.867
Prazo da Obra (meses)	23	**Torre Unit.**	54.038
Custo Total Unit. (LPU):	96.118 (95)	**Infra Unit.**	14.245
Início de Obra	mai-26	**Fundação Unit.**	5.268

[5]

Preço Nominal Unit.	241.376	**VSO**	28
Preço Raso Unit.	221.191	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	229.186	**Renda (% em RET 1%)**	3.595 (17,9%)

[6]

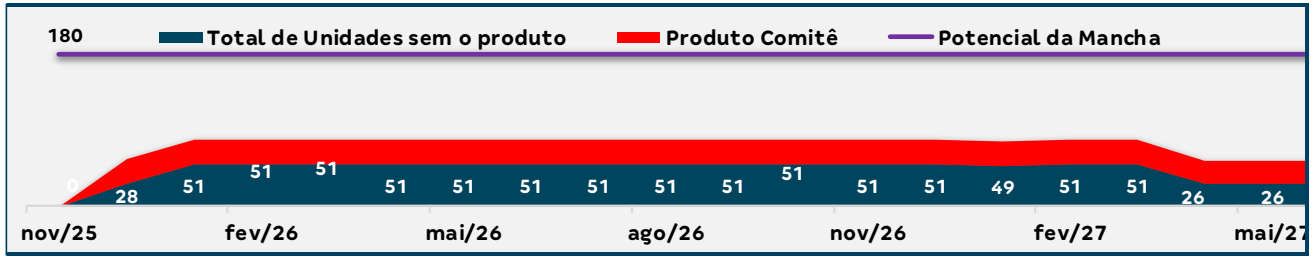

LI (Régua):	**20,0% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	40,7%
LI Marginal:	20,5%	**Margem Rasa Econômica:**	34,5%
Margem Bruta REF:	44,4%	**Margem Contribuição Econômica**	27,3%
Margem Rasa REF:	**39,3%**	**Exposição (% VGV):**	11.432 (9,6%)
TIR:	129,2%	**VGV Total:**	**120.929**
Payback Contingente (21 m) :	**20 m/ (-1 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(9.643)
Payback Consolidado:	20	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	9.233

Destaques

[1] Apresentamos à comitê de escritura o projeto Estilo Faiçalville, projeto num terreno de excelente localização, e que marca o início dos empreendimentos verticais na Regional Goiás.

[2] Alcançamos a densidade máxima de unidades possível para este terreno, respeitando as restrições legais relacionadas à oferta mínima de vagas de estacionamento.

[3] O negócio foi firmado integralmente em cash, com o preço do terreno fixo e irreajustável, contemplando o pagamento de R$ 500k na escritura e o saldo remanescente em 24 parcelas iguais. A primeira parcela vence em julho de 2026, com as demais nos meses subsequentes. Adicionalmente, antecipamos o lançamento em 8 meses, o que permitiu capturar resultado financeiro, uma vez que o fluxo de pagamento está fixo a partir de julho de 2026.

[4] Este é o primeiro projeto da Regional a contar com elevador, localizado em uma área de alta percepção de valor pelos nossos clientes. Desde a apresentação ao Comitê de Investimento, o projeto foi aprimorado com a inclusão de novos atributos nas áreas de lazer, como quadra poliesportiva e piscina. Além disso, durante o desenvolvimento da esteira de projetos, implementamos varandas em 48% das unidades, o que permitirá avaliar a receptividade desse diferencial na Regional.

Para mitigar riscos e garantir a entrega do empreendimento já energizado, estamos estrategicamente adicionando três meses ao prazo de obra, de forma a manter o cronograma alinhado à previsão de energização da concessionária. Ressaltamos, contudo, que a concessionária tem historicamente atendido nossas solicitações de antecipação, e a orientação atual é formalizar o pedido em momento mais próximo à data de entrega.

[5] A precificação foi estruturada com base na regra de ouro, tomando como referência um valor de avaliação que consideramos tecnicamente consistente e representativo da realidade do produto. Esse valor traduz nossa leitura estratégica de mercado e define o patamar que buscamos consolidar junto à CEF, respaldados pelos bons fundamentos técnicos que sustentam nossa pedida de avaliação.

[6] Nesse cenário, o projeto está entregando 20,0% de LI e 40,7% de Margem Bruta.

***Valores em R$ '000**

One Page – Cenário Real

[1]

Cidade	Goiânia	**Mancha de demanda**	GO - GOS - Goiânia Sul + Aparecida de Goiânia
Regional	GO	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura e Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Out

[2]

Unidades (Fases)	501 (1)	**CA Máx | Proj**	6,0 | 3,0
Unidades com Vaga (%)	167 (33%)	**Escritura | Lançamento**	out/25 | nov/25
Unidades com Varandas (%)	238 (48%)	**Tipologia**	F2E - Concreto

[3]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	12.800 (10,6%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	12.800 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	1.865	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[4]

Custo Construção (%VGV)	49.101 (40,6%)	**Indireto Unit.**	19.867
Prazo da Obra (meses)	23	**Torre Unit.**	54.038
Custo Total Unit. (LPU):	98.005 (95)	**Infra Unit.**	14.245
Início de Obra	mai-26	**Fundação Unit.**	5.268

[5]

Preço Nominal Unit.	241.376	**VSO**	28
Preço Raso Unit.	221.191	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	229.186	**Renda (% em RET 1%)**	3.595 (17,9%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	225.420
Preço Inf. Médio Unit.	245.973	**Margem Bruta REF (%)**	43,5%
Custo Inf. Médio Unit.	138.920	**Margem Rasa REF (%)**	38,4%



[6]

LI (Régua):	**19,1% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	39,8%
LI Marginal:	19,5%	**Margem Rasa Econômica:**	33,5%
Margem Bruta REF:	43,5%	**Margem Contribuição Econômic**	26,3%
Margem Rasa REF:	**38,4%**	**Exposição (% VGV):**	11.685 (9,8%)
TIR:	122,4%	**VGV Total:**	**120.929**
Payback Contingente (21 m) :	**20 m/ (-1 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(9.800)
Payback Consolidado:	20	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	8.502

Destaques

[1] Apresentamos à comitê de escritura o projeto Estilo Faiçalville, projeto num terreno de excelente localização, e que marca o início dos empreendimentos verticais na Regional Goiás.

[2] Alcançamos a densidade máxima de unidades possível para este terreno, respeitando as restrições legais relacionadas à oferta mínima de vagas de estacionamento.

[3] O negócio foi firmado integralmente em cash, com o preço do terreno fixo e irreajustável, contemplando o pagamento de R$ 500k na escritura e o saldo remanescente em 24 parcelas iguais. A primeira parcela vence em julho de 2026, com as demais nos meses subsequentes. Adicionalmente, antecipamos o lançamento em 8 meses, o que permitiu capturar resultado financeiro, uma vez que o fluxo de pagamento está fixo a partir de julho de 2026.

[4] Este é o primeiro projeto da Regional a contar com elevador, localizado em uma área de alta percepção de valor pelos nossos clientes. Desde a apresentação ao Comitê de Investimento, o projeto foi aprimorado com a inclusão de novos atributos nas áreas de lazer, como quadra poliesportiva e piscina. Além disso, durante o desenvolvimento da esteira de projetos, implementamos varandas em 48% das unidades, o que permitirá avaliar a receptividade desse diferencial na Regional.

Para mitigar riscos e garantir a entrega do empreendimento já energizado, estamos estrategicamente adicionando três meses ao prazo de obra, de forma a manter o cronograma alinhado à previsão de energização da concessionária. Ressaltamos, contudo, que a concessionária tem historicamente atendido nossas solicitações de antecipação, e a orientação atual é formalizar o pedido em momento mais próximo à data de entrega. Neste cenário, foi considerada também MO de aprendizado no valor de R$ 1.887/UH, por se tratar do primeiro empreendimento vertical da Regional.

[5] A precificação é a mesma nos cenários Real e Aprovação, uma vez que coincidem os meses de pró soluto.

[6] Nesse cenário, o projeto está entregando 19,1% de LI e 39,8% de Margem Bruta.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Farol Pareceres – Faiçalville

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Due Diligence realizada em 01/2025, concluída positivamente e renovada em 08/2025 para fins de escritura. Certidões de tombamento municipal e desapropriação estadual estão pendentes, contudo não foram identificadas em Due ações expropriatórias envolvendo os imóveis. A Certidão da Receita Federal da Vendedora está positiva com efeitos de negativa, contudo o valor de débito fiscal é irrisório frente ao negócio e a Vendedora possui ativo suficiente para fazer frente ao débito (que está parcelado). O remembramento dos lotes foi concluído, pendente abertura da inscrição individualizada do imóvel para emissão do ITBI.	Com ressalvas	
Legalização	Terreno com remembramento aprovado e registrado. IPTU em processo de remembramento. Terreno advindo de um loteamento aprovado, não necessária doação. Uso do solo em linha. Previsão de alvará para out/2025. Não foi identificado riscos.	Ok	
Produto	Sem riscos associados	Ok	
GETEC	**Custos**: Orçamento realizado com projetos de infra em desenvolvimento e torre CT em AP. Quantitativo de torre CT (concreto/aço/fundação rasa) utilizado em Eng. de Produto. Considerado no custo 3 meses a mais dos serviços mínimos indiretos devido restrição da Equatorial **Projetos**: Orçamento de conexão assinado em 28/05/2025 com restrição de 1020 dias. Ligação da Equatorial prevista para março de 2028. Foi solicitada a antecipação da ligação, a qual foi negada pela Equatorial. Alerta de Energização da Obra devido à data de entrega do PCP, prevista para dezembro de 2027	Com ressalvas	
Logística	Sem riscos associados	Ok	
Contratação	**Laudo de engenharia:** Pendente, vamos entrar com o primeiro protocolo de análise em outubro. **Risco:** Pendente - emissão LAE; **Jurídico:** Pendente emissão do RI - Previsão: 14.11.2025	Com ressalvas	
Inteligência de mercado	IM avalia o preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Ciclo está de acordo com a precificação do produto	Ok	
Estudos Econômicos	Sem riscos associados	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA
Goiânia Sul + Aparecida

Lançamento
1. Sonho Dourado

LandBank
2. Estancia Dourados
3. Santa Rita Clay
4. Faiçalville

Cluster MPR – (Comitê)

- Cluster 3 – Verde

Região

Capital

Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Faiçalville
Descritivo - Escritura

Informações Gerais – Condomínio Único		
Terreno	**Área terreno**	6965,35 m²
	Menor poligonal	6865,84 m²
	App/fna	Não
	Doação para víario	Sim | 99,51m²
	Área liquida	6865,84m²
	Zoneamento	AA+HIS
	Ca máximo	6
	Ca projetado	3,03
	Gabarito máximo	263m (COMAER)
Geral	**Total uh**	501
	Total de vagas exigidas	1 vaga a cada 3 UH, sendo que destas, 30% podem ser destinadas à motos
	Total de vagas projetadas	117 vagas carros (sendo 2 PCD), 6 vagas visitantes e 50 vagas motos – 35%
Tipologia	**Tipologia**	Modular com elevador
	Gabarito	T+17
	Lâmina	01 torre 16PP e 01 torre 12PP
	Área privativa	31,99m²
	Varanda	Sim – 238 (47%)
	Garden	Não
Condomínio	**Unidade pcd**	15 (3%), último pavimento
	Unidade lazer|técnica	03 Lazer
	Torre	02
	Fase	01
Lazer	**Lazer Interno**	01-Salão de festas gourmet, 02-Espaço Delivery/Minimarket, 03-Brinquedoteca
	Lazer Externo	04-Multipla estação, 05-Praça dos Sabores, 06-Espaço Cultivo, 07-Churrasqueira com banheiro e previsão de geladeira, 08- Salão de festas com churrasqueira, 09-Piscinas adulto e infantil, 10-Play baby, 11-Play kids, 12-Quadra de StreetBall, 13-Praça de Chegada, 14-Play Pet

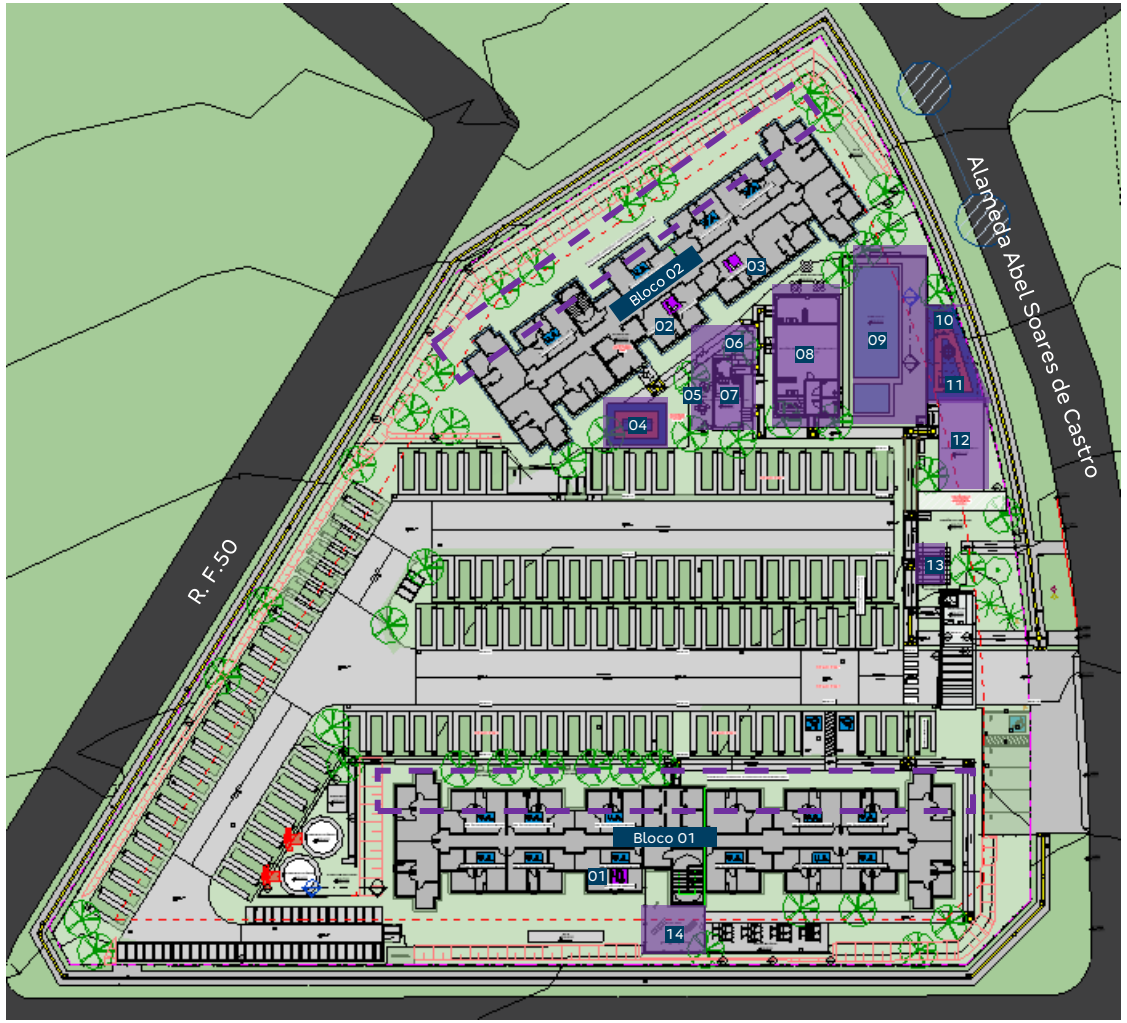

Implantação
S/escala

R. Presidente Jéfferson

Varanda

Empreendimento Faiçalville
Atributos de Produto - Escritura

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Faixa de renda**	2	
	Prime	Sim	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	Portaria com pórtico de veículos, Quadra de Streetball, Piscinas
	Atributos Torre	Sim	Varanda em uma face de cada torre
	Edifício Garagem	Não	

Portaria com pórtico de veículos (imagem ref.)

Quadra de Streetball (imagem ref.)

Piscinas (imagem ref.)

Empreendimento Faiçalville
Modulação - Escritura

Fase Única: 501 uh- 123 vagas (sendo 02 PCD, 06 visitantes e 52 de motos)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	01 Bloco (T+17)	287 Uh	103 vagas comuns (2 PCD), 6 de visitantes (1 PCD) e 47 de motos	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 01 o Espaço Cultivo, Churrasqueira gourmet, Salão de festas com churrasqueira, Piscinas adulto e infantil, Play baby, Play kids, Quadra de StreetBall, Praça de Chegada, Play Pet. Demais lazeres que não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas.
Módulo 02	01 Bloco (T+17)	214 UH	14 vagas comuns e 3 de motos	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 02 a Multipla estação e Praça dos Sabores

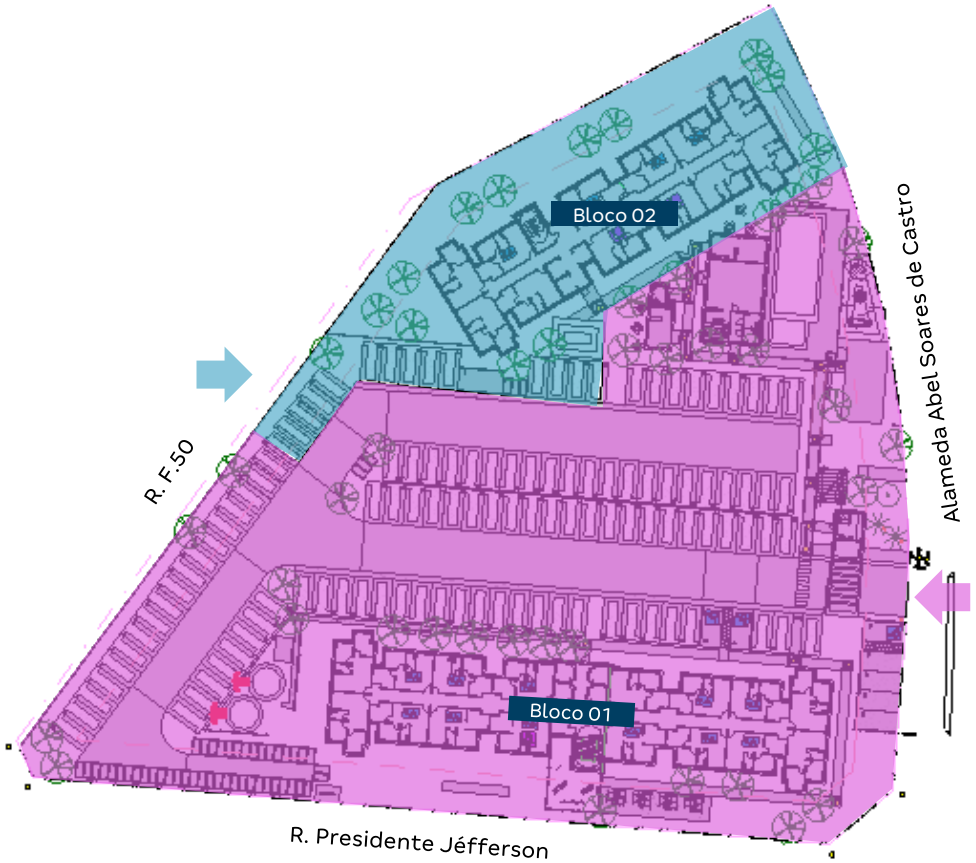

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

VALOR DO TERRENO: O terreno original do Faiçalville era constituído por 15 lotes, remembrados no dia 04/08/2025 e, conforme PCV assinada em 08/10/2025, seu valor total é de R$ 12.800.000,00 (doze milhões e oitocentos mil reais).

CONDIÇÕES COMERCIAIS: O empreendimento foi negociado 100% em Cash, com uma parcela inicial de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a ser pago no ato da assinatura da Escritura Pública e as demais parcela mensais, iguais e consecutivas, em 24 vezes, no valor de R$512.500,00 (quinhentos e doze mil e quinhentos reais), com a primeira parcela vencendo no dia 08/07/2026 e as demais parcelas pagas nos meses subsequentes. O valor do terreno será fixo e irreajustável, com fluxo de pagamento fixo.

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS: A PCV foi assinada no dia 08/11/24, tendo-se o prazo de 12 meses com prorrogação automática de 6 meses, contatos da assinatura da PCV, para a escrituração. O prazo para lançamento do empreendimento será de até 3 (três) meses, contados a partir do término do prazo estabelecido acima.

GARANTIAS E INTERMEDIAÇÕES IMOBILIÁRIAS: Tanto a vendedora quanto a Tenda decidiram excluir a modalidade de “Carta Fiança” como garantia de pagamento, substituindo-a pelo Seguro de Garantia de Pagamento, que será contratado pela Tenda no valor de R$ 156.470,00, conforme acordado no item 1.1.(b) do primeiro aditivo da PCV. O terreno foi adquirido sem intermediação imobiliária e diretamente com o proprietário, de modo que não pagaremos nenhuma taxa de corretagem.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

PCP 170

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de form	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI
Parque dos Sonhos III	dez/24	444	2	A	30/03/25	19/06/25	26/06/25		30/10/25	04/11/25		mar/26
Estância Dourados I	mar/25	376	2	A	02/08/25	31/10/25	05/11/25		24/02/26	01/03/26		jul/26
Parque dos Sonhos IV	ago/25	490	2	A	25/10/25	25/02/26	02/03/26		27/07/26	01/08/26		dez/26
Estância Dourados II	out/25	451	3	A	09/03/26	28/07/26	02/08/26	17/08/26	30/10/26	04/11/26	03/12/26	abr/27
Faiçalville	nov/25	501	3	A	13/05/26	31/10/26	05/11/26	04/12/26	12/02/27	17/02/27	17/03/27	dez/27
Estação das Fontes III - F1+F2	mai/26	520	3	A	15/11/26	13/02/27	18/02/27	18/03/27	01/06/27	06/06/27	03/07/27	dez/27
Novos Ares Aurora (Santa Rita)	jul/26	267	2	B	10/01/27	01/05/27	03/07/27		23/08/27	24/08/27		jan/28

Implantação | Google Earth

FAIÇALVILLE
GOIÂNIA- GO

Custo de Construção

	FAIÇALVILLE R04	FAIÇALVILLE PARAMETRIZAÇÃO R00	PRESIDENTE PARAMETRIZAÇÃO
Torres	2	2	2
Unidades Construídas	504	504	570
Unidades Vendidas	501	501	568
Cidade	Goiânia - GO	Goiânia - GO	Goiânia - GO
Produto / Selo	F2E	F2EP - PCT Modular	F2E
Tipologia	1 Torre | T+17 | 12PP	1 Torre | T+17 | 12PP	1 Torre | T+18 | 14PP
Tipologia	1 Torre | T+17 | 16PP	1 Torre | T+17 | 16PP	1 Torre | T+18 | 16PP
Atributos	238 Varandas | Piscina | Quadra		Varanda e Piscina
Projeto Infra	ED	AP	AP
Projeto Torre	AP	AP	AP
Mês Base	outubro-25	novembro-24	agosto-25
Incc	1216,71	1149,17	1199,51
LVS	julho-25	outubro-24	junho-25
Indiretos	julho-25	outubro-24	junho-25
Base de Preço	LPU 95	LPU 84	LPU 93
Takt	2+2	2x2	2x2
Prazo (mês)	23	19	19
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 94.274	R$ / UND R$ 88.776	R$ / UND R$ 91.425
Indireto	R$ 19.867	R$ 18.418	R$ 18.153
Torre	R$ 54.038	R$ 50.332	R$ 52.022
Infra	R$ 14.245	R$ 13.939	R$ 14.077
Fundação	R$ 5.268	R$ 4.772	R$ 5.271
EEE			R$ 454
ETE		R$ 1.000	R$ 1.219
Contenção	R$ 557	R$ 12	R$ 44
Terraplenagem	R$ 300	R$ 302	R$ 185
CUSTO TOTAL II	R$ 1.844	R$ 1.546	R$ 1.813
Urbanização	R$ 299	R$ 384	R$ 1.085
Drenagem			R$ 302
Extensão de Rede Elétrica	R$ 100	R$ 130	R$ 167
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.445	R$ 1.032	R$ 259
CUSTO TOTAL III			
Incorridos			
CUSTO TOTAL IV	R$ 1.887		
Aprendizado	R$ 1.887		
CUSTO TOTAL IV		R$ 5.983	R$ 1.337
Atualização por INCC		R$ 5.983	R$ 1.337
CUSTO TOTAL I+II	R$ 96.118	R$ 101.809	R$ 93.238
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 98.005	R$ 96.305	R$ 94.575

Custo de Construção

	FAIÇALVILLE R04	FAIÇALVILLE PARAMETRIZAÇÃO R00	
Torres	2	2	
Unidades Construídas	504	504	
Unidades Vendidas	501	501	
Condomínios (qta.)	1	501	
Cidade	Goiânia - GO	Goiânia - GO	
Produto / Selo	F2E	F2EP - PCT Modular	
Tipologia	1 Torre | T+17 | 12PP	1 Torre | T+17 | 12PP	
Tipologia	1 Torre | T+17 | 16PP	1 Torre | T+17 | 16PP	
Atributos	238 Varandas | Piscina | Quadra	0	
Projeto Infra	ED	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	outubro-25	novembro-24	
Incc	1216,706	1149,170	
LVS	julho-25	outubro-24	
Indiretos	julho-25	outubro-24	
Base de Preço	LPU 95	LPU 84	
Takt	2+2	2x2	
Prazo (mês)	23	19	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 94.274	R$ / UND R$ 88.776	DIF R$ 5.498
Indireto	R$ 19.867	R$ 18.418	R$ 1.449
Torre	R$ 54.038	R$ 50.332	R$ 3.706
Infra	R$ 14.245	R$ 13.939	R$ 305
Fundação	R$ 5.268	R$ 4.772	R$ 496
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 1.000	-R$ 1.000
Contenção	R$ 557	R$ 12	R$ 544
Terraplenagem	R$ 300	R$ 302	-R$ 2
CUSTO TOTAL II	R$ 1.844	R$ 1.546	R$ 298
Urbanização	R$ 299	R$ 384	-R$ 85
Drenagem	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Elétrica	R$ 100	R$ 130	-R$ 30
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.445	R$ 1.032	R$ 413
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 1.887	R$ 0	
Aprendizado	R$ 1.887	R$ 0	R$ 1.887
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 5.983	
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 5.983	-R$ 5.983
CUSTO TOTAL	R$ 98.005	R$ 96.305	R$ 1.700

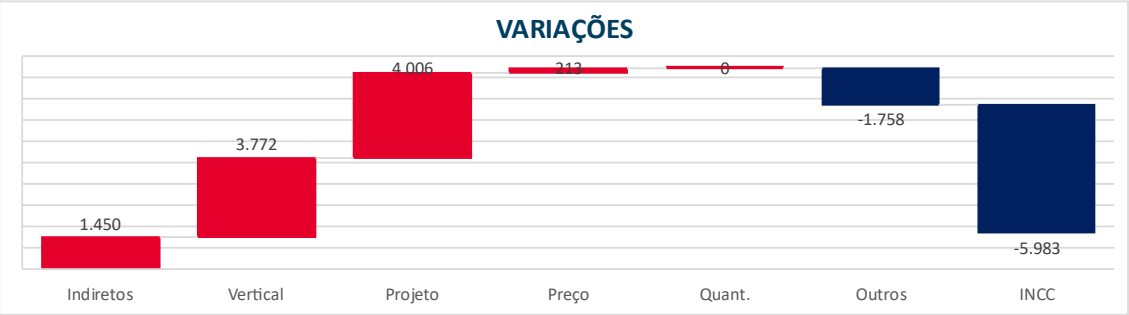

INDIRETOS
- 104 | G12 Gastos Gerais
+461 | G13 Pessoal Permanente
+264 | G14 Vigilância (preço e prazo)
+96 | G15 Implantação do Canteiro
+418 | G16 SLQA/MO Apropriada
+ 370 | 3 meses para energização

VERTICAL
+1.885 | Retroalimentação (Dissídio + QLP + Estepe)
+1.887 | Aprendizado

PROJETO
-1.000 | ETE
  +544 | Contenção
  +917 | Porta Varanda
  +265 | Esquadria de Ferro (varanda + porta corta fogo)
+1.282 | Projeto de Extensão de Rede Hidráulica (de 700m para 1.123m)
  +543 | Contenção
  +232 | Vaga em U – Concreto + grama (AP em brita)
  -114 | Reservatório Metálico
+1.536 | Anexos (churrasqueira, quadra, salão de festa, piscina)
+ 404 | Aço torre (Anterior = taxa de aço 40 kg/m³ x Atual = 45 kg/m³)

PREÇO
+496 | Fundação Rasa (concreto/aço/estrutura piso)
+309 | Estrutura Formas
+665 | Estrutura Torre (concreto/aço/ gesso)
-869 | Cotação (Grupo Vitória x Trópicos)

OUTROS
-1.347 | Inst. Infra

INCC
-5.983 | Atualização INCC

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
O ponto de ligação de água para abastecimento do empreendimento será na tubulação existente em PVC DEFoFo DN 150 mm, localizada na Rua Presidente Jefferson, em frente ao empreendimento.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Extensão de rede de 1.155m interligando no PV que está localizado na Alameda Jose Gerson de Morais com Avenida Madrid.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
GLP.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado calçada no entorno do empreendimento.

Operações

Água	Nível 1
Esgoto	Nível 3
Drenagem	Nível 5
Elétrica	NA
Gás	NA
Urbanização	Nível 1

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Considerado verba para ligação na porta. Não é necessário aprovação.

Esgoto:
- Extensão de rede de 1.155m interligando no PV que está localizado na Alameda Jose Gerson de Morais com Avenida Madrid. Necessária aprovação de projeto. Protocolo feito dia 20/08 versão final para aprovação. Expectativa para aprovação 20/09

Drenagem:
- Ligação na sarjeta.

Elétrica:
• BT: Projeto em análise junto a Equatorial. Previsão de Aprovação: 09/11/2025
• MT: Será protocolado depois da aprovação da BT
• Orçamento de Conexão: Assinado em 28/05/2025 com restrição de 1020 dias. Ligação de energia pela Equatorial prevista para Março/2028. Foi solicitada antecipação, a qual foi negada pela Equatorial. Alerta de energização da Obra devido a data de entrega da obra pelo PCP 169 previsto para Dezembro/2027.

Gás:
GLP.

Urbanização:
- Considerado calçada na testada do empreendimento.

Logística

VIVÊNCIA - CONTAINERS									
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
CONTAINER ALMOXARIFADO (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO		
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO COM SANITÁRIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-		
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-		
CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	-	TODO PERÍODO		
CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER (EQUIPE VERTICAL)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	-		
CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	CONSIDERAR 14 MÓDULOS COM 2 ESCADAS (7 MÓDULOS NO PAV. T E 7 MÓDULOS NO PAV SUPERIOR)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO		

TENDAS_PERÍODOS								
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	-		
GAIOLA DE INFLAMÁVEIS (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO		
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	5,00	12,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO		
TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	7,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-		
TENDA ARMAZENAMENTO (LOG)	1	5,00	12,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO		
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	5,00	12,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO		
TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	5,00	12,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO		
TENDA LAZER (LOG)	1	4,84	4,97	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO		
TENDA LAZER (LOG)	1	2,50	6,05	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO		
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	2,00	5,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-		
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	3,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-		

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS								
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-		
BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO		
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_R01	1 EQUIP PARA O BLOCO 01 E 02	-	-	-	TODO PERÍODO	-		
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-		
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-		
CREMALHEIRA PCT (LOG)	2 EQUIP	1 MOBILIZAÇÃO POR EQUIP	1 DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIP	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO		
GUINDASTE (LOG)	1 EQUIPAMENTO PARA IÇAMENTO DOS CASTELOS	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	-	-		
MINIGRUA (LOG)	2 EQUIP	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-		
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-		

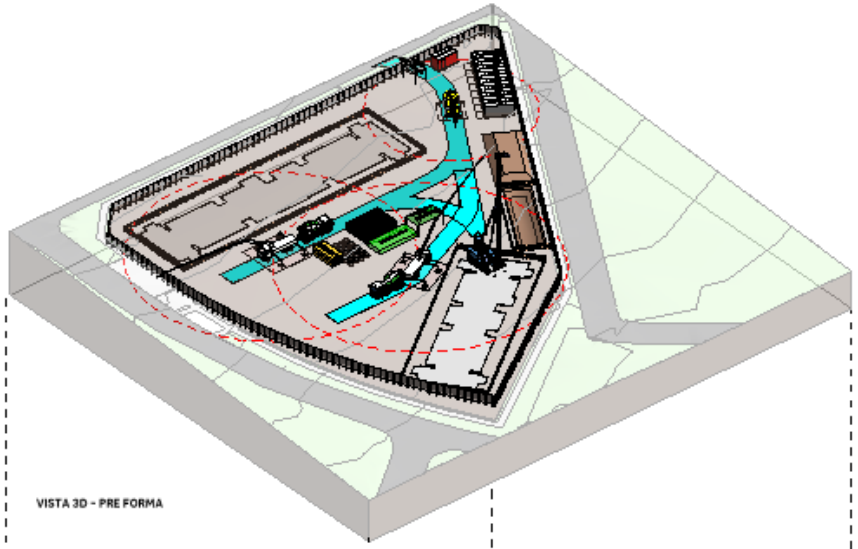

VISTA 3D - PRE FORMA

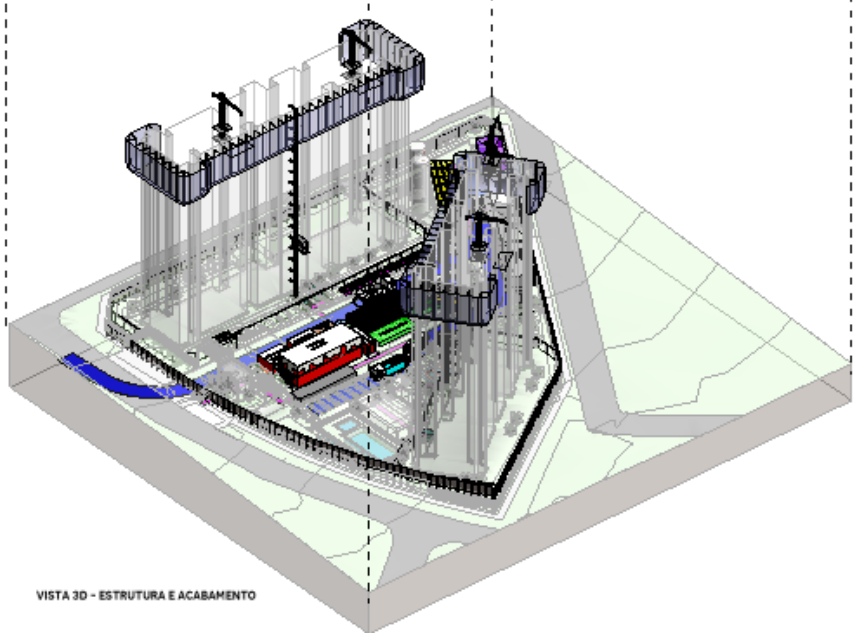

VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO

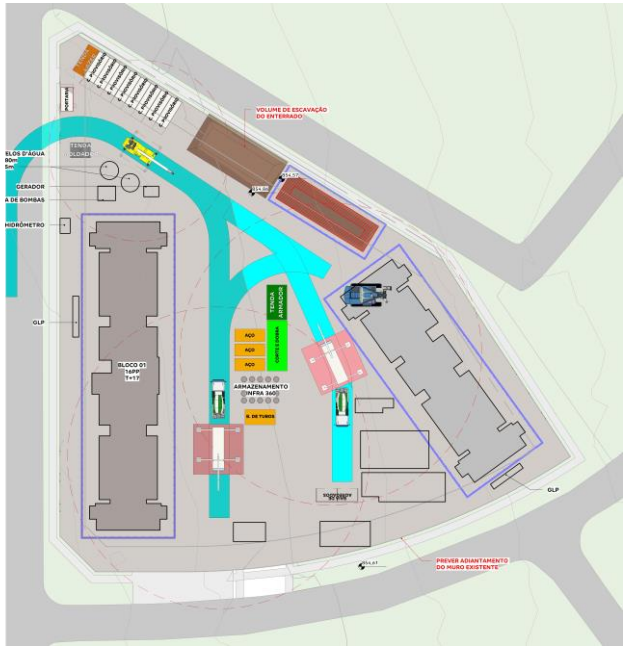

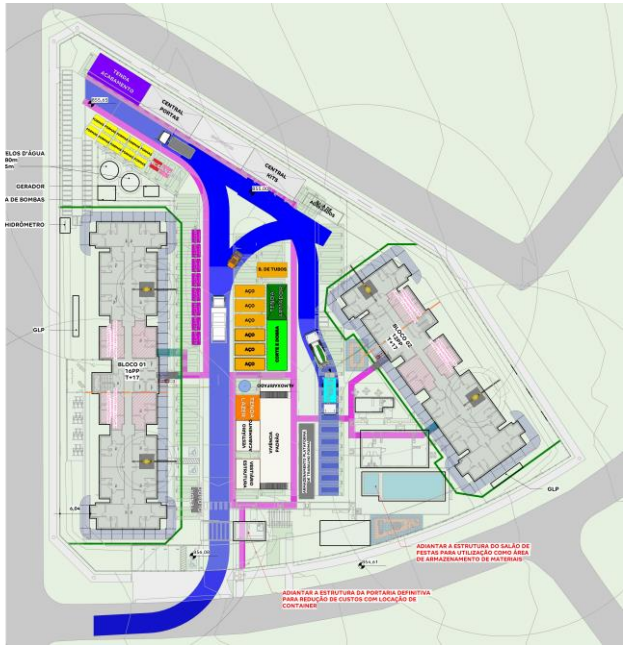

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Goiânia Sul + Aparecida	GOS	36%	1.805	150	2.165	180

Empreendimento	Renda	Lançamento	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27
Estância Dourados II	2.437	out-25		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	3
Santa Rita	2.463	nov-25			23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	21			
Faiçalville	**3.595**	**nov-25**			**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**
Videira	2.424	dez-26																23	23	23
Total de Vendas Lançados			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**0**	**28**	**79**	**79**	**79**	**79**	**79**	**79**	**79**	**79**	**79**	**79**	**79**	**79**	**77**	**79**	**79**	**54**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Faiçalville | Mapa Concorrência

		Faiçalville	Gran Paris
		TENDA	MRV
	Distância Tenda (km)		200M
Região 1 Km	População	8.470	8.470
	Dens. Demográfica	2.714	2.714
	Renda (R$)	7.017	7.017
	Classe Social	B2 (4.6k a 8.1k)	B2 (4.6k a 8.1k)
	PEA Dia	7.604	7.604
Quantitativo	Lançamento	nov/25	04/2023
	Unidades	501	224
	Estoque	501	0
	VSO	28	16
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	2	2
	Gabarito	T+17	T+13
	Plantas (m²)	32m²	35,78m² e 44,7m² e 42,6m²
	Tipologia	2 Dorms	1 e 2 Dorms
	Opções	Não	Garden
	Varanda	Sim	Sim
	Vagas	33%	Com Vaga
	Lazer	Salão de Festas, Churrasqueira Gourmet, Piscina Adulto e Infantil, Quadra esportiva, Playground, Playkids, Playbaby	Bicicletário, Espaço Gourmet, Pet Place, Piscina, Piscina infantil, Playground, Salão de Festas,

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- Apesar do Gran Paris não possuir mais estoque, o mesmo vendeu na região do Faiçallville com performance de preço e captura de rendas superiores à estimada para o produto Tenda. O preços da tabela abaixo são do final de estoque da concorrência (março/2024).

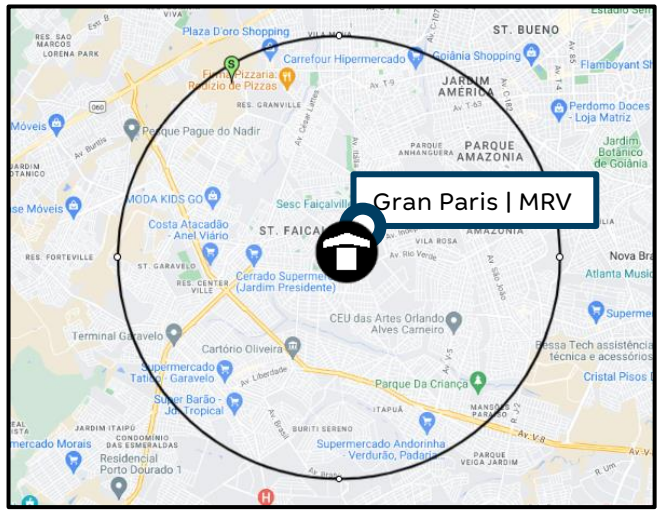

-	Faiçalville					Gran Paris					
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol
Sem Vaga	220.000	233.223	178.439	3.346	36%	-	-	-	-	-	-
Varanda	226.000	238.504	182.866	3.486	31%	-	-	-	-	-	-
Moto	228.000	241.444	185.101	3.570	5%	-	-	-	-	-	-
Moto - Varanda	235.000	246.596	189.608	3.750	5%	-	-	-	-	-	-
Carro	243.000	253.875	194.451	3.895	12%	255.000	254.990	201.442	4.100	23%	●
Carro - Varanda	250.000	259.217	195.691	4.295	12%	268.900	280.990	224.792	4.500	74%	●
Garden	-	-	-	-	-	265.000	264.748	211.798	4.325	3%	-

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Faiçalville					
Tipo:	**Sem Vaga**		**Moto**		**Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	220.000		228.000		243.000	
Renda Inicial (VF)	3.346		3.570		3.895	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	25%		25%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,70	2.355	0,65	2.355	0,74	2.932
FGTS	0,58	1.947	0,54	1.947	0,66	2.605
Financiamento	96,63%	171.696	97,30%	179.448	96,07%	188.374
Subsídio	123,44%	4.796	145,88%	3.705	166,42%	3.472
Prazo de Pró-soluto	28	28	28	28	28	28
Pró-Soluto	94,62%	32.208	93,23%	33.859	91,83%	36.390
Preço Raso (RS)	213.002	213.002	221.314	221.314	233.773	233.773
TCD	59,95%	20.221	55,94%	20.129	51,20%	20.102
VSO	10	10	2	2	3	3
Preço de Venda	**230.660**	**230.660**	**238.790**	**238.790**	**251.085**	**251.085**
Elasticidade	1,111%	1,111%	1,111%	1,111%	1,111%	1,111%
Preço de Venda Final	**233.223**	**233.223**	**241.444**	**241.444**	**253.875**	**253.875**
Preço Raso (R$)	**213.002**		**221.314**		**233.773**	
% de Raso	**91,33%**		**91,66%**		**92,08%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Faiçalville					
Tipo:	**Varanda**		**Moto - Varanda**		**Carro - Varanda**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	226.000		235.000		250.000	
Renda Inicial (VF)	3.486		3.750		4.295	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	25%		0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,67	2.355	0,62	2.355	0,68	2.932
FGTS	0,55	1.947	0,51	1.947	0,60	2.605
Financiamento	96,80%	176.954	97,06%	184.159	95,60%	191.290
Subsídio	136,47%	3.964	162,29%	3.501	107,75%	1.797
Prazo de Pró-soluto	28	28	28	28	28	28
Pró-Soluto	93,23%	33.062	90,44%	34.504	92,67%	40.492
Preço Raso (RS)	218.282	218.282	226.467	226.467	239.115	239.115
TCD	57,55%	20.221	53,25%	20.129	46,43%	20.102
VSO	8	8	2	2	3	3
Preço de Venda	**235.883**	**235.883**	**243.886**	**243.886**	**256.369**	**256.369**
Elasticidade	1,111%	1,111%	1,111%	1,111%	1,111%	1,111%
Preço de Venda Final	**238.504**	**238.504**	**246.596**	**246.596**	**259.217**	**259.217**
Preço Raso (R$)	**218.282**		**226.467**		**239.115**	
% de Raso	**91,52%**		**91,84%**		**92,25%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Faiçalville	
Tipo:	**Faixa 2**	
Método	**Vision**	
Avaliação	229.186	
Renda Inicial (VF)	3.595	
Renda Final*	-	
Tipo:	**VF**	**R$**
Ato	0,68	2.490
FGTS	0,58	2.101
Financiamento	96,55%	178.564
Subsídio	133,77%	3.916
Prazo de Pró-soluto	28	28
Pró-Soluto	93,36%	34.121
Preço Raso (RS)	221.191	221.191
TCD	56,08%	20.184
VSO	28	28
Preço de Venda	**238.694**	**238.694**
Elasticidade	1,111%	1,111%
Preço de Venda Final	**241.376**	**241.376**
Preço Raso (R$)	**221.191**	
% de Raso	**91,64%**	
Raso Todas as Fases	**221.191**	
Nominal Todas as Fases	**241.376**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região com ótimos indicadores sociodemográficos, região superior à do "Estância Dourados", O projeto também contempla piscina e unidades com varanda, reforçando seu atrativo no mercado.

2) A avaliação considerada neste parecer trata-se de uma estimativa, não sendo ainda a oficial emitida pela CEF. Ressaltamos que, para alcançarmos a performance de preço prevista pelo Vision, será necessário que a avaliação oficial esteja em linha com esta estimativa.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", apesar de não termos concorrentes com estoque na região dentro do programa MCMV, o concorrente que já performou na região vendeu em preço e renda acima do previsto pelo Vision.

Segue escalonamento da regional:

	Preço Real					Preço Norm. (29m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda MED	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Estância Dourados	213.091	190.250	2.799	47	16	13.741	203.991
Faiçalville	229.186	222.410	3.595	28	29	-	222.410

FAIÇALVILLE

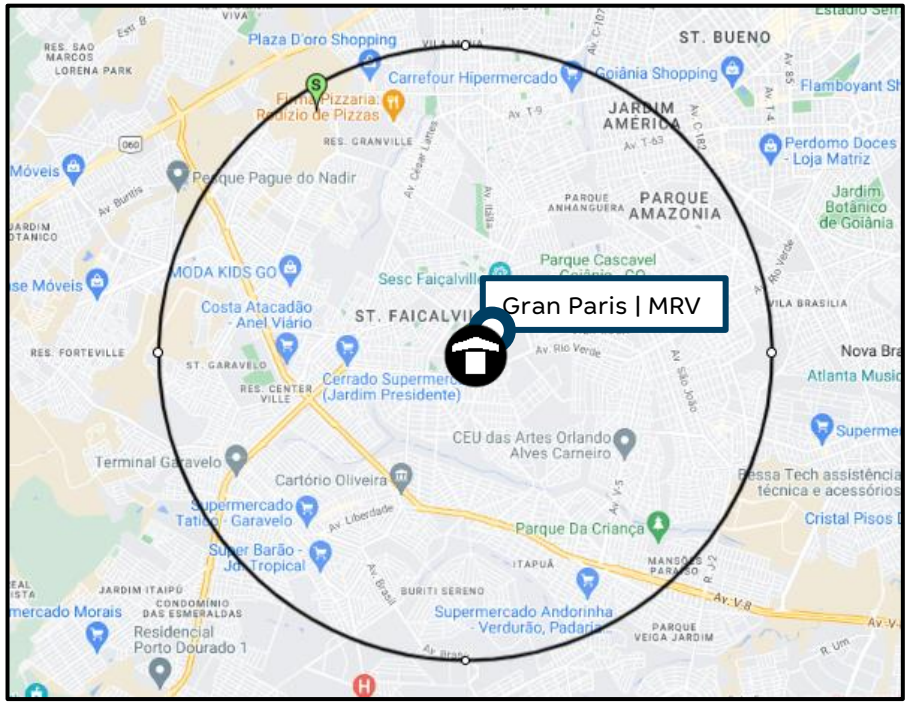

*São considerados apenas as unidades dos concorrentes que estão alinhadas com o produto Tenda

Análise de Riscos	Farol CF
Ciclo Financeiro avalia o Preço Vision como **factível.**	

1) O Ciclo Financeiro está de acordo com a precificação apresentada. No entanto, é importante ressaltar que essa precificação está vinculada a uma avaliação estimada. Caso ocorra uma redução na avaliação, será necessário revisar a precificação.

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Faiçalville					
Tipo:	**Sem Vaga**		**Moto**		**Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	220.000		228.000		243.000	
Renda Inicial (VF)	3.346		3.570		3.895	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	25%		25%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,70	2.355	0,65	2.355	0,74	2.932
FGTS	0,58	1.947	0,54	1.947	0,66	2.605
Financiamento	96,63%	171.696	97,30%	179.448	96,07%	188.374
Subsídio	123,44%	4.796	145,88%	3.705	166,42%	3.472
Prazo de Pró-soluto	28	28	28	28	28	28
Pró-Soluto	94,62%	32.208	93,23%	33.859	91,83%	36.390
Preço Raso (RS)	213.002	213.002	221.314	221.314	233.773	233.773
TCD	59,95%	20.221	55,94%	20.129	51,20%	20.102
VSO	10	10	2	2	3	3
Preço de Venda	**230.660**	**230.660**	**238.790**	**238.790**	**251.085**	**251.085**
Elasticidade	1,111%	1,111%	1,111%	1,111%	1,111%	1,111%
Preço de Venda Final	**233.223**	**233.223**	**241.444**	**241.444**	**253.875**	**253.875**
Preço Raso (R$)	**213.002**		**221.314**		**233.773**	
% de Raso	**91,33%**		**91,66%**		**92,08%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Faiçalville					
Tipo:	**Varanda**		**Moto - Varanda**		**Carro - Varanda**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	226.000		235.000		250.000	
Renda Inicial (VF)	3.486		3.750		4.295	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	25%		0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,67	2.355	0,62	2.355	0,68	2.932
FGTS	0,55	1.947	0,51	1.947	0,60	2.605
Financiamento	96,80%	176.954	97,06%	184.159	95,60%	191.290
Subsídio	136,47%	3.964	162,29%	3.501	107,75%	1.797
Prazo de Pró-soluto	28	28	28	28	28	28
Pró-Soluto	93,23%	33.062	90,44%	34.504	92,67%	40.492
Preço Raso (RS)	218.282	218.282	226.467	226.467	239.115	239.115
TCD	57,55%	20.221	53,25%	20.129	46,43%	20.102
VSO	8	8	2	2	3	3
Preço de Venda	**235.883**	**235.883**	**243.886**	**243.886**	**256.369**	**256.369**
Elasticidade	1,111%	1,111%	1,111%	1,111%	1,111%	1,111%
Preço de Venda Final	**238.504**	**238.504**	**246.596**	**246.596**	**259.217**	**259.217**
Preço Raso (R$)	**218.282**		**226.467**		**239.115**	
% de Raso	**91,52%**		**91,84%**		**92,25%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Faiçalville – Resumo – Cenário Aprovação

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	nov-24							
Faiçalville - Sem Vaga		nov-25	mai-26	abr-28	6 meses	23 meses	nov-28	36 meses
Faiçalville - Sem Vaga + Varanda		nov-25	mai-26	abr-28	6 meses	23 meses	nov-28	36 meses
Faiçalville - Vaga Moto		nov-25	mai-26	abr-28	6 meses	23 meses	nov-28	36 meses
aiçalville - Vaga Moto + Varanda		nov-25	mai-26	abr-28	6 meses	23 meses	nov-28	36 meses
Faiçalville - Vaga Carro		nov-25	mai-26	abr-28	6 meses	23 meses	nov-28	36 meses
aiçalville - Vaga Carro + Varanda		nov-25	mai-26	abr-28	6 meses	23 meses	nov-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	12,80 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	6.965 m²	**Área Líquida do Terreno:**	6.865 m²
Cash:	12,80 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	25	**Custo de terreno m²:**	1.837,7	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	1.864,5
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):**	10,6% / 50,4%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.**	6,0 / 3,0
Ato / %VGV:	0,50 MM / 0,4%			**Incorrido de Construção:**	0,08 MM	**Incorridos de Incorporação:**	0,24 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Faiçalville - Sem Vaga	T+17	213.002	179	233.223	220.000	96,6%	94,6%	60,0%
Faiçalville - Sem Vaga + Varanda	T+17	218.282	155	238.504	226.000	96,8%	93,2%	57,5%
Faiçalville - Vaga Moto	T+17	221.314	25	241.444	228.000	97,3%	93,2%	55,9%
aiçalville - Vaga Moto + Varanda	T+17	226.467	25	246.596	235.000	97,1%	90,4%	53,3%
Faiçalville - Vaga Carro	T+17	233.773	59	253.875	243.000	96,1%	91,8%	51,2%
aiçalville - Vaga Carro + Varanda	T+17	239.115	58	259.217	250.000	95,6%	92,7%	46,4%

Unidades Totais:	501	**Preço Médio:**	241.376	**Renda Média:**	3.595	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	8.427
Unidades Tenda:	501	**Avaliação Média:**	229.186	**Ato:**	2.462 (0,68 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	15.810
VSO:	28 Unidades	**VGV Total:**	120.929.142	**FGTS:**	2.072 (0,58 Salários)	**Preço Raso Médio:**	221.191
RET Médio:	3,5%	**VGV Tenda:**	120.929.142	**% em RET 1%:**	18%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	774

Construção

Custo Total Unit.:	96.118	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	32,00	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**16.941.740**	**LI:**	**20,05%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**11.432.238**	**Margem Bruta Econômica:**	**40,71%**
TIR:	**129,23%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(9.643.472)**	**Margem Bruta REF:**	**44,39%**
Exposição de Caixa:	**9,62%**	**Δ LI:**	**0,05%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**9.232.635**	**Margem Rasa Econômica:**	**34,52%**
Payback Contingente (21 m):	**20 m/ (-1 m)**	**LI Marginal:**	**20,46%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**30.270.855**	**Margem Rasa REF:**	**39,32%**
Payback Consolidado:	**20 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**27,27%**

Faiçalville – DRE – Cenário Aprovação

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Faiçalville - Aprovação		Faiçalville - Sem Vaga		Faiçalville - Sem Vaga + Varanda		Faiçalville - Vaga Moto		Faiçalville - Vaga Moto + Varanda		Faiçalville - Vaga Carro		Faiçalville - Vaga Carro + Varanda	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	118.870	100,0%	41.120	100,0%	36.306	100,0%	5.997	100,0%	6.125	100,0%	14.663	100,0%	14.659	100,0%
PIS/COFINS	(2.261)	1,9%	(732)	1,8%	(646)	1,8%	(107)	1,8%	(134)	2,2%	(321)	2,2%	(321)	2,2%
Custo Total	(69.134)	59,3%	(24.760)	61,3%	(21.337)	59,8%	(3.458)	58,7%	(3.458)	57,7%	(8.129)	56,7%	(7.992)	55,7%
Custo Terreno	(12.800)	11,0%	(4.573)	11,3%	(3.960)	11,1%	(639)	10,8%	(639)	10,7%	(1.507)	10,5%	(1.482)	10,3%
Custo Relacionados a Terreno	(527)	0,5%	(188)	0,5%	(163)	0,5%	(26)	0,4%	(26)	0,4%	(62)	0,4%	(61)	0,4%
Custos de Incorporação	(1.197)	1,0%	(487)	1,2%	(318)	0,9%	(68)	1,2%	(68)	1,1%	(128)	0,9%	(127)	0,9%
Custo de Construção	(54.611)	46,8%	(19.512)	48,3%	(16.896)	47,4%	(2.725)	46,3%	(2.725)	45,5%	(6.431)	44,8%	(6.322)	44,1%
Lucro Bruto Econômico	47.475	40,7%	15.628	38,7%	14.323	40,2%	2.432	41,3%	2.532	42,3%	6.212	43,3%	6.347	44,3%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	47.475	40,7%	15.628	38,7%	14.323	40,2%	2.432	41,3%	2.532	42,3%	6.212	43,3%	6.347	44,3%
Despesas de Selling	(12.947)	11,1%	(4.470)	11,1%	(3.947)	11,1%	(640)	10,9%	(652)	10,9%	(1.619)	11,3%	(1.618)	11,3%
Contingência	(2.734)	2,3%	(946)	2,3%	(835)	2,3%	(138)	2,3%	(141)	2,4%	(337)	2,4%	(337)	2,4%
Margem de Contribuição	31.794	27,3%	10.212	25,3%	9.540	26,8%	1.654	28,1%	1.740	29,0%	4.256	29,7%	4.391	30,6%
IR e CSLL	(1.850)	1,6%	(599)	1,5%	(529)	1,5%	(87)	1,5%	(110)	1,8%	(263)	1,8%	(263)	1,8%
Margem Líquida	29.944	25,7%	9.614	23,8%	9.012	25,3%	1.567	26,6%	1.630	27,2%	3.994	27,8%	4.128	28,8%
Lucro Bruto REF Unit.	109.187	44,4%	100.753	42,4%	106.484	43,8%	107.864	44,1%	113.083	45,3%	122.464	47,3%	127.823	48,3%
Lucro Raso REF Unit.	88.634	39,3%	80.171	36,9%	85.869	38,6%	87.507	39,0%	92.727	40,4%	101.948	42,7%	107.318	44,0%

R$ Mil - VPL - Compra	Faiçalville - Aprovação		Faiçalville - Sem Vaga		Faiçalville - Sem Vaga + Varanda		Faiçalville - Vaga Moto		Faiçalville - Vaga Moto + Varanda		Faiçalville - Vaga Carro		Faiçalville - Vaga Carro + Varanda	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	84.507	100,0%	29.268	100,0%	25.730	100,0%	4.330	100,0%	4.424	100,0%	10.367	100,0%	10.388	100,0%
PIS/COFINS	(1.583)	1,9%	(513)	1,8%	(451)	1,8%	(76)	1,8%	(95)	2,2%	(224)	2,2%	(224)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(65.983)	78,1%	(23.448)	80,1%	(20.260)	78,7%	(3.317)	76,6%	(3.344)	75,6%	(7.858)	75,8%	(7.757)	74,7%
Custo Terreno	(9.666)	11,4%	(3.453)	11,8%	(2.990)	11,6%	(482)	11,1%	(482)	10,9%	(1.138)	11,0%	(1.119)	10,8%
Custo Relacionados a Terreno	(539)	0,6%	(193)	0,7%	(167)	0,6%	(27)	0,6%	(27)	0,6%	(63)	0,6%	(62)	0,6%
Custos de Incorporação	(1.095)	1,3%	(439)	1,5%	(293)	1,1%	(64)	1,5%	(64)	1,5%	(119)	1,1%	(117)	1,1%
Custo de Construção	(41.373)	49,0%	(14.782)	50,5%	(12.800)	49,7%	(2.065)	47,7%	(2.065)	46,7%	(4.872)	47,0%	(4.790)	46,1%
Despesas de Selling	(11.018)	13,0%	(3.817)	13,0%	(3.337)	13,0%	(566)	13,1%	(576)	13,0%	(1.359)	13,1%	(1.363)	13,1%
Contingência	(997)	1,2%	(345)	1,2%	(304)	1,2%	(50)	1,2%	(51)	1,2%	(123)	1,2%	(123)	1,2%
IR e CSLL	(1.295)	1,5%	(420)	1,4%	(369)	1,4%	(62)	1,4%	(78)	1,8%	(183)	1,8%	(183)	1,8%
Lucro Imobiliário	16.942	20,0%	5.307	18,1%	5.019	19,5%	937	21,6%	985	22,3%	2.286	22,0%	2.407	23,2%

*Valores em R$ '000

Faiçalville – DRE – Cenário Aprovação

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Faiçalville - Aprovação		Primeira Fase	
	Nominal	%	Nominal	%
Receita	118.870	100,0%	118.870	100,0%
PIS/COFINS	(2.261)	1,9%	(2.261)	1,9%
Custo Total	(69.134)	59,3%	(69.134)	59,3%
Custo Terreno	(12.800)	11,0%	(12.800)	11,0%
Custo Relacionados a Terreno	(527)	0,5%	(527)	0,5%
Custos de Incorporação	(1.197)	1,0%	(1.197)	1,0%
Custo de Construção	(54.611)	46,8%	(54.611)	46,8%
Lucro Bruto Econômico	47.475	40,7%	47.475	40,7%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	47.475	40,7%	47.475	40,7%
Despesas de Selling	(12.947)	11,1%	(12.947)	11,1%
Contingência	(2.734)	2,3%	(2.734)	2,3%
Margem de Contribuição	31.794	27,3%	31.794	27,3%
IR e CSLL	(1.850)	1,6%	(1.850)	1,6%
Margem Líquida	29.944	25,7%	29.944	25,7%
Lucro Bruto REF Unit.	109.187	44,4%	109.187	44,4%
Lucro Raso REF Unit.	88.634	39,3%	88.634	39,3%

R$ Mil - VPL - Compra	Faiçalville - Aprovação		Primeira Fase	
	VP	%	VP	%
Receitas	84.507	100,0%	84.507	100,0%
PIS/COFINS	(1.583)	1,9%	(1.583)	1,9%
Custos e Despesas Totais	(65.983)	78,1%	(65.983)	78,1%
Custo Terreno	(9.666)	11,4%	(9.666)	11,4%
Custo Relacionados a Terreno	(539)	0,6%	(539)	0,6%
Custos de Incorporação	(1.095)	1,3%	(1.095)	1,3%
Custo de Construção	(41.373)	49,0%	(41.373)	49,0%
Despesas de Selling	(11.018)	13,0%	(11.018)	13,0%
Contingência	(997)	1,2%	(997)	1,2%
IR e CSLL	(1.295)	1,5%	(1.295)	1,5%
Lucro Imobiliário	16.942	20,0%	16.942	20,0%

*Valores em R$ '000

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	BP - 2025	Atual	Atual vs BP - 2025	Δ%
Data Estudo:	dezembro-24	outubro-25	10 Meses	N/A
Lançamento:	julho-26	novembro-25	-8 Meses	N/A
Uhs:	501	501	-	0,0%
Preço Nominal:	232.153	241.376	9.222	4,0%
Preço Raso:	202.490	221.191	18.702	9,2%
Preço Nominal Inflacionado:	255.873	245.973	(9.900)	-3,9%
Preço Raso Inflacionado:	223.171	225.420	2.249	1,0%
Renda Média:	3.464	3.595	131	3,8%
RET Médio:	N/A	3,46%	N/A	N/A
% em RET 1%:	N/A	17,91%	N/A	N/A
VSO:	28	28	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	8.418	9.254	836	9,9%
Avaliação:	237.335	229.186	(8.150)	-3,4%
Prazo construção F1:	19	23	4	21,1%
Prazo de Pró-Soluto F1:	24	28	4	16,7%
Custo Total Inf (Unit):	147.979	137.993	(9.986)	-6,7%
Custo Construção (Unit):	90.322	96.118	5.796	6,4%
Fração de construção:	38,9%	39,8%	0,9 p.p.	2,4%
INCC Folha Rosto:	1.149,17	1.216,71	68	5,9%
Custo Terreno Inf:	12.800.000	12.800.000	0	0,0%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	1.283	1.051	(232)	-18,1%
Fração do Terreno[1]:	11,0% / 49,9%	10,6% / 50,4%	-0,4 p.p.	-3,6%
Custo de Incorp. por uh:	3.972	2.389	(1.584)	-39,9%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	4.217.306	4.636.128	418.822	9,9%
Custo do Ciclo (Unit):	15.646	15.810	164	1,0%
Lucro Imobiliário:	20,4%	20,0%	-0,3 p.p.	-1,6%
LI Marginal:	N/A	20,5%	N/A	N/A
Exposição de caixa:	14,5%	9,6%	-4,9 p.p.	-33,8%
TIR:	91,8%	129,2%	37,4 p.p.	40,8%
Margem Bruta REF:	42,7%	44,4%	1,7 p.p.	4,0%
Margem Bruta Econômica:	39,0%	40,7%	1,7 p.p.	4,3%
Margem Rasa REF:	34,3%	39,3%	5,0 p.p.	14,6%
Margem Rasa Econômica:	29,4%	34,5%	5,1 p.p.	17,3%
Margem Contribuição Econômica:	29,7%	27,3%	-2,4 p.p.	-8,1%
Payback Contingente (Régua 21 m):	20 m/ (0 m)	20 m/ (-1 m)	0	0,0%
Payback Consolidado:	20 Meses	20 Meses	0 Meses	0,0%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Faiçalville – Informações Gerais – Cenário Real

Faiçalville - Real - GO - Goiânia Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	nov-24							
Faiçalville - Sem Vaga		nov-25	mai-26	abr-28	6 meses	23 meses	nov-28	36 meses
aiçalville - Sem Vaga + Varanda		nov-25	mai-26	abr-28	6 meses	23 meses	nov-28	36 meses
Faiçalville - Vaga Moto		nov-25	mai-26	abr-28	6 meses	23 meses	nov-28	36 meses
çalville - Vaga Moto + Varanda		nov-25	mai-26	abr-28	6 meses	23 meses	nov-28	36 meses
Faiçalville - Vaga Carro		nov-25	mai-26	abr-28	6 meses	23 meses	nov-28	36 meses
içalville - Vaga Carro + Varanda		nov-25	mai-26	abr-28	6 meses	23 meses	nov-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	12,80 MM	Incorrido Terreno:	0,00 MM	Área do Terreno (100%):	6.965 m²
Cash:	12,80 MM	Nº de Parcelas Cash :	25	Custo de terreno m²:	1.837,7
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			VaR 25 (R$ mil):	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			VaR 26 (R$ mil):	0
Ato / %VGV:	0,50 MM / 0,4%			Incorrido de Construção:	0,08 MM

Área Líquida do Terreno:	6.865 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	1.864,5
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	10,6% / 51,2%
CA Máx/Proj.	6,0 / 3,0
Incorridos de Incorporação:	0,24 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Faiçalville - Sem Vaga	T+17	213.002	179	233.223	220.000	96,6%	94,6%	60,0%
aiçalville - Sem Vaga + Varanda	T+17	218.282	155	238.504	226.000	96,8%	93,2%	57,5%
Faiçalville - Vaga Moto	T+17	221.314	25	241.444	228.000	97,3%	93,2%	55,9%
çalville - Vaga Moto + Varanda	T+17	226.467	25	246.596	235.000	97,1%	90,4%	53,3%
Faiçalville - Vaga Carro	T+17	233.773	59	253.875	243.000	96,1%	91,8%	51,2%
içalville - Vaga Carro + Varanda	T+17	239.115	58	259.217	250.000	95,6%	92,7%	46,4%

Unidades Totais:	501	Preço Médio:	241.376	Renda Média:	3.595	ITBI+Emol. Unit. Médio:	8.427
Unidades Tenda:	501	Avaliação Média:	229.186	Ato:	2.462 (0,68 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	15.810
VSO:	28 Unidades	VGV Total:	120.929.142	FGTS:	2.072 (0,58 Salários)	Preço Raso Médio:	221.191
RET Médio:	3,5%	VGV Tenda:	120.929.142	% em RET 1%:	18%	Adc. Tx. de Aceleração Médio:	774

Construção

Custo Total Unit.:	98.005	Eventuais:	4,00%	Área priv (m²):	32,00	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	**16.129.642**	LI:	**19,09%**	Exposição de Caixa (R$):	**11.684.792**	Margem Bruta Econômica:	**39,80%**
TIR:	**122,41%**	LI Aprovação:	**20,00%**	Ger. Caixa 12 meses (R$):	**(9.799.525)**	Margem Bruta REF:	**43,52%**
Exposição de Caixa:	**9,83%**	Δ LI:	**-0,91%**	Ger. Caixa 24 meses (R$):	**8.501.999**	Margem Rasa Econômica:	**33,51%**
Payback Contingente (21 m):	**20 m/ (-1 m)**	LI Marginal:	**19,50%**	Ger. Caixa Marginal (R$):	**29.204.654**	Margem Rasa REF:	**38,37%**
Payback Consolidado:	**20 meses**					Margem de Contribuição Econômica:	**26,35%**

Faiçalville – DRE – Cenário Real

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Faiçalville - Real		Faiçalville - Sem Vaga		Faiçalville - Sem Vaga + Varanda		Faiçalville - Vaga Moto		Faiçalville - Vaga Moto + Varanda		Faiçalville - Vaga Carro		Faiçalville - Vaga Carro + Varanda	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	118.870	100,0%	41.120	100,0%	36.306	100,0%	5.997	100,0%	6.125	100,0%	14.663	100,0%	14.659	100,0%
PIS/COFINS	(2.261)	1,9%	(732)	1,8%	(646)	1,8%	(107)	1,8%	(134)	2,2%	(321)	2,2%	(321)	2,2%
Custo Total	(70.203)	60,2%	(25.142)	62,2%	(21.668)	60,8%	(3.512)	59,6%	(3.512)	58,6%	(8.255)	57,6%	(8.115)	56,6%
Custo Terreno	(12.800)	11,0%	(4.573)	11,3%	(3.960)	11,1%	(639)	10,8%	(639)	10,7%	(1.507)	10,5%	(1.482)	10,3%
Custo Relacionados a Terreno	(527)	0,5%	(188)	0,5%	(163)	0,5%	(26)	0,4%	(26)	0,4%	(62)	0,4%	(61)	0,4%
Custos de Incorporação	(1.199)	1,0%	(487)	1,2%	(319)	0,9%	(68)	1,2%	(68)	1,1%	(129)	0,9%	(127)	0,9%
Custo de Construção	(55.677)	47,7%	(19.893)	49,3%	(17.226)	48,3%	(2.778)	47,2%	(2.778)	46,4%	(6.557)	45,7%	(6.446)	45,0%
Lucro Bruto Econômico	46.406	39,8%	15.247	37,8%	13.992	39,2%	2.379	40,4%	2.479	41,4%	6.086	42,4%	6.223	43,4%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	46.406	39,8%	15.247	37,8%	13.992	39,2%	2.379	40,4%	2.479	41,4%	6.086	42,4%	6.223	43,4%
Despesas de Selling	(12.947)	11,1%	(4.470)	11,1%	(3.947)	11,1%	(640)	10,9%	(652)	10,9%	(1.619)	11,3%	(1.618)	11,3%
Contingência	(2.734)	2,3%	(946)	2,3%	(835)	2,3%	(138)	2,3%	(141)	2,4%	(337)	2,4%	(337)	2,4%
Margem de Contribuição	30.725	26,3%	9.831	24,3%	9.209	25,8%	1.601	27,2%	1.686	28,1%	4.131	28,8%	4.267	29,8%
IR e CSLL	(1.850)	1,6%	(599)	1,5%	(529)	1,5%	(87)	1,5%	(110)	1,8%	(263)	1,8%	(263)	1,8%
Margem Líquida	28.875	24,8%	9.232	22,9%	8.681	24,3%	1.513	25,7%	1.576	26,3%	3.868	27,0%	4.005	27,9%
Lucro Bruto REF Unit.	107.053	43,5%	98.619	41,5%	104.351	42,9%	105.731	43,2%	110.950	44,4%	120.330	46,4%	125.690	47,5%
Lucro Raso REF Unit.	86.500	38,4%	78.037	36,0%	83.736	37,6%	85.373	38,1%	90.593	39,5%	99.815	41,8%	105.185	43,1%

R$ Mil - VPL - Compra	Faiçalville - Real		Faiçalville - Sem Vaga		Faiçalville - Sem Vaga + Varanda		Faiçalville - Vaga Moto		Faiçalville - Vaga Moto + Varanda		Faiçalville - Vaga Carro		Faiçalville - Vaga Carro + Varanda	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	84.507	100,0%	29.268	100,0%	25.730	100,0%	4.330	100,0%	4.424	100,0%	10.367	100,0%	10.388	100,0%
PIS/COFINS	(1.583)	1,9%	(513)	1,8%	(451)	1,8%	(76)	1,8%	(95)	2,2%	(224)	2,2%	(224)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(66.795)	79,0%	(23.738)	81,1%	(20.511)	79,7%	(3.357)	77,5%	(3.384)	76,5%	(7.953)	76,7%	(7.851)	75,6%
Custo Terreno	(9.666)	11,4%	(3.453)	11,8%	(2.990)	11,6%	(482)	11,1%	(482)	10,9%	(1.138)	11,0%	(1.119)	10,8%
Custo Relacionados a Terreno	(539)	0,6%	(193)	0,7%	(167)	0,6%	(27)	0,6%	(27)	0,6%	(63)	0,6%	(62)	0,6%
Custos de Incorporação	(1.098)	1,3%	(440)	1,5%	(293)	1,1%	(64)	1,5%	(64)	1,5%	(119)	1,1%	(117)	1,1%
Custo de Construção	(42.183)	49,9%	(15.071)	51,5%	(13.050)	50,7%	(2.105)	48,6%	(2.105)	47,6%	(4.968)	47,9%	(4.883)	47,0%
Despesas de Selling	(11.018)	13,0%	(3.817)	13,0%	(3.337)	13,0%	(566)	13,1%	(576)	13,0%	(1.359)	13,1%	(1.363)	13,1%
Contingência	(997)	1,2%	(345)	1,2%	(304)	1,2%	(50)	1,2%	(51)	1,2%	(123)	1,2%	(123)	1,2%
IR e CSLL	(1.295)	1,5%	(420)	1,4%	(369)	1,4%	(62)	1,4%	(78)	1,8%	(183)	1,8%	(183)	1,8%
Lucro Imobiliário	16.130	19,1%	5.017	17,1%	4.768	18,5%	897	20,7%	945	21,4%	2.190	21,1%	2.313	22,3%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Obrigado!
