Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento

Regional: BA

Projeto: Jaguaribe Prime

Data Comitê: 13/01/2025

Comitê Digital 13.01.25

Nome	Jaguaribe Prime - Investimento	
Renan Barbosa Sanches	Discutir em Comitê	Dado que o projeto é um compromisso em cash de 42mm que depende de uma equação de preço e vso de alta performance (e ainda assim a fração ficou alta, em 13,5%), considero que o perfil de risco do projeto é diferente da média da Tenda. Caso tenhamos problemas de performance a rentabilidade desse projeto é afetada de forma bastante desproporcional a um projeto em permuta, com tamanho menor. Gostaria de entender algumas coisas: 1) como foi possível a entrega do indicador de payback dado que o fluxo é em cash com alta fração (EE validar inclusive os cálculos e fórmulas) 2) qual a possibilidade de quebrarmos esse negócio em 2 condomínios e fazermos o compromisso dividido por 2 3) gostaria de ver também sensibilidades caso não consigamos entregar o VSO e caso o preço varie 2, 4, 6, 8 e 10%
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Alejandro Octavio Abiusi	Discutir em Comitê	Apesar de termos duas fases, o empreendimento será, na prática, um condomínio só com mais de mil unidades? Qual é o preço inflacionado que a VF prevê para o momento do lançamento? O cenário de preço hoje me parece razoável por ser um produto premium e bem localizado. Porém, me preocupa qual é o preço que será necessário para aprovar o lançamento, uma vez que teremos que escriturar 6 meses antes da data prevista para lançar (set/25 x mar/26).
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	ok
Rodrigo Osmo	Aprovado	N/A

Respostas Comitê

Questionamento Comitê Renan: 1) como foi possível a entrega do indicador de payback dado que o fluxo é em cash com alta fração (EE validar inclusive os cálculos e fórmulas)

R1: Cálculos e fórmulas validados por EE conforme solicitado, sem desvios. Sobre a entrega do Payback em 21 meses, no mês do payback (Nov/27) já teremos recebido a receita do repasse de 75% da Fase 1, e só teremos pago menos da metade do preço terreno (46%), o que contribui para o Payback nesse mês.

Questionamento Comitê Renan: 2) Qual a possibilidade de quebrarmos esse negócio em 2 condomínios e fazermos o compromisso dividido por 2

R2: A divisão do condomínio em 2 gera perda de 251 unidades, aumento do custo por duplicação das áreas de lazer e técnica e redução no percentual de vagas para 14%, afetando consequentemente o VGV em dois pontos cruciais: pela redução do número de unidades e pela redução das vagas que são atreladas as unidades, uma redução total de 68 MM de VGV conforme comparativo abaixo. Quanto a divisão do compromisso em dois, não foi possível devido a imposição comercial do proprietário que já tinha negociações avançadas com uma concorrente (Stanza), com proposta comercial de compromisso único. A Stanza já possui 2 lançamentos a poucos metros desse terreno com preço médio acima de 450k.

Indicadores	Condomínio único	Dois condominios
VGV	R$ 310.747.410	R$ 242.508.040
Valor do negócio	R$ 42.000.000	R$ 42.000.000
% do terreno	13,52%	17,32%

Respostas Comitê

Questionamento Comitê Renan: 3) gostaria de ver também sensibilidades caso não consigamos entregar o VSO e caso o preço varie 2, 4, 6, 8 e 10%

R3: Segue sensibilidades de variação de preço e VSO, bem como os resultados financeiros de cada cenário. Estamos confiantes e alinhados com o time do ciclo que por conta da localização e produto estamos bem posicionados com o VSO e o preço atual do comitê.

Indicadores – Variação Preço (Mantendo VSO regra de ouro)

Indicadores	-10%	-8%	-6%	-4%	-2%	0%	2%	4%	6%	8%	10%
Preço Nominal:	R$ 244.683	R$ 250.120	R$ 255.558	R$ 260.995	R$ 266.433	R$ 271.870	R$ 277.307	R$ 282.745	R$ 288.182	R$ 293.620	R$ 299.057
Preço Raso:	R$ 219.085	R$ 223.954	R$ 228.822	R$ 233.691	R$ 238.560	R$ 244.467	R$ 248.297	R$ 253.165	R$ 258.034	R$ 262.902	R$ 267.771
Lucro Imobiliário:	13,7%	15,2%	16,6%	18,0%	19,3%	20,6%	21,8%	23,0%	24,1%	25,2%	26,1%
Margem Bruta Econômica:	36,6%	37,9%	39,3%	40,5%	41,7%	42,8%	44,0%	45,1%	46,1%	47,1%	48,1%
Payback Contingente (Régua 21 m):	25 m/ (4 m)	23 m/ (2 m)	22 m/ (1 m)	21 m/ (0 m)	21 m/ (0 m)	21 m/ (0 m)	20 m/ (-1 m)	20 m/ (-1 m)	20 m/ (-1 m)	20 m/ (-1 m)	20 m/ (-1 m)

Indicadores – Variação VSO (Mantendo preço nominal)

Indicadores	VSO (-20%)	VSO (-10%)	VSO Atual (32)	VSO (+10%)	VSO (20%)
VSO	26	29	32	35	38
Lucro Imobiliário:	18,4%	19,8%	20,6%	21,1%	21,4%
Margem Bruta Econômica:	42,4%	42,6%	42,8%	43,0%	43,1%
Payback Contingente (Régua 21 m):	24 m/ (3 m)	22 m/ (1 m)	21 m/ (0 m)	20 m/ (-1 m)	19 m/ (-2 m)

Respostas Comitê

Questionamento Comitê Alejandro: 1) Apesar de termos duas fases, o empreendimento será, na prática, um condomínio só com mais de mil unidades?

R1: Positivo. Na prática, será um condomínio único com mais de 1000 unidades. Para isso, investimos em atributos técnicos e de lazer durante a execução do cenário para o bom desenvolvimento do condomínio como: Uma churrasqueira a cada 250 unidades, áreas de lazer internas em cada torre, lixeiras intermediárias ao longo da implantação e previsão para espaço delivery na portaria.

Questionamento Comitê Alejandro: 2) Qual é o preço inflacionado que a VF prevê para o momento do lançamento?
R2: Segue preço inflacionado nominal e raso da VF para os dois lançamentos:

Preço inflacionado F1	
Nominal	R$ 295.013
Raso	R$ 266.331
Previsão lançamento	fev/26

Preço inflacionado F2	
Nominal	R$ 310.134
Raso	R$ 277.742
Previsão lançamento	ago/27

Questionamento Comitê Alejandro: 3) O cenário de preço hoje me parece razoável por ser um produto premium e bem localizado. Porém, me preocupa qual é o preço que será necessário para aprovar o lançamento, uma vez que teremos que escriturar 6 meses antes da data prevista para lançar (set/25 x mar/26).

R3: O prazo de 12 meses para escriturar está vinculado a aprovação de projeto na prefeitura e o lançamento deverá ocorrer imediatamente após a escritura. A viabilidade está considerando uma aprovação de projeto dentro dos prazos médios que temos hoje em Salvador para terrenos menos complexos e também leva em consideração alguns cumprimentos de obrigações por parte dos Vendedores que devem anteceder à escritura/ aprovação de projeto. O cronograma real do projeto está sendo conduzido para termos a aprovação dentro do prazo da opção, porém, existe uma ressalva contratual de suspensão dos prazos caso venha a ser verificada alguma pendência na documentação que seja de responsabilidade dos vendedores, o que nos dá o conforto necessário para seguirmos com o negócio conforme apresentado, destacamos que a lavratura da escritura no prazo de 12 meses é uma faculdade da TENDA.

One Page – Jaguaribe Prime

Cidade	Salvador	**Mancha de demanda**	BA - Salvador - Alta
Regional	BA	**Cluster MPR**	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Investimento	**Versão da VF**	Versão 1.1: Jan

Unidades (% Vagas)	1143 (19%)	**CA Máx | Proj**	3,0 | 1,8
Tipologia	F2E - Concreto	**Escritura**	jan-26
Fases	2 fases	**Lçto | Duração (m)**	fev/26 | 43

Valor Terreno (% VGV)	42.999 (13,8%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	42.999 (IPCA)	**%VGV Perm Fin (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	2.293	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	107.842 (34,7%)	**Indireto Unit.**	15.312
Prazo da Obra (meses)	19	**Torre Unit.**	56.398
Custo Total Unit.:	94.350	**Infra Unit.**	11.644
Início de Obra	ago-26	**Fundação Unit.**	7.028

Preço Nominal Unit.	271.870	**VSO**	32
Preço Raso Unit.	244.467	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	292.021	**Renda (% em RET 1%)**	4.682 (0,0%)



LI (Régua):	**20,6% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	42,8%
LI Resiliência:	13,4% (N/A)	**Margem Rasa Econômica:**	35,6%
Margem Bruta REF:	46,4%	**Margem Contribuição Econômica:**	29,6%
Margem Rasa REF:	**40,4%**	**Exposição (% VGV):**	24.694 (7,2%)
TIR:	98,7%	**VGV Total:**	310.747
Payback Contingente (21 m) :	**21 m/ (0 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(627)
Payback Consolidado:	21	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	(22.012)

Destaques

[1] Localização

- Localizado na mancha premium, entre a Avenida Paralela, principal avenida de Salvador, e a praia de Jaguaribe, este empreendimento destaca-se por sua localização estratégica em relação à mobilidade urbana, facilitando o acesso a diversas regiões da cidade.
- O terreno pertence a uma área prime da cidade com pontos de referências como: Clube Adelba ao lado do empreendimento, Shopping Paralela a 800 metros; Avenida Paralela, Estação de metrô, Alphaville e Faculdade FTC a 900 metros; a praia de Jaguaribe 1 km; além disso centros comerciais, outras faculdades, escolas e mercados num raio de 3 km.

[2] Condição Comercial

- Negócio fechado em cash no valor de R$42.000.000, a ser pago em 48 parcelas de R$875.000, reajustadas por INCC, vencendo a primeira na escritura, desde que superadas as condições resolutivas e obrigações contratuais.
- Os valores da viabilidade de comitê já estão considerando a correção do valor do negócio de dois meses antes da assinatura (jul/24) até o último índice INCC divulgado.
- Este negócio marca o 5º projeto fechado com a Delta Participações (CS) em um intervalo de 5 anos, apresentando um feito relevante conforme números indicados abaixo:

Projeto	UHS	VGV	Valor Terreno	Fração Terreno
Jardim Primavera	334	R$ 54.882.546	R$ 3.145.353	5,73%
Reserva Piatã	1280	R$ 242.005.696	R$ 32.200.981	13,31%
Encanto Piatã	1611	R$ 384.818.122	R$ 25.821.288	6,71%
Vivenda Real I e II	1007	R$ 235.608.413	R$ 15.483.547	6,57%
Jaguaribe Prime	1143	R$ 310.747.995	R$ 42.000.000	13,52%
Total	**5375**	**R$ 1.228.062.773**	**R$ 118.651.169**	**9,17%**

[3] Projeto

- Esse empreendimento se destaca por ser o primeiro da Bahia com 100% das unidades tipo com varanda, com exceção das unidades PCD e térreo.
- O produto também conta com piscina adulto e infantil, quadra poliesportiva e 19% de vagas, com possibilidade de estacionamento de carros também nas ruas no entorno do empreendimento.
- Em decorrência dos impactos da área em estágio médio e a FNA existentes no terreno, não foi possível ultrapassar o CA além dos 1,8 previstos no projeto.

Jaguaribe Prime – Implantação

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Farol Pareceres – Jaguaribe Prime

Área	Riscos Associados	Parecer	Flag
Jurídico Imobiliário	**Due diligence em andamento**, restando pendente a Certidão/Ofício da **SEFAZ CAP (desapropriação)**. **Do imóvel;** i) Necessária retificação de área do imóvel, com anuência de confrontantes; ii) Imóvel possui débitos de IPTU no valor aproximado de 6MM; iii) **Identificamos divergência na somatória da área dos registros anteriores**, estamos em fase de entendimento sobre essa situação, evitando riscos de sobreposições; iv) Identificamos **2 Embargos Ambientais** realizados pelo IBAMA, em área próxima ao imóvel (em fase de entendimento se recai na área do Imóvel); vi) O IMÓVEL foi **caucionado** em processo judicial da antecessora, no qual se discute o valor venal para fins de ITIV. Além desse processo, a Vendedora também ingressou com ação judicial visando a redução do valor venal atribuido para fins de ITIV. Para escritura, tais ações deverão ser encerradas pela Vendedora, com a quitaçao de eventuais débitos; **Da vendedora (Delta) e da Antecessora (Toprojet)**: i) Foram constatados passivos em nome de ambas, porém, com relação a antecessora, estamos buscando patrimônio suficiente para fazer frente a tal passivo, entretanto, cumpre destacar que o ativo da Vendedora é suficiente para cobrir os passivos de ambas. (Vendedora: Empresa do Grupo Suarez).	Ok com ressalvas	
Legalização	O acesso do empreedimento será através da área desapropriada para fins de implantação de sistema viário, que deverá ser aprovado junto a SEDUR e SEINFRA para tornar esse acesso um logradouro oficial, e com isso, garantir essa testada como acesso oficial. Será protocolado defesa para isenção de fachada ativa face incidência na zona ZCLMu, seguindo as premissas de defesas acatadas, (área de preservação da Mata Atlântica, declividade acentuada e proximidade de centro comercial. Além disso, com a formalização do acesso pela área desapropriada, o terreno poderá ser enquadrado como ZPR 3, isentando-o dessa exigência. Existem dois autos de infração relacionados ao terreno registrados junto ao IBAMA. Caso seja identificado algum passivo ambiental serão integralmente do atual proprietário do terreno, conforme previsto em contrato. Está sendo previsto área externa para compensação da área de estágio médio de Mata Atlântica, no qual será de responsabilidade do atual proprietário do terreno sua aquisição, devendo ser aprovado no órgão público como uma resolutiva na escritura; O Laudo de Restrições Ambientais indica inexistência de APPs no terreno, devendo apenas ser previsto faixa de manutenção do Rio Trobogy canalizados, epor conta disso foi considerado FNA de 15m desse córrego. Em paralelo, foi protocolado Manifestação Prévia junto a prefeitura no qual emitido parecer preliminar confirmando ausência de restrições quanto às margens desse rio. Considerando que o terreno fez parte da matricula objeto do loteamento Alphaville com previsão de área de doação, o terreno será divido em duas áreas através de "Desdobro de lotes" sem previsão de doação de áreas, reservando uma área ao condomínio e outra ao proprietário.	Ok com ressalvas	
Produto	Sem riscos	Ok	
GETEC	Sem riscos	Ok	
Logística	Sem riscos	Ok	
Inteligência de mercado	IM avalia preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	O Parecer do ciclo e favorável estamos com uma diferença segura de preço para o concorrente, e o mesmo já está em final de estoque também.	Ok	
Estudos Econômicos	Sem riscos	Ok	

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

SSA – Salvador

Lançamento

1. Farol de Itapuã | Ponta Humaitá
2. Parque Topázio
3. Vista Salvador Norte
4. Reserva Piatã
5. Encanto Piatã
6. Vale dos Lírios
7. Morada das Estações
8. Jardim Armação Prime

LandBank

9. Vale das Tulipas
10. Solar de Itapagipe
11. Torres Vila Laura
12. Vista Serena
13. Vivenda Real
14. Portal de Salvador
15. Solar Patamares
16. Jaguaribe Prime

Cluster MPR – (Comitê)

- Cluster 4 - Azul

Região

Capital

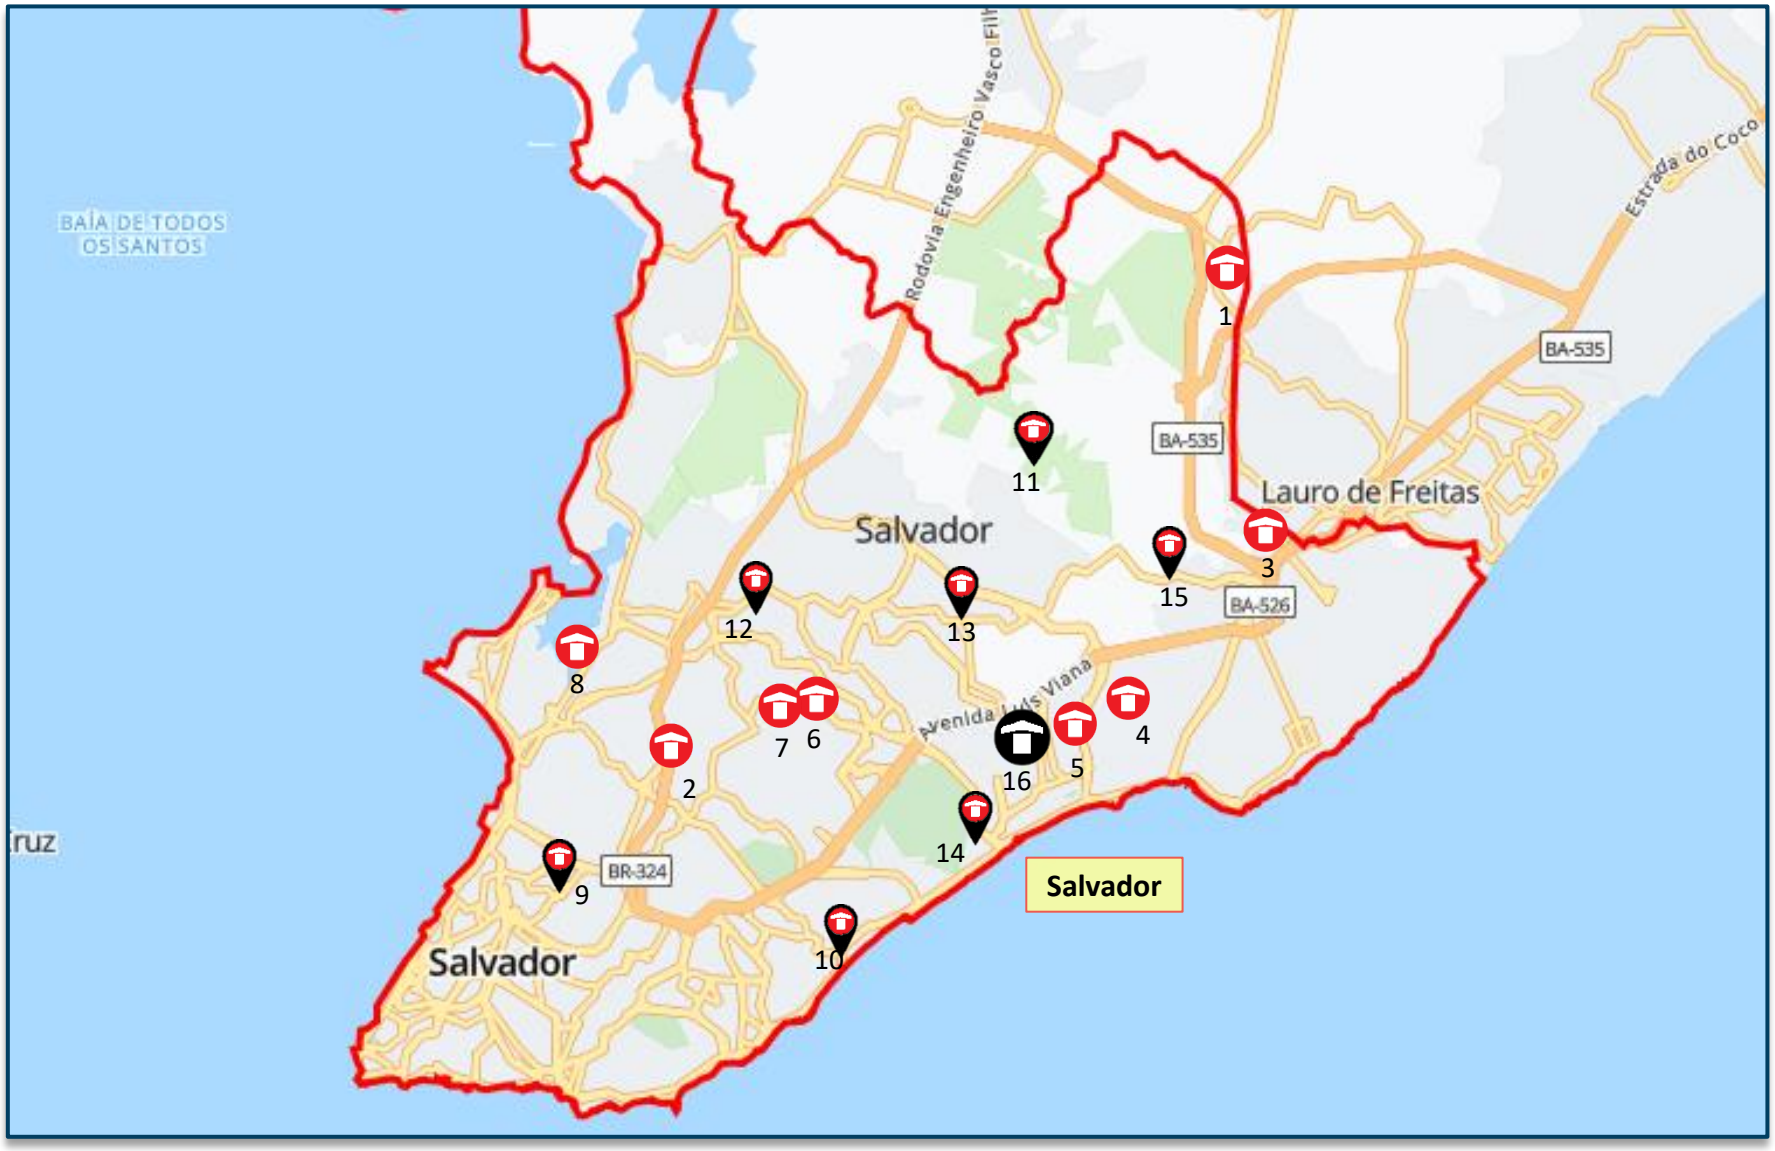

Lançados *LandBank* *Comitê*

Macrolocalização

1.Estação de metrô (Shopping paralela)
2.Av. Paralela
3.Shopping Paralela
4.Faculdade FTC
5.Av. Otávio Mangabeira (Orla Marítima) e Praia de Jaguaribe
6.Villagio de Napoli (Tenda)
7.Villagio do Alto (Tenda)
8.Reserva Piatã (Tenda)
9.Encanto Piatã (Tenda)
10.Ferreira Costa
11. Supermercado Atakarejo
12.Supermercado Rede Mix
13.Escola Villa Global Education
14.Universidade Jorge Amado
15.Escola Patamares
16.Escola Pan American School of Bahia
17.Alphaville
18.Universidade Senai Cimatec
19.Supermercado Redemix

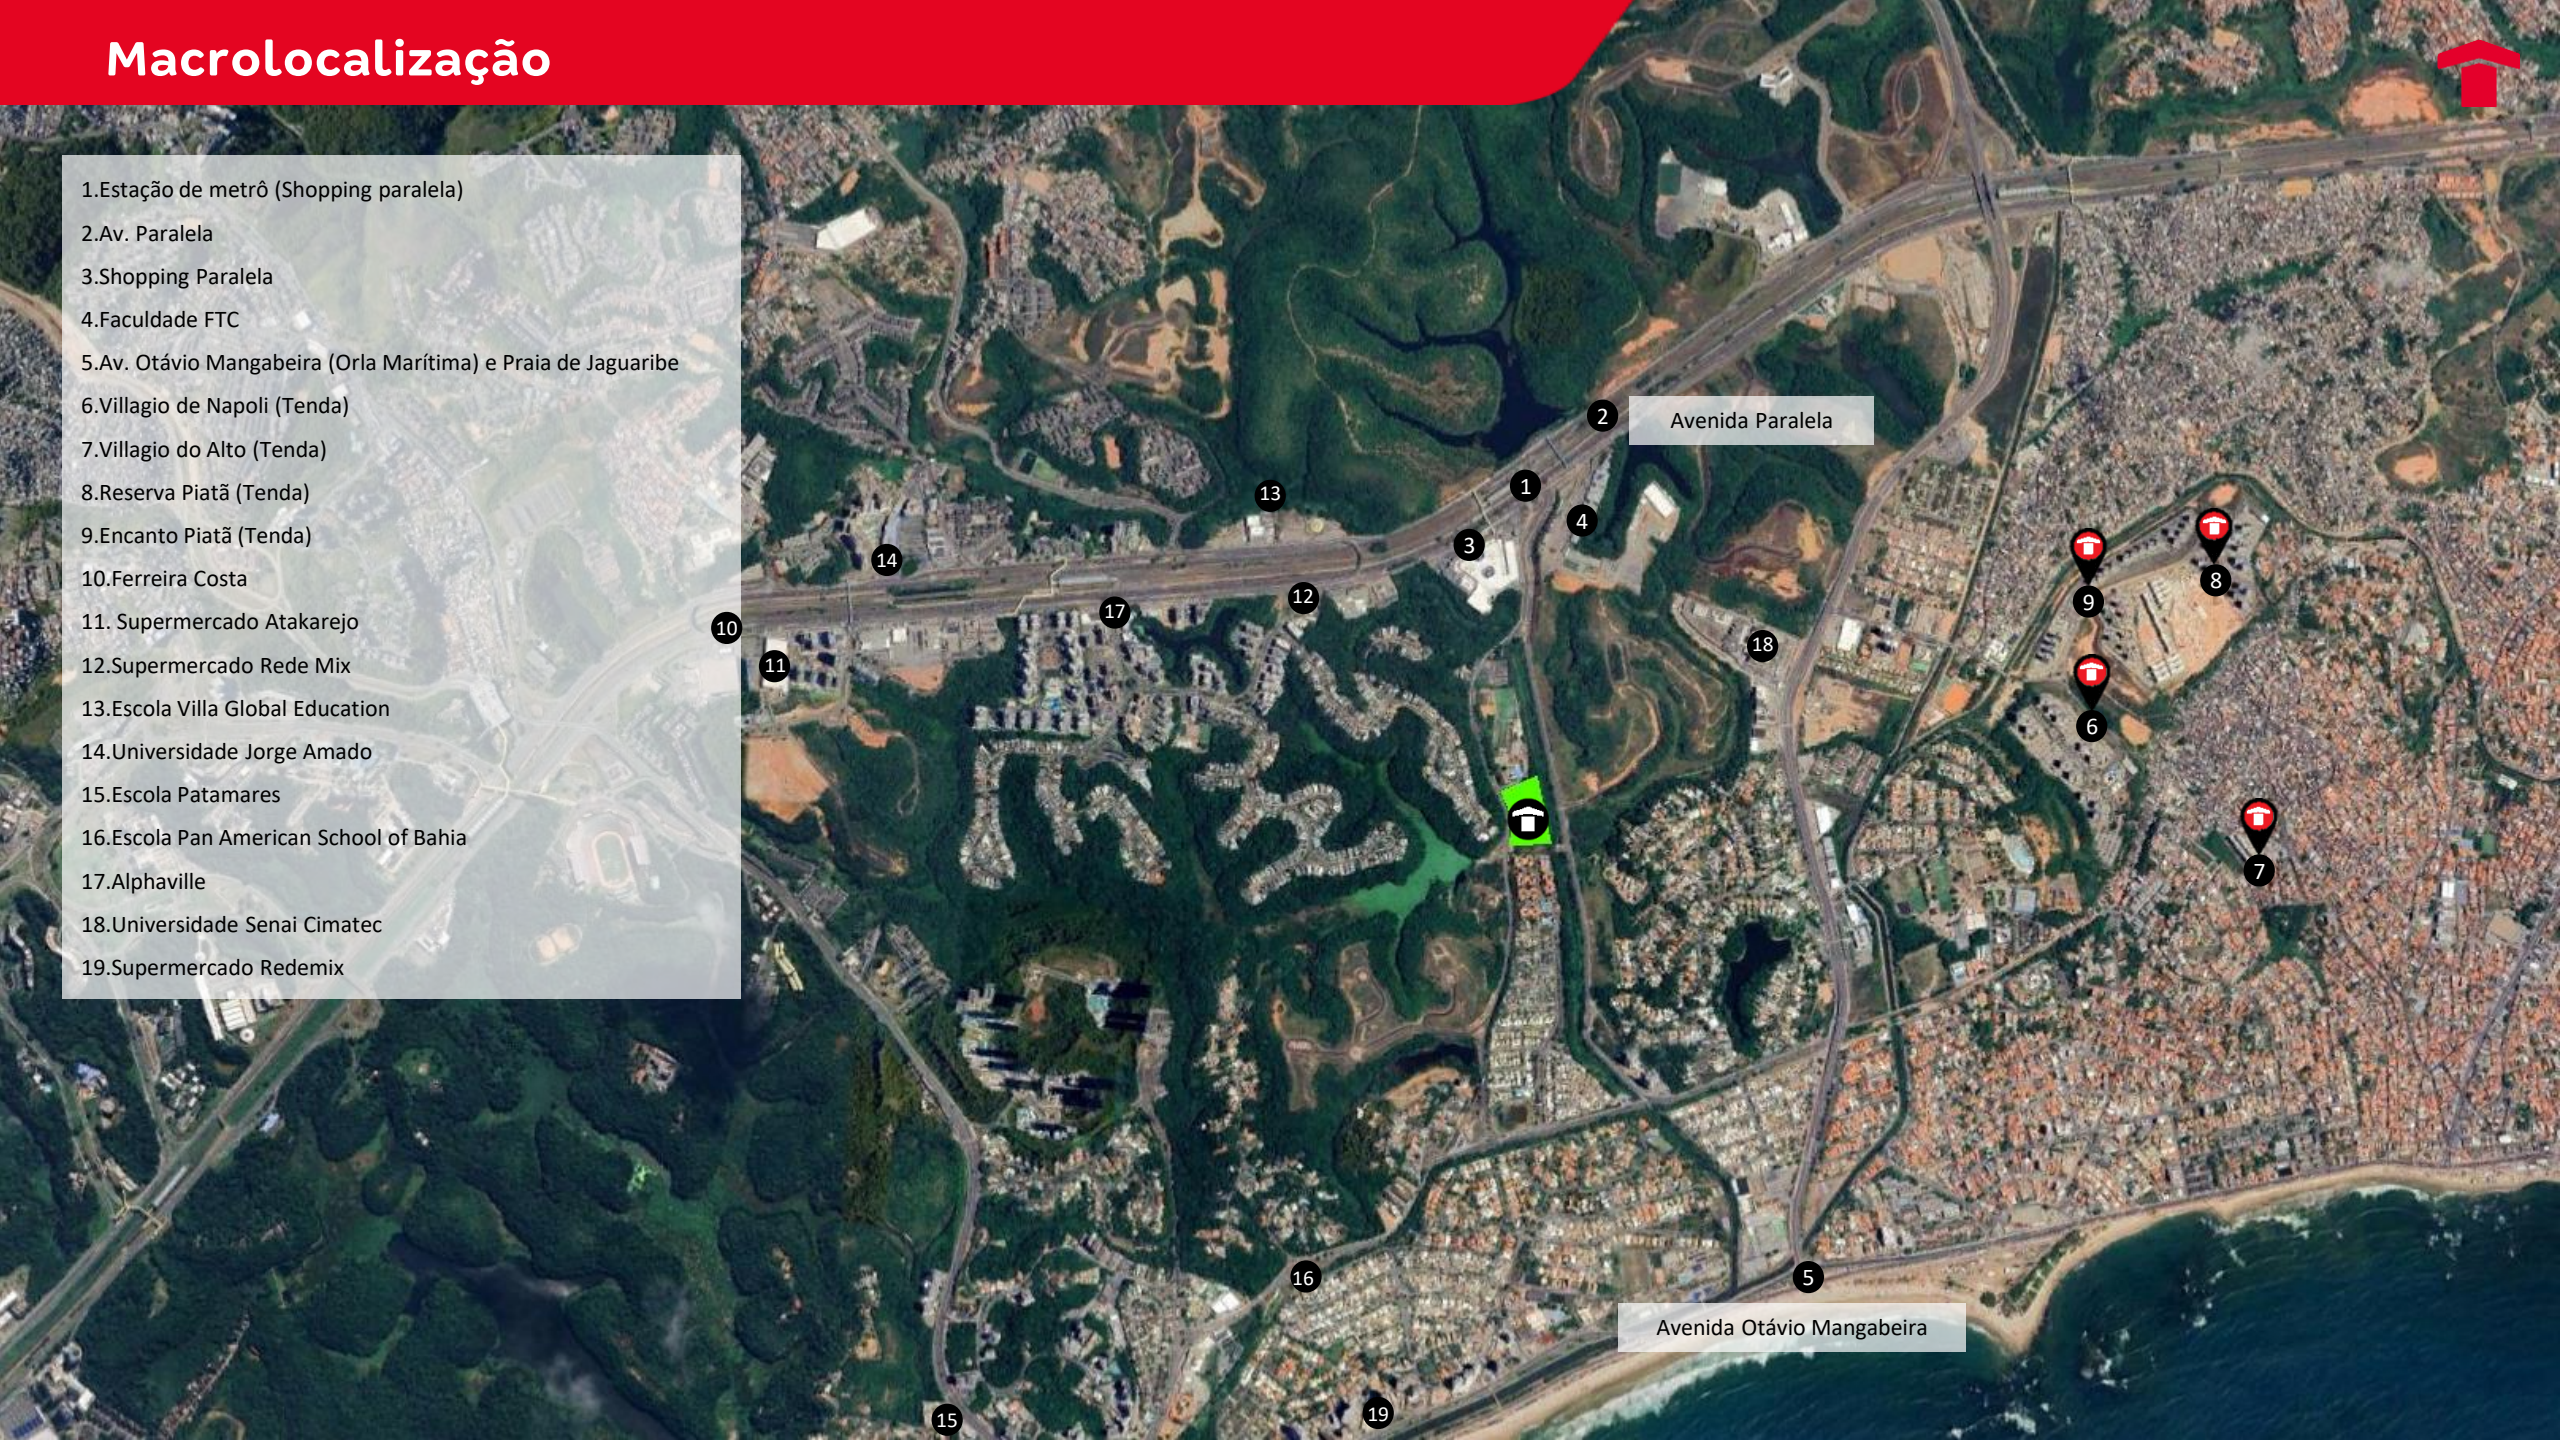

PRODUTO

Empreendimento Jaguaribe Prime
Investimento

Informações Gerais – Condomínio Único		
Terreno	Área terreno	18.904,01m²
	Menor poligonal	18.750,66m²
	App/fna	Sim – 1.248,98m²
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim – 153,35m²
	Área liquida	15.714,47m²
	Zoneamento	ZCLMu
	Ca máximo	3,0
	Ca projetado	1,80
	Gabarito máximo	N/A
Geral	Total uh	1.143
	Total de vagas (auto|motos)	220 | 43
Tipologia	Tipologia	Modular com elevador
	Gabarito	T+17
	Lâmina	04 16PP
	Área privativa	34,94 m²
Condomínio	Unidade pcd	58
	Unidade lazer|Técnica	4 | 5
	Torre	4
	Fase	2 Fases
Lazer	Lazer coberto	Salão de Festas com Churrasqueira, 3 churrasqueiras, Espaço Office, Brinquedoteca, Espaço Teen, Espaço saúde.
	Lazer descoberto	Praça de chegada, Praça de Jogos, Piscina adulto e infantil, Quadra recreativa P, Praça dos Sabores, Redário, Playkids, Playbaby, Fitness externo, Espaço Cultivo, Funcional externo, Playpet

IMPLANTAÇÃO

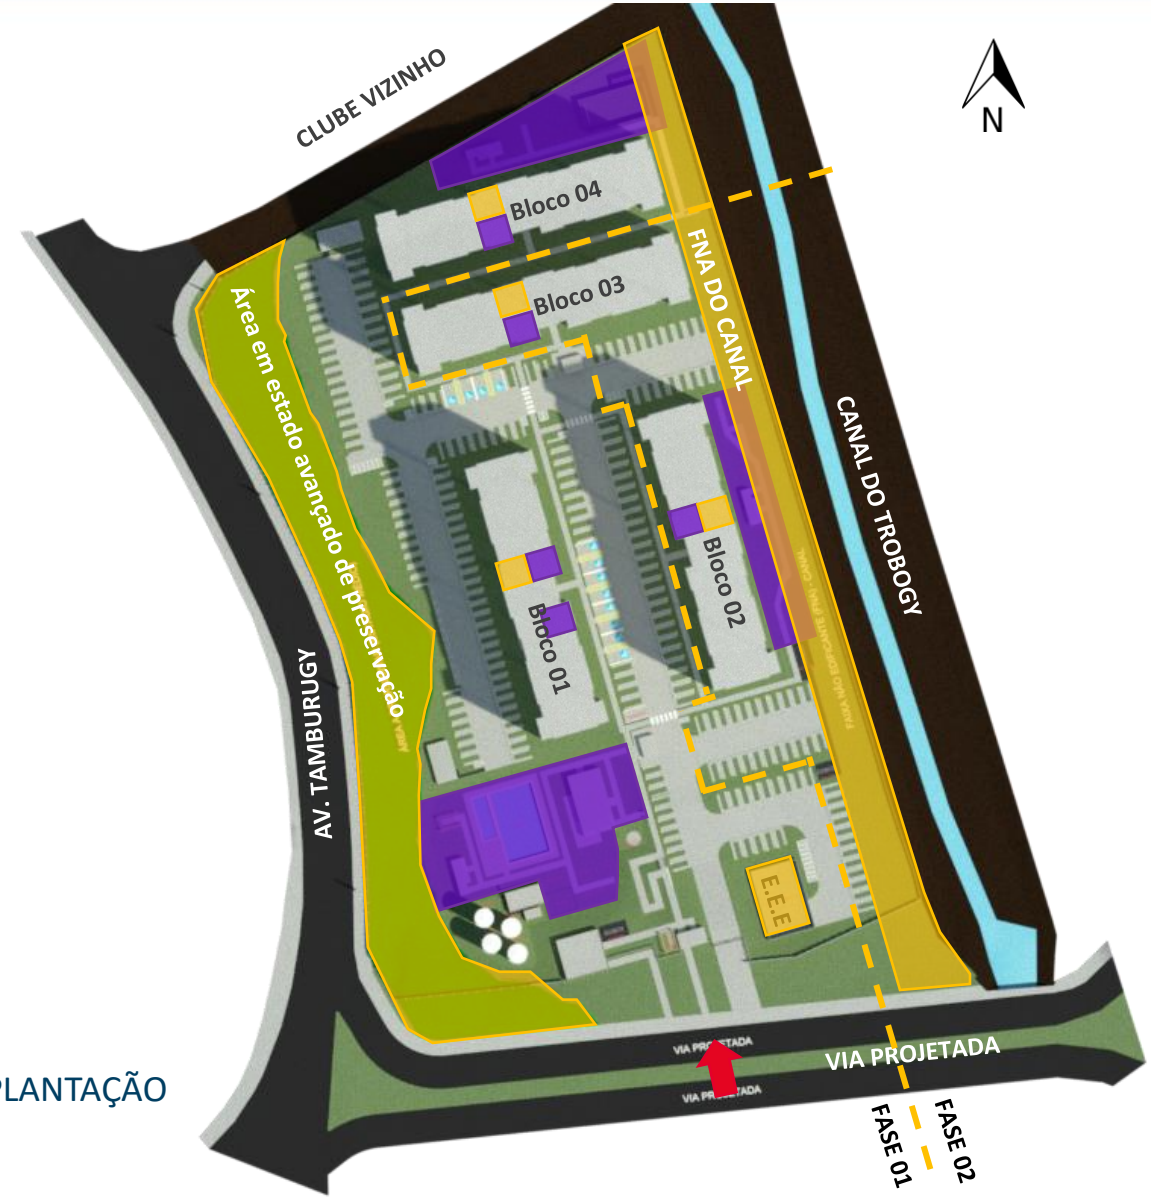

PRODUTO

Empreendimento Jaguaribe Prime
Investimento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	**Limite supercondomínio**		1.143
	Acesso		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Atributos Infra**	Sim	Piscina, quadra
	Atributos Torre	Sim	100% varanda
	Edifício Garagem	Não	

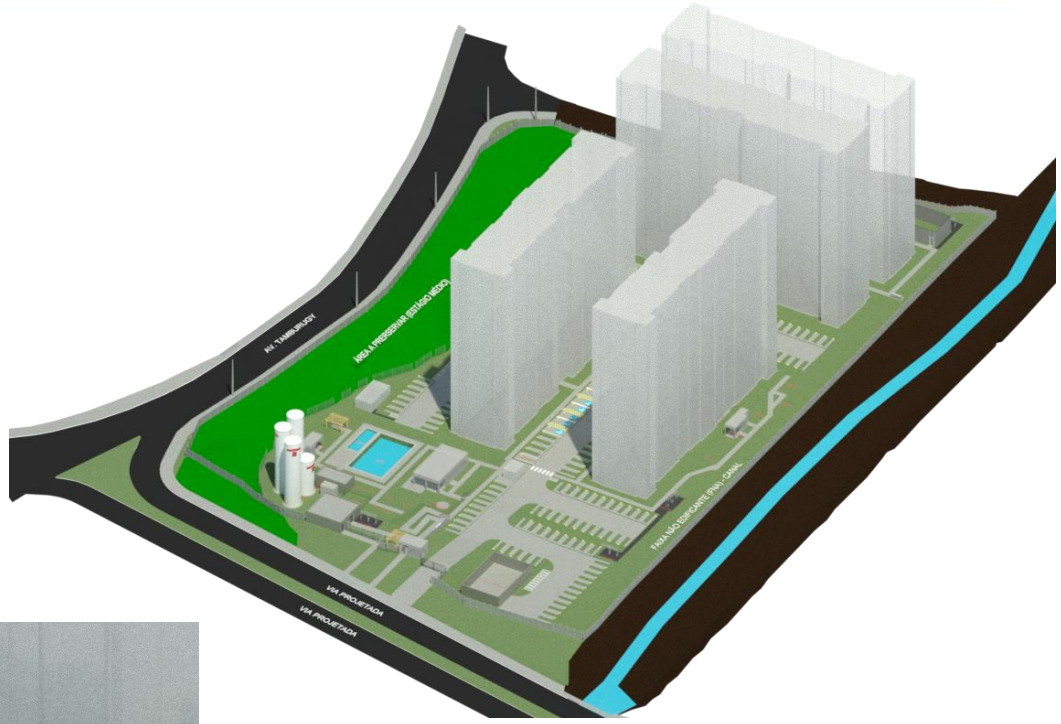

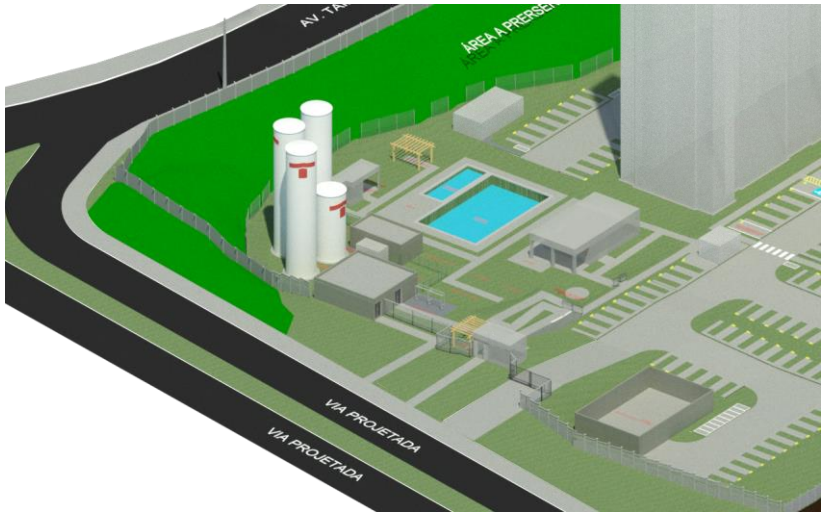

PISCINA

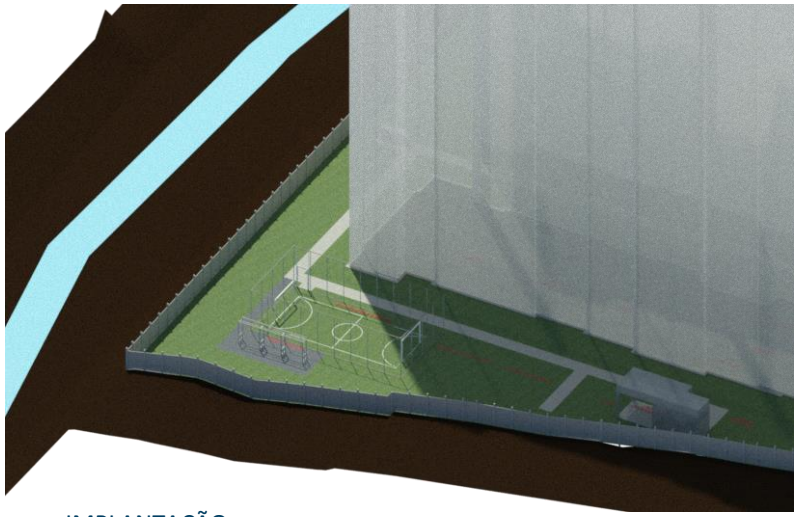

IMPLANTAÇÃO

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Condições do Negócio

➢ **VALOR DO NEGÓCIO**

- O Valor do negócio é R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões reais), à serem pagos em cash.

➢ **CONDIÇÃO DO NEGÓCIO E PRAZOS CONTRATUAIS**

a) O negócio será pago em 48 parcelas mensais, no valor de R$ 875.000,00 cada, vencendo-se a primeira na data da lavratura da escritura pública de compra e venda do IMÓVEL;
b) A Opção de compra e venda tem prazo de vigência de 12 meses a contar da data de assinatura, improrrogáveis, com exceção apenas de atrasos provocados pelos vendedores no cumprimento das obrigações previstas na cláusula quatro da opção. Previsão de vencimento em set/25.
c) Caso haja necessidade de pagamento de outorga onerosa o vendedor arcará de forma integral.

➢ **CORREÇÃO MONETÁRIA**

- Correção pelo INCC a contar de 2 meses antes da assinatura da Opção, até 2 meses antes da data de pagamento de cada parcela;

➢ **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Opção assinada em set/24
- Não há previsão de cláusulas resolutivas específicas por se tratar de opção de compra e venda. O não exercício da opção do prazo de 12 meses implica na extinção de total e qualquer obrigação de parte a parte sem qualquer ônus.
- Apesar de não constarem resolutivas na Opção, apenas iremos escriturar o Imóvel, ou seja, exercer o direito de compra nela previsto, após aprovação de projeto de construção perante todos os órgãos competentes e renovação positiva da DUE.
- Não há intermediação imobiliária.

➢ **GARANTIAS**

- Tenda: N/A
- Vendedor: N/A

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Custo de Construção

	JAGUARIBE PRIME - ADELBA CEN01 | REV01 | FASE 1	JAGUARIBE PRIME - ADELBA CEN01 | REV01 | FASE 2	JAGUARIBE PRIME - ADELBA CEN01 | REV01 CONSOLIDADO	JAGUARIBE PRIME - ADELBA CEN01 | REV00 CONSOLIDADO	TORRES DE PIRAJÁ CEN01 | REV00 CONSOLIDADO	MONTE SERRANO PRIME R01 | CEN1	BELA VISTA PRIME R01 | CEN1
Torres	2	2	4	4	4	1	2
Unidades Construídas	576	576	576 | 576	576 | 576	576 | 288	216	504
Unidades Vendidas	571	572	571 | 572	571 | 572	572 | 286	213	498
Total Unidades Vendidas	571	572	1.143	1.143	858	213	498
Condomínios (qta.)	1	1	1	1	1	1	1
Cidade	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA
Produto / Selo	BA GRB F2E MODULAR	BA GRB F2E MODULAR	BA GRB F2E MODULAR	BA GRB F2E MODULAR	BA GRB F2E MODULAR	BA GRB F2E MODULAR	BA GRB F2E MODULAR
Atribuitos de projeto	Varanda | Piscina	Varanda | Piscina	Varanda | Piscina	Varanda | Piscina	Piscina	Varanda | Piscina	Varanda | Piscina
Tipologia	2 Torre | T+17 | 16PP | C2B	2 Torre | T+17 | 16PP | C2B	4 Torre | T+17 | 16PP | C2B	4 Torre | T+17 | 16PP | C2B	3 Torres | T+17 | 16PP | C2B	1 Torre | T+17 | 12PP | C3A	1 Torre | T+17 | 12PP | C3A
Tipologia	-	-	-	-	-	-	1 Torre | T+17 | 16PP | C2B
Tipologia	-	-	-	-	-	-	-
Tipologia	-	-	-	-	-	-	-
Projeto Infra	AP	AP	AP	AP	AP	AP	AP
Projeto Torre	EP	EP	EP	EP	EP	ED	ED
Mês Base	janeiro-25	janeiro-25	janeiro-25	novembro-24	dezembro-24	outubro-24	setembro-24
Incc	1.159,536	1.159,536	1.159,536	1.149,170	1.153,725	1.141,398	1.126,916
LVS	novembro-24	novembro-24	novembro-24	outubro-24	outubro-24	setembro-24	julho-24
Indiretos	novembro-24	novembro-24	novembro-24	outubro-24	outubro-24	setembro-24	julho-24
Base de Preço	LPU 86	LPU 86	LPU 86	LPU 84	LPU 85	LPU 83	LPU 82
Takt	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	20	19	20 | 19	20 | 19	20 | 15	14	19
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 100.094	R$ / UND R$ 84.347	R$ / UND R$ 92.213	R$ / UND R$ 91.866	R$ / UND R$ 92.555	R$ / UND R$ 109.041	R$ / UND R$ 95.712
Indireto	R$ 17.476	R$ 13.152	R$ 15.312	R$ 15.324	R$ 16.960	R$ 22.871	R$ 16.257
Torre	R$ 56.443	R$ 56.353	R$ 56.398	R$ 56.192	R$ 54.274	R$ 58.511	R$ 56.666
Infra	R$ 15.732	R$ 7.564	R$ 11.644	R$ 11.605	R$ 13.522	R$ 18.146	R$ 14.111
Fundação	R$ 6.910	R$ 7.146	R$ 7.028	R$ 7.003	R$ 7.118	R$ 8.024	R$ 6.120
EEE	R$ 1.317		R$ 658	R$ 658			R$ 1.161
ETE							
Contenção	R$ 35		R$ 18	R$ 18	R$ 272	R$ 909	R$ 991
Terraplenagem	R$ 2.181	R$ 132	R$ 1.156	R$ 1.067	R$ 408	R$ 579	R$ 406
CUSTO TOTAL II	R$ 2.136	R$ 2.136	R$ 2.136	R$ 2.131	R$ 1.459	R$ 3.373	R$ 637
Urbanização	R$ 793	R$ 793	R$ 793	R$ 788	R$ 93	R$ 448	R$ 112
Drenagem	R$ 18	R$ 18	R$ 18	R$ 18	R$ 53	R$ 1.258	R$ 439
Extensão de Rede Elétrica						R$ 282	
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.326	R$ 1.326	R$ 1.326	R$ 1.326	R$ 1.313	R$ 1.384	R$ 85
CUSTO TOTAL III							
Incorridos							
CUSTO TOTAL IV							
Aprendizado							
CUSTO TOTAL V				R$ 848	R$ 474	R$ 1.786	R$ 2.789
Atualização por INCC				R$ 848	R$ 474	R$ 1.786	R$ 2.789
CUSTO TOTAL I+II	R$ 102.230	R$ 86.483	R$ 94.350	R$ 93.998	R$ 94.014	R$ 112.413	R$ 96.349
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 102.230	R$ 86.483	R$ 94.350	R$ 94.846	R$ 94.488	R$ 114.200	R$ 99.138

Custo de Construção

TORRE
+194 | Vertical (LVS Nov/24 x Out/24)

	JAGUARIBE PRIME - ADELBA CEN01 | REV01 CONSOLIDADO	JAGUARIBE PRIME - ADELBA CEN01 | REV00 CONSOLIDADO	
Torres	4	4	
Unidades Construídas	576 | 576	576 | 576	
Unidades Vendidas	571 | 572	571 | 572	
Total Unidades Vendidas	1143	1143	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Salvador - BA	Salvador - BA	
Produto / Selo	BA GRB F2E MODULAR	BA GRB F2E MODULAR	
Atribuitos de projeto	Varanda | Piscina	Varanda | Piscina	
Tipologia	4 Torre | T+17 | 16PP | C2B	4 Torre | T+17 | 16PP | C2B	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	EP	EP	
Mês Base	janeiro-25	novembro-24	
Incc	1159,536	1149,170	
LVS	novembro-24	outubro-24	
Indiretos	novembro-24	outubro-24	
Base de Preço	LPU 86	LPU 84	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	20 | 19	20 | 19	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 92.213	R$ / UND R$ 91.866	DIF R$ 347
Indireto	R$ 15.312	R$ 15.324	-R$ 12
Torre	R$ 56.398	R$ 56.192	R$ 206
Infra	R$ 11.644	R$ 11.605	R$ 39
Fundação	R$ 7.028	R$ 7.003	R$ 25
EEE	R$ 658	R$ 658	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 18	R$ 18	R$ 0
Terrapplenagem	R$ 1.156	R$ 1.067	R$ 89
CUSTO TOTAL II	R$ 2.136	R$ 2.131	R$ 5
Urbanização	R$ 793	R$ 788	R$ 5
Drenagem	R$ 18	R$ 18	R$ 0
Extensão de Rede Eletrica	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.326	R$ 1.326	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 848	-R$ 848
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 848	-R$ 848
CUSTO TOTAL	R$ 94.350	R$ 94.846	-R$ 496

Custo de Construção

	JAGUARIBE PRIME - ADELBA CEN01 | REV01 CONSOLIDADO	TORRES DE PIRAJÁ CEN01 | REV00 CONSOLIDADO	
Torres	4	4	
Unidades Construídas	576 | 576	576 | 288	
Unidades Vendidas	571 | 572	572 | 286	
Total Unidades Vendidas	1143	858	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Salvador - BA	Salvador - BA	
Produto / Selo	BA GRB F2E MODULAR	BA GRB F2E MODULAR	
Atributos de projeto	Varanda | Piscina	Piscina	
Tipologia	4 Torre | T+17 | 16PP | C2B	3 Torres | T+17 | 16PP | C2B	
Tipologia	-	-	
Tipologia	-	-	
Tipologia	-	-	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	EP	EP	
Mês Base	janeiro-25	dezembro-24	
Incc	1159,536	1153,725	
LVS	novembro-24	outubro-24	
Indiretos	novembro-24	outubro-24	
Base de Preço	LPU 86	LPU 85	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	20 | 19	20 | 15	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 92.213	R$ / UND R$ 92.555	DIF -R$ 341
Indireto	R$ 15.312	R$ 16.960	-R$ 1.649
Torre	R$ 56.398	R$ 54.274	**R$ 2.124**
Infra	R$ 11.644	R$ 13.522	-R$ 1.878
Fundação	R$ 7.028	R$ 7.118	-R$ 90
EEE	R$ 658	R$ 0	**R$ 658**
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 18	R$ 272	-R$ 254
Terrapplenagem	R$ 1.156	R$ 408	**R$ 748**
CUSTO TOTAL II	R$ 2.136	R$ 1.459	**R$ 677**
Urbanização	R$ 793	R$ 93	**R$ 700**
Drenagem	R$ 18	R$ 53	-R$ 35
Extensão de Rede Eletrica	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.326	R$ 1.313	R$ 12
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 474	-R$ 474
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 474	-R$ 474
CUSTO TOTAL	R$ 94.350	R$ 94.488	-R$ 138

INDIRETOS

-486 | Serviços técnicos (Diluição)
-281 | Administração (Diluição)
-503 | Canteiro (Diluição)
-340 | SSO (Diluição)

TORRE

+307 | Vertical (LVS Nov/24 F2E - COM VARANDA x Out/24 F2E - FLUXO – SEM VARANDA)
+179 | Revestimento cerâmico (Tipologia com varanda – Jaguaribe | Sem Varanda - Pirajá)
+761 | Esquadrias de Alumínio (Tipologia com varanda – Jaguaribe | Sem Varanda - Pirajá)
+348 | Esquadrias de Ferro (Tipologia com varanda – Jaguaribe | Sem Varanda - Pirajá)
+136 | Instalações (LVS Nov/24 – Imbui Prime x LVS Out/24 – Média Imbui Prime e Monte Carmelo)
+217 | Pintura (Tipologia com varanda – Jaguaribe | Sem Varanda - Pirajá)

INFRA

-469 | Alvenaria de vedação
Jaguaribe: 327m
Pirajá: 715m
+211 | Outros Revestimentos de Piso
Jaguaribe - Viário: 2.394m³ | Passeio: 958m³
Pirajá - Viário: 990m³ | Passeio: 599m³
-1.218 | Instalações
Jaguaribe: Rede aérea
Pirajá: Rede mista + escada hidráulica
-332 | Reservatório Metálico (Diluição)
Jaguaribe: altura de 6,2m - Ø 3.80 – 1 unid.
altura de 18,37m - Ø 3.80 – 3 unid.
Pirajá: altura de 12,20m - Ø 3.18 – 1 unid.
altura de 25,28m - Ø 3.18 – 2 unid.

CONTENÇÃO

-254 | Projeto

TERRAPLANAGEM

+748 | Projeto
Jaguaribe- Aterro s/ importe: 132m³
Aterro c/ importe: 25.784 m³
Pirajá-Aterro s/ importe: 8.460m³
Aterro c/ importe: 5.823 m³

URBANIZAÇÃO

+700 | Projeto

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Existe viabilidade técnica para abastecimento de água. Considerado a extensão de 1.843m na Av. Orlando Gomes.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Existe viabilidade técnica. Considerado a extensão de 65m na Rua Geraldo Del Rey.

SISTEMA DE DRENAGEM
Descarte pelo fundo do terreno no canal que está na lateral direita, conforme informado pelo projetista.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado execução da rua e da calçada que dá acesso ao terreno e trecho de reconstituição do pavimento na lateral do terreno.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em Set/2024, com validade em Set/2025.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em Set/2024, com validade em Set/2025.

Drenagem:
- Não se aplica.

Elétrica:
- Existe viabilidade emitida.

Gás:
- Não se aplica. Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado execução da rua e da calçada que dá acesso ao terreno e trecho de reconstituição do pavimento na lateral do terreno.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 10 furos.
- Considerada Estaca Hélice, com diâmetros de Ø 50, 60 e 70cm e profundidade de 19,70 a 27,5m.

Logística

VIVÊNCIA - CONTAINERS								
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO COM SANITÁRIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	CONSIDERAR DEFINITIVA	CONSIDERAR DEFINITIVA	F1
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO COM SANITÁRIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	F2
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-	
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 7 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-	F1
CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO BA (LOG)	CONSIDERAR 20 MÓDULOS DE CONTAINERS (SENDO 10 MÓDULOS NO PAV T E 10 MÓDULOS NO PAV SUPERIOR)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	F1
CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO BA (LOG)	CONSIDERAR 20 MÓDULOS DE CONTAINERS (SENDO 10 MÓDULOS NO PAV T E 10 MÓDULOS NO PAV SUPERIOR)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	F2

TENDAS_PERÍODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	4,00	6,00	-	TODO PERÍODO	-	F1
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	8,00	8,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	F1
TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	7,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	F1
TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	6,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	F2
TENDA BANHEIRO QUÍMICO E BEBEDOURO (LOG)	1	3,00	3,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	F1
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	2	10,00	<varia>	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	F2
TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	10,00	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	F1
TENDA LAZER (LOG)	1	9,00	6,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	F1
TENDA LAZER (LOG)	1	7,50	6,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	F2
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	3,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	F1
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	2,80	4,50	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	F2

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	F1
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	F2
BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	F1
BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	F2
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_R01	1 EQUIP PARA O BLOCO X	-	-	-	TODO PERÍODO	-	F1
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_R01	1 EQUIP PARA O BLOCO X	-	-	-	TODO PERÍODO	-	F2
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	F1
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	F2
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-	F1
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-	F2
CREMALHEIRA PCT (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	F1
CREMALHEIRA PCT (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	F2
MINIGRUA (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-	F1
MINIGRUA (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-	F2
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-	F1
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-	F2

FASE 01: ESTRUTURA E ACABAMENTO

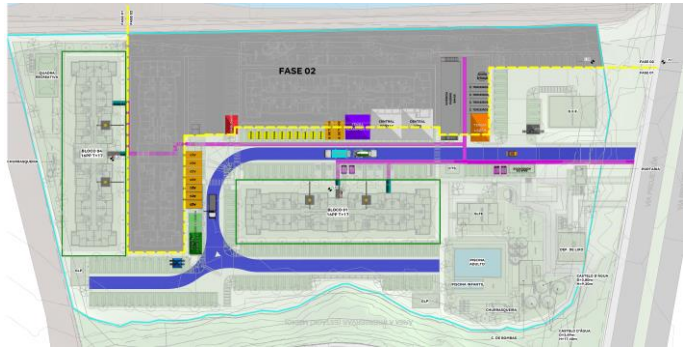

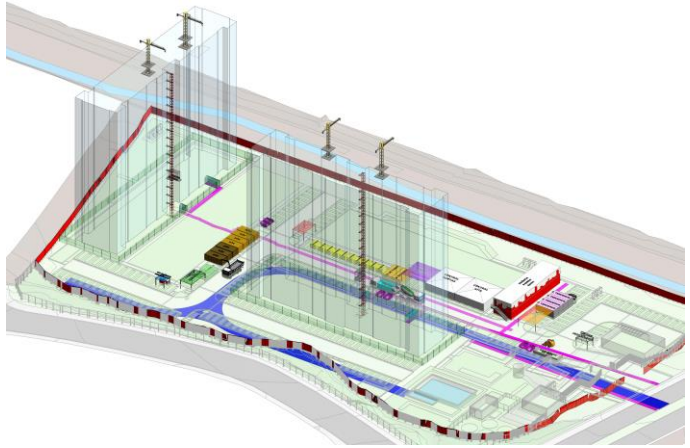

FASE 02: ESTRUTURA E ACABAMENTO

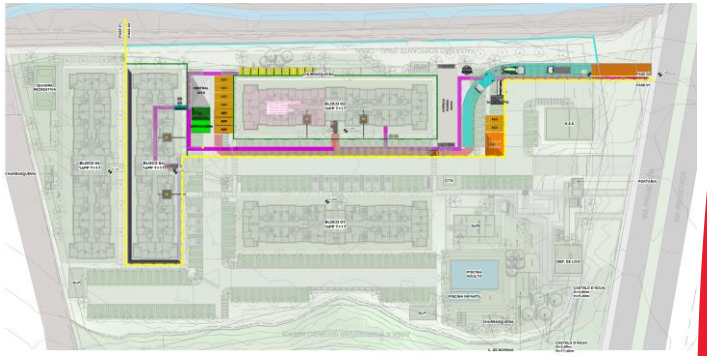

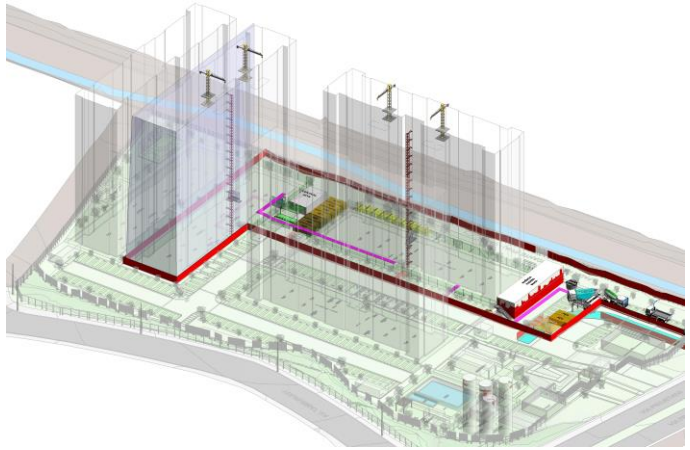

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CUSTO E PRAZO PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS PROVISÓRIAS NA FASE 2, CONFORME INDICADAS NA IMPLANTAÇÃO, PARA VIABILIZAR ACESSOS NO EMPREENIMENTO, GARANTINDO ASSIM A EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO/TERRAPLENAGEM. AS RAMPAS DEVERÃO SER ABSORVIDAS NO PROJETO DE TERRAPLENAGEM PROVISÓRIA, CONSIDERANDO O REFORÇO DE BASE PARA A PISTA PROVISÓRIA (CAMADA DE SACRIFÍCIO).
	NÃO HÁ ALCANCE DO RAIO DO MUNCK PARA MOBILIZAR E DESMOBILIZAR A CREMALHEIRA DO BLOCO 04 NA FASE 2. ASSIM, A MOBILIZAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM A BOBCAT. PREVER LARGURA SUFICIENTE PARA PASSAGEM DESTE MAQUINÁRIO E PREVER COM SUPRIMENTOS CONTRATAÇÃO DE CREMALHEIRA COM CABINE DESMONTÁVEL. CASO A CABINE NÃO SEJA DESMONTÁVEL, SERÁ NECESSÁRIO CONTRATAR UM GUINDASTE DE GRANDE PORTE.
	CONSIDERAR EM CUSTO CONJUNTOS DE BANHEIRO QUÍMICO+BEBEDOURO+COBERTURA (CONFORME INDICADO EM PROJETO E TABELA QUANTITATIVA), DEVIDO AO DISTANCIAMENTO SUPERIOR À 100m DO POSTO DE TRABALHO DO COLABORADOR ATÉ A INSTALAÇÃO SANITÁRIA MAIS PRÓXIMA NA FASE 1. PARA O BEBEDOURO, CONSIDERAR UMA TORNEIRA A CADA 25 COLABORADORES.

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Salvador	SSA	45%	4.595	383	5.514	460

Empreendimento	Renda	Lançamento	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27
Morada Das Estações	3.416	dez-24	38	38	38	38	33																	
Vivenda Real Cond I	2.459	fev-25	31	31	31	31	31	31	31	13														
Encanto Piatã F2	3.557	ago-25	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	35									
Vila Laura Prime	4.363	nov-25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28						
V Salvador - Forte Sao Marcelo	1.877	jan-26	70	70	70	70	70	70	70	10														
Vale Das Tulipas F1	3.217	fev-26		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24			
Jaguaribe Prime - F1	**4.929**	**fev-26**		**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**27**			
Jaguaribe Prime - F2	**4.929**	**ago-27**																				**32**	**32**	**32**
Mirante Veneza F1	3.577	mai-26					32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	26
V Salvador - Parque Da Cidade	1.877	ago-26								60	70	70	70	70	70	30								
Vivenda Real Cond Ii	2.459	ago-26								13	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Privilege Salvador Norte	3.023	nov-26											33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Vista Serena F1	2.030	dez-26												28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Encanto Piatã F3	3.616	fev-27														25	25	25	25	25	25	25	25	25
Solar De Itapagipe	3.700	jul-27																			23	23	23	23
Vale Das Tulipas F2	3.217	ago-27																				16	16	16
Portal Salvador I F1	2.933	set-27																					30	30
Total de Vendas Lançados			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**206**	**268**	**268**	**268**	**295**	**262**	**262**	**257**	**257**	**257**	**290**	**318**	**316**	**266**	**236**	**234**	**206**	**206**	**218**	**215**	**245**	**239**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Jaguaribe Prime – F1 | Mapa Concorrência

		Jaguaribe Prime - F1	Portal de Piatã
		TENDA	MRV
	Distância Tenda (km)		1,89Km
Região 1 Km	População	9.575	31.296
	Dens. Demográfica	3.068	10.024
	Renda (R$)	11.629	4.914
	Classe Social	B1 (8.1k a 16k)	C2 (1.4k até 2.6k)
	PEA Dia	7.624	13.276
Quantitativo	Lançamento	fev/26	mar/24
	Unidades	571	720
	Estoque	571	189
	VSO	32	53
	Stockout	18	4
	Preço Nominal (R$)	275.027	276.990
	Preço CEF (R$)	210.550	221.592
	Renda Comprador (R$)	4.929	5.200
	Dif Tenda (R$)		-271
	Factibilidade		●
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	4	5
	Gabarito	T+17	T+17
	Plantas (m²)	34,3 m²	45m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Garden
	Varanda	Sim	Não
	Suite	Não	Sim
	Dif. Entrega	Não	Não
	Vagas	19% de carros	68% Com Vaga
	Lazer	Quadra, piscina e lazer coberto	Salão de Festas, Playground, Pet Place, Área de Convivência, Piscina Adulto, Churrasqueira, Espaço Gourmet, Quadra, Pomar, Bicicletário.

Farol Renda
● Acima de 300
● Entre 0 e 300
● Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- O empreendimento da MRV, está performando com target de preço e renda, similar ao estimado no Vision. No entanto o Jaguaribe Prime está melhor localizado e o Encanto Piatã (Tenda) já performa na região com bom desempenho de vendas.

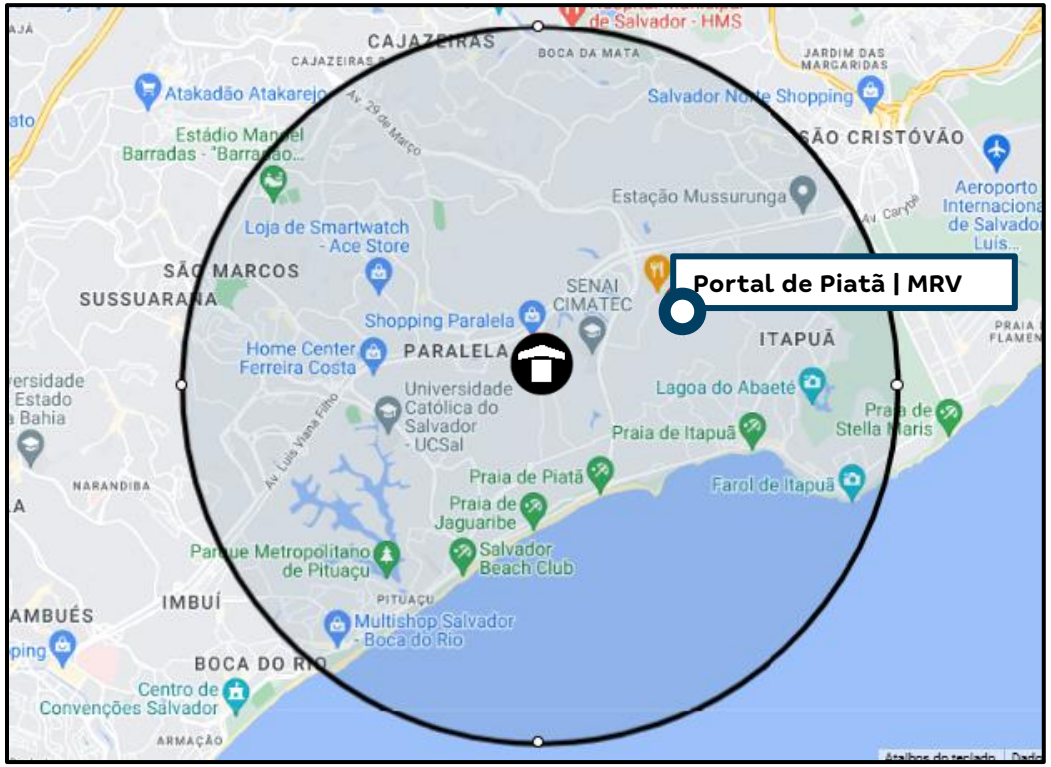

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Jaguaribe Prime - F1					
Tipo:	**Sem Vaga - Sem Varanda**		**Sem Vaga - Com Varanda**		**Com Vaga - Com Varanda**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	280.000		290.000		310.000	
Renda Inicial	4.383		4.598		5.250	
Renda Final*	4.600		4.800		5.400	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,74	3.371	0,84	4.005	0,87	4.740
FGTS	0,79	3.580	0,95	4.515	0,95	5.169
Financiamento	94,96%	194.083	94,83%	199.674	95,78%	225.615
Subsídio	143,04%	1.723	0,00%	0	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25	25	25
Pró-Soluto	63,58%	25.317	77,32%	32.292	86,95%	41.463
Preço Raso (RS)	228.074	228.074	240.485	240.485	276.987	276.987
TCD	65,15%	28.788	62,11%	28.788	39,95%	21.142
VSO	5	5	18	18	9	9
Preço de Venda	**248.576**	**248.576**	**260.587**	**260.587**	**288.511**	**288.511**
Elasticidade	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
Preço de Venda Final	**256.862**	**256.862**	**269.274**	**269.274**	**298.128**	**298.128**
Preço Raso (R$)	**228.074**		**240.485**		**276.987**	
% de Raso	**88,79%**		**89,31%**		**92,91%**	

Resumo de Preços

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pós	PSOL (m)	RET-1
Jaguaribe Prime - F2	Sem Vaga - Sem Varanda	4.383	0,74	0,79	95,2%	143,0%	63,6%	65,2%	5	247.596	280.000	3,3333%	255.850	227.061	24	
Jaguaribe Prime - F2	Sem Vaga - Com Varanda	4.598	0,84	0,95	94,9%	0,0%	77,3%	62,1%	24	259.337	290.000	3,3333%	267.982	239.194	24	0%
Jaguaribe Prime - F2	Com Vaga - Com Varanda	5.250	0,87	0,95	96,1%	0,0%	86,9%	40,0%	3	286.906	310.000	3,3333%	296.470	275.328	24	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Jaguaribe Prime - F1	
Tipo:	**Faixa 2**	
Método	**Vision**	
Avaliação	293.765	
Renda Inicial	4.739	
Renda Final*	4.929	
RET-1	0%	
Tipo:	**VF**	**R$**
Ato	0,84	4.101
FGTS	0,93	4.541
Financiamento	95,11%	205.734
Subsídio	22,80%	275
Prazo de Pró-soluto	25	25
Pró-Soluto	77,71%	33.637
Preço Raso (RS)	248.288	248.288
TCD	56,66%	26.739
VSO	32	32
Preço de Venda	**265.860**	**265.860**
Elasticidade	3,333%	3,333%
Preço de Venda Final	**275.027**	**275.027**
Preço Raso (R$)	**248.288**	
% de Raso	**90,28%**	
Raso Todas as Fases	**243.826**	
Nominal Todas as Fases	**271.230**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, visto que, o preço estimado no parecer está próximo do preço referência, que simula as vendas do Encanto Piatã. A diferença entre o preço referência e Vision se dá por conta da melhora de produto que temos para o Jaguaribe Prime (Piscina 7k e Varanda 12k). Abaixo apresentamos a tabela com a comparação de preços em relação ao projeto de referência:

		Encanto Piatã		Jaguaribe Prime		
		Sem Vaga	Com Vaga	Sem Vaga	Sem Vaga Com Varanda	Com Vaga Com Varanda
Preço Real	Preço Raso	213.671	249.968	220.717	232.728	268.051
	Renda Média	4.091	5.982	4.600	4.800	5.400
	VSO	50	13	5	18	9
	PSOL	25	25	25	25	25
Preço Pós Elasticidade	Δ Elastic.	3,3333%	3,3333%	3,3333%	3,3333%	3,3333%
	Preço Raso	220.793	258.300	228.074	240.485	276.987

Conforme consta no slide “Panorama de Concorrência”, o empreendimento da MRV está performando com target de preço e renda, similar ao estimado no Vision. No entanto o Jaguaribe Prime está melhor localizado e o Encanto Piatã (Tenda) já performa na região com bom desempenho de vendas.

Entorno

Distâncias POI Mobilidade

- Shopping Paralela
- SENAI CIMATEC
- UCSAL
- Avenida Paralela
- Praia de Piatã
- Praia de Itapuã
- Estação de Metro
- Ferreira Costa

Percepção Comercial

Concorrência

Lançamentos na região (Raio de 5KM)

1. Avaliação Media: 259.555
2. Preço Médio: 276.990 (189 Unidades Estoque)

PORTAL DE PIATÃ

Ficha Técnica

Área total do terreno: **18.877,10 m²**

Endereço: **Rua Pasquale Gatto, 2000, Piatã, Salvador/BA**

Itens de lazer: **piscinas adulto e infantil, playground, salão de festas, espaço gourmet, pet place, pomar, bicicletário, churrasqueira, quadra gramada e praça de convivência**

Unidades: **720 unidades**

Vagas de garagem: **486 vagas no total para automóveis. Sendo 50 para motos e 436 para carros, das quais 36 são para PCD. Além de 40 para bicicleta.**

Tipologia das unidades:

1 quarto para PCD: 40,49m²

2 quartos: 40,49m²

2 quartos com suíte/varanda: 45,89m²

Área privativa*: de 16,80m² a 74,68m²

*Área real privativa acessória com valores aproximados. Consulte unidades disponíveis.

Percepção Comercial

Parecer: O Parecer do ciclo e favorável mesmo sem diferença no preço entre os projetos, pois a nossa localização e melhor, e até o lançamento a concorrência estará quase sem estoque.

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Resumo

Jaguaribe Prime - BA - Salvador Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	jan-25							
Jaguaribe F1 S vaga s varanda		fev-26	ago-26	abr-28	6 meses	20 meses	fev-29	36 meses
Jaguariba F1 S vaga c varanda		fev-26	ago-26	abr-28	6 meses	20 meses	fev-29	36 meses
Jaguaribe F1 c vaga c varanda		fev-26	ago-26	abr-28	6 meses	20 meses	fev-29	36 meses
Jaguaribe F2 S vaga s varanda		ago-27	fev-28	set-29	6 meses	19 meses	ago-30	36 meses
Jaguariba F2 S vaga c varanda		ago-27	fev-28	set-29	6 meses	19 meses	ago-30	36 meses
Jaguaribe F2 c vaga c varanda		ago-27	fev-28	set-29	6 meses	19 meses	ago-30	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	43,00 MM	**Incorrido Terreno:** 0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	18.904 m²	**Área Líquida do Terreno:** 18.751 m²
Cash:	43,00 MM		**Custo de terreno m²:**	2.274,6	**Custo de terreno m² Área Líquida:** 2.293,2
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 13,8% / 48,5%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 26 (R$ mil):**	5.380	**CA Máx/Proj.** 3,0 / 1,8
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%		**Incorrido de Construção:**	0,00 MM	**Incorridos de Incorporação:** 0,11 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Jaguaribe F1 S vaga s varanda	T+17	228.073	91	256.861	280.000	95,0%	63,6%	65,2%
Jaguariba F1 S vaga c varanda	T+17	240.485	327	269.273	290.000	94,8%	77,3%	62,1%
Jaguaribe F1 c vaga c varanda	T+17	276.986	153	298.127	310.000	95,8%	86,9%	40,0%
Jaguaribe F2 S vaga s varanda	T+17	227.061	92	255.849	280.000	95,2%	63,6%	65,2%
Jaguariba F2 S vaga c varanda	T+17	239.193	426	267.981	290.000	94,9%	77,3%	62,1%
Jaguaribe F2 c vaga c varanda	T+17	275.327	54	296.469	310.000	96,1%	86,9%	40,0%

Unidades Totais:	1.143	**Preço Médio:**	271.870	**Renda Média:**	4.682	**ITBI+Emol. Unit.:**	11.430
Unidades Tenda:	1.143	**Avaliação Média:**	292.021	**Ato:**	3.899 (0,83 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	16.076
VSO:	32 Unit.s.	**VGV Total:**	310.747.396	**FGTS:**	4.331 (0,93 Salários)	**Preço Raso Médio:**	244.467
RET Médio:	4,0%	**VGV Tenda:**	310.747.396	**% em RET 1%:**	0%		

Construção

Custo Total Unit.:	94.350	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	34,94	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**37.713.342**	**LI:**	**20,58%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**24.694.053**	**Margem Bruta Econômica:**	**42,81%**
TIR:	**98,74%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(626.825)**	**Margem Bruta REF:**	**46,36%**
Exposição de Caixa:	**7,25%**	**Δ LI:**	**0,58%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(22.011.940)**	**Margem Rasa Econômica:**	**35,58%**
Payback Contingente (21 m):	**21 m/ (0 m)**	**LI Resiliência:**	**13,38%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**92.799.370**	**Margem Rasa REF:**	**40,35%**
Payback Consolidado:	**21 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**29,65%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Jaguaribe Prime		Jaguaribe F1 S vaga s varanda		Jaguaribe F1 S vaga c varanda		Jaguaribe F1 c vaga c varanda		Jaguaribe F2 S vaga s varanda		Jaguaribe F2 S vaga c varanda		Jaguaribe F2 c vaga c varanda	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	340.746	100,0%	24.906	100,0%	93.107	100,0%	47.868	100,0%	26.961	100,0%	129.883	100,0%	18.021	100,0%
PIS/COFINS	(7.469)	2,2%	(546)	2,2%	(2.041)	2,2%	(1.049)	2,2%	(591)	2,2%	(2.847)	2,2%	(395)	2,2%
Custo Total	(190.598)	57,2%	(15.646)	64,2%	(56.190)	61,7%	(26.332)	56,2%	(14.870)	56,4%	(68.810)	54,2%	(8.749)	49,6%
Custo Terreno	(50.623)	15,2%	(4.030)	16,5%	(14.483)	15,9%	(6.776)	14,5%	(4.075)	15,5%	(18.867)	14,9%	(2.392)	13,6%
Custo Relacionados a Terreno	(166)	0,0%	(13)	0,1%	(47)	0,1%	(22)	0,0%	(14)	0,1%	(63)	0,0%	(8)	0,0%
Custos de Incorporação	(6.417)	1,9%	(465)	1,9%	(1.641)	1,8%	(809)	1,7%	(567)	2,2%	(2.580)	2,0%	(354)	2,0%
Custo de Construção	(133.393)	40,0%	(11.137)	45,7%	(40.020)	43,9%	(18.725)	40,0%	(10.215)	38,7%	(47.300)	37,2%	(5.996)	34,0%
Lucro Bruto Econômico	142.679	42,8%	8.715	35,8%	34.875	38,3%	20.487	43,8%	11.500	43,6%	58.225	45,8%	8.876	50,4%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	142.679	42,8%	8.715	35,8%	34.875	38,3%	20.487	43,8%	11.500	43,6%	58.225	45,8%	8.876	50,4%
Despesas de Selling	(36.042)	10,8%	(2.624)	10,8%	(9.828)	10,8%	(5.102)	10,9%	(2.844)	10,8%	(13.714)	10,8%	(1.929)	10,9%
Contingência	(7.837)	2,4%	(573)	2,4%	(2.141)	2,4%	(1.101)	2,4%	(620)	2,4%	(2.987)	2,4%	(414)	2,4%
Margem de Contribuição	98.800	29,6%	5.518	22,7%	22.906	25,2%	14.283	30,5%	8.036	30,5%	41.524	32,7%	6.533	37,1%
IR e CSLL	(6.111)	1,8%	(447)	1,8%	(1.670)	1,8%	(858)	1,8%	(484)	1,8%	(2.329)	1,8%	(323)	1,8%
Margem Líquida	92.689	27,8%	5.071	20,8%	21.236	23,3%	13.425	28,7%	7.552	28,6%	39.195	30,9%	6.209	35,2%
Lucro Bruto REF	142.292	46,4%	105.115	38,2%	118.367	41,0%	149.249	46,7%	135.144	45,8%	149.099	48,2%	182.024	53,2%
Lucro Raso REF	111.221	40,4%	74.235	30,3%	87.487	33,9%	126.571	42,6%	101.919	38,9%	115.874	42,0%	157.624	49,6%

R$ Mil - VPL - Compra	Jaguaribe Prime		Jaguaribe F1 S vaga s varanda		Jaguaribe F1 S vaga c varanda		Jaguaribe F1 c vaga c varanda		Jaguaribe F2 S vaga s varanda		Jaguaribe F2 S vaga c varanda		Jaguaribe F2 c vaga c varanda	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	183.253	100,0%	14.998	100,0%	56.457	100,0%	29.646	100,0%	12.551	100,0%	61.055	100,0%	8.546	100,0%
PIS/COFINS	(3.956)	2,2%	(324)	2,2%	(1.219)	2,2%	(640)	2,2%	(271)	2,2%	(1.318)	2,2%	(185)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(141.583)	77,3%	(12.405)	82,7%	(44.931)	79,6%	(21.530)	72,6%	(9.992)	79,6%	(46.672)	76,4%	(6.053)	70,8%
Custo Terreno	(30.465)	16,6%	(2.425)	16,2%	(8.716)	15,4%	(4.078)	13,8%	(2.452)	19,5%	(11.354)	18,6%	(1.439)	16,8%
Custo Relacionados a Terreno	(169)	0,1%	(13)	0,1%	(48)	0,1%	(22)	0,1%	(14)	0,1%	(64)	0,1%	(8)	0,1%
Custos de Incorporação	(4.547)	2,5%	(357)	2,4%	(1.256)	2,2%	(621)	2,1%	(375)	3,0%	(1.705)	2,8%	(233)	2,7%
Custo de Construção	(78.162)	42,7%	(7.290)	48,6%	(26.194)	46,4%	(12.256)	41,3%	(5.215)	41,5%	(24.147)	39,5%	(3.061)	35,8%
Despesas de Selling	(22.778)	12,4%	(1.871)	12,5%	(7.035)	12,5%	(3.677)	12,4%	(1.559)	12,4%	(7.578)	12,4%	(1.058)	12,4%
Contingência	(2.224)	1,2%	(183)	1,2%	(685)	1,2%	(352)	1,2%	(155)	1,2%	(746)	1,2%	(103)	1,2%
IR e CSLL	(3.237)	1,8%	(265)	1,8%	(997)	1,8%	(524)	1,8%	(222)	1,8%	(1.079)	1,8%	(151)	1,8%
Lucro Imobiliário	37.713	20,6%	2.269	15,1%	10.307	18,3%	7.476	25,2%	2.288	18,2%	13.064	21,4%	2.309	27,0%

Obrigado
