Tenda

sua próxima conquista

Book de Lançamento

Regional: RS

Projeto: Acqua Danúbio

Data Comitê: 20/01/2025

One Page – Danubio – Cenário Real

Cidade	Canoas	**Mancha de demanda**	RS - CAN - Canoas
Regional	RS	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Acqua Sena - F2	**Aprovação Fase Anterior**	Fase
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.1: Jan

[1]

Unidades (% Vagas)	597 (23%)	**CA Máx | Proj**	2,0 | 2,0
Tipologia	F2E - Concreto	**Escritura**	set-22
Fases	2 fases	**Lçto | Duração (m)**	jan/25 | 37

[2]

Valor Terreno (% VGV)	4.254 (3,3%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	4.254 (IPCA)	**%VGV Perm Fin (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	398	**VAR (%VGV)**	745 (0,6%)
Custo Construção (%VGV)	60.520 (46,7%)	**Indireto Unit.**	20.812
Prazo da Obra (meses)	18	**Torre Unit.**	56.180
Custo Total Unit.:	101.373	**Infra Unit.**	14.298
Início de Obra	jun-25	**Fundação Unit.**	6.433

[3]

Preço Nominal Unit.	217.040	**VSO**	16
Preço Raso Unit.	193.235	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	204.302	**Renda (% em RET 1%)**	2.555 (41,2%)



[4]

LI (Régua):	**20,1% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	42,0%
LI Marginal:	24,0%	**Margem Rasa Econômica:**	34,1%
Margem Bruta REF:	45,0%	**Margem Contribuição Econômica:**	30,8%
Margem Rasa REF:	**38,2%**	**Exposição (% VGV):**	16.950 (12,7%)
TIR:	65,7%	**VGV Total:**	129.573
Payback Contingente (21 m) :	**21 m/ (0 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(13.235)
Payback Consolidado:	21	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	9.610

*(Conforme régua para aprovação anteriores)

Destaques

[1] Empreendimento com primeiro condomínio (Acqua Sena) lançado em dez/22.

Terreno localizado em Canoas, todos lotes (Acqua Sena e Acqua Danubio) escriturados e em processo de pagamento (100% Cash). Condomínio Acqua Danubio passou por processo de reversão de tipologia (T+4 Hzinho -> F2E) gerando um acréscimo **de 337 unidades** vs Projeto na tipologia anterior, possibilitado pelo esgotamento do Índice de Aproveitamento do terreno na tipologia F2E.

Lançados: Acqua Sena F1 – 240 UHs e Acqua Sena F2 – 220 Uhs;
A Lançar: Acqua Danubio – 597 UHs (lançamento atual jan/25);

Projeto possui 149 vagas (25%), sendo 138 de uso exclusivo (23%). Também contará COM CHURRASQUEIRA instalada (180 Unidades) como diferencial de produto.

[2] Terreno escriturado em SET/22

[3] Primeiro projeto vertical da RM de POA. Projeto com Preço Nominal Médio **na primeira fase** de 213,6k (190,1k de Raso) e VSO médio de 21, adequado para teste de produto com elevador na Mancha, onde o produto vizinho da MRV performa a média de 236,0k.

Precificação não considera a utilização de Cheque Estadual.

[4] Projeto atinge financials exigidos pela companhia.

One Page – Danubio – Cenário Aprovação

Cidade	Canoas	**Mancha de demanda**	RS - CAN - Canoas
Regional	RS	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Primeira Fase
Fase Anterior	Acqua Sena - F2	**Aprovação Fase Anterior**	Fase
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.1: Jan

Unidades (% Vagas)	388 (23%)	**CA Máx | Proj**	2,0 | 2,0
Tipologia	F2E - Concreto	**Escritura**	set-22
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	jan/25 | 36

Valor Terreno (% VGV)	2.765 (3,3%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	2.765 (IPCA)	**%VGV Perm Fin (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	398	**VAR (%VGV)**	745 (0,6%)

Custo Construção (%VGV)	40.555 (48,7%)	**Indireto Unit.**	21.393
Prazo da Obra (meses)	18	**Torre Unit.**	55.894
Custo Total Unit.:	104.524	**Infra Unit.**	16.507
Início de Obra	jul-25	**Fundação Unit.**	6.456

[1]

Preço Nominal Unit.	214.464	**VSO**	21
Preço Raso Unit.	190.902	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	203.835	**Renda (% em RET 1%)**	2.521 (50,0%)



LI (Régua):	**20,3% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	40,1%
LI Marginal:	22,2%	**Margem Rasa Econômica:**	24,5%
Margem Bruta REF:	41,9%	**Margem Contribuição Econômica:**	30,8%
Margem Rasa REF:	**40,5%**	**Exposição (% VGV):**	16.047 (12,0%)
TIR:	67,2%	**VGV Total:**	83.212
Payback Contingente (21 m) :	**21 m/ (0 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(11.815)
Payback Primeira Fase:	21	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	7.527

***Valores em R$ 1000**

Destaques

[1] O Cenário Aprovação difere do Cenário Real no período de PSOL na primeira fase.

PSOL

- PSOL Real: 22 meses (Folga de Início de 5 meses)
- PSOL Aprovação: 23 meses (Folga de Início de 6 meses)

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Pareceres

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Escritura de compra e venda lavrada em 02/09/2022, respectivo registro de aquisição no Cartório de Registro de Imóveis realizado em 12/09/2022. O Registro de Incorporação Imobiliária e a Averbação do Patrimônio de Afetação estão previstos para 27/01/2025.	Ok	
Legalização	Pendente emissão da licença de instalação. Pendente emissão da autorização de manejo dos peixes anuais localizados no viário a ser executado na frente do empreendimento.	Ok	
Produto	Sem riscos associados.	Ok	
GETEC	Projetos de estrutura sem quantitativo, partindo de eng de base preliminar. Conforme parecer logístico e faseamento proposto, não há espaço operacional na fase 2 para implantação das baias, sendo previsto o uso de big bags.	OK com ressalvas	
Logística	Sem riscos associados.	Ok	
Contratação	Laudo Eng. Pendente, Risco Pendente, Jurídico Pendente (RI OK - 27/01/2025). Teremos a baixa de eng até 31/01/2025 e o retorno da análise jurídica até 31/01/2025.	OK com ressalvas	
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Vision como factível.	Ok	
Comercial/Ciclo	Ciclo acredita que o preço é POSSÍVEL com o VSO proposto, dado o histórico que temos nos demais produtos da mancha.	Ok	
Estudos Econômicos	Não há	OK	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- CAN – Canoas

Lançamento

1. Floratta
2. Acqua Danúbio

LandBank

3. Vinhedos - Pinot | Merlot | Tannat
4. Pq Ventura
6. Jardim Amarena

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 3 - Verde

Região

Metropolitana

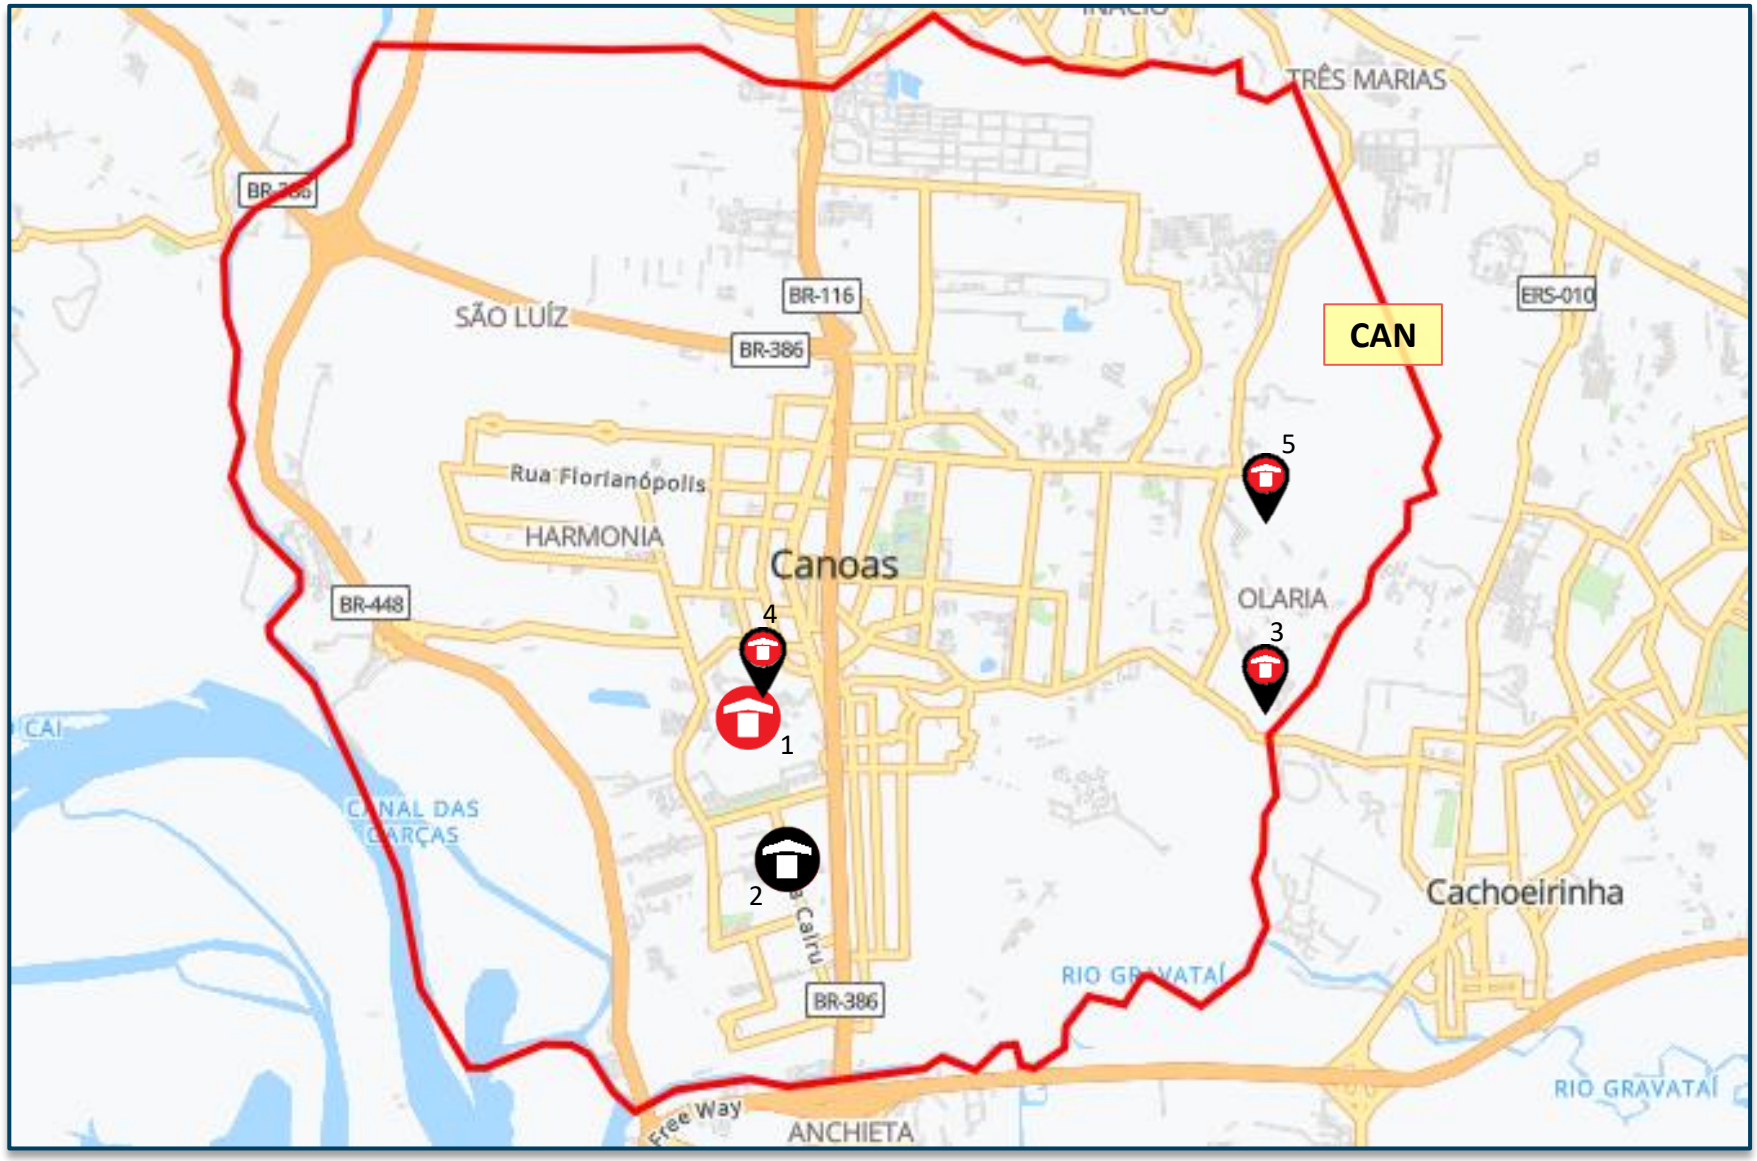

Lançados *LandBank* *Comitê*

Localização macro

PRODUTO

Empreendimento Acqua Danúbio
Investimento e Escritura | Lançamento

Informações Gerais – Condomínio Único		
Terreno	Área terreno	10.693,01m²
	Menor poligonal	10.629,03m²
	App/fna	-
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim
	Área liquida	10.629,03m²
	Zoneamento	ZUC 4
	Ca máximo	2,00
	Ca projetado	1,95
	Gabarito máximo	T+14
Geral	Total uh	597
	Total de vagas	149 (Sendo 04 PCD e 07 idoso)
Tipologia	Tipologia	Modular com elevador
	Gabarito	T+14
	Lâmina	02 14PP e 01 12PP
	Área privativa	36 m²
Condomínio	Unidade pcd	19 Adaptadas PCD e 19 Idoso
	Unidade lazer|técnica	03 unidades técnicas
	Torre	03
	Fase	02
Lazer	Lazer coberto	-
	Lazer descoberto	Salão de festas com churrasqueira e zeladoria, quadra descoberta, churrasqueira Gourmet, Praça de Jogos, Espaço Relax, Play Baby, Play Kids, Funcional Externo, Fitness Externo, Pergolado, Chimarródromo e Playpet

Empreendimento Acqua Danúbio
Investimento e Escritura | Lançamento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	Supercondomínio		-
	Acesso Empreendimento		-
	Percurso do pedestre até torre		-
Diferencial produto	Atributos Infra	Sim	Quadra Gramada , Churrasqueira com banheiro e Chimarródromo
	Atributos Torre	Não	-
	Edifício Garagem	Não	-

Acesso

Quadra Gramada

Chimarródromo

10

Empreendimento Acqua Danúbio
Lançamento

Fase 1: 388 UH (Sendo 11 Adaptadas PCD e 13 Idoso) - 122 vagas (sendo 02 PCD e 05 Idoso)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	01 Bloco (T+14)	209 UH (Sendo 06 PCD e 08 Idoso)	71 Vagas (Sendo 02 PCD E 05 Idoso)	Churrasqueira Gourmet, Praça de Jogos, Espaço Relax, Play Baby, Play Kids, Funcional e Fitness Externo, Quadra Gramada, Pergolado, Chimarródromo e Play Pet não foram considerados no módulo 1, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas
Módulo 02	01 Bloco (T+14)	179 UH (Sendo 05 PCD e 05 Idoso)	51 Vagas	

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Custo de Construção

	ACQUA DANUBIO F1 - R07	ACQUA DANUBIO F2 - R07	ACQUA DANUBIO ESCRITURA| REV07 CONSOLIDADO	QUINTA DO LAGO (BOLSENA) R16	BP 2025 ACQUA DANUBIO F1
Torres	2	1	3	1	3
Unidades Construídas	390	210	390 | 210	256	390
Unidades Vendidas	388	209	388 | 209	251	388
Total Unidades Vendidas	388	209	597	251	388
Condomínios (qta.)	1	1	1	1	1
Cidade	Canoas - RS	Canoas - RS	Canoas - RS	Porto Alegre - RS	Canoas - RS
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	1 Torre | T+14 | 14PP | C2A	1 Torre | T+14 | 14PP | C2A	1 Torre | T+14 | 14PP | C2A	1 Torre | T+15 | 16PP | C3A	1 Torre | T+14 | 14PP | C2A
Tipologia	1 Torre | T+14 | 12PP | C2A	-	1 Torre | T+14 | 12PP | C2A	-	1 Torre | T+14 | 12PP | C2A
Projeto Infra	AP	AP	AP	AP	AP
Projeto Torre	PR	PR	PR	PR	PR
Mês Base	janeiro-25	janeiro-25	janeiro-25	dezembro	agosto-24
Incc	1.159,536	1.159,536	1.159,536	1.149,170	1.134,774
LVS	novembro-25	novembro-25	novembro-25	outubro-24	
Indiretos	novembro-25	novembro-25	novembro-25	outubro-24	
Base de Preço	LPU 86	LPU 86	LPU 86	LPU 85	
Takt	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	18	14	18 | 14	17	18 | 14
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 102.242	R$ / UND R$ 93.241	R$ / UND R$ 99.091	R$ / UND R$ 103.640	R$ / UND R$ 100.490
Indireto	R$ 21.393	R$ 19.735	R$ 20.812	R$ 23.760	R$ 20.083
Torre	R$ 55.894	R$ 56.712	R$ 56.180	R$ 55.042	R$ 54.044
Infra	R$ 16.507	R$ 10.196	R$ 14.298	R$ 16.354	R$ 18.362
Fundação	R$ 6.456	R$ 6.389	R$ 6.433	R$ 7.426	R$ 6.119
EEE					
ETE					
Contenção	R$ 69		R$ 45	R$ 111	R$ 69
Terraplenagem	R$ 1.923	R$ 209	R$ 1.323	R$ 946	R$ 1.812
CUSTO TOTAL II	R$ 2.282	R$ 2.282	R$ 2.282	R$ 9.288	R$ 2.163
Urbanização	R$ 906	R$ 906	R$ 906	R$ 6.572	R$ 852
Drenagem				R$ 958	
Extensão de Rede Elétrica				R$ 496	
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.376	R$ 1.376	R$ 1.376	R$ 1.262	R$ 1.310
CUSTO TOTAL III	R$ 0		R$ 0	R$ 16	
Incorridos	R$ 0		R$ 0	R$ 16	
CUSTO TOTAL IV				R$ 1.500	
Aprendizado				R$ 1.500	
CUSTO TOTAL V					R$ 2.240
Atualização por INCC					R$ 2.240
CUSTO TOTAL I+II	R$ 104.524	R$ 95.523	R$ 101.373	R$ 112.928	R$ 102.653
CUSTO TOTAL I AO IV	**R$ 104.524**	**R$ 95.523**	**R$ 101.373**	**R$ 114.444**	**R$ 104.893**

Custo de Construção

	ACQUA DANUBIO F1 - R07	ACQUA DANUBIO BP 2025 FASE 1	
Torres	2	3	
Unidades Construídas	390	390	
Unidades Vendidas	388	388	
Total Unidades Vendidas	388	388	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Canoas - RS	Canoas - RS	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	1 Torre | T+14 | 14PP | C2A	1 Torre | T+14 | 14PP | C2A	
Tipologia	1 Torre | T+14 | 12PP | C2A	1 Torre | T+14 | 12PP | C2A	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	PR	PR	
Mês Base	janeiro-25	agosto-24	
Incc	1.159,536	1.134,774	
LVS	novembro-25		
Indiretos	novembro-25		
Base de Preço	LPU 86		
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	18 | 14	18 | 14	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 102.242	R$ / UND R$ 100.490	DIF R$ 1.752
Indireto	R$ 21.393	R$ 20.083	R$ 1.309
Torre	R$ 55.894	R$ 54.044	R$ 1.849
Infra	R$ 16.507	R$ 18.362	-R$ 1.855
Fundação	R$ 6.456	R$ 6.119	R$ 337
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 69	R$ 69	R$ 0
Terrapplenagem	R$ 1.923	R$ 1.812	R$ 112
CUSTO TOTAL II	R$ 2.282	R$ 2.163	R$ 119
Urbanização	R$ 906	R$ 852	R$ 54
Drenagem	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Eletrica	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.376	R$ 1.310	R$ 66
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 2.240	-R$ 2.240
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 2.240	-R$ 2.240
CUSTO TOTAL	R$ 104.524	R$ 104.893	-R$ 368

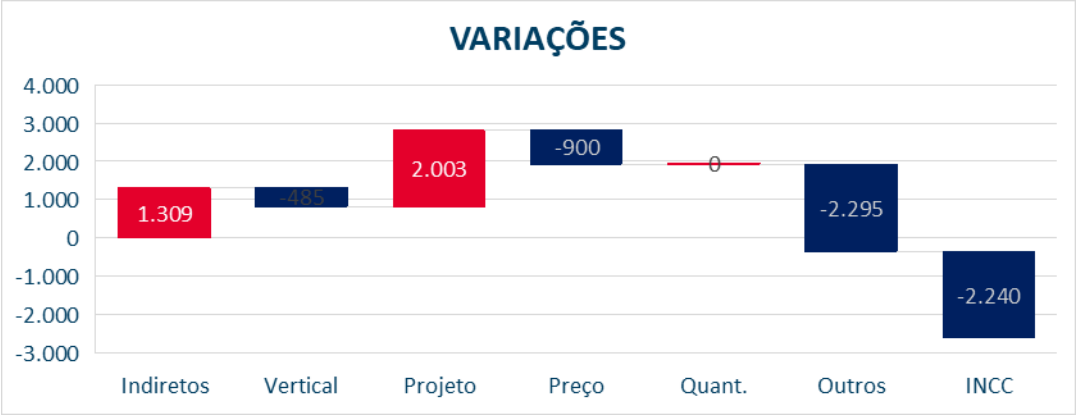

INDIRETOS
+273 | Administração
+1041 | Equipamento - SLQA

Vertical
- 485 | Retroalimentação

Projeto
+ 930 | Churrasqueira e Insuflamento
+440 | Forro de gesso hall
+337 | Fundação
+193 | Cobogó
+112 | Terraplanagem

Preço
- 974 | Elevador

Instalações
- 2356 | Instalações

INCC
-2240 | INCC

Custo por Churrasqueira

ITENS A SEREM CONTEMPLADOS:

- Sistema de exaustão para churrasqueiras;
- Sistema de automatização da exaustão (elétrica);
- Shaft específico corta fogo.

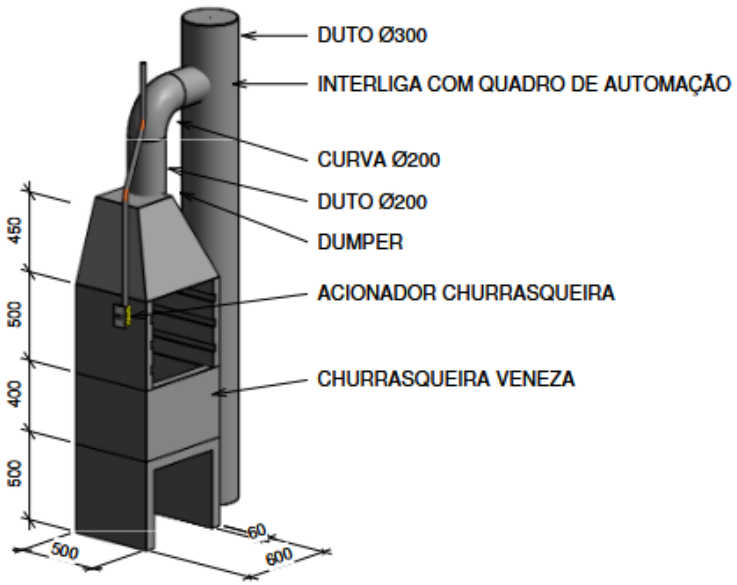

ACRÉSCIMOS PARA CHURRASQUEIRA - BOLSENA/RS			
Item	sem churrasqueira	com churrasqueira	DIF
Estrutura	10	0	-10
Sistema de automatização exaustão	0	1.515	1.515
Shaft específico corta fogo	0	600	600
Marmores e granitos	0	12	12
Rev. Piso	22	0	-22
Pintura	7	0	-7
Churrasqueira e Sistema de Exaustão	0	3.000	3.000
TOTAL	**39**	**5.127**	**5.088**

Custo por Churrasqueira

EXAUSTÃO PARA CHURRASQUEIRA
Implantação de dutos e coifas para exaustão por prumadas.

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA EXAUSTÃO
Botoeiras e quadros de comando para acionar/desligar a exaustão.

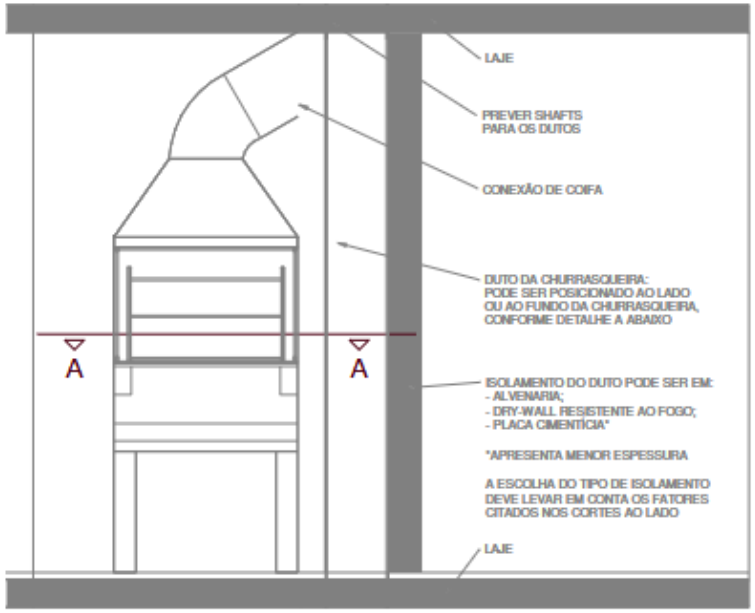

VISTA EM CORTE VERTICAL

Orçado por: Brunilo
R$3000,00/Churrasqueira

Orçado por: Pólux (Rogério)
R$1515,05/Churrasqueira

Sistemas de injeção de ar externo nos Halls

Sistema de insuflamento

Trata-se do sistema de injeção de ar externo nos halls para atendimento da norma de renovação de ar.

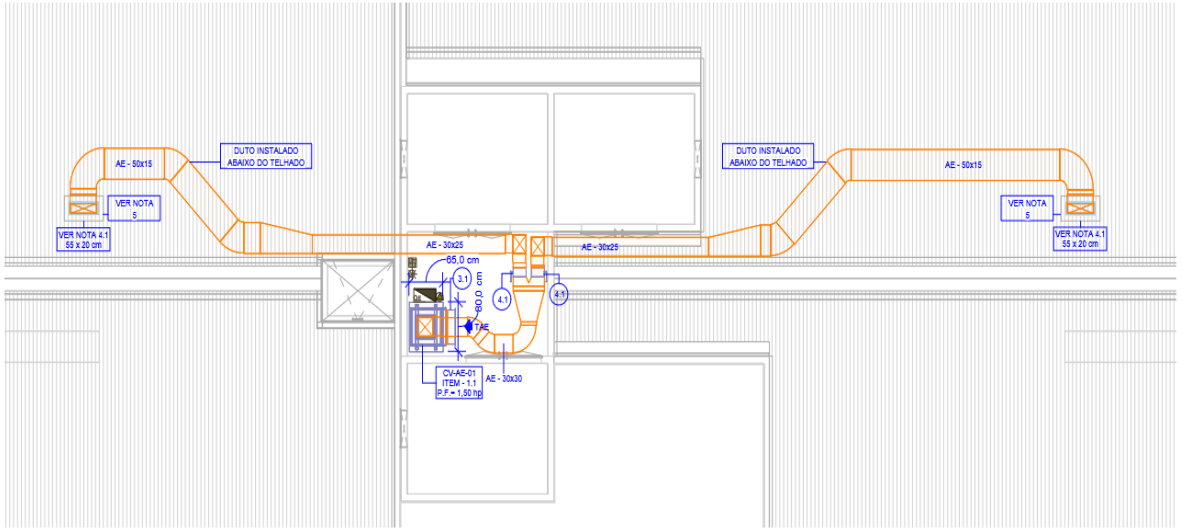

Orçado por: Neoclima
R$837/U.H. ou
R$10.826,16/PAV.

Logística

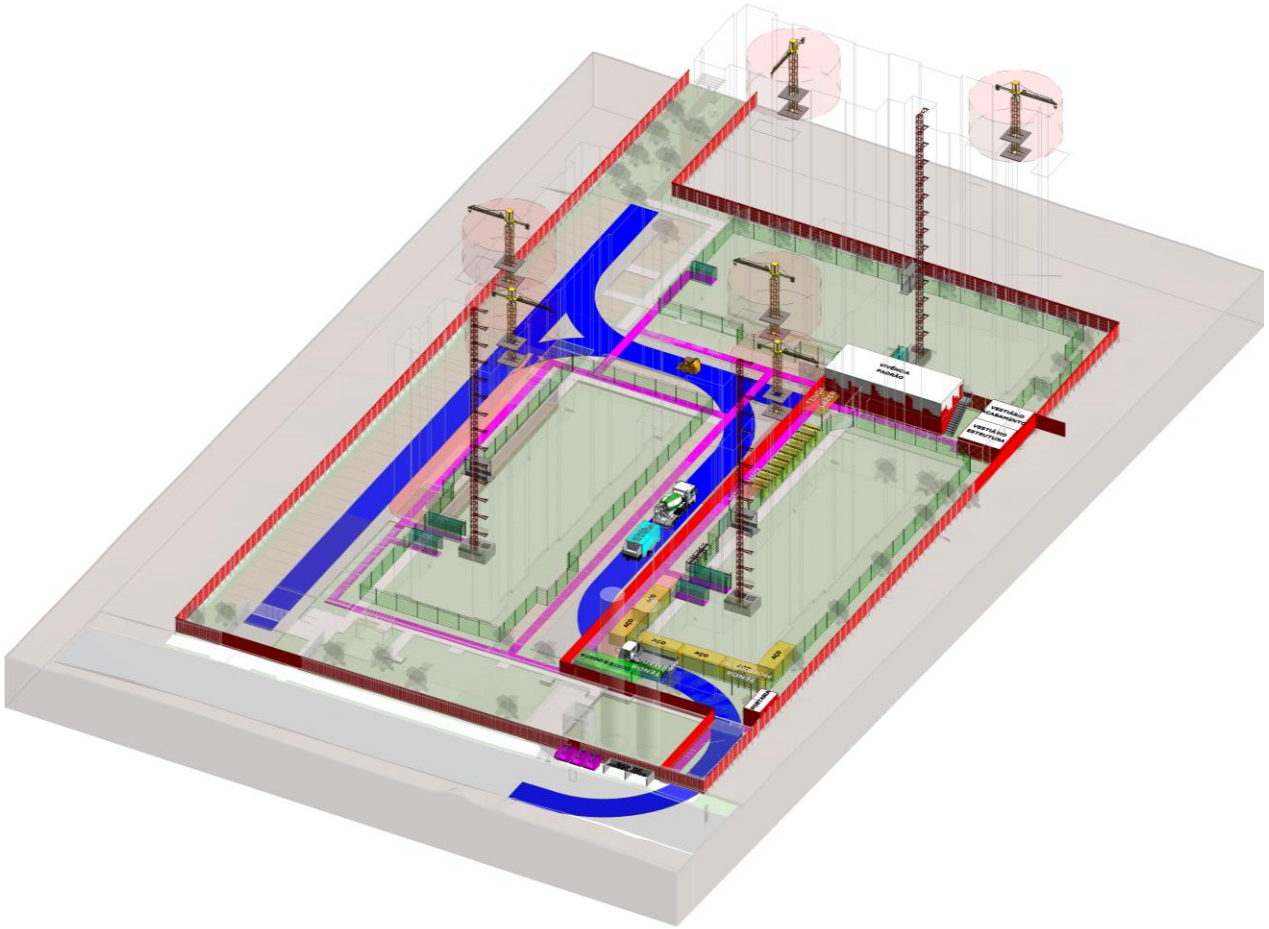

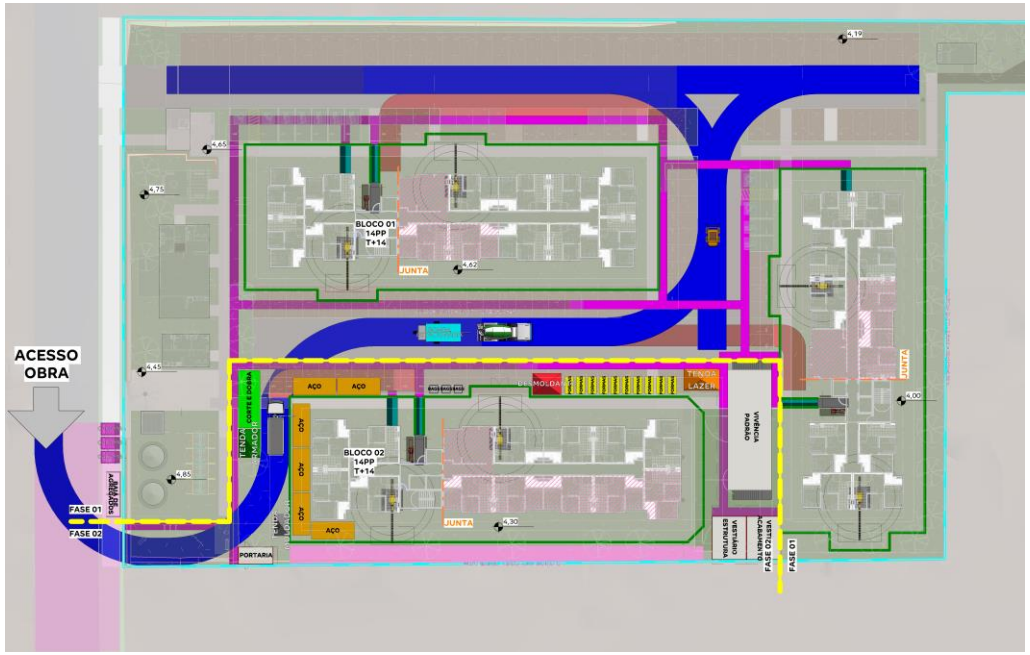

ARQUIVO REF.: LG-LOGT-0-RS-A-F02E-PCT-C2A-00PP-AP-LOG-801-C03-PAAP-R00

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

- **OBRA / LEGALIZAÇÃO** EXISTE A POSSIBILIDADE DE UTILIZAR O VIÁRIO PROJETADO PARA LOCAR A ÁREA OPERACIONAL (CONTAINERS E MATERIAIS), FACILITANDO O ANDAMENTO DA OBRA. VERIFICAR DURANTE O INÍCIO DE EP A VIABILIDADE OU NÃO DESSA ESTRATÉGIA.
- **CUSTOS / OBRA** DEVIDO AO FASEAMENTO PROPOSTO, NÃO HÁ ESPAÇO OPERACIONAL NA FASE 2 PARA IMPLANTAÇÃO DA BAIA PARA SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS. DEVERÃO SER PREVISTAS BIG BAG'S, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS PRÓXIMAS DAS ENTRADAS DOS BLOCOS. CASO OCORRAM PERÍODOS DE CHUVA, É IMPORTANTE QUE AS BIG BAG'S SEJAM COBERTAS COM TELHA.

C000 - TENDAS_PERÍODOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_DESMOLDANTE (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	-	FASES 01 E 02
_TENDA_TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	-	-	TODO PERÍODO	FASE 01
_TENDA_TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	-	-	TODO PERÍODO	FASE 01
_TENDA_TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	-	-	TODO PERÍODO	FASE 01
_TENDA_TENDA LAZER (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02

C000 - TELA FACHADEIRA/SLQA

DESCRIÇÃO	ÁREA	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_TELA FACHADEIRA (LOG)	1808,75 m²	-	-	TODO PERÍODO	FASE 01

C000 - VIVÊNCIA - CONTAINERS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE CONTAINERS	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_CONTAINER PORTARIA (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02
_TENDA_CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	8 MÓDULOS DE CONTAINER	TODO PERÍODO	-	-	FASES 01 E 02
_TENDA_CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG)	2 MÓDULOS DE CONTAINER	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02
_TENDA_CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG)	2 MÓDULOS DE CONTAINER	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02
_TENDA_CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	7 MÓDULOS DE CONTAINER EMBAIXO, 7 MÓDULOS DE CONTAINER EM CIMA	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01 E 02

C000 - EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

EQUIPAMENTO	QUANTITATIVO	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	-	-	-	TODO PERÍODO	+ 15 DIAS	FASES 01 E 02
_TENDA_CAMINHÃO MUNK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	-	-	-	MEIO PERÍODO	-	FASES 01 E 02
_TENDA_CREMALHEIRA PCT (LOG)_R01	2 EQUIPAMENTOS	4 MOBILIZAÇÕES (2 TORRES - TAKT 2X2)	4 DESMOB. (2 TORRES - TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	MEIO PERÍODO	FASE 01
_TENDA_CREMALHEIRA PCT (LOG)_R01	1 EQUIPAMENTO	2 MOBILIZAÇÃO (1 TORRE - TAKT 2X2)	2 DESMOB. (1 TORRE - TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	MEIO PERÍODO	FASE 02
_TENDA_MINIGRUA (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	4 MOBILIZAÇÕES (2 TORRES - TAKT 2X2)	4 DESMOB. (2 TORRES - TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-	FASE 01
_TENDA_MINIGRUA (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	2 MOBILIZAÇÃO (1 TORRE - TAKT 2X2)	2 DESMOB. (1 TORRE - TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-	FASE 02

PCP-160

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI	Folga Inicio	Folga Aptidão	Folga Cliente	Carência CEF
Quinta do Lago - F3 | Cond 02 Garda	fev/24	300	2	B	19/09/24	12/01/25	18/01/25		17/04/25	23/04/25		jul/25	7,24	5,70	19,23	OK
Acqua Sena - F2	fev/24	220	2	A	09/11/24	08/01/25	15/01/25		18/03/25	25/03/25		ago/25	8,93	17,63	18,20	Problema
Ipanema Residence - F2	jun/24	240	2	A	15/01/25	19/03/25	26/03/25		03/06/25	10/06/25		nov/25	7,16	7,16	19,23	NC
Morada do Campo II	ago/24	540	2	B	28/12/24	18/04/25	24/04/25		06/10/25	12/10/25		mar/26	4,50	9,04	17,27	OK
Morada Serena	nov/24	500	2	A	28/02/25	04/06/25	11/06/25		10/11/25	17/11/25		mai/26	3,52	3,52	18,27	NC
Quinta do Lago - F4 | Cond 04 Bolsena	dez/24	251	2	B	13/05/25	07/10/25	13/10/25		25/12/25	31/12/25		out/26	4,97	4,97	14,20	NC
Acqua Danúbio - F1	jan/25	388	2	A	29/06/25	11/11/25	18/11/25		14/03/26	21/03/26		dez/26	5,51	5,51	13,20	NC
Parque Ventura III F1	mar/25	440	2	B	10/08/25	26/12/25	01/01/26		15/05/26	21/05/26		fev/27	4,97	4,97	13,23	NC
Atilio 1407 - F1	mai/25	446	2	A	01/10/25	15/03/26	22/03/26		03/08/26	10/08/26		mai/27	4,64	4,64	12,20	NC
Solar do Bosque - F1	jun/25	380	2	B	19/01/26	16/05/26	22/05/26		13/09/26	19/09/26		fev/27	7,28	7,28	16,27	NC
Reserva das Figueiras F1	jun/25	260	2	A	22/03/26	04/08/26	11/08/26		25/10/26	01/11/26		abr/27	9,35	9,35	14,23	NC

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Canoas	CAN	80%	664	55	797	66

Empreendimento	Renda	Lançamento	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Acqua Danúbio	**2.824**	**jan-25**		**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**10**
Acqua Danubio - F2	**2.824**	**jun-26**																			**11**	**11**
Parque Ventura Iii F1	2.134	abr-25					30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	
Jardim Amarena F1	2.421	dez-25													25	25	25	25	25	25	25	25
Parque Ventura Iii F2	2.134	abr-26																		14	14	14
Total de Vendas Lançados			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**0**	**21**	**21**	**21**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**76**	**76**	**76**	**76**	**76**	**90**	**91**	**60**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Acqua Danúbio | Mapa Concorrência

		Acqua Danúbio	Residencial Porto Bello
		TENDA	MRV
	Distância Tenda (km)		500m
Região 1 Km	População	17.654	18.674
	Dens. Demográfica	5.640	5.965
	Renda (R$)	6.288	6.287
	Classe Social	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)
	PEA Dia	12.281	12.963
Quantitativo	Lançamento	jan/25	set/21
	Unidades	388	480
	Estoque	388	89
	VSO	21	11
	Stockout	18	8
	Preço Nominal (R$)	213.664	236.000
	Preço CEF (R$)	170.066	188.800
	Renda Comprador (R$)	2.824	4.150
	Dif Tenda (R$)		-1.326
	Factibilidade		●
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	3	4
	Gabarito	T+14	T+14
	Plantas (m²)	36m²	39,88m² e 46,48m²
	Tipologia	2 Dorms	Não
	Opções	Não	Não
	Varanda	Sim	Sim
	Suite	Não	Não
	Dif. Entrega	Não	Não
	Vagas	20% de Vagas	100% de Vaga
	Lazer	Churrasqueiras Gourmet, Funcional Externo, Fitness Externo, Playkids, Playbaby, Espaço Relax, Praça de Jogos, Bicicletários, Quadra Descoberta, Chimarródromo, Playpet, Salão de Festas com Churrasqueira.	Brinquedoteca, Climatização, Fitness Center, Piscina infantil, Praça, Quadra, Sauna Seca,

Farol Renda
● Acima de 300
● Entre 0 e 300
● Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência possui target de preço e renda acima ao previsto para o Acqua Danúbio.

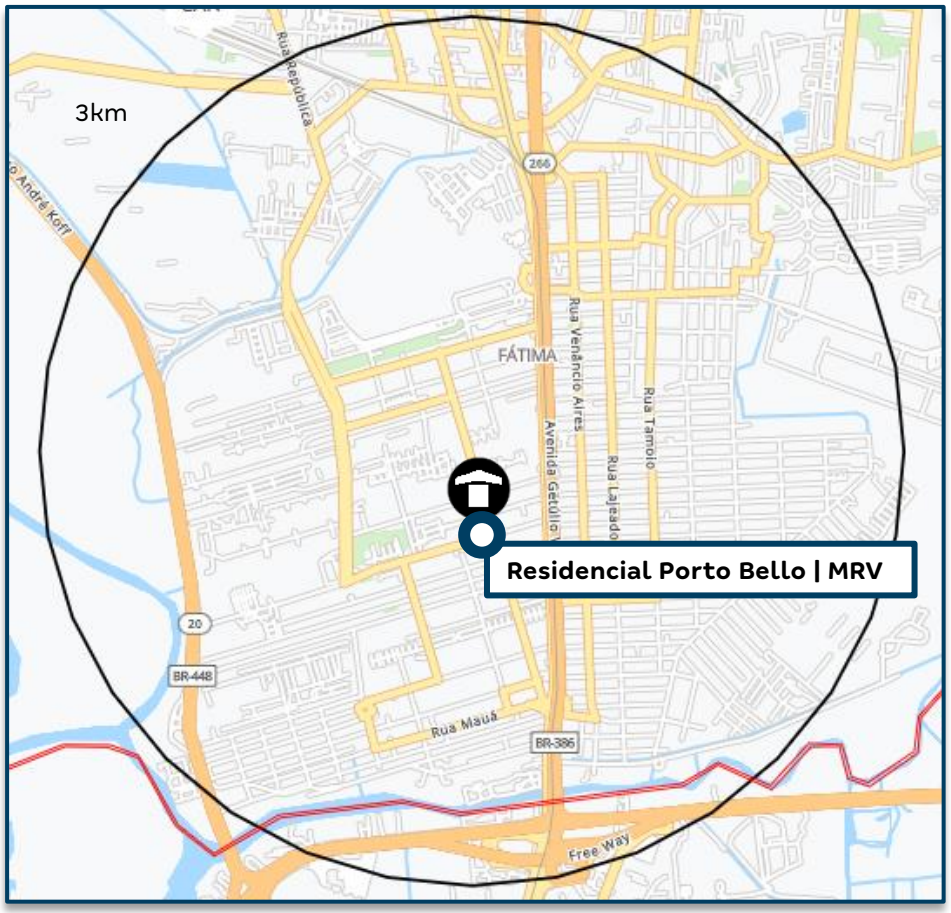

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Acqua Danúbio					
Tipo:	**Sem Vaga e Churrasqueira**		**Sem Vaga e Com Churrasqueira**		**Com Vaga e Churrasqueira**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	200.000		202.000		218.000	
Renda Inicial (VF)	2.347		2.695		3.189	
Renda Final*	2.600		3.000		3.500	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,93	2.268	0,90	2.514	0,90	2.974
FGTS	0,56	1.362	0,86	2.407	0,73	2.428
Financiamento	95,73%	141.724	95,43%	153.547	96,69%	172.851
Subsídio	94,72%	23.247	119,92%	17.008	116,50%	6.051
Prazo de Pró-soluto	22	22	22	22	22	22
Pró-Soluto	91,50%	17.165	83,94%	18.081	73,89%	18.838
Preço Raso (RS)	185.766	185.766	193.557	193.557	203.142	203.142
TCD	98,20%	23.231	89,36%	24.273	75,63%	24.314
VSO	15	15	2	2	4	4
Preço de Venda	**200.637**	**200.637**	**209.116**	**209.116**	**218.357**	**218.357**
Elasticidade	4,167%	4,167%	4,167%	4,167%	4,167%	4,167%
Preço de Venda Final	**208.997**	**208.997**	**217.830**	**217.830**	**227.456**	**227.456**
Preço Raso (R$)	**185.766**		**193.557**		**203.142**	
% de Raso	**88,88%**		**88,86%**		**89,31%**	
BP25 - Não Inflacionado	**181.835**		**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**184.384**		**-**		**-**	

Resumo de Preços

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pós	PSOL (m)	RET-1
Acqua Danubio - F2	Com Vaga e Churrasqueira	3.079	0,93	0,76	99,0%	91,0%	80,9%	77,5%	3	214.391	218.000	10,1190%	236.086	212.034	19	25%
Acqua Danubio - F2	Sem Vaga e Churrasqueira	2.347	0,93	0,56	95,7%	94,7%	96,7%	102,9%	8	198.190	200.000	10,1190%	218.245	193.907	19	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Acqua Danúbio
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	203.835
Renda Inicial (VF)	2.554
Renda Final*	2.824
RET-1	50%

Tipo:	VF	R$
Ato	0,92	2.436
FGTS	0,62	1.689
Financiamento	95,89%	149.262
Subsídio	101,83%	19.115
Prazo de Pró-soluto	22	22
Pró-Soluto	87,14%	17.600
Preço Raso (RS)	190.102	190.102
TCD	92,71%	23.562
VSO	21	21
Preço de Venda	**204.761**	**204.761**
Elasticidade	4,167%	4,167%
Preço de Venda Final	**213.664**	**213.664**
Preço Raso (R$)	**190.102**	
% de Raso	**88,97%**	
Raso Todas as Fases	**193.256**	
Nominal Todas as Fases	**217.061**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, visto que, o valor estimado no parecer está próximo do preço referência, que simula as vendas da fase anterior retirando o valor de cheque moradia dessa simulação, a diferença entre os preços referência e Vision se dá por conta da verticalização e à inclusão da churrasqueira para o Acqua Danúbio.
O projeto possuí na 1° fase 50% de RET-1.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", o concorrente da região vende em um target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda.

	Preço Real				Preço Normalizado (22m)	
	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Floratta	178.942	2.817	21	6	9.568	188.510
Acqua Sena	169.780	2.767	26	12	7.820	177.600
Acqua Danúbio	190.102	2.824	21	22	-	190.102

Entorno

Distâncias - Mobilidade

- BR 448– 3,8 km
- BR 116– 2,5 km
- Rua Cairu – 350 m

Raio 2,5 Km

- Asun Supermercado
- Estação Niterói
- Estação Fátima

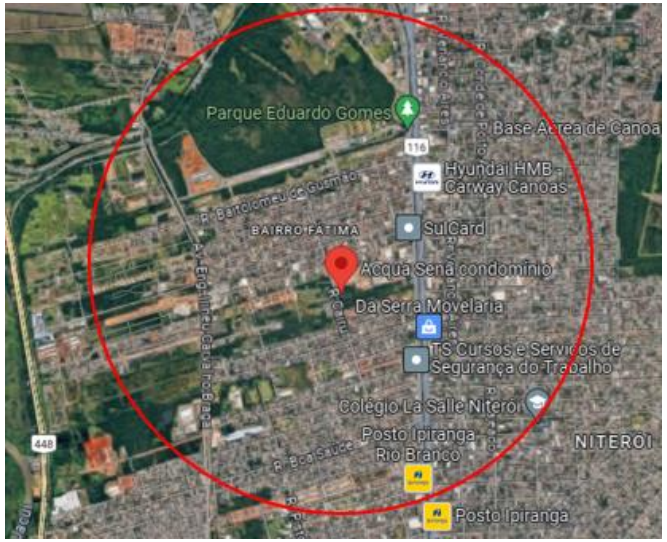

Concorrência

Porto Bello (MRV) – 500 m

- Preço Cheio (UH mais barata): R$ 230.990
- Avaliação: R$ 233.000
- Renda: R$ 3.700
- Estoque: 48
- 80% Vaga de Estacionamento
- Diferenciais: Opção de sacada com churrasqueira, energia solar, piso laminado nos quartos e sala, lazer equipado, piscina, porcelanato. Desconto 15k “bom pagador”.

Parecer: Acreditamos que o preço é POSSÍVEL com o VSO proposto, dado o histórico que temos nos demais produtos da mancha.

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Informações Viabilidade

Projeto:	Acqua Danúbio					
Tipo:	**Sem Vaga e Churrasqueira**		**Sem Vaga e Com Churrasqueira**		**Com Vaga e Churrasqueira**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	200.000		202.000		218.000	
Renda Inicial (VF)	2.347		2.595		3.079	
Renda Final*	2.600		3.000		3.500	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,93	2.268	0,93	2.514	0,93	2.974
FGTS	0,56	1.362	0,89	2.407	0,76	2.428
Financiamento	95,73%	141.724	97,36%	153.547	98,64%	172.851
Subsídio	94,72%	23.247	101,32%	17.008	90,95%	6.051
Prazo de Pró-soluto	23	23	23	23	23	23
Pró-Soluto	91,50%	17.945	87,17%	18.903	76,53%	19.694
Preço Raso (RS)	186.546	186.546	194.379	194.379	203.998	203.998
TCD	98,20%	23.231	92,80%	24.273	78,33%	24.314
VSO	15	15	2	2	4	4
Preço de Venda	**201.386**	**201.386**	**209.905**	**209.905**	**219.179**	**219.179**
Elasticidade	4,167%	4,167%	4,167%	4,167%	4,167%	4,167%
Preço de Venda Final	**209.777**	**209.777**	**218.651**	**218.651**	**228.312**	**228.312**
Preço Raso (R$)	**186.546**		**194.379**		**203.998**	
% de Raso	**88,93%**		**88,90%**		**89,35%**	
BP24 - Não Inflacionado	**182.418**		**-**		**-**	
BP24 - Inflacionado	**184.967**		**-**		**-**	

Resumo de Preços

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pós	PSOL (m)	RET-1
Acqua Danubio - F2	Com Vaga e Churrasqueira	3.079	0,93	0,76	99,0%	91,0%	80,9%	77,5%	3	214.391	218.000	10,1190%	236.086	212.034	19	25%
Acqua Danubio - F2	Sem Vaga e Churrasqueira	2.347	0,93	0,56	95,7%	94,7%	96,7%	102,9%	8	198.190	200.000	10,1190%	218.245	193.907	19	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Informações Gerais – Cenário Real

Acqua Danúbio - RS - Região Metropolitana > 100mil RS

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	ago-22							
F1 C/ VAGA E C/ CHURRAS		jan-25	jun-25	dez-26	5 meses	18 meses	jan-28	36 meses
F1 S/ VAGA E C/ CHURRAS		jan-25	jun-25	dez-26	5 meses	18 meses	jan-28	36 meses
F1 S/ VAGA E S/ CHURRAS		jan-25	jun-25	dez-26	5 meses	18 meses	jan-28	36 meses
F2 C/ VAGA E C/ CHURRAS		jun-26	dez-26	fev-28	6 meses	14 meses	jun-29	36 meses
F2 S/ VAGA E S/ CHURRAS		jun-26	dez-26	fev-28	6 meses	14 meses	jun-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	4,25 MM	**Incorrido Terreno:** 1,05 MM	**Área do Terreno (100%):**	39.840 m²	**Área Líquida do Terreno:** 10.693 m²
Cash:	4,25 MM		**Custo de terreno m²:**	106,8	**Custo de terreno m² Área Líquida:** 397,8
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 25 (R$ mil):**	745	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 3,3% / 50,0%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.** 2,0 / 2,0
Ato / %VGV:	2,13 MM / 1,6%		**Incorrido de Construção:**	0,97 MM	**Incorridos de Incorporação:** 1,06 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
F1 C/ VAGA E C/ CHURRAS	T+14	203.142	78	227.456	218.000	96,7%	73,9%	75,6%
F1 S/ VAGA E C/ CHURRAS	T+14	193.557	42	217.830	202.000	95,4%	83,9%	89,4%
F1 S/ VAGA E S/ CHURRAS	T+14	185.766	268	208.997	200.000	95,7%	91,5%	98,2%
F2 C/ VAGA E C/ CHURRAS	T+14	211.825	60	235.876	218.000	99,0%	79,9%	77,5%
F2 S/ VAGA E S/ CHURRAS	T+14	193.907	149	218.245	200.000	95,7%	96,7%	102,9%

Unidades Totais:	597	**Preço Médio:**	217.040	**Renda Média:**	2.555	**ITBI+Emol. Unit.:**	4.001
Unidades Tenda:	597	**Avaliação Média:**	204.302	**Ato:**	2.353 (0,92 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.218
VSO:	21 Unit.s.	**VGV Total:**	129.572.621	**FGTS:**	1.587 (0,62 Salários)	**Preço Raso Médio:**	193.235
RET Médio:	2,8%	**VGV Tenda:**	129.572.621	**% em RET 1%:**	41%		

Construção

Custo Total Unit.:	101.373	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	35,62	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**18.160.786**	**LI:**	**20,06%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**16.949.947**	**Margem Bruta Econômica:**	**42,01%**
TIR:	**65,65%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(13.235.378)**	**Margem Bruta REF:**	**44,98%**
Exposição de Caixa:	**12,71%**	**Δ LI:**	**0,06%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**9.609.967**	**Margem Rasa Econômica:**	**34,13%**
Payback Contingente (21 m):	**21 m/ (0 m)**	**LI Marginal:**	**24,04%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**41.814.070**	**Margem Rasa REF:**	**38,21%**
Payback Consolidado:	**21 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,77%**

DRE – Cenário Real

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Acqua Danúbio		F1 C/ VAGA E C/ CHURRAS		F1 S/ VAGA E C/ CHURRAS		F1 S/ VAGA E S/ CHURRAS		F2 C/ VAGA E C/ CHURRAS		F2 S/ VAGA E S/ CHURRAS	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	133.321	100,0%	17.718	100,0%	9.124	100,0%	56.060	100,0%	15.263	100,0%	35.156	100,0%
PIS/COFINS	(2.034)	1,5%	(243)	1,4%	(125)	1,4%	(768)	1,4%	(272)	1,8%	(626)	1,8%
Custo Total	(76.134)	58,0%	(10.023)	57,4%	(5.409)	60,1%	(34.475)	62,4%	(7.542)	50,3%	(18.685)	54,1%
Custo Terreno	(4.476)	3,4%	(585)	3,3%	(315)	3,5%	(2.009)	3,6%	(450)	3,0%	(1.117)	3,2%
Custo Relacionados a Terreno	(1.098)	0,8%	(141)	0,8%	(76)	0,8%	(486)	0,9%	(114)	0,8%	(282)	0,8%
Custos de Incorporação	(1.178)	0,9%	(142)	0,8%	(88)	1,0%	(523)	0,9%	(135)	0,9%	(290)	0,8%
Custo de Construção	(69.381)	52,8%	(9.155)	52,4%	(4.930)	54,8%	(31.457)	56,9%	(6.844)	45,7%	(16.996)	49,2%
Lucro Bruto Econômico	55.153	42,0%	7.452	42,6%	3.590	39,9%	20.817	37,6%	7.449	49,7%	15.846	45,9%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	55.153	42,0%	7.452	42,6%	3.590	39,9%	20.817	37,6%	7.449	49,7%	15.846	45,9%
Despesas de Selling	(11.684)	8,9%	(1.554)	8,9%	(801)	8,9%	(4.910)	8,9%	(1.340)	8,9%	(3.079)	8,9%
Contingência	(3.066)	2,3%	(408)	2,3%	(210)	2,3%	(1.289)	2,3%	(351)	2,3%	(809)	2,3%
Margem de Contribuição	40.403	30,8%	5.491	31,4%	2.579	28,7%	14.617	26,4%	5.758	38,4%	11.958	34,6%
IR e CSLL	(1.664)	1,2%	(199)	1,1%	(102)	1,1%	(628)	1,1%	(222)	1,5%	(512)	1,5%
Margem Líquida	38.739	29,5%	5.292	30,3%	2.477	27,5%	13.989	25,3%	5.535	36,9%	11.445	33,1%
Lucro Bruto REF	102.587	45,0%	100.236	44,1%	90.610	41,6%	81.702	39,1%	133.145	51,8%	113.787	47,8%
Lucro Raso REF	77.457	38,2%	75.922	37,4%	66.337	34,3%	58.471	31,5%	106.922	46,3%	87.252	41,3%

R$ Mil - VPL - Compra	Acqua Danúbio		F1 C/ VAGA E C/ CHURRAS		F1 S/ VAGA E C/ CHURRAS		F1 S/ VAGA E S/ CHURRAS		F2 C/ VAGA E C/ CHURRAS		F2 S/ VAGA E S/ CHURRAS	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	90.529	100,0%	12.980	100,0%	6.552	100,0%	41.538	100,0%	8.868	100,0%	20.591	100,0%
PIS/COFINS	(1.341)	1,5%	(175)	1,3%	(88)	1,3%	(561)	1,3%	(156)	1,8%	(361)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(71.028)	78,5%	(9.978)	76,9%	(5.335)	81,4%	(33.917)	81,7%	(6.318)	71,2%	(15.479)	75,2%
Custo Terreno	(3.971)	4,4%	(519)	4,0%	(279)	4,3%	(1.783)	4,3%	(399)	4,5%	(991)	4,8%
Custo Relacionados a Terreno	(1.240)	1,4%	(160)	1,2%	(86)	1,3%	(549)	1,3%	(128)	1,4%	(317)	1,5%
Custos de Incorporação	(1.247)	1,4%	(157)	1,2%	(94)	1,4%	(573)	1,4%	(131)	1,5%	(293)	1,4%
Custo de Construção	(53.027)	58,6%	(7.494)	57,7%	(4.035)	61,6%	(25.749)	62,0%	(4.521)	51,0%	(11.228)	54,5%
Despesas de Selling	(9.294)	10,3%	(1.340)	10,3%	(683)	10,4%	(4.284)	10,3%	(897)	10,1%	(2.089)	10,1%
Contingência	(1.151)	1,3%	(164)	1,3%	(85)	1,3%	(520)	1,3%	(116)	1,3%	(266)	1,3%
IR e CSLL	(1.097)	1,2%	(143)	1,1%	(72)	1,1%	(459)	1,1%	(127)	1,4%	(296)	1,4%
Lucro Imobiliário	18.161	20,1%	2.827	21,8%	1.128	17,2%	7.060	17,0%	2.394	27,0%	4.751	23,1%

Informações Gerais – Cenário Aprovação

Acqua Danúbio - RS - Região Metropolitana > 100mil RS

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	ago-22							
F1 C/ VAGA E C/ CHURRAS		jan-25	jul-25	jan-27	6 meses	18 meses	jan-28	36 meses
F1 S/ VAGA E C/ CHURRAS		jan-25	jul-25	jan-27	6 meses	18 meses	jan-28	36 meses
F1 S/ VAGA E S/ CHURRAS		jan-25	jul-25	jan-27	6 meses	18 meses	jan-28	36 meses
F2 C/ VAGA E C/ CHURRAS		jun-26	dez-26	fev-28	6 meses	14 meses	jun-29	36 meses
F2 S/ VAGA E S/ CHURRAS		jun-26	dez-26	fev-28	6 meses	14 meses	jun-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	4,25 MM	**Incorrido Terreno:**	1,05 MM	**Área do Terreno (100%):**	39.840 m²	**Área Líquida do Terreno:**	10.693 m²
Cash:	4,25 MM			**Custo de terreno m²:**	106,8	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	397,8
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	745	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):**	3,3% / 49,9%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.**	2,0 / 2,0
Ato / %VGV:	2,13 MM / 1,6%			**Incorrido de Construção:**	0,97 MM	**Incorridos de Incorporação:**	1,06 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
F1 C/ VAGA E C/ CHURRAS	T+14	203.998	78	228.312	218.000	98,6%	76,5%	78,3%
F1 S/ VAGA E C/ CHURRAS	T+14	194.379	42	218.651	202.000	97,4%	87,2%	92,8%
F1 S/ VAGA E S/ CHURRAS	T+14	186.546	268	209.777	200.000	95,7%	91,5%	98,2%
F2 C/ VAGA E C/ CHURRAS	T+14	212.034	60	236.086	218.000	99,0%	80,9%	77,5%
F2 S/ VAGA E S/ CHURRAS	T+14	193.907	149	218.245	200.000	95,7%	96,7%	102,9%

Unidades Totais:	597	**Preço Médio:**	217.581	**Renda Média:**	2.534	**ITBI+Emol. Unit.:**	4.007
Unidades Tenda:	597	**Avaliação Média:**	204.302	**Ato:**	2.350 (0,93 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.254
VSO:	33 Unit.s.	**VGV Total:**	129.895.577	**FGTS:**	1.588 (0,63 Salários)	**Preço Raso Médio:**	193.776
RET Médio:	2,8%	**VGV Tenda:**	129.895.577	**% em RET 1%:**	41%		

Construção

Custo Total Unit.:	101.373	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	35,62	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**18.300.140**	**LI:**	**20,27%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**16.046.818**	**Margem Bruta Econômica:**	**42,02%**
TIR:	**67,16%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(11.814.971)**	**Margem Bruta REF:**	**44,97%**
Exposição de Caixa:	**12,00%**	**Δ LI:**	**0,27%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**7.527.050**	**Margem Rasa Econômica:**	**34,14%**
Payback Contingente (21 m):	**21 m/ (0 m)**	**LI Marginal:**	**24,26%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**41.935.759**	**Margem Rasa REF:**	**38,22%**
Payback Consolidado:	**21 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,79%**

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Lançamento Anterior	Atual	Atual vs Lançamento Anterior	Δ%
Data Estudo:	janeiro-24	janeiro-25	12 Meses	N/A
Lançamento:	fevereiro-24	janeiro-25	11 Meses	N/A
Uhs:	480	597	117	24,4%
Preço Nominal:	188.360	217.581	29.220	15,5%
Preço Raso:	165.241	193.776	28.535	17,3%
Preço Nominal Inflacionado:	197.276	229.889	32.613	16,5%
Preço Raso Inflacionado:	173.063	204.759	31.696	18,3%
Renda Média:	2.431	2.534	102	4,2%
Ato:	0,4	0,9	0,5	109,7%
FGTS:	0,4	0,6	0,2	41,6%
VSO:	19	16	(3)	-13,5%
VSO2:	19	16	(3)	-13,5%
ITBI/Emol. (Unit):	2.761	4.007	1.246	45,1%
Avaliação:	192.503	204.302	11.798	6,1%
Cond. Financiamento:	98,4%	96,5%	-1,9 p.p.	-1,9%
Percentual Pró-Soluto:	98,2%	89,5%	-8,7 p.p.	-8,9%
Percentual utilização TCD:	94,7%	94,3%	-0,4 p.p.	-0,4%
Prazo construção F1:	12	18	6	50,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	15	23	8	53,3%
Custo Total Inf (uh):	115.805	127.865	12.060	10,4%
Custo Construção:	81.293	101.373	20.080	24,7%
Fração de construção:	43%	46,6%	3,4 p.p.	8,0%
INCC Folha Rosto:	1.088,31	1.153,73	65	6,0%
Custo Terreno:	8.118.971	4.475.735	(3.643.236)	-44,9%
Custo Relacionados a Terreno (uh):	1.025	1.840	815	79,5%
Fração do Terreno[1]:	8,3% / 51,4%	3,3% / 49,9%	-5,0 p.p.	-60,2%
Custo de Incorp. (s/ ITBI/ Emolum.) por uh:	5.092	-2.033	(7.125)	-139,9%
ITBI/Emol. (Total):	1.325.110	2.391.893	1.066.784	80,5%
Custo do Ciclo:	15.933	14.254	(1.679)	-10,5%
Lucro Imobiliário:	18,0%	20,3%	2,2 p.p.	12,4%
LI Marginal:	20,8%	24,3%	3,5 p.p.	16,9%
Exposição de caixa:	15,3%	12,0%	-3,3 p.p.	-21,3%
TIR:	58,2%	67,2%	8,9 p.p.	15,3%
Margem Bruta Econômica:	38,8%	42,0%	3,2 p.p.	8,3%
Margem Rasa Econômica:	29,9%	34,1%	4,3 p.p.	14,4%
Margem Contribuição Econômica:	27,4%	30,8%	3,4 p.p.	12,2%
Payback Contingente (Régua 21 m):	16 m/ (-6 m)	21 m/ (0 m)	5	31,3%
Payback Consolidado:	17 Meses	21 Meses	4 Meses	23,5%

[1] Valor do terreno contratual

DRE – Cenário Aprovação

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Acqua Danúbio		F1 C/ VAGA E C/ CHURRAS		F1 S/ VAGA E C/ CHURRAS		F1 S/ VAGA E S/ CHURRAS		F2 C/ VAGA E C/ CHURRAS		F2 S/ VAGA E S/ CHURRAS	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	133.687	100,0%	17.795	100,0%	9.164	100,0%	56.303	100,0%	15.270	100,0%	35.156	100,0%
PIS/COFINS	(2.039)	1,5%	(244)	1,4%	(126)	1,4%	(771)	1,4%	(272)	1,8%	(626)	1,8%
Custo Total	(76.335)	58,0%	(10.063)	57,3%	(5.431)	60,1%	(34.613)	62,3%	(7.543)	50,3%	(18.686)	54,1%
Custo Terreno	(4.476)	3,4%	(585)	3,3%	(315)	3,5%	(2.009)	3,6%	(450)	3,0%	(1.117)	3,2%
Custo Relacionados a Terreno	(1.098)	0,8%	(141)	0,8%	(76)	0,8%	(486)	0,9%	(114)	0,8%	(282)	0,8%
Custos de Incorporação	(1.178)	0,9%	(142)	0,8%	(88)	1,0%	(523)	0,9%	(135)	0,9%	(290)	0,8%
Custo de Construção	(69.583)	52,9%	(9.195)	52,4%	(4.951)	54,8%	(31.594)	56,9%	(6.845)	45,6%	(16.997)	49,2%
Lucro Bruto Econômico	55.313	42,0%	7.488	42,7%	3.608	39,9%	20.919	37,7%	7.455	49,7%	15.844	45,9%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	55.313	42,0%	7.488	42,7%	3.608	39,9%	20.919	37,7%	7.455	49,7%	15.844	45,9%
Despesas de Selling	(11.710)	8,9%	(1.559)	8,9%	(804)	8,9%	(4.927)	8,9%	(1.341)	8,9%	(3.079)	8,9%
Contingência	(3.075)	2,3%	(409)	2,3%	(211)	2,3%	(1.295)	2,3%	(351)	2,3%	(809)	2,3%
Margem de Contribuição	40.528	30,8%	5.519	31,4%	2.593	28,7%	14.697	26,5%	5.763	38,4%	11.956	34,6%
IR e CSLL	(1.668)	1,2%	(199)	1,1%	(103)	1,1%	(631)	1,1%	(223)	1,5%	(512)	1,5%
Margem Líquida	38.860	29,5%	5.320	30,3%	2.490	27,6%	14.066	25,3%	5.540	36,9%	11.444	33,1%
Lucro Bruto REF	102.806	45,0%	100.578	44,1%	90.917	41,6%	81.968	39,1%	133.361	51,8%	113.776	47,8%
Lucro Raso REF	77.676	38,2%	76.264	37,4%	66.645	34,3%	58.737	31,5%	107.139	46,3%	87.241	41,3%

R$ Mil - VPL - Compra	Acqua Danúbio		F1 C/ VAGA E C/ CHURRAS		F1 S/ VAGA E C/ CHURRAS		F1 S/ VAGA E S/ CHURRAS		F2 C/ VAGA E C/ CHURRAS		F2 S/ VAGA E S/ CHURRAS	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	90.296	100,0%	12.938	100,0%	6.539	100,0%	41.355	100,0%	8.873	100,0%	20.591	100,0%
PIS/COFINS	(1.338)	1,5%	(175)	1,3%	(88)	1,3%	(558)	1,3%	(156)	1,8%	(361)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(70.658)	78,3%	(9.905)	76,6%	(5.296)	81,0%	(33.666)	81,4%	(6.317)	71,2%	(15.474)	75,1%
Custo Terreno	(3.971)	4,4%	(519)	4,0%	(279)	4,3%	(1.783)	4,3%	(399)	4,5%	(991)	4,8%
Custo Relacionados a Terreno	(1.232)	1,4%	(159)	1,2%	(86)	1,3%	(546)	1,3%	(127)	1,4%	(315)	1,5%
Custos de Incorporação	(1.245)	1,4%	(156)	1,2%	(94)	1,4%	(572)	1,4%	(131)	1,5%	(293)	1,4%
Custo de Construção	(52.656)	58,3%	(7.420)	57,4%	(3.996)	61,1%	(25.496)	61,7%	(4.520)	50,9%	(11.225)	54,5%
Despesas de Selling	(9.315)	10,3%	(1.345)	10,4%	(686)	10,5%	(4.298)	10,4%	(898)	10,1%	(2.089)	10,1%
Contingência	(1.143)	1,3%	(163)	1,3%	(84)	1,3%	(515)	1,2%	(116)	1,3%	(266)	1,3%
IR e CSLL	(1.095)	1,2%	(143)	1,1%	(72)	1,1%	(457)	1,1%	(127)	1,4%	(296)	1,4%
Lucro Imobiliário	18.300	20,3%	2.859	22,1%	1.155	17,7%	7.131	17,2%	2.400	27,0%	4.756	23,1%

Obrigado
