Tenda

sua próxima conquista

Book de Escritura

Regional: RS

Projeto: Parque Ventura III

Data Comitê: 28/02/2025

Atualização de Material

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Anterior	Atual	Atual vs atual - anterior
Data Estudo:	fevereiro-25	fevereiro-25	0 Meses
Lançamento:	março-25	março-25	0 Meses
Preço Nominal:	215.508	212.253	(3.254)
Preço Raso:	190.558	187.303	(3.254)
Preço Nominal Inflacionado:	239.200	235.567	(3.633)
Preço Raso Inflacionado:	211.462	207.829	(3.633)
Avaliação:	222.687	213.717	(8.970)
Lucro Imobiliário:	24,0%	23,0%	-1,0 p.p.
Régua LI	20,0%	20,0%	0,0 p.p.
Exposição de caixa:	6,9%	7,1%	0,2 p.p.
TIR:	98,3%	92,7%	-5,5 p.p.
Margem Bruta REF:	47,4%	46,6%	-0,8 p.p.
Margem Bruta Econômica:	44,7%	43,9%	-0,9 p.p.
Margem Rasa REF:	40,5%	39,5%	-1,0 p.p.
Margem Rasa Econômica:	36,8%	35,6%	-1,1 p.p.
Margem Contribuição Econômica:	33,5%	32,6%	-0,9 p.p.
Payback Contingente (Régua 21 m):	21 m/ (0 m)	21 m/ (0 m)	0
Payback Consolidado:	21 Meses	21 Meses	0 Meses

Atualização do valor de avaliação.

Comitê Digital – 24.02.2025

Nome	Parque Ventura III - Escritura	Observação - Parque Ventura III
Rodrigo Osmo	Discutir em Comitê	O projeto é um único condomínio, entregue em 3 fases. Temos risco de barulho com os moradores enquanto estivermos executando as fases subsequentes?
Alejandro Octavio Abiusi	Discutir em Comitê	O VSO é o que está no One Page (17) ou no parecer de IM (24)? Entendi que o cheque não foi considerado na precificacao, mas qual é o grau de conforto do Ciclo com esse preço e VSO num cenário em que não exista o cheque? Qual tem sido o valor praticado em cada atributo no único projeto lançado com eles agora?
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	Ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Discutir em Comitê	empreendimento concorrente da MRV tem 1 dorm, varanda, piscina e Garden. Todos os atributos que geram muito valor, ainda mais nesse perfil de renda. Como 1 dorm ainda não conseguimos, não temos como incluir alguns dos demais?

Pergunta Rodrigo Osmo

➢ **Pergunta: O projeto é um único condomínio, entregue em 3 fases. Temos risco de barulho com os moradores enquanto estivermos executando as fases subsequentes?**

R: Sim, o risco existe. Porém, temos histórico recente de empreendimentos Fase 1 entregues, com obras das fases seguintes em andamento, e não tivemos impacto no NPS com menção a este ponto.

Por exemplo:

- Morada do Campo I: Fase 1 entregue em Julho/24 e obra da Fase 2 iniciada em Setembro/24, com forma iniciando em Novembro/24.
- Acqua Sena: Fase 1 entregue em Agosto/24 e obra da Fase 2 iniciada em Novembro/24, com forma iniciando em Janeiro/25.

COD.	EMPREENDIMENTO	REGIONAL	FABRICA	DT AGI	NPS CHAVES +3M	NPS CHAVES +6M	TARGET NPS CHAVES+6M RS	FLOOR NPS CHAVES+6M RS	META CHAVES+6M BR	FLOOR CHAVES+6M BR	Dif Chaves+3m real x target RS	Dif Chaves+6m real x target RS	Dif Chaves+3m real x meta BR	Dif Chaves+6m real x meta BR
UK10	MORADA DO CAMPO I - F1	RS	B	07/2024	7	0	2	-8	-10	-20	ACIMA DA META	ACIMA DO FLOOR	ACIMA DA META	ACIMA DA META
UK60	ACQUA SENA - F1	RS	B	09/2024	0		2	-8	-10	-20	ACIMA DO FLOOR		ACIMA DA META	

Os comentários detratores destes empreendimentos (e demais exemplos na companhia), nas pesquisas NPS, fazem menção a outros itens referentes ao faseamento, onde o principal impacto atualmente não são relacionados ao barulho, mas a existência de algum item de lazer, acessibilidade, estacionamento, área comum que fica restrito a entrega e uso do cliente apenas nas fases seguintes. Temos tomado medidas preventivas para os próximos projetos não apresentarem estas características detratoras.

Perguntas Alejandro Abiusi

- **Pergunta 1: O VSO é o que está no One Page (17) ou no parecer de IM (24)?**

R: VSO One Page é do consolidado (média das 3 fases), no parecer de IM está o VSO somente da primeira fase. Os VSOs respeitam a Regra de Ouro de 18 meses.

Fase 1: 440 unidades; VSO 24;
Fase 2: 253 unidades; VSO 14;
Fase 3: 253 unidades; VSO 14;

- **Perguntas 2 e 3: Entendi que o cheque não foi considerado na precificação, mas qual é o grau de conforto do Ciclo com esse preço e VSO num cenário em que não exista o cheque? Qual tem sido o valor praticado em cada atributo no único projeto lançado com eles agora?**

R: O Cheque não foi considerado por se tratar de cenário aprovação, com VSO 24 para primeira fase (Regra de Ouro), utilizando a ferramenta Vision com os parâmetros usuais da companhia. Ciclo encara o Preço Raso de 193.563 (Sem Cheque), para a primeira fase, como factível, considerando o VSO de 24, dado a amostragem dos 2 primeiros projetos verticais em vendas na Regional (Bolsena e Danúbio). O Parque Ventura III conta ainda com a Varanda, sendo o primeiro projeto da Regional com este atributo. O acréscimo de preço da Varanda está sendo projetado, na precificação de IM, em aproximadamente R$ 17.000/uh (benchmark Vista do Golf). Os deltas de Churrasqueira e Vaga estão utilizando o projeto Bolsena como Benchmark, pois é o único produto com mais de 3 meses de venda com estes atributos + verticalização, da Regional RS.

Empreendimento	Preço Raso (Elasticidade)	Total Uh
Parque Ventura 3 - Fase 1 - Faixa 2	179.181	162
Parque Ventura 3 - Fase 1 - Com Churrasqueira, Sem Varanda E Sem Vaga	186.627	60
Parque Ventura 3 - Fase 1 - Sem Churrasqueira, Com Varanda, Sem Vaga	196.636	64
Parque Ventura 3 - Fase 1 - Com Churrasqueira, Com Varanda, Sem Vaga	206.071	18
Parque Ventura 3 - Fase 1 - Com Churrasqueira, Sem Varanda E Com Vaga	196.044	8
Parque Ventura 3 - Fase 1 - Sem Churrasqueira, Com Varanda, Com Vaga	206.259	56
Parque Ventura 3 - Fase 1 - Com Churrasqueira, Com Varanda, Com Vaga	215.690	72
Ponderado - Fase 1	193.563	440

Atributos	Varanda	Churrasqueira	Vaga
Δ Preço Praticado	18.938	8.617	8.576
Δ Preço Comitê	17.455	7.446	9.416

Perguntas Luiz Mauricio

- **Pergunta: Empreendimento concorrente da MRV tem 1 dorm, varanda, piscina e Garden. Todos os atributos que geram muito valor, ainda mais nesse perfil de renda. Como 1 dorm ainda não conseguimos, não temos como incluir alguns dos demais?**

As unidades de 1 dormitório da MRV são adaptadas para PCD, e o projeto Porto Bello não possui Garden—esse atributo está presente no Poema, da Lottici.

O Parque Ventura 3 já inclui varandas (210 unidades) e churrasqueiras (316 unidades). Adicionar piscina ou unidades Garden exigiria grandes revisões no projeto, que está em fase avançada. Essas mudanças impactariam o cronograma (atraso de ~4 meses numa visão otimista), custos de projetistas e a transição para a operação (PCP).

Inclusão de Piscina: exigiria revisão completa dos projetos hidrossanitário, terraplenagem, legal e de contratação com a CEF.
Inclusão de Garden: afetaria redes do entorno da torre, além de impactar apenas 6% das unidades.

O entendimento da Regional é que o acréscimo de VGV não justificaria o impacto financeiro causado pelo atraso no lançamento (EBITDA e Caixa bianual), visto que o projeto está previsto em BP25 p/ abril/25, sendo parte fundamental dos resultados para o biênio.

A Regional passou pelo processo de reversão de tipologia no ano de 2024, e está em fase de implementação e lançamento dos primeiros projetos verticais, que ainda não contam com todos os atributos que começaram a ser disponibilizados pela área de produto no início de 2025. Estamos em processo de inclusão nos projetos factíveis (sem distúrbios de BP e/ou PCP) que devem ser lançados a partir do 4TRI25.

One Page – Parque Ventura III

Cidade	Canoas	Mancha de demanda	RS - CAN - Canoas
Regional	RS	Cluster MPR	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	Tipo de Aprovação	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura	Versão da VF	Versão 1.0: Fev

[1]

Unidades (% Vagas)	946 (19%)	CA Máx | Proj	2,5 | 2,4
Tipologia	F2E - Concreto	Escritura	fev-25
Fases	3 fases	Lçto | Duração (m)	mar/25 | 61

[2]

Valor Terreno (% VGV)	4.619 (2,3%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
Cash (Correção)	4.619 (IPCA)	%VGV Perm Fin (% Ter)	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	377	VAR (%VGV)	566 (0,3%)

[3]

Custo Construção (%VGV)	92.461 (46,0%)	Indireto Unit.	19.673
Prazo da Obra (meses)	19	Torre Unit.	55.970
Custo Total Unit. (LPU):	97.739 (87)	Infra Unit.	12.524
Início de Obra	set-25	Fundação Unit.	5.928

[4]

Preço Nominal Unit.	212.253	VSO	17
Preço Raso Unit.	187.303	Referência	Vision
Avaliação Unit.	213.717	Renda (% em RET 1%)	2.847 (48,0%)

[5]


Total de Unidades sem o produto
Produto Comitê
Potencial da Mancha
55
25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 45 45 45 45 45 45 38 37 37 37

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Pareceres

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Minutas de Escritura Pública validadas. Due Diligence revalidada e apta à aquisição em janeiro/25.	Ok	
Legalização	Contrapartidas ainda não definidas (sem prejuízo de cronograma de lançamento): EIV aprovado em 26/12/2024, com mitigações a serem definidas (Considerado em Viabilidade Financeira o valor historicamente utilizado como referência pelo município - 700/uh). Com alteração na gestão municipal, a comissão que discute as contrapartidas ainda não foi nomeada. / Pendente aprovação do projeto arquitetônico (Previsão 26/02). / Pendente emissão da Licença de Instalação (previsão 28/02).	Ok com ressalvas	
Produto	Sem Riscos.	Ok	
GETEC	Adequação na Estação Elevatória de esgoto estimada conforme solicitado pela CORSAN	Ok com ressalvas	
Logística	Sem Riscos.	Ok	
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Acreditamos que o Preço é POSSÍVEL, considerando o histórico na Região e novos atributos e Verticalização	Ok	
Estudos Econômicos	Sem Riscos.	OK	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- CAN – Canoas

Lançamento

1. Floratta
2. Acqua Danúbio

LandBank

3. Vinhedos - Pinot | Merlot | Tannat
4. Pq Ventura III
6. Jardim Amarena

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 3 - Verde

Região

Metropolitana

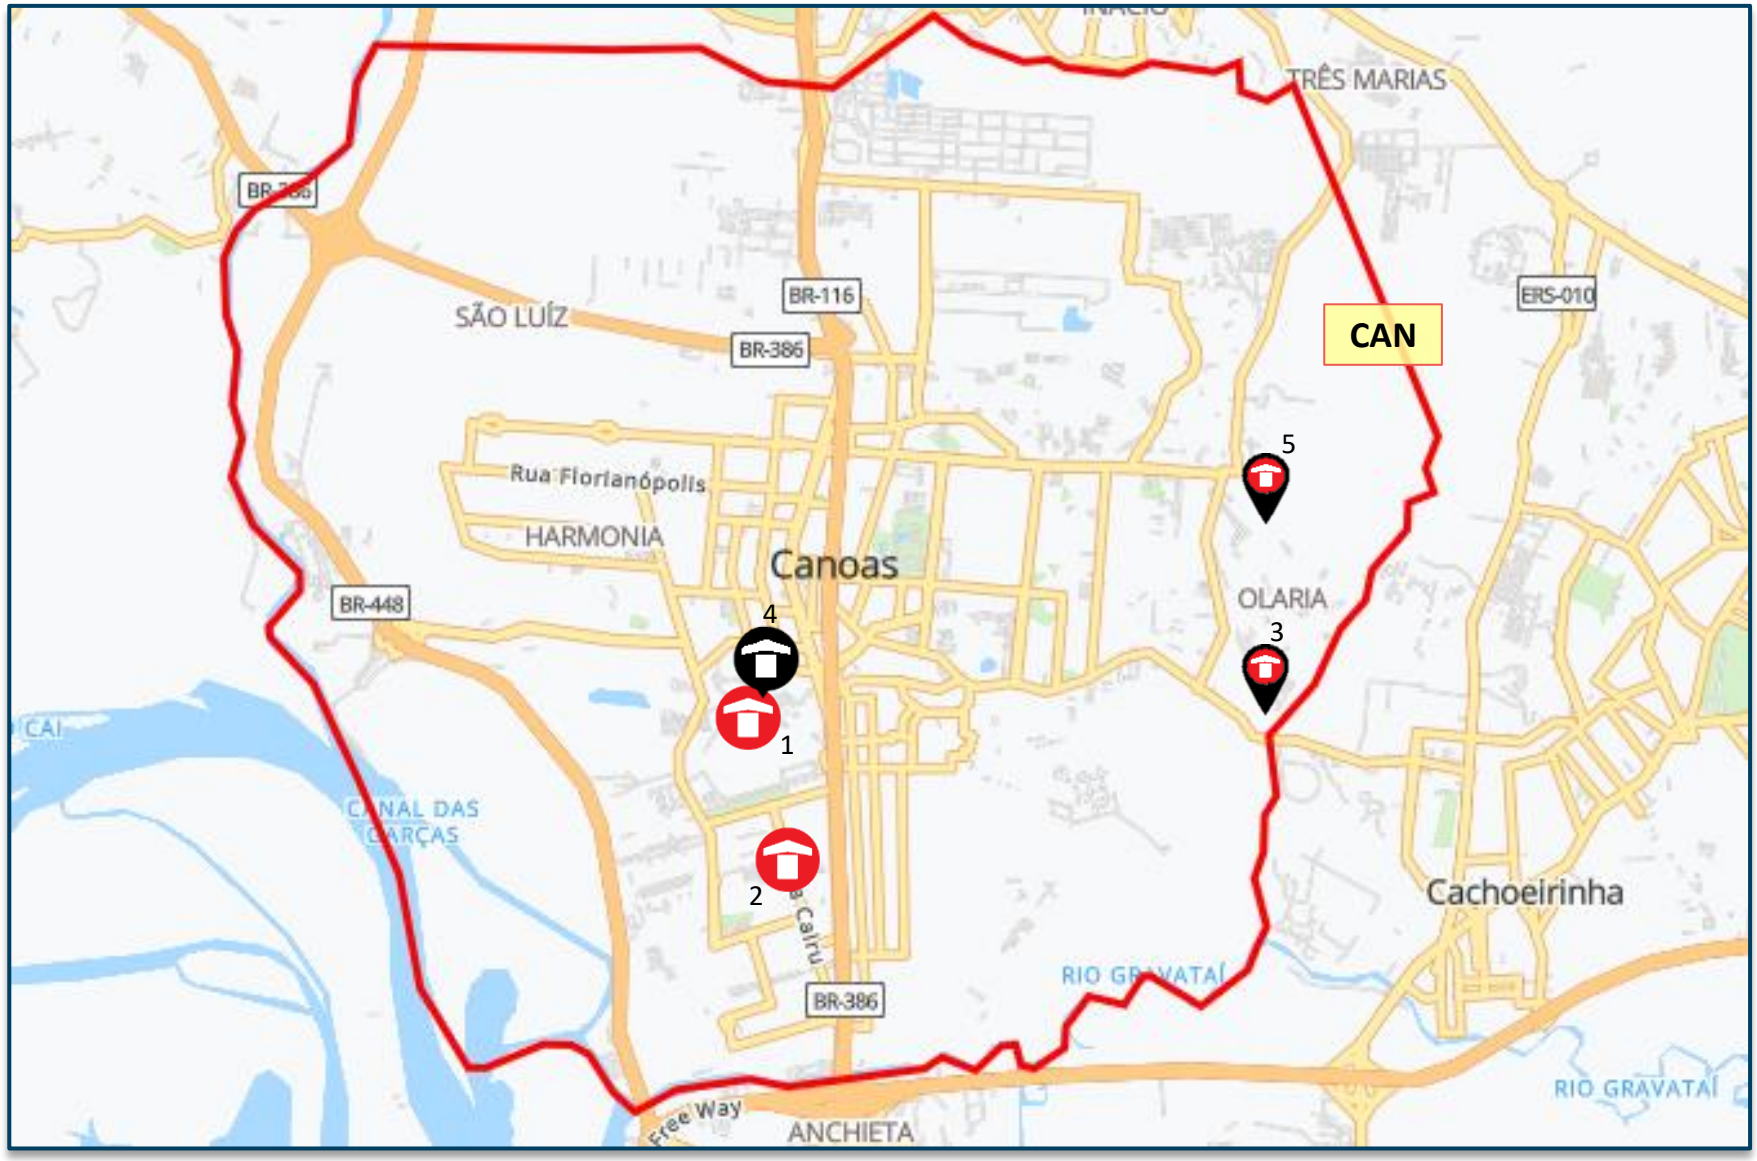

Lançados *LandBank* *Comitê*

BAIRRO MATO GRANDE – CANOAS

PRODUTO

Empreendimento Parque Ventura 3
Escritura

Informações Gerais – Parque Ventura 3		
Terreno	**Área terreno**	13.854,39m²
	Menor poligonal	13.854,39m²
	App/fna	Sim – 1.603,56m²
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Não
	Área liquida	12.250,83m²
	Zoneamento	ZUR 2.2 | ZUC 4
	Ca máximo	ZUR 2.2 = 2,5 | ZUC 4 = 2,0
	Ca projetado	2,43
	Gabarito máximo	T+15
Geral	**Total uh**	946
	Total de vagas	176 Vagas
Tipologia	**Tipologia**	IS2 Flex com elevador
	Gabarito	T+15
	Lâmina	02 16pp e 02 14pp
	Área privativa	35,44m² | 35,64m² | 35,90m² | 35,72m²
Condomínio	**Unidade PCD**	30
	Unidade lazer | técnica	10 | 04
	Torre	04
	Fase	Fase 01 : 440uh | Fase 02 : 253uh | Fase 03-253uh
Lazer	**Lazer coberto**	Salão de Festas Gourmet, Espaço Office, Brinquedoteca, Sport Bar, Espaço Teen, Fitness, Churrasqueira Gourmet
	Lazer descoberto	Play Baby, Play Kids, Quadra Gramada, Chimarródromo, Play Pet, Fitness Externo, Funcional Externo

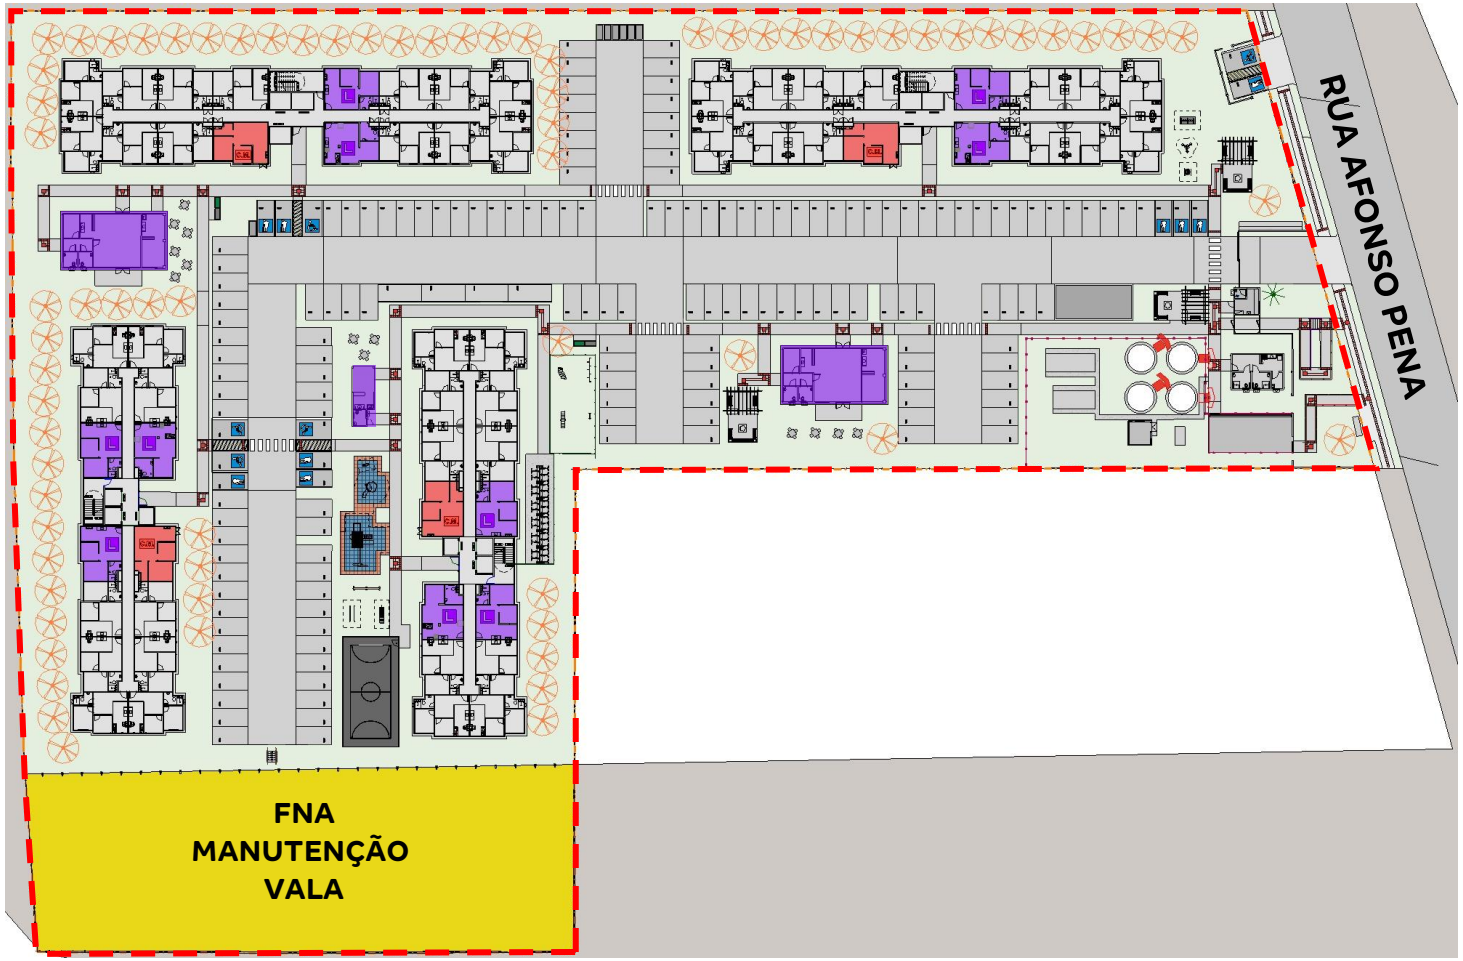

PRODUTO

Empreendimento Parque Ventura 3
Escritura

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	**Supercondomínio**		946 UH
	Acesso Empreendimento		-
	Percurso do pedestre até torre		-
Diferencial produto	**Atributos Infra**	Não	Quadra gramada, chimarródromo
	Atributos Torre	Sim	Varanda com churrasqueira
	Edifício Garagem	Não	-

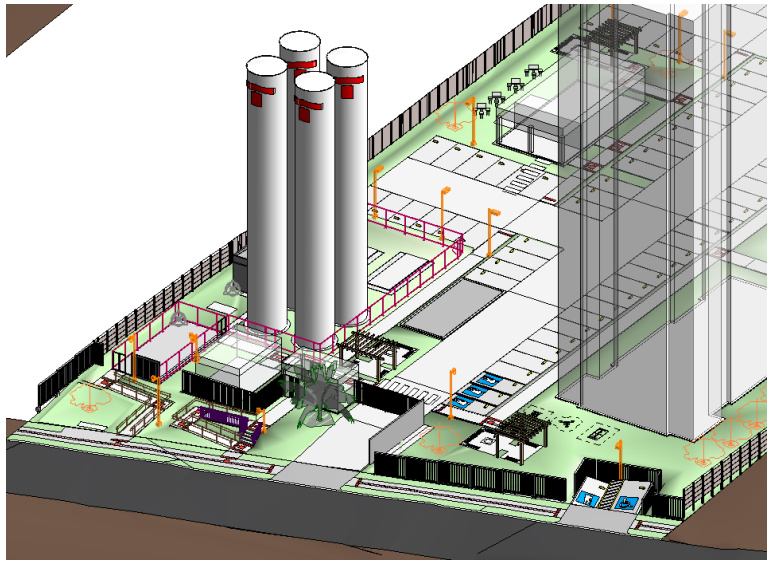

Acesso

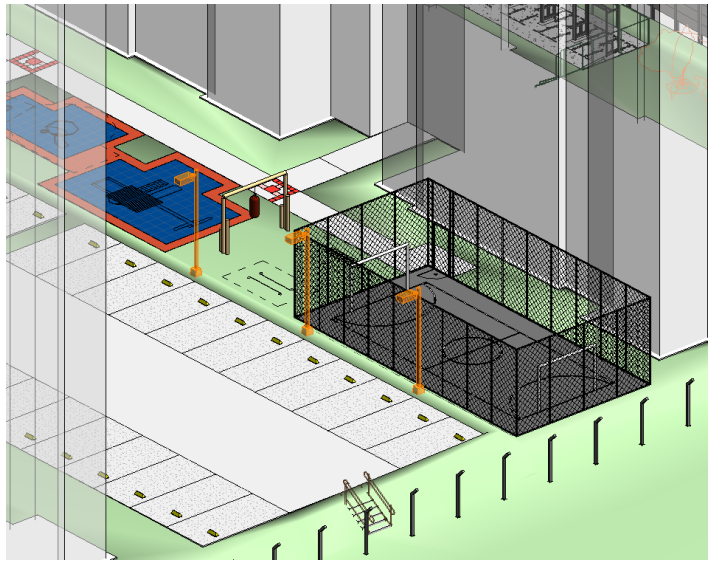

Quadra Gramada

14

Empreendimento Parque Ventura 3
Escritura

Fase 1: 568 uh (sendo 28 U.R) - 273 vagas (sendo 08 pcd e 92 motos)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	01 Bloco (14PP T+15)	220 UH (sendo 5 PCD e 5 idoso)	60 vagas (sendo 1 PCD e 1 carga e descarga)	Fitness externo não foi considerado no módulo 01
Módulo 02	01 Bloco (14PP T+15)	220 UH (sendo 5 PCD e 5 idoso)	39 vagas (sendo 2 PCD e 3 idoso)	
Módulo 03	01 Bloco (16PP T+15)	253 UH (sendo 10 PCD e 10 idoso)	19 vagas (sendo 1 PCD e 2 idoso)	
Módulo 04	01 Bloco (16PP T+15)	253 UH (sendo 10 PCD e 10 idoso)	51 vagas (sendo 1 PCD e 4 idoso)	

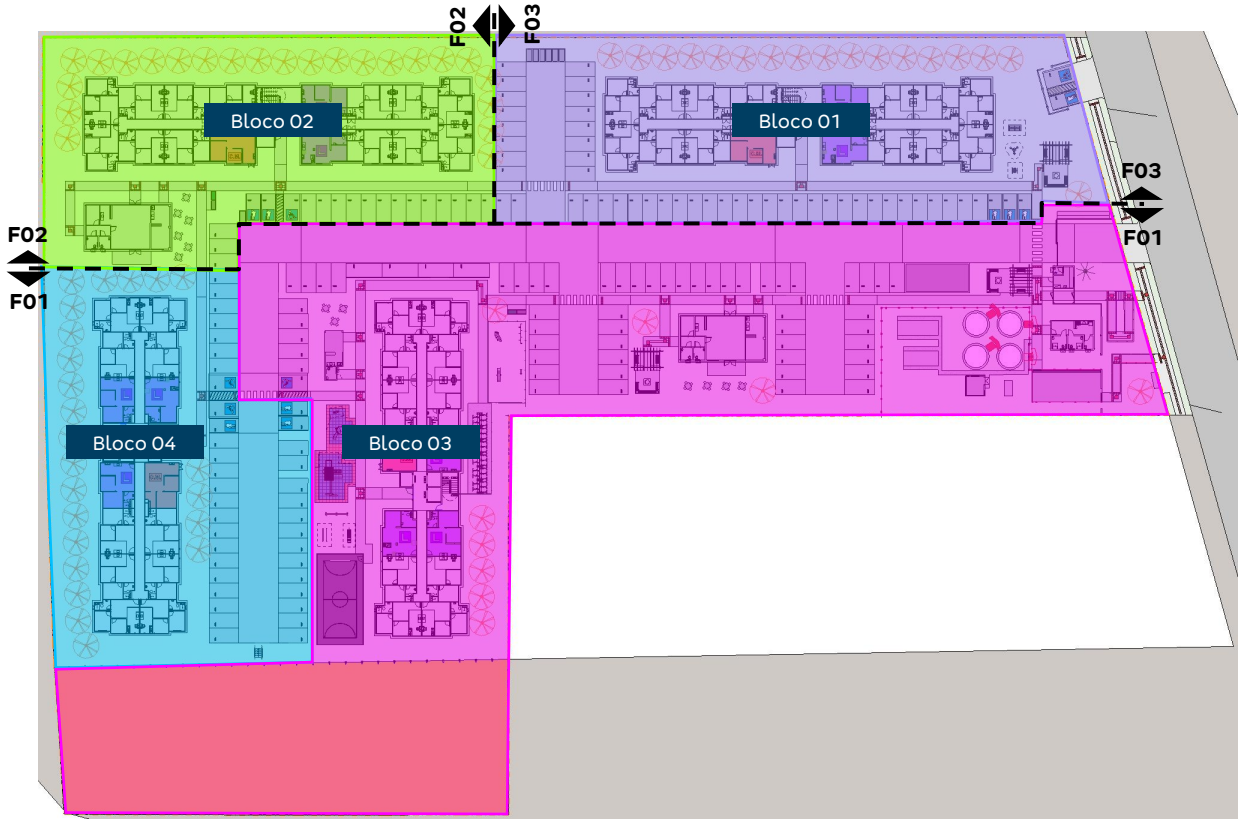

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Condições do Negócio

- **VALOR DO NEGÓCIO**
- **R$ 4.618.791,20 (2,31% do VGV) – atualizado pelo IPCA (Original: 4,370MM)**

- **CONDIÇÃO**
  - **a) <u>100% Cash</u>**
    - i. R$ 4,619MM a serem pagos 48 parcelas mensais e consecutivas de R$ 96.224,82, sendo a primeira com vencimento no ato da outorga da escritura Escritura de Compra e Venda do imóvel.

- **PRAZOS CONTRATUAIS – CVC assinado em OUT/2023**
- Cláusulas Suspensivas com prazo de vencimento de 180 dias (06/2024) – **superado**;
- Cláusulas Resolutivas sem prazo de vencimento – **em andamento (aguarda aprovação do Projeto – previsto p/ 21/02)**;

- **CORREÇÃO MONETÁRIA**
- Índice de reajuste das parcelas será pelo IPCA, a partir da data de assinatura da CVC.
- Índice de reajuste das parcelas será o divulgado 2 meses antes ao efetivo pagamento de cada parcela.

- **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA**
- R$174,8k (3,78% sobre o valor do terreno) a ser pago em 5 parcelas de R$ 34.950,00 cada, a primeira a ser paga 60 dias após a ECV;

- **GARANTIAS**
- **Em favor da Tenda:** N.A.
- **Em favor do Vendedor:** Seguro garantia (cotado no valor de 166,5k – 3,6% do valor do negócio).

➢ CONDIÇÕES RESOLUTIVAS PARA ECV

i. Due Dilligence favorável – **OK**;
ii. Aprovação e Licenciamento do Projeto de Construção com no mínimo 320 unidades **– em andamento (prev. 21/02), aprovação de 946 unidades;**
iii. A existência de passivo ambiental, constatado após elaboração de laudos de cobertura vegetal, levantamento topográfico e planialtimétrico, e de contaminação no solo e/ou no lençol freático – **OK superado**;
iv. A existência de qualquer medida, óbice e/ou empecilho, de natureza administrativa e/ou judicial de forma a impedir a remoção ou manipulação de eventual vegetação local, a qual deverá ser implementada anteriormente a outorga das escrituras públicas definitivas, ou ainda, a exigência de contrapartida financeira para se obter as devidas autorizações de manejo de vegetação – **OK superado, LI aguarda aprovação arquitetônico p/ ser emitida (documento pronto);**
v. Inviabilidade técnica e financeira pela necessidade de execução de rede de água e esgoto que atenda ao empreendimento – **OK superado, reservatório externo inicialmente solicitado, de 2MM de custo p/ implantação, foi removido com sucesso pela equipe de projetos;**
vi. Análise positiva da viabilidade técnica , financeira e comercial do Empreendimento – **em andamento (aprovação do comitê)**;
vii. A não viabilidade das redes de água e esgoto existentes no local, que sejam tidas como insuficientes a garantir a vazão necessária às unidades autônomas que comporão o Empreendimento pretendido – **OK Superado, viabilidades emitidas com economia do reservatório externo**;
viii. a inviabilidade de contratação de financiamento pela instituição financeira para construção do empreendimento antes mencionado, consoante os termos e condições do Programa do Governo Federal Casa Verde Amarela ou qualquer outro programa que venha a substituí-lo **– em andamento, sem riscos (primeiro ofício LAE sem apontamentos relevantes);**

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Comitê

	PQ. VENTURA III F1 REV03	PQ.VENTURA III F2 REV03	PQ.VENTURA III F3 REV03	PQ. VENTURA III R.03 CONSOLIDADO	ACQUA DANUBIO ESCRITURA| REV07 CONSOLIDADO	QUINTA DO LAGO (BOLSENA) R16	BP 2025 PQ. VENTURA III CONSOLIDADO
Torres	2	1	1	4	3	1	4
Unidades Construídas	448	256	256	960	390 | 210	256	960
Unidades Vendidas	440	253	253	440 | 253 | 253	388 | 209	251	440 | 253 | 253
Total Unidades Vendidas	440	253	253	946	597	251	946
Condomínios (qta.)	1	1	1	1	1	1	1
Cidade	Canoas - RS	Canoas - RS	Canoas - RS	Canoas - RS	Canoas - RS	Porto Alegre - RS	Canoas - RS
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	-	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	2 Torres | T+15 | 14PP | C2A	-	-	2 Torres | T+15 | 14PP | C2A	1 Torre | T+14 | 14PP | C2A	1 Torre | T+15 | 16PP | C3A	2 Torres | T+15 | 14PP | C2A
Tipologia	-	1 Torre | T+15 | 16PP | C3A	1 Torre | T+15 | 16PP | C3A	1 Torre | T+15 | 16PP | C3A	1 Torre | T+14 | 12PP | C2A	-	1 Torre | T+15 | 16PP | C3A
Varanda	210	-	-	210	-	-	-
Churrasqueira	160	80	80	320	180	80	320
Projeto Infra	EP	EP	EP	EP	AP	AP	AP
Projeto Torre	EP	EP	EP	EP	PR	PR	PR
Mês Base	fevereiro-25	fevereiro-25	fevereiro-25	fevereiro-25	janeiro-25	dezembro	agosto-24
Incc	1.169,116	1.169,116	1.169,116	1.169,116	1.159,536	1.149,170	1.134,77
LVS	dezembro-24	dezembro-24	dezembro-24	dezembro-24	novembro-25	outubro-24	
Indiretos	dezembro-24	dezembro-24	dezembro-24	dezembro-24	novembro-25	outubro-24	
Base de Preço	LPU 87	LPU 87	LPU 87	LPU 87	LPU 86	LPU 85	
Takt	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	19	14	14	19 | 14 | 14	18 | 14	17	19 | 15 | 15
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 100.491	R$ / UND R$ 90.044	R$ / UND R$ 89.875	R$ / UND R$ 94.858	R$ / UND R$ 99.091	R$ / UND R$ 103.640	R$ / UND R$ 86.054
Indireto	R$ 19.247	R$ 20.046	R$ 20.040	R$ 19.673	R$ 20.812	R$ 23.760	R$ 18.549
Torre	R$ 56.954	R$ 55.397	R$ 54.831	R$ 55.970	R$ 56.180	R$ 55.042	R$ 48.455
Infra	R$ 17.060	R$ 8.396	R$ 8.766	R$ 12.524	R$ 14.298	R$ 16.354	R$ 13.645
Fundação	R$ 5.795	R$ 6.038	R$ 6.050	R$ 5.928	R$ 6.433	R$ 7.426	R$ 4.935
EEE							
ETE							
Contenção					R$ 45	R$ 111	
Terraplenagem	R$ 1.435	R$ 167	R$ 187	R$ 762	R$ 1.323	R$ 946	R$ 471
CUSTO TOTAL II	R$ 2.881	R$ 2.881	R$ 2.881	R$ 2.881	R$ 2.282	R$ 9.288	R$ 3.026
Urbanização					R$ 906	R$ 6.572	R$ 64
Drenagem	R$ 83	R$ 83	R$ 83	R$ 83		R$ 958	R$ 83
Extensão de Rede Elétrica	R$ 32	R$ 32	R$ 32	R$ 32		R$ 496	R$ 32
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 2.767	R$ 2.767	R$ 2.767	R$ 2.767	R$ 1.376	R$ 1.262	R$ 2.847
CUSTO TOTAL III					R$ 0	R$ 16	
Incorridos					R$ 0	R$ 16	
CUSTO TOTAL IV						R$ 1.500	
Aprendizado						R$ 1.500	
CUSTO TOTAL V							R$ 2.696
Atualização por INCC							R$ 2.696
CUSTO TOTAL I+II	R$ 103.372	R$ 92.926	R$ 92.756	R$ 97.739	R$ 101.373	R$ 112.928	R$ 89.080
CUSTO TOTAL I AO IV	**R$ 103.372**	**R$ 92.926**	**R$ 92.756**	**R$ 97.739**	**R$ 101.373**	**R$ 114.444**	**R$ 91.776**

Custo de Construção

	PQ. VENTURA III R.03 CONSOLIDADO	BP 2025 PQ. VENTURA III CONSOLIDADO
Torres	4	4
Unidades Construídas	960	960
Unidades Vendidas	440 | 253 | 253	440 | 253 | 253
Total Unidades Vendidas	946	946
Condomínios (qta.)	1	1
Cidade	Canoas - RS	Canoas - RS
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	2 Torres | T+15 | 14PP | C2A	2 Torres | T+15 | 14PP | C2A
Tipologia	1 Torre | T+15 | 16PP | C3A	1 Torre | T+15 | 16PP | C3A
Varanda	210	-
Churrasqueira	320	320
Projeto Infra	EP	AP
Projeto Torre	EP	PR
Mês Base	fevereiro-25	agosto-24
Incc	1.169,116	1134,774
LVS	dezembro-24	
Indiretos	dezembro-24	
Base de Preço	LPU 87	
Takt	2x2	2x2
Prazo (mês)	19 | 14 | 14	19 | 15 | 15

CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 94.858	R$ / UND R$ 86.054	DIF R$ 8.804
Indireto	R$ 19.673	R$ 18.549	R$ 1.124
Torre	R$ 55.970	R$ 48.455	R$ 7.515
Infra	R$ 12.524	R$ 13.645	-R$ 1.120
Fundação	R$ 5.928	R$ 4.935	R$ 993
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Terrapplenagem	R$ 762	R$ 471	R$ 292
CUSTO TOTAL II	R$ 2.881	R$ 3.026	-R$ 144
Urbanização	R$ 0	R$ 64	-R$ 64
Drenagem	R$ 83	R$ 83	R$ 0
Extensão de Rede Eletrica	R$ 32	R$ 32	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 2.767	R$ 2.847	-R$ 81
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 2.696	-R$ 2.696
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 2.696	-R$ 2.696
CUSTO TOTAL	R$ 97.739	R$ 91.776	R$ 5.964

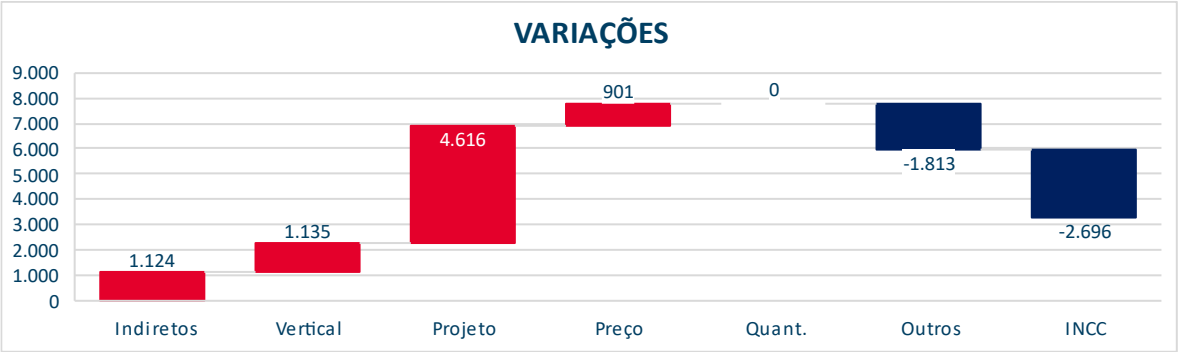

INDIRETOS
+360 – SLQA e Tela Fachadeira
+309 – Ensaios de estaca
+293 – Operação de canteiro
+170 – Implantação de canteiro

VERTICAL
+1135 - Retroalimentação e inclusão estepes

PROJETO
+1264 – Reservatório Metálico
+993 – Fundação (9m – 12m 50cm-70/80cm)
+ 843 – Ar condicionado (Exaustão churrasqueira e insuflamento hall)
+292 – Terraplanagem
+262 – Esquadria de alumínio (porta sacada)
+130 – Esquadria de ferro (peitoril sacada)
+120 – Viário

PREÇOS
+129 – Ferragens porta madeira + +85 – Louças e Metais

OUTROS
+3631 - Torre
-2748 – Infra

INCC
-2696

Custo de Construção

	PQ. VENTURA III R.03 CONSOLIDADO	BP 2025 PQ. VENTURA III CONSOLIDADO	
Torres	4	4	
Unidades Construídas	960	960	
Unidades Vendidas	440 | 253 | 253	440 | 253 | 253	
Total Unidades Vendidas	946	946	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Canoas - RS	Canoas - RS	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	2 Torres | T+15 | 14PP | C2A	2 Torres | T+15 | 14PP | C2A	
Tipologia	1 Torre | T+15 | 16PP | C3A	1 Torre | T+15 | 16PP | C3A	
Varanda	210	-	
Churrasqueira	320	320	
Projeto Infra	EP	AP	
Projeto Torre	EP	PR	
Mês Base	fevereiro-25	agosto-24	
Incc	1.169,116	1134,774	
LVS	dezembro-24		
Indiretos	dezembro-24		
Base de Preço	LPU 87		
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	19 | 14 | 14	19 | 15 | 15	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 94.858	R$ / UND R$ 86.054	DIF **R$ 8.804**
Indireto	R$ 19.673	R$ 18.549	**R$ 1.124**
Torre	R$ 55.970	R$ 48.455	**R$ 7.515**
Infra	R$ 12.524	R$ 13.645	-R$ 1.120
Fundação	R$ 5.928	R$ 4.935	**R$ 993**
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Terrapplenagem	R$ 762	R$ 471	R$ 292
CUSTO TOTAL II	R$ 2.881	R$ 3.026	-R$ 144
Urbanização	R$ 0	R$ 64	-R$ 64
Drenagem	R$ 83	R$ 83	R$ 0
Extensão de Rede Eletrica	R$ 32	R$ 32	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 2.767	R$ 2.847	-R$ 81
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 2.696	-R$ 2.696
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 2.696	-R$ 2.696
CUSTO TOTAL	R$ 97.739	R$ 91.776	**R$ 5.964**

INDIRETOS

+360 – SLQA e Tela Fachadeira (solicitados por logística)
+309 – Ensaios de estaca (Conforme contratação morada do campo 2)
+293 – Operação de canteiro (Considerando munk todo período, conforme fabrica)
+170 – Implantação de canteiro (Aumento preço containers)

TORRE

+3631 – Instalações Torre (considerando conf. obras verticais de São Paulo)
+1135 – Vertical - Retroalimentação e inclusão estepes (LVS)
+ 843 – Ar condicionado (Exaustão churrasqueira e insuflamento hall), conf. projeto
+289 – Fita intumescente (diretriz pci)
+262 – Esquadria de alumínio (porta sacada), conf. Projeto
+256 – Instalações (elétrica exaustão)
+136 – Piso acústico (preço)
+130 – Esquadria de ferro (peitoril sacada) , conf. Projeto
+129 – Ferragens porta madeira (preço por inclusão das ferragens)
+86 – Revest. Cerâmico (considerando 1,5 nas paredes do banheiro, conf. Projeto)
+ 85 – Louças e Metais (preço)
+ 81 – Estrutura Formas (preço)
+ 76 – Consumo de formas (preço)
+73 – Impermeabilização (preço)
+66 – Cobertura (preço)

INFRA

-2748 – Instalações Infra (considerando conf obras verticais de São Paulo)
+1264 – Reservatório Metálico (projeto)
+120 – Viário (projeto)
+ 85 – Esquadrias de ferro – fechamentos de projeto
+ 81 – Outras instalações – Preço
+ 80 – Paisagismo – Equipamentos preço

FUNDAÇÃO

+993 – Fundação (aumento do diâmetro das estacas de 50cm, 70cm e 80cm para somente 70cm e 80cm e aumento na profundidade de 9m para 12m)

TERRAPLANAGEM

+292 – Revisão de projeto

CUSTO II
EXTENSÃO DE REDE

-81 – Extensão de rede Hidráulica (substituição de fornecimento de novo reservatório de água prevendo nova EEE, solicitada pela CORSAN)

INCC

-2696

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Existe viabilidade técnica para abastecimento de água. Necessário extensão de rede com 500m aproximadamente e instalação de reservatório externo.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Existe viabilidade técnica para abastecimento de esgoto. Necessário a execução de extensão de rede com 300m aproximadamente.

SISTEMA DE DRENAGEM
FNA de Drenagem.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Não tem viabilidade.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado execução de calçada no entorno de empreendimento.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 06/2024, com validade em 06/2027.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 06/2024, com validade em 06/2027.

Drenagem:
- FNA de Drenagem.

Elétrica:
- Há viabilidade.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado execução de calçada em torno do empreendimento.

Logística

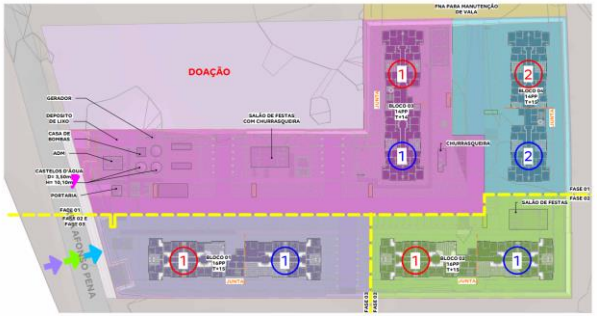

TENDAS_PERÍODOS					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_INFLAMÁVEIS (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01, 02 E 03
_TENDA_TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01, 02 E 03
_TENDA_TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01, 02 E 03
_TENDA_TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01, 02 E 03
_TENDA_TENDA EXTRA (LOG)	1	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01, 02 E 03
_TENDA_TENDA MOLDADOR (LOG)	1	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASES 01, 02 E 03

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTITATIVO	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_BOBCAT (LOG)	1 EQUIP POR FASE	-	-	-	TODO PERÍODO	+15 DIAS	FASES 01, 02 E 03
_TENDA_BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)	VARIÁVEL	-	-	-	TODO PERÍODO	-	FASES 01, 02 E 03
_TENDA_CAMINHÃO MUNK (LOG)	1 EQUIP POR FASE	-	-	-	MEIO PERÍODO	-	FASES 01, 02 E 03
_TENDA_CREMALHEIRA PCT (LOG)_R01	2 EQUIP	4 MOB	4 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01, 02 E 03
_TENDA_MINIGRUA (LOG)	2 EQUIP	8 MOB (4 TORRES)	8 DESMOB (4 TORRES)	-	TODO PERÍODO	-	FASES 01, 02 E 03

VIVÊNCIA - CONTAINERS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE CONTAINERS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_CONTAINER PORTARIA (LOG)	1 MÓDULO COM SANITÁRIO	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01, 02 E 03
_TENDA_CONTAINER PORTARIA (LOG)	1 MÓDULO COM SANITÁRIO	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 02 E 03
_TENDA_CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	8 MÓDULOS	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	FASES 01, 02 E 03
_TENDA_VIVÊNCIA MODULAR RS (LOG)	20 MÓDULOS	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASES 01, 02 E 03

PRÉ FORMA

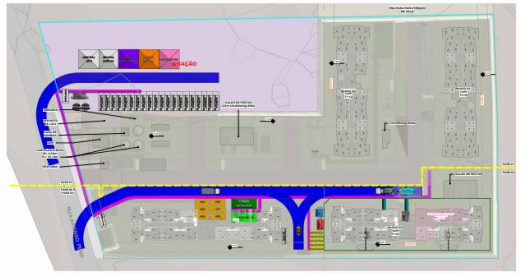

ESTRUTURA E ACABAMENTO-F2

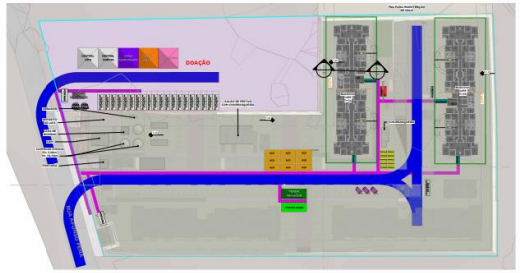

ESTRUTURA E ACABAMENTO-F1

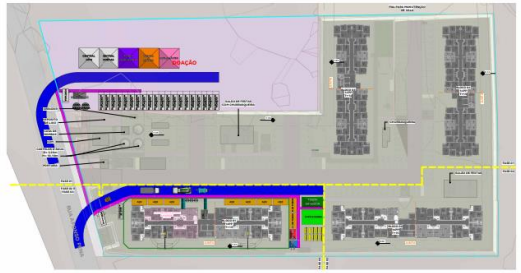

ESTRUTURA E ACABAMENTO-F3

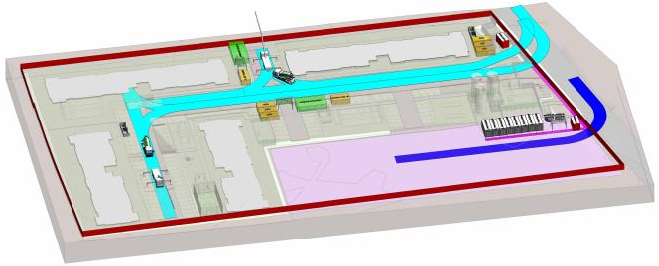

VISTA 3D - PRÉ FORMA

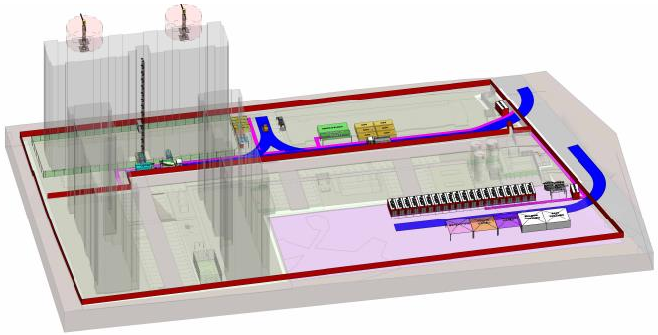

VISTA 3D - ESTRUTURA E ACAB.F2

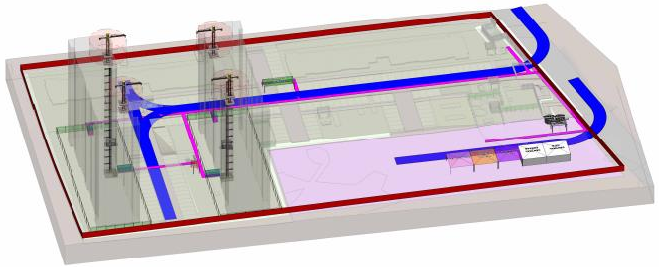

VISTA 3D - ESTRUTURA E ACAB.F1

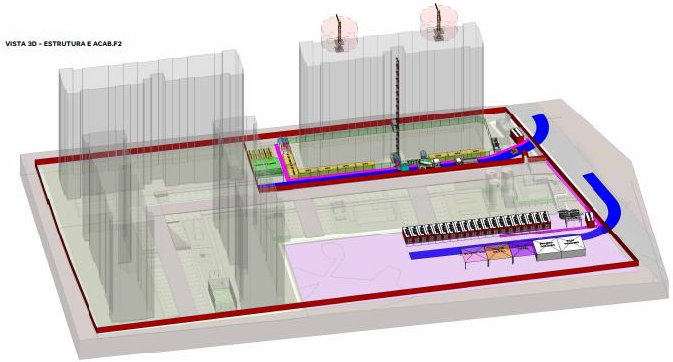

VISTA 3D - ESTRUTURA E ACAB.F3

Logística

PARQUE VENTURA III - RS

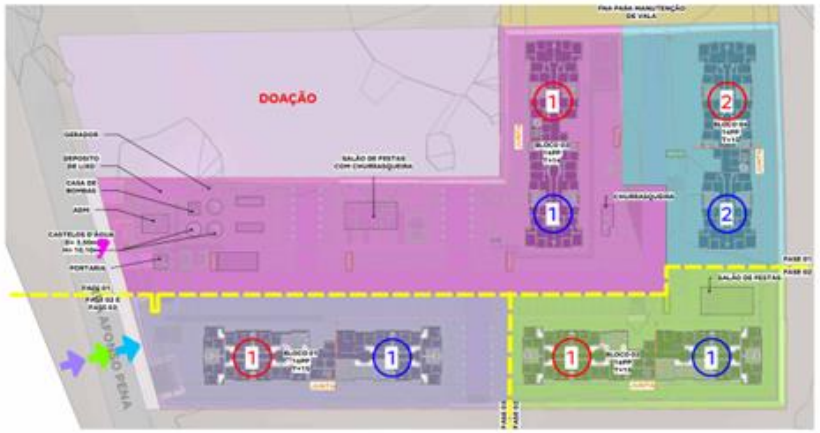

PRÉ FORMA

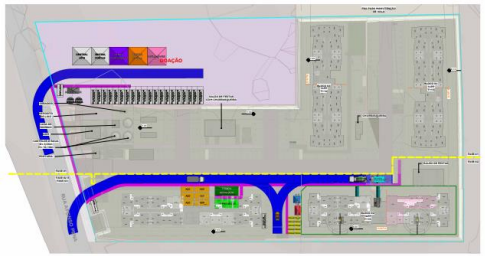

ESTRUTURA E ACABAMENTO-F2

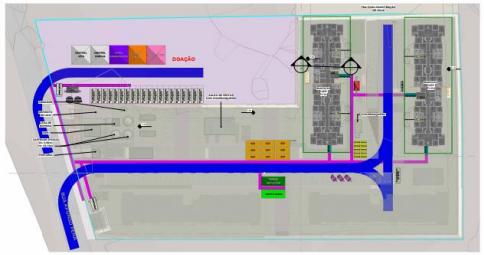

ESTRUTURA E ACABAMENTO-F1

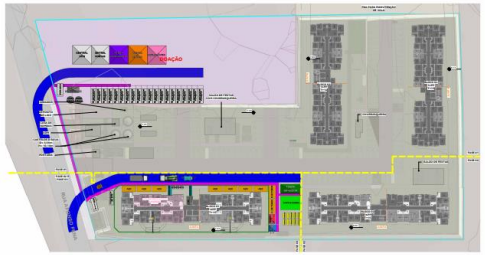

ESTRUTURA E ACABAMENTO-F3

VISTA 3D - PRÉ FORMA

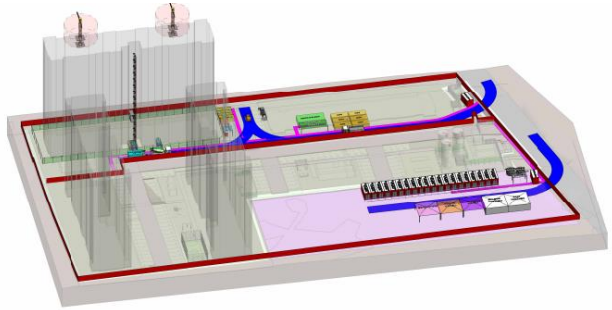

VISTA 3D - ESTRUTURA E ACAB.F2



VISTA 3D - ESTRUTURA E ACAB.F1

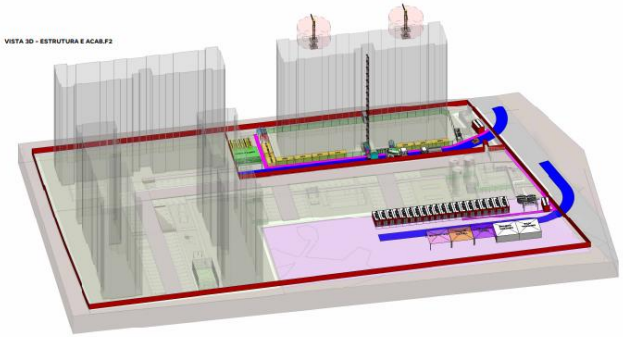

VISTA 3D - ESTRUTURA E ACAB.F3

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **LEGALIZAÇÃO**	CONFORME ALINHADO COM DPP, DEVERÁ SER UTILIZADA A ÁREA DE DOAÇÃO INSTITUCIONAL PARA LOCAR A ÁREA OPERACIONAL (CONTAINERS E MATERIAIS), FACILITANDO O ANDAMENTO DA OBRA.
➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CUSTO DE DOIS PORTÕES DE ACESSO, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
➢ **OBRA**	CASO O FORNECEDOR DE ELEVADORES SEJA VILLARTA OU OTIS, PREVER ARMAZENAMENTO NO TÉRREO – 1 APARTAMENTO PARA CADA ELEVADOR E GUIA NO CORREDOR OU INFRA. CASO SEJA OUTRO FORNECEDOR (POR EXEMPLO, KONE), PREVER O ARMAZENAMENTO FORA DA TORRE.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Canoas	CAN	80%	664	55	797	66

Empreendimento	Renda	Lançamento	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Acqua Danubio F1	2.498	jan-25	25	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	13					
Parque Ventura III	**3.090**	**mar-25**		**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**20**						
Parque Ventura III - F2	**3.090**	**abr-26**															**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**
Jardim Amarena F1	2.421	dez-25											25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Acqua Danubio F2	2.576	jun-26																		12	12	12	12	12
Total de Vendas Lançados			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**25**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**50**	**50**	**50**	**50**	**75**	**75**	**75**	**75**	**89**	**79**	**52**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Canoas	CAN	80%	664	55	797	66

Empreendimento	Renda	Lançamento	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Acqua Danubio F1	2.498	jan-25	25	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	13					
Parque Ventura III	**3.090**	**mar-25**		**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**8**		
Parque Ventura III - F2	**3.090**	**set-26**																				**14**	**14**	**14**
Jardim Amarena F1	2.421	dez-25											25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Acqua Danubio F2	2.576	jun-26																		12	12	12	12	12
Total de Vendas Lançados			**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**25**	**49**	**49**	**49**	**49**	**49**	**44**	**44**	**44**	**44**	**69**	**69**	**69**	**69**	**69**	**69**	**62**	**61**	**61**	**59**	**51**	**51**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Parque Ventura III | Mapa Concorrência

		Parque Ventura III	Residencial Porto Bello	Poema Condomínio Residencial
		TENDA	MRV	Lottici
	Distância Tenda (km)		2,75km	2,2km
Região 1 Km	População	15.742	18.674	15.363
	Dens. Demográfica	5.043	5.965	4.908
	Renda (R$)	7.691	6.287	5.344
	Classe Social	B1 (8.1k a 16k)	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)
	PEA Dia	8.077	12.963	6.119
Quantitativo	Lançamento	mar/25	set/21	ago/22
	Unidades	440	480	240
	Estoque	440	84	42
	VSO	24	10	7
	Stockout	18	9	6
	Preço Nominal (R$)	218.295	256.240	227.000
	Preço CEF (R$)	171.731	204.992	181.600
	Renda Comprador (R$)	3.061	3.400	3.620
	Dif Tenda (R$)		-339	-559
	Factibilidade		●	●
Qualitativo	Condomínios	1	1	1
	Torres	3	4	2
	Gabarito	T+15	T+14	T+5
	Plantas (m²)	36m²	39,88m² e 46,48m²	49m² 50m² e 86m²
	Tipologia	2 Dorms	1 e 2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Não	Garden
	Varanda	Sim	Sim	Não
	Suite	Não	Não	Não
	Dif. Entrega	Não	Equipado e Decorado	Equipado e Decorado
	Vagas	31% de Vagas	Com Vaga	Com Vaga
	Lazer	Chimarródromo, Churrasqueira Gourmet, Fitness Externo, Funcional Externo, Playbaby, Playkids, Playpet, Quadra descoberta, Salão de festas com churrasqueira Salão de festas gourmet, Espaço Teen, Brinquedoteca (2), Fitness, Espaço Office, Sport Bar.	Brinquedoteca, Climatização, Fitness Center, Piscina infantil, Praça, Quadra, Sauna Seca,	Tem Garden, Brinquedoteca, Churrasqueria, Espaço delivery, Piscina, Piscina infantil, Pista caminhada, Quadra Poliesportiva, Quiosque, Salão de Festas,

Farol Renda
● Acima de 300
● Entre 0 e 300
● Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- Os concorrentes possuí target de preço e renda superior ao previsto para o Parque Ventura III.

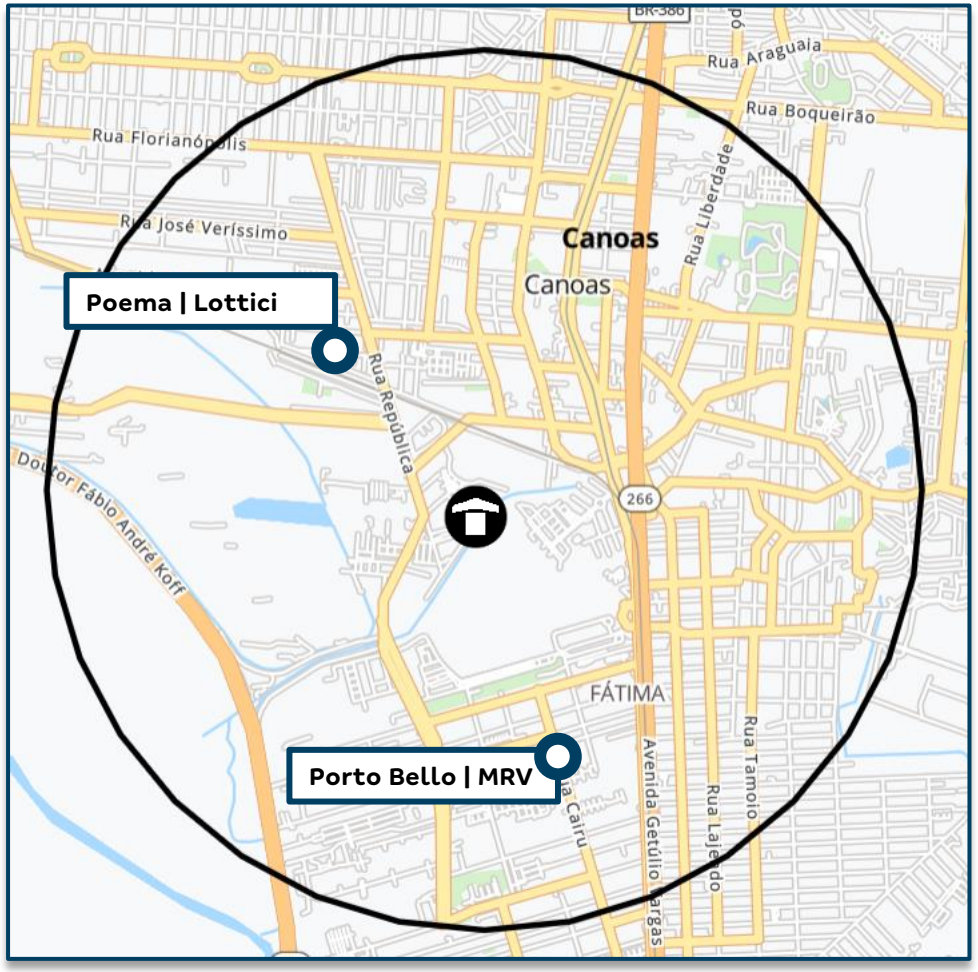

Simulação de Preço – Sem Vaga

Informações Viabilidade

Projeto:	Parque Ventura III							
Tipo:	**Faixa 2**		**Churrasqueira**		**Varanda**		**Churrasqueira e Varanda**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	210.000		212.000		212.000		214.000	
Renda Inicial (VF)	2.576		2.798		3.336		3.498	
Renda Final*	-		-		-		-	
% RET1	75%		50%		25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,42	1.110	0,50	1.452	0,44	1.521	0,52	1.864
FGTS	0,21	569	0,35	1.016	0,17	569	0,28	1.016
Financiamento	92,66%	143.109	92,99%	150.273	96,99%	169.174	99,76%	175.695
Subsídio	103,49%	17.704	126,46%	14.726	168,81%	6.213	200,98%	5.300
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24	24	24	24	24
Pró-Soluto	74,30%	16.690	78,53%	19.159	65,86%	19.159	72,77%	22.196
Preço Raso (RS)	179.181	179.181	186.627	186.627	196.636	196.636	206.071	206.071
TCD	94,76%	24.604	87,24%	24.604	73,17%	24.604	71,19%	25.103
VSO	9	9	3	3	3	3	1	1
Preço de Venda	**198.093**	**198.093**	**205.331**	**205.331**	**215.060**	**215.060**	**224.716**	**224.716**
Elasticidade	2,874%	2,874%	2,874%	2,874%	2,874%	2,874%	2,874%	2,874%
Preço de Venda Final	**203.785**	**203.785**	**211.231**	**211.231**	**221.240**	**221.240**	**231.174**	**231.174**
Preço Raso (R$)	**179.181**		**186.627**		**196.636**		**206.071**	
% de Raso	**87,93%**		**88,35%**		**88,88%**		**89,14%**	
BP25 - Não Inflacionado	**181.013**		**-**		**189.376**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**183.553**		**-**		**191.870**		**-**	

Simulação de Preço – Com Vaga

Informações Viabilidade

Projeto:	Parque Ventura III					
Tipo:	**Churrasqueira**		**Varanda**		**Churrasqueira e Varanda**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	228.000		228.000		230.000	
Renda Inicial (VF)	3.225		3.487		3.668	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	25%		25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,44	1.464	0,51	1.844	0,52	1.974
FGTS	0,48	1.600	0,45	1.600	0,42	1.600
Financiamento	94,06%	164.989	95,56%	174.931	95,66%	180.155
Subsídio	112,35%	5.326	194,07%	5.219	184,62%	3.889
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24	24	24
Pró-Soluto	80,59%	22.665	74,53%	22.665	87,77%	28.072
Preço Raso (RS)	196.044	196.044	206.259	206.259	215.690	215.690
TCD	77,96%	25.344	72,10%	25.344	66,55%	24.604
VSO	1	1	3	3	4	4
Preço de Venda	**215.204**	**215.204**	**225.134**	**225.134**	**233.582**	**233.582**
Elasticidade	2,874%	2,874%	2,874%	2,874%	2,874%	2,874%
Preço de Venda Final	**221.388**	**221.388**	**231.603**	**231.603**	**240.294**	**240.294**
Preço Raso (R$)	**196.044**		**206.259**		**215.690**	
% de Raso	**88,55%**		**89,06%**		**89,76%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**		**193.776**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**		**196.057**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Parque Ventura III
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	216.618
Renda Inicial (VF)	3.061
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,47	1.488
FGTS	0,30	967
Financiamento	94,51%	159.720
Subsídio	145,08%	11.044
Prazo de Pró-soluto	24	24
Pró-Soluto	75,94%	20.343
Preço Raso (RS)	193.563	193.563
TCD	81,82%	24.732
VSO	24	24
Preço de Venda	**212.022**	**212.022**
Elasticidade	2,874%	2,874%
Preço de Venda Final	**218.295**	**218.295**

Preço Raso (R$)	**193.563**
% de Raso	**88,67%**
Raso Todas as Fases	**187.303**
Nominal Todas as Fases	**212.253**

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região com bons indicadores sociodemográficos, como renda e PEA/Dia, e está localizado em uma região onde já atuamos com o produto Floratta e o Parque Ventura II que teve stockout em Set/2023.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes possuí target de preço e renda superior ao previsto para o Parque Ventura II.

2) Temos como referência para o projeto o Floratta, desconsiderando o cheque moradia, e aplicando a verticalização, e melhoria de produtos, como , Churrasqueira, Varanda, Churrasqueira + Varanda e Vaga de Carro.

	Preço Real					Preço Normalizado (22m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Acqua Danúbio	207.000	175.968	2.784	16	23	-842	175.126
Floratta	189.571	165.355	2.730	25	10	8.436	173.791
Ventura III	216.618	193.563	3.061	24	24	-	193.563

Resumo de Preços

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pós	PSOL (m)	RET1
Parque Ventura III - F2	Sem Vaga	2.576	0,42	0,21	92,7%	103,5%	75,8%	96,7%	9	194.713	210.000	5,0000%	204.449	179.336	19	50%
Parque Ventura III - F2	Com Churrasqueira - Sem Vaga	2.798	0,50	0,35	93,4%	126,5%	80,1%	89,0%	4	201.451	212.000	5,0000%	211.524	186.411	19	50%
Parque Ventura III - F2	Com Churrasqueira e Vaga	3.225	0,44	0,48	95,3%	112,3%	82,3%	79,6%	1	210.614	228.000	5,0000%	221.144	195.276	19	25%
Parque Ventura III - F3	Sem Vaga	2.576	0,42	0,21	92,7%	103,5%	75,8%	96,7%	9	194.713	210.000	5,0000%	204.449	179.336	19	50%
Parque Ventura III - F3	Com Churrasqueira - Sem Vaga	2.798	0,50	0,35	93,4%	126,5%	80,1%	89,0%	4	201.451	212.000	5,0000%	211.524	186.411	19	50%
Parque Ventura III - F3	Com Churrasqueira e Vaga	3.225	0,44	0,48	95,3%	112,3%	82,3%	79,6%	1	210.614	228.000	5,0000%	221.144	195.276	19	25%

Entorno

Distâncias - Mobilidade

- Centro de Canoas – 2,2 Km
- Parque Eduardo Gomes – 2,5 Km
- Universidade La Salle – 2,1 km

Raio 2,5 Km

- Av Guilherme Schell
- Estação de Trem Fátima
- BR 116
- Canoas Shopping

Concorrência

Porto Bello (MRV) – 3,5km

- Preço Cheio (UH 2dorm mais barata): R$ 236.990
- Avaliação: R$ 217.950
- Renda: R$ 2.900
- Estoque: 97
- 82% de Vagas de Estacionamento
- Diferenciais: Opção de varanda com churrasqueira, piscina.

Poema (Lottici) – 3,5km

- Preço Cheio (UH 2dorm mais barata): 226.166
- Avaliação:
- Renda: 2.600
- Estoque: 42
- 100% de Vagas de Estacionamentos
- Diferenciais: Unidades Garden, Área de lazer completa com piscina.

Parecer: Acreditamos que o preço é POSSÍVEL com o VSO proposto, dado o histórico que temos nos demais produtos da mancha.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Informações Gerais – Consolidado – APROVAÇÃO

Parque Ventura III - RS - Região Metropolitana > 100mil RS

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	set-23							
Fase 1 - Faixa 2		mar-25	set-25	abr-27	6 meses	19 meses	mar-28	36 meses
/ Churras, S/ Varanda E S/ Vaga		mar-25	set-25	abr-27	6 meses	19 meses	mar-28	36 meses
S/ Churras, C/ Varanda, S/ Vaga		mar-25	set-25	abr-27	6 meses	19 meses	mar-28	36 meses
:/ Churras, C/ Varanda, S/ Vaga		mar-25	set-25	abr-27	6 meses	19 meses	mar-28	36 meses
/ Churras, S/ Varanda E C/ Vaga		mar-25	set-25	abr-27	6 meses	19 meses	mar-28	36 meses
S/ Churras, C/ Varanda, C/ Vaga		mar-25	set-25	abr-27	6 meses	19 meses	mar-28	36 meses
:/ Churras, C/ Varanda, C/ Vaga		mar-25	set-25	abr-27	6 meses	19 meses	mar-28	36 meses
Fase 2 - Faixa 2		jan-27	jul-27	set-28	6 meses	14 meses	jan-30	36 meses
/ Churras, S/ Varanda E S/ Vaga		jan-27	jul-27	set-28	6 meses	14 meses	jan-30	36 meses
/ Churras, S/ Varanda E C/ Vaga		jan-27	jul-27	set-28	6 meses	14 meses	jan-30	36 meses
Fase 3 - Faixa 2		ago-28	fev-29	abr-30	6 meses	14 meses	ago-31	36 meses
/ Churras, S/ Varanda E S/ Vaga		ago-28	fev-29	abr-30	6 meses	14 meses	ago-31	36 meses
/ Churras, S/ Varanda E C/ Vaga		ago-28	fev-29	abr-30	6 meses	14 meses	ago-31	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	4,62 MM	Incorrido Terreno:	0,00 MM	Área do Terreno (100%):	13.854 m²
Cash:	4,62 MM			Custo de terreno m²:	333,4
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			VaR 25 (R$ mil):	566
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			VaR 26 (R$ mil):	1.184
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			Incorrido de Construção:	0,00 MM

Área Líquida do Terreno:	12.251 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	377,0
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	2,3% / 48,3%
CA Máx/Proj.	2,5 / 2,4
Incorridos de Incorporação:	0,36 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Fase 1 - Faixa 2	T+15	179.181	162	203.785	210.000	92,7%	74,3%	94,8%
/ Churras, S/ Varanda E S/ Vaga	T+15	186.627	60	211.231	212.000	93,0%	78,5%	87,2%
S/ Churras, C/ Varanda, S/ Vaga	T+15	196.636	64	221.240	212.000	97,0%	65,9%	73,2%
:/ Churras, C/ Varanda, S/ Vaga	T+15	206.071	18	231.174	214.000	99,8%	72,8%	71,2%
/ Churras, S/ Varanda E C/ Vaga	T+15	196.044	8	221.388	228.000	94,1%	80,6%	78,0%
S/ Churras, C/ Varanda, C/ Vaga	T+15	206.259	56	231.603	228.000	95,6%	74,5%	72,1%
:/ Churras, C/ Varanda, C/ Vaga	T+15	215.690	72	240.294	230.000	95,7%	87,8%	66,5%
Fase 2 - Faixa 2	T+15	179.336	174	204.449	210.000	92,7%	75,8%	96,7%
/ Churras, S/ Varanda E S/ Vaga	T+15	186.411	70	211.524	212.000	93,4%	80,1%	89,0%
/ Churras, S/ Varanda E C/ Vaga	T+15	195.276	9	221.144	228.000	95,3%	82,3%	79,6%
Fase 3 - Faixa 2	T+15	179.336	174	204.449	210.000	92,7%	75,8%	96,7%
/ Churras, S/ Varanda E S/ Vaga	T+15	186.411	70	211.524	212.000	93,4%	80,1%	89,0%
/ Churras, S/ Varanda E C/ Vaga	T+15	195.276	9	221.144	228.000	95,3%	82,3%	79,6%

Unidades Totais:	946	Preço Médio:	212.253	Renda Média:	2.847	ITBI+Emol. Unit.:	3.986
Unidades Tenda:	946	Avaliação Média:	213.717	Ato:	1.294 (0,45 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	13.907
VSO:	24 Unit.s.	VGV Total:	200.791.592	FGTS:	794 (0,28 Salários)	Preço Raso Médio:	187.303
RET Médio:	2,6%	VGV Tenda:	200.791.592	% em RET 1%:	48%		

Construção

Custo Total Unit.:	97.739	Eventuais:	4,00%	Área priv (m²):	36,00	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	28.750.366	LI:	23,00%	Exposição de Caixa (R$):	15.372.651	Margem Bruta Econômica:	43,87%
TIR:	92,71%	LI Aprovação:	20,00%	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(11.894.002)	Margem Bruta REF:	46,58%
Exposição de Caixa:	7,08%	Δ LI:	3,00%	Ger. Caixa 24 meses (R$):	6.217.549	Margem Rasa Econômica:	35,61%
Payback Contingente (21 m):	21 m/ (0 m)	LI Marginal:	23,32%	Ger. Caixa Marginal (R$):	67.714.520	Margem Rasa REF:	39,46%
Payback Consolidado:	21 meses					Margem de Contribuição Econômica:	32,62%

DRE – APROVAÇÃO

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Parque Ventura III		Primeira Fase		Demais Fases	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	217.277	100,0%	96.481	100,0%	120.796	100,0%
PIS/COFINS	(3.066)	1,4%	(1.392)	1,4%	(1.674)	1,4%
Custo Total	(120.236)	56,1%	(55.599)	58,5%	(64.637)	54,3%
Custo Terreno	(5.162)	2,4%	(2.401)	2,5%	(2.761)	2,3%
Custo Relacionados a Terreno	(823)	0,4%	(328)	0,3%	(495)	0,4%
Custos de Incorporação	(2.752)	1,3%	(1.215)	1,3%	(1.536)	1,3%
Custo de Construção	(111.499)	52,1%	(51.655)	54,3%	(59.844)	50,2%
Lucro Bruto Econômico	93.975	43,9%	39.490	41,5%	54.486	45,7%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	93.975	43,9%	39.490	41,5%	54.486	45,7%
Despesas de Selling	(19.113)	8,9%	(8.473)	8,9%	(10.640)	8,9%
Contingência	(4.997)	2,3%	(2.219)	2,3%	(2.778)	2,3%
Margem de Contribuição	69.865	32,6%	28.798	30,3%	41.068	34,5%
IR e CSLL	(2.508)	1,2%	(1.139)	1,2%	(1.370)	1,1%
Margem Líquida	67.357	31,4%	27.659	29,1%	39.698	33,3%

R$ Mil - VPL - Compra	Parque Ventura III		Primeira Fase		Demais Fases	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	125.023	100,0%	68.630	100,0%	56.393	100,0%
PIS/COFINS	(1.745)	1,4%	(975)	1,4%	(770)	1,4%
Custos e Despesas Totais	(94.528)	75,6%	(52.576)	76,6%	(41.952)	74,4%
Custo Terreno	(3.697)	3,0%	(1.720)	2,5%	(1.978)	3,5%
Custo Relacionados a Terreno	(844)	0,7%	(338)	0,5%	(506)	0,9%
Custos de Incorporação	(2.036)	1,6%	(1.080)	1,6%	(956)	1,7%
Custo de Construção	(71.910)	57,5%	(40.548)	59,1%	(31.361)	55,6%
Despesas de Selling	(13.022)	10,4%	(7.234)	10,5%	(5.788)	10,3%
Contingência	(1.590)	1,3%	(857)	1,2%	(733)	1,3%
IR e CSLL	(1.428)	1,1%	(798)	1,2%	(630)	1,1%
Lucro Imobiliário	28.750	23,0%	15.079	22,0%	13.672	24,2%

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Compra	BP - 2025	Anterior	Atual	Atual vs Anterior	Δ%
Data Estudo:	novembro-23	setembro-24	fevereiro-25	fevereiro-25	0 Meses	N/A
Lançamento:	abril-25	fevereiro-25	março-25	março-25	0 Meses	N/A
Uhs:	340	946	946	946	-	0,0%
Preço Nominal:	189.759	210.244	215.508	212.253	(3.254)	1,0%
Preço Raso:	166.879	191.943	190.558	187.303	(3.254)	-2,4%
Preço Nominal Inflacionado:	211.775	233.802	239.200	235.567	(3.633)	0,8%
Preço Raso Inflacionado:	186.237	213.504	211.462	207.829	(3.633)	-2,7%
Renda Média:	2.134	2.951	2.862	2.847	(15)	-3,5%
RET Médio:	n/a	2,2%	2,6%	2,6%	0,0 p.p.	
% em RET 1%:	n/a	61,6%	48,0%	48,0%	0,0 p.p.	
VSO:	13	17	17	17	-	0,0%
ITBI/Emol. (Unit):	2.773	3.560	4.051	3.986	(65)	12,0%
Avaliação:	187.400	210.000	222.687	213.717	(8.970)	1,8%
Prazo construção F1:	10	18	19	19	-	5,6%
Prazo de Pró-Soluto F1:	15	23	24	24	-	4,3%
Custo Total Inf (uh):	124.129	116.793	127.099	127.099	-	8,8%
Custo Construção:	83.976	89.080	97.739	97.739	(0)	9,7%
Fração de construção:	44%	42%	45,4%	46,0%	0,7 p.p.	9,4%
INCC Folha Rosto:	1.082,10	1.134,78	1.159,54	1.159,54	-	2,2%
Custo Terreno:	5.118.615	5.099.602	5.162.093	5.162.093	-	1,2%
Custo Relacionados a Terreno (uh):	2.679	1.084	870	870	-	-19,8%
Fração do Terreno[1]:	6,8% / 51,0%	2,6% / 44,9%	2,3% / 47,6%	2,3% / 48,3%	0,0 p.p.	-11,5%
ITBI/Emol. (Total):	942.964	3.367.549	3.832.031	3.770.653	(61.378)	12,0%
Custo do Ciclo:	16.051	13.775	14.120	13.907	(213)	1,0%
Lucro Imobiliário:	18,0%	28,9%	24,0%	23,0%	-1,0 p.p.	-20,5%
Régua LI	18,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0 p.p.	0,0%
Exposição de caixa:	15,9%	7,4%	6,9%	7,1%	0,2 p.p.	-4,3%
TIR:	66,9%	120,0%	98,3%	92,7%	-5,5 p.p.	-22,8%
Margem Bruta REF:	n/a	50,6%	47,4%	46,6%	-0,8 p.p.	
Margem Bruta Econômica:	38,7%	48,1%	44,7%	43,9%	-0,9 p.p.	-8,8%
Margem Rasa REF:	n/a	46,0%	40,5%	39,5%	-1,0 p.p.	
Margem Rasa Econômica:	30,0%	42,7%	36,8%	35,6%	-1,1 p.p.	-16,5%
Margem Contribuição Econômica:	27,3%	37,1%	33,5%	32,6%	-0,9 p.p.	-12,0%
Payback Contingente (Régua 21 m):	17 meses	20 m/ (-1 m)	21 m/ (0 m)	21 m/ (0 m)	0	5,0%
Payback Consolidado:	19 meses	20 Meses	21 Meses	21 Meses	0 Meses	5,0%

[1] Valor do terreno contratual

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

One Page – Parque Ventura III

Cidade	Canoas	**Mancha de demanda**	RS - CAN - Canoas
Regional	RS	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura	**Versão da VF**	Versão 1.0: Fev

[1]	**Unidades (% Vagas)**	946 (19%)	**CA Máx | Proj**	2,5 | 2,4
	Tipologia	F2E - Concreto	**Escritura**	fev-25
	Fases	3 fases	**Lçto | Duração (m)**	mar/25 | 61

[2]	**Valor Terreno (% VGV)**	4.619 (2,3%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
	Cash (Correção)	4.619 (IPCA)	**%VGV Perm Fin (% Ter)**	0,0% (0,0%)
	Valor R$/m²	377	**VAR (%VGV)**	566 (0,3%)

[3]	**Custo Construção (%VGV)**	92.461 (45,4%)	**Indireto Unit.**	19.673
	Prazo da Obra (meses)	19	**Torre Unit.**	55.970
	Custo Total Unit. (LPU):	97.739 (87)	**Infra Unit.**	12.524
	Início de Obra	set-25	**Fundação Unit.**	5.928

[4]	**Preço Nominal Unit.**	215.508	**VSO**	17
	Preço Raso Unit.	190.558	**Referência**	Vision
	Avaliação Unit.	222.687	**Renda (% em RET 1%)**	2.862 (48,0%)

[5]



[6]	**LI (Régua):**	**24,0% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	44,7%
	LI Marginal:	24,3%	**Margem Rasa Econômica:**	36,8%
	Margem Bruta REF:	47,4%	**Margem Contribuição Econômica:**	33,5%
	Margem Rasa REF:	**40,5%**	**Exposição (% VGV):**	15.275 (6,9%)
	TIR:	98,3%	**VGV Total:**	203.870
	Payback Contingente (21 m) :	**21 m/ (0 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(11.912)
	Payback Consolidado:	21	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	7.136

***Valores em R$ 1000**

Destaques

[1] Terreno localizado no município de **Canoas**, ao lado dos empreendimento Parque Ventura I e II (já entregues) e Floratta (entrega em andamento p/ fevereiro). O projeto é o sequenciamento natural da região próxima ao centro. O projeto passou por processo de reversão de tipologia (T+4 Hzinho -> F2E) gerando um acréscimo **de 606 unidades** vs Projeto na tipologia anterior, totalizando **1 condomínio de 946 unidades, a ser lançado em 3 fases, conforme segue:**

1ª Fase: 440 unidades;
2ª Fase: 253 unidades;
3ª Fase: 253 unidades;

[2] Negócio com valor de R$ 4.618.791,20 **(2,31% de fração do VGV) – valor corrigido pelo IPCA desde assinatura (Original: 4,370MM)**

100% Cash: R$ 4,619MM a serem pagos em 48 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 96.224,82, estando a primeira com vencimento na data outorga da escritura, e as demais nos meses seguintes.

CVC assinado em Outubro de 2023. Cláusulas resolutivas sem prazo de vencimento.

Garantia: Seguro Garantia de Pagamento em favor dos Vendedores, cotado em 166k (3,7% do valor do negócio).

Escritura aguarda emissão do projeto aprovado, previsto p/ 26/02.

Corretagem: R$ 174.800 (3,8% do Preço Terreno) pagos em 5 parcelas.

[3] Custo de obra consolidado de 97.739/uh condizente com as

[4] Preço de venda desconsidera o subsídio estadual (20k/uh)

[5] Projeto em linha com a estratégia da Regional de dois projetos em paralelo na mancha de Canoas, na Zona Oeste da cidade.

[6] Entrega acima dos Financials mínimos exigidos.

Informações Gerais – Consolidado – APROVAÇÃO

Parque Ventura III - RS - Região Metropolitana > 100mil RS

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	set-23							
Fase 1 - Faixa 2		mar-25	set-25	abr-27	6 meses	19 meses	mar-28	36 meses
C/ Churras, S/ Varanda E S/ Vaga		mar-25	set-25	abr-27	6 meses	19 meses	mar-28	36 meses
S/ Churras, C/ Varanda, S/ Vaga		mar-25	set-25	abr-27	6 meses	19 meses	mar-28	36 meses
C/ Churras, C/ Varanda, S/ Vaga		mar-25	set-25	abr-27	6 meses	19 meses	mar-28	36 meses
C/ Churras, S/ Varanda E C/ Vaga		mar-25	set-25	abr-27	6 meses	19 meses	mar-28	36 meses
S/ Churras, C/ Varanda, C/ Vaga		mar-25	set-25	abr-27	6 meses	19 meses	mar-28	36 meses
C/ Churras, C/ Varanda, C/ Vaga		mar-25	set-25	abr-27	6 meses	19 meses	mar-28	36 meses
Fase 2 - Faixa 2		jan-27	jul-27	set-28	6 meses	14 meses	jan-30	36 meses
C/ Churras, S/ Varanda E S/ Vaga		jan-27	jul-27	set-28	6 meses	14 meses	jan-30	36 meses
C/ Churras, S/ Varanda E C/ Vaga		jan-27	jul-27	set-28	6 meses	14 meses	jan-30	36 meses
Fase 3 - Faixa 2		ago-28	fev-29	abr-30	6 meses	14 meses	ago-31	36 meses
C/ Churras, S/ Varanda E S/ Vaga		ago-28	fev-29	abr-30	6 meses	14 meses	ago-31	36 meses
C/ Churras, S/ Varanda E C/ Vaga		ago-28	fev-29	abr-30	6 meses	14 meses	ago-31	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	4,62 MM	**Incorrido Terreno:** 0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	13.854 m²	**Área Líquida do Terreno:** 12.251 m²
Cash:	4,62 MM		**Custo de terreno m²:**	333,4	**Custo de terreno m² Área Líquida:** 377,0
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 25 (R$ mil):**	566	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 2,3% / 47,6%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 26 (R$ mil):**	1.184	**CA Máx/Proj.** 2,5 / 2,4
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%		**Incorrido de Construção:**	0,00 MM	**Incorridos de Incorporação:** 0,36 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Fase 1 - Faixa 2	T+15	182.474	162	207.078	221.000	94,9%	74,3%	94,8%
C/ Churras, S/ Varanda E S/ Vaga	T+15	190.106	60	214.710	223.000	95,0%	78,5%	87,2%
S/ Churras, C/ Varanda, S/ Vaga	T+15	199.690	64	224.294	221.000	96,2%	64,7%	71,9%
C/ Churras, C/ Varanda, S/ Vaga	T+15	206.969	18	232.072	223.000	96,9%	72,8%	71,2%
C/ Churras, S/ Varanda E C/ Vaga	T+15	199.908	8	225.252	231.000	94,4%	78,9%	76,3%
S/ Churras, C/ Varanda, C/ Vaga	T+15	210.481	56	235.825	221.000	98,5%	72,3%	69,9%
C/ Churras, C/ Varanda, C/ Vaga	T+15	217.355	72	241.959	233.000	95,5%	87,1%	66,0%
Fase 2 - Faixa 2	T+15	182.696	174	207.809	221.000	94,9%	75,8%	96,7%
C/ Churras, S/ Varanda E S/ Vaga	T+15	189.962	70	215.074	223.000	95,3%	80,1%	89,0%
C/ Churras, S/ Varanda E C/ Vaga	T+15	199.221	9	225.089	233.000	95,7%	80,5%	77,9%
Fase 3 - Faixa 2	T+15	182.696	174	207.809	221.000	94,9%	75,8%	96,7%
C/ Churras, S/ Varanda E S/ Vaga	T+15	189.962	70	215.074	223.000	95,3%	80,1%	89,0%
C/ Churras, S/ Varanda E C/ Vaga	T+15	199.221	9	225.089	233.000	95,7%	80,5%	77,9%

Unidades Totais:	946	**Preço Médio:**	215.508	**Renda Média:**	2.862	**ITBI+Emol. Unit.:**	4.051
Unidades Tenda:	946	**Avaliação Média:**	222.687	**Ato:**	1.295 (0,45 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.120
VSO:	24 Unit.s.	**VGV Total:**	203.870.141	**FGTS:**	794 (0,28 Salários)	**Preço Raso Médio:**	190.558
RET Médio:	2,6%	**VGV Tenda:**	203.870.141	**% em RET 1%:**	48%		

Construção

Custo Total Unit.:	97.739	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	36,00	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**30.526.652**	**LI:**	**24,02%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**15.274.968**	**Margem Bruta Econômica:**	**44,74%**
TIR:	**98,25%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(11.912.492)**	**Margem Bruta REF:**	**47,40%**
Exposição de Caixa:	**6,92%**	**Δ LI:**	**4,02%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**7.135.963**	**Margem Rasa Econômica:**	**36,76%**
Payback Contingente (21 m):	**21 m/ (0 m)**	**LI Marginal:**	**24,34%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**70.686.967**	**Margem Rasa REF:**	**40,50%**
Payback Consolidado:	**21 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**33,49%**

DRE – APROVAÇÃO

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Parque Ventura III		Primeira Fase		Demais Fases	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	**220.714**	**100,0%**	**97.863**	**100,0%**	**122.851**	**100,0%**
PIS/COFINS	(3.114)	1,4%	(1.411)	1,4%	(1.702)	1,4%
Custo Total	**(120.236)**	**55,3%**	**(55.599)**	**57,6%**	**(64.637)**	**53,4%**
Custo Terreno	(5.162)	2,4%	(2.401)	2,5%	(2.761)	2,3%
Custo Relacionados a Terreno	(823)	0,4%	(328)	0,3%	(495)	0,4%
Custos de Incorporação	(2.752)	1,3%	(1.215)	1,3%	(1.536)	1,3%
Custo de Construção	(111.499)	51,2%	(51.655)	53,6%	(59.844)	49,4%
Lucro Bruto Econômico	**97.365**	**44,7%**	**40.853**	**42,4%**	**56.512**	**46,6%**
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	**97.365**	**44,7%**	**40.853**	**42,4%**	**56.512**	**46,6%**
Despesas de Selling	(19.411)	8,9%	(8.594)	8,9%	(10.817)	8,9%
Contingência	(5.076)	2,3%	(2.251)	2,3%	(2.826)	2,3%
Margem de Contribuição	**72.877**	**33,5%**	**30.008**	**31,1%**	**42.869**	**35,4%**
IR e CSLL	(2.547)	1,2%	(1.155)	1,2%	(1.393)	1,1%
Margem Líquida	**70.329**	**32,3%**	**28.853**	**29,9%**	**41.476**	**34,2%**

R$ Mil - VPL - Compra	Parque Ventura III		Primeira Fase		Demais Fases	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	**127.075**	**100,0%**	**69.668**	**100,0%**	**57.407**	**100,0%**
PIS/COFINS	(1.773)	1,4%	(989)	1,4%	(784)	1,4%
Custos e Despesas Totais	**(94.775)**	**74,6%**	**(52.703)**	**75,6%**	**(42.072)**	**73,3%**
Custo Terreno	(3.697)	2,9%	(1.720)	2,5%	(1.978)	3,4%
Custo Relacionados a Terreno	(844)	0,7%	(338)	0,5%	(506)	0,9%
Custos de Incorporação	(2.036)	1,6%	(1.080)	1,6%	(956)	1,7%
Custo de Construção	(71.910)	56,6%	(40.548)	58,2%	(31.361)	54,6%
Despesas de Selling	(13.222)	10,4%	(7.338)	10,5%	(5.884)	10,3%
Contingência	(1.615)	1,3%	(870)	1,2%	(745)	1,3%
IR e CSLL	(1.451)	1,1%	(809)	1,2%	(641)	1,1%
Lucro Imobiliário	**30.527**	**24,0%**	**15.976**	**22,9%**	**14.551**	**25,3%**

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Compra	BP - 2025	Atual	Atual vs BP - 2025	Δ%
Data Estudo:	novembro-23	setembro-24	fevereiro-25	5 Meses	N/A
Lançamento:	abril-25	fevereiro-25	março-25	1 Meses	N/A
Uhs:	340	946	946	-	0,0%
Preço Nominal:	189.759	210.244	215.508	5.263	2,5%
Preço Raso:	166.879	191.943	190.558	(1.386)	-0,7%
Preço Nominal Inflacionado:	211.775	233.802	239.200	5.398	2,3%
Preço Raso Inflacionado:	186.237	213.504	211.462	(2.042)	-1,0%
Renda Média:	2.134	2.951	2.862	(89)	-3,0%
RET Médio:	n/a	2,2%	2,6%	0,4 p.p.	
% em RET 1%:	n/a	61,6%	48,0%	-13,6 p.p.	
VSO:	13	17	17	-	0,0%
ITBI/Emol. (Unit):	2.773	3.560	4.051	491	13,8%
Avaliação:	187.400	210.000	222.687	12.687	6,0%
Prazo construção F1:	10	18	19	1	5,6%
Prazo de Pró-Soluto F1:	15	23	24	1	4,3%
Custo Total Inf (uh):	124.129	116.793	127.099	10.306	8,8%
Custo Construção:	83.976	89.080	97.739	8.659	9,7%
Fração de construção:	44%	42%	45,4%	3,3 p.p.	7,8%
INCC Folha Rosto:	1.082,10	1.134,78	1.159,54	25	2,2%
Custo Terreno:	5.118.615	5.099.602	5.162.093	62.490	1,2%
Custo Relacionados a Terreno (uh):	2.679	1.084	870	(214)	-19,8%
Fração do Terreno[1]:	6,8% / 51,0%	2,6% / 44,9%	2,3% / 47,6%	-0,3 p.p.	-11,5%
ITBI/Emol. (Total):	942.964	3.367.549	3.832.031	464.482	13,8%
Custo do Ciclo:	16.051	13.775	14.120	345	2,5%
Lucro Imobiliário:	18,0%	28,9%	24,0%	-4,9 p.p.	-17,0%
Régua LI	18,0%	20,0%	20,0%	0,0 p.p.	0,0%
Exposição de caixa:	15,9%	7,4%	6,9%	-0,5 p.p.	-6,4%
TIR:	66,9%	120,0%	98,3%	-21,8 p.p.	-18,2%
Margem Bruta REF:	n/a	50,6%	47,4%	-3,3 p.p.	
Margem Bruta Econômica:	38,7%	48,1%	44,7%	-3,4 p.p.	-7,0%
Margem Rasa REF:	n/a	46,0%	40,5%	-5,5 p.p.	
Margem Rasa Econômica:	30,0%	42,7%	36,8%	-5,9 p.p.	-13,8%
Margem Contribuição Econômica:	27,3%	37,1%	33,5%	-3,6 p.p.	-9,6%
Payback Contingente (Régua 21 m):	17 meses	20 m/ (-1 m)	21 m/ (0 m)	1	5,0%
Payback Consolidado:	19 meses	20 Meses	21 Meses	1 Meses	5,0%

[1] Valor do terreno contratual

Parque Ventura III | Mapa Concorrência

		Parque Ventura III	Residencial Porto Bello	Poema Condomínio Residencial
		TENDA	MRV	Lottici
	Distância Tenda (km)		2,75km	2,2km
Região 1 Km	População	15.742	18.674	15.363
	Dens. Demográfica	5.043	5.965	4.908
	Renda (R$)	7.691	6.287	5.344
	Classe Social	B1 (8.1k a 16k)	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)
	PEA Dia	8.077	12.963	6.119
Quantitativo	Lançamento	mar/25	set/21	ago/22
	Unidades	440	480	240
	Estoque	440	84	42
	VSO	24	10	7
	Stockout	18	9	6
	Preço Nominal (R$)	221.342	256.240	227.000
	Preço CEF (R$)	174.779	204.992	181.600
	Renda Comprador (R$)	3.090	3.400	3.620
	Dif Tenda (R$)		-310	-530
	Factibilidade		●	●
Qualitativo	Condomínios	1	1	1
	Torres	3	4	2
	Gabarito	T+15	T+14	T+5
	Plantas (m²)	36m²	39,88m² e 46,48m²	49m² 50m² e 86m²
	Tipologia	2 Dorms	1 e 2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Não	Garden
	Varanda	Sim	Sim	Não
	Suite	Não	Não	Não
	Dif. Entrega	Não	Equipado e Decorado	Equipado e Decorado
	Vagas	31% de Vagas	Com Vaga	Com Vaga
	Lazer	Chimarródromo, Churrasqueira Gourmet, Fitness Externo, Funcional Externo, Playbaby, Playkids, Playpet, Quadra descoberta, Salão de festas com churrasqueira Salão de festas gourmet, Espaço Teen, Brinquedoteca (2), Fitness, Espaço Office, Sport Bar.	Brinquedoteca, Climatização, Fitness Center, Piscina infantil, Praça, Quadra, Sauna Seca,	Tem Garden, Brinquedoteca, Churrasqueria, Espaço delivery, Piscina, Piscina infantil, Pista caminhada, Quadra Poliesportiva, Quiosque, Salão de Festas,

Farol Renda
● Acima de 300
● Entre 0 e 300
● Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- Os concorrentes possuí target de preço e renda superior ao previsto para o Parque Ventura III.

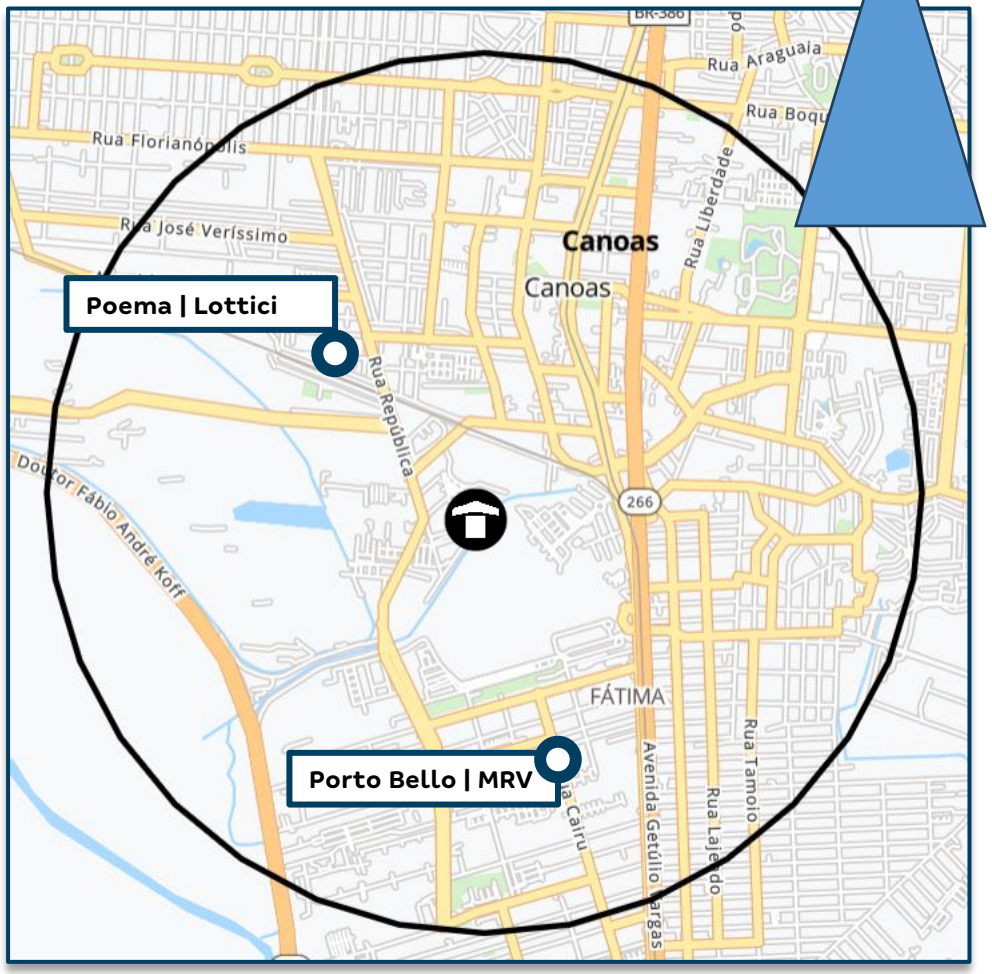

Simulação de Preço – Sem Vaga

Informações Viabilidade

Projeto:	Parque Ventura III							
Tipo:	**Faixa 2**		**Churrasqueira**		**Varanda**		**Churrasqueira e Varanda**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	221.000		223.000		221.000		223.000	
Renda Inicial (VF)	2.576		2.798		3.396		3.498	
Renda Final*	-		-		-		-	
% RET1	75%		50%		25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,42	1.110	0,50	1.452	0,44	1.521	0,52	1.864
FGTS	0,21	569	0,35	1.016	0,16	569	0,28	1.016
Financiamento	94,90%	146.402	95,02%	153.752	96,19%	172.229	96,88%	176.593
Subsídio	103,49%	17.704	126,46%	14.726	193,12%	6.213	200,98%	5.300
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24	24	24	24	24
Pró-Soluto	74,30%	16.690	78,53%	19.159	64,70%	19.159	72,77%	22.196
Preço Raso (RS)	182.474	182.474	190.106	190.106	199.690	199.690	206.969	206.969
TCD	94,76%	24.604	87,24%	24.604	71,88%	24.604	71,19%	25.103
VSO	9	9	3	3	3	3	1	1
Preço de Venda	**201.293**	**201.293**	**208.713**	**208.713**	**218.029**	**218.029**	**225.590**	**225.590**
Elasticidade	2,874%	2,874%	2,874%	2,874%	2,874%	2,874%	2,874%	2,874%
Preço de Venda Final	**207.078**	**207.078**	**214.710**	**214.710**	**224.294**	**224.294**	**232.072**	**232.072**
Preço Raso (R$)	**182.474**		**190.106**		**199.690**		**206.969**	
% de Raso	**88,12%**		**88,54%**		**89,03%**		**89,18%**	
BP25 - Não Inflacionado	**181.013**		**-**		**189.376**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**183.553**		**-**		**191.870**		**-**	

Simulação de Preço – Com Vaga

Informações Viabilidade

Projeto:	Parque Ventura III					
Tipo:	**Churrasqueira**		**Varanda**		**Churrasqueira e Varanda**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	231.000		221.000		233.000	
Renda Inicial (VF)	3.295		3.597		3.698	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	25%		25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,43	1.464	0,50	1.844	0,52	1.974
FGTS	0,47	1.600	0,43	1.600	0,42	1.600
Financiamento	94,40%	168.854	98,50%	179.153	95,48%	181.820
Subsídio	132,31%	5.326	230,79%	5.219	189,22%	3.889
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24	24	24
Pró-Soluto	78,88%	22.665	72,26%	22.665	87,06%	28.072
Preço Raso (RS)	199.908	199.908	210.481	210.481	217.355	217.355
TCD	76,31%	25.344	69,90%	25.344	66,01%	24.604
VSO	1	1	3	3	4	4
Preço de Venda	**218.960**	**218.960**	**229.238**	**229.238**	**235.200**	**235.200**
Elasticidade	2,874%	2,874%	2,874%	2,874%	2,874%	2,874%
Preço de Venda Final	**225.252**	**225.252**	**235.825**	**235.825**	**241.959**	**241.959**
Preço Raso (R$)	**199.908**		**210.481**		**217.355**	
% de Raso	**88,75%**		**89,25%**		**89,83%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**		**193.776**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**		**196.057**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Parque Ventura III
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	223.500
Renda Inicial (VF)	3.090
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,46	1.488
FGTS	0,29	967
Financiamento	95,73%	162.768
Subsídio	154,40%	11.044
Prazo de Pró-soluto	24	24
Pró-Soluto	75,33%	20.343
Preço Raso (RS)	196.610	196.610
TCD	81,23%	24.732
VSO	24	24
Preço de Venda	**214.982**	**214.982**
Elasticidade	2,874%	2,874%
Preço de Venda Final	**221.342**	**221.342**

1

Preço Raso (R$)	**196.610**
% de Raso	**88,83%**
Raso Todas as Fases	**190.558**
Nominal Todas as Fases	**215.508**

Análise de Riscos	Farol IM

IM avalia o Preço Vision como **factível**.

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região com bons indicadores sociodemográficos, como renda e PEA/Dia, e está localizado em uma região onde já atuamos com o produto Floratta e o Parque Ventura II que teve stockout em Set/2023.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes possuí target de preço e renda superior ao previsto para o Parque Ventura II.

2) Temos como referência para o projeto o Floratta, desconsiderando o cheque moradia, e aplicando a verticalização, e melhoria de produtos, como , Churrasqueira, Varanda, Churrasqueira + Varanda e Vaga de Carro.

	Preço Real					Preço Normalizado (22m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Acqua Danúbio	**207.000**	**175.968**	**2.784**	**16**	**23**	**-842**	**175.126**
Floratta	**189.571**	**165.355**	**2.730**	**25**	**10**	**8.436**	**173.791**
Ventura III	**223.500**	**196.610**	**3.090**	**24**	**24**	**-**	**196.610**

Resumo de Preços

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pó	(m)	RET1
Parque Ventura III - F2	Sem Vaga	2.576	0,42	0,21	94,9%	103,5%	75,8%	96,7%	9	197.913	221.000	5,0000%	207.809	182.6		50%
Parque Ventura III - F2	Com Churrasqueira - Sem Vaga	2.798	0,50	0,35	95,3%	126,5%	80,1%	89,0%	4	204.833	223.000	5,0000%	215.074	189.9		50%
Parque Ventura III - F2	Com Churrasqueira e Vaga	3.295	0,43	0,47	95,7%	132,3%	80,5%	77,9%	1	214.370	233.000	5,0000%	225.089	199		25%
Parque Ventura III - F3	Sem Vaga	2.576	0,42	0,21	94,9%	103,5%	75,8%	96,7%	9	197.913	221.000	5,0000%	207.809	182.696	19	50%
Parque Ventura III - F3	Com Churrasqueira - Sem Vaga	2.798	0,50	0,35	95,3%	126,5%	80,1%	89,0%	4	204.833	223.000	5,0000%	215.074	189.962	19	50%
Parque Ventura III - F3	Com Churrasqueira e Vaga	3.295	0,43	0,47	95,7%	132,3%	80,5%	77,9%	1	214.370	233.000	5,0000%	225.089	199.221	19	25%

Obrigado
