Tenda

sua próxima conquista

Book de Lançamento

Regional: BA

Projeto: Vale dos Lírios - F2

Data Comitê: 24/02/2025

Comitê Digital – 24/02/25

Nome	Vale dos Lírios F2- Lançamento	Observação - Vale dos Lírios F2
Rodrigo Osmo	Discutir em Comitê	(1) Estamos nos preparando para vender 55 (Real) ou 18 (Aprovação) unidades por mês? Imagino que 55. Mas projeto é pequeno (300 unidades). Não faria sentido mirarmos um VSO menor (ex.: o necessário para secarmos o projeto dentro do ano)?; (2) Por que o produto da MRV, que está mais acessível que o nosso, está com um VSO tão abaixo?
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	Ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	Ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	pensando em próximos lançamentos Fase 2 ou mais: tem como incluirmos unidades Garden, piscina, ou algum outro atributo, sem um novo rito de aprovação que atrase o projeto? Iria gerar muito valor nessas fases adicionais, que não previram isso no início.

1. **Estamos nos preparando para vender 55 (Real) ou 18 (Aprovação) unidades por mês? Imagino que 55. Mas projeto é pequeno (300 unidades). Não faria sentido mirarmos um VSO menor (ex: o necessário para secarmos o projeto dentro do ano? (Rodrigo Osmo)**

Definimos no plano BP um VSO de 55 para os Lírios F2, com o objetivo de atingir volume de vendas ao longo do ano e ajudar no caixa. Como evidenciado pelo histórico abaixo, a largada da fase 1 apresentou um VSO significativo. No entanto, com o lançamento de novos projetos (Morada das Estações e Vivenda Real), é natural que o VSO do Vale dos Lírios F2 seja mais baixo. Acreditamos que o volume médio de 35 de VSO será o razoável para o projeto e é o que deve vir nos exercícios de VSO dos próximos meses. No entanto, mantivemos no cenário real conforme histórico (melhor referência que temos atualmente) e o BP.

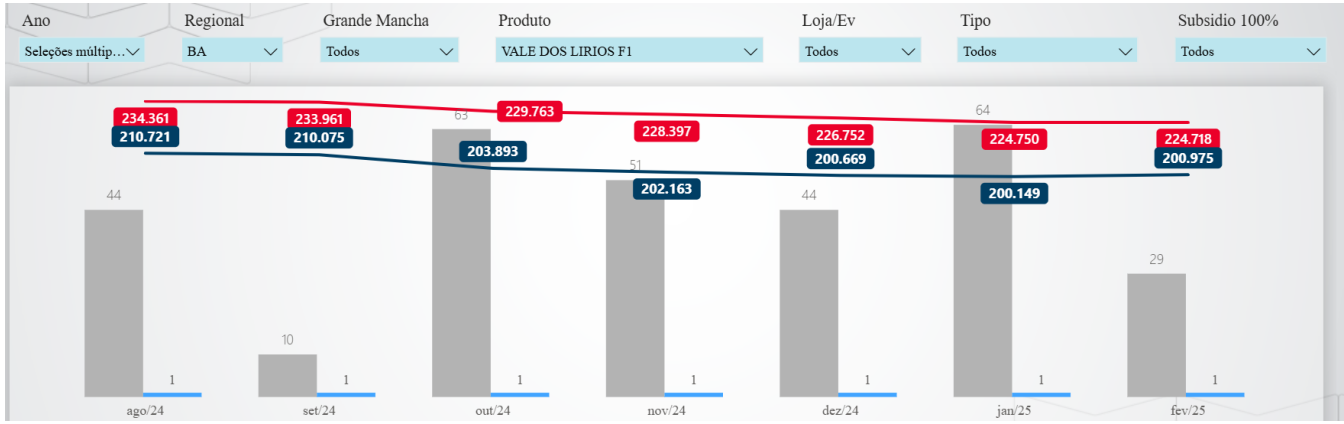

2. Por que o produto da MRV, que está mais acessível que o nosso, está com VSO tão abaixo? (Rodrigo Osmo)

Embora ambos os projetos estejam situados na mesma macroregião, o projeto da MRV se encontra em uma microregião de características bem inferiores à da Tenda. Até o momento, a MRV obteve uma média de 39 em VSO. Esse desempenho pode ser explicado pelo fato de o Reserva da Mata oferecer um produto de qualidade superior, com diferenciais como piscina e pisos nos apartamentos. Além disso, o projeto da MRV se beneficia da parceria com a Encash, uma fintech que permite aos clientes financiar o valor não coberto pelo financiamento em até 60 parcelas, ampliando significativamente o alcance para diferentes faixas de renda.

3. Pensando em próximos lançamentos Fase 2 ou mais: tem como incluirmos unidades Garden, piscina, ou algum outro atributo, sem um novo rito de aprovação que atrase o projeto? Iria gerar muito valor nessas fases adicionais, que não previram isso no início (Luiz Maurício)

Após o lançamento do empreendimento, não é possível realizar alterações em qualquer item que modifique as áreas construídas do projeto, uma vez que nesta etapa já possuem a incorporação registrada, com as frações ideais devidamente definidas. No caso do Vale dos Lírios, por se tratar de um terreno com continuidade (Complexo Vale do Abaré – Polo), teremos incremento de atributos de produto nos próximos condomínios a serem lançados. O Vale das Tulipas, próximo lançamento, já virá com piscina e o Vale das Orquídeas com piscina e varanda. As unidades Garden estão em fase de estudo pela regional.

One Page – Vale dos Lírios F2 - Aprovação

Cidade	Salvador	**Mancha de demanda**	BA - Salvador - Alta
Regional	BA	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Vale dos Lírios F1	**Aprovação Fase Anterior**	Consolidado
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Fev

[1]

Unidades (% Vagas)	316 (35%)	**CA Máx | Proj**	3,0 | 1,5
Tipologia	F2E - Concreto	**Escritura**	jul-24
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	mar/25 | 22

[2]

Valor Terreno (% VGV)	6.029 (8,0%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (IPCA)	**%VGV Perm Fin (% Ter)**	8,0% (100,0%)
Valor R$/m²	467	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[3]

Custo Construção (%VGV)	29.690 (39,4%)	**Indireto Unit.**	14.547
Prazo da Obra (meses)	16	**Torre Unit.**	57.416
Custo Total Unit. (LPU):	93.957 (87)	**Infra Unit.**	9.335
Início de Obra	set-25	**Fundação Unit.**	7.355

Preço Nominal Unit.	238.501	**VSO**	18
Preço Raso Unit.	211.939	**Referência**	Vale dos Lirios F1
Avaliação Unit.	224.993	**Renda (% em RET 1%)**	3.357 (18,0%)



LI (Régua):	**23,7% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	44,0%
LI Marginal:	26,4%	**Margem Rasa Econômica:**	36,2%
Margem Bruta REF:	47,3%	**Margem Contribuição Econômica:**	31,7%
Margem Rasa REF:	**40,7%**	**Exposição (% VGV):**	9.159 (12,2%)
TIR:	119,8%	**VGV Total:**	75.366
Payback Contingente (21 m) :	**17 m/ (-4 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(7.779)
Payback Consolidado:	17	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	16.890

[1] Destaques

- Lançamos o Vale dos Lírios F1 em ago/24 e ele tem apresentado uma performance de vendas acima do esperado. Estamos trazendo o Lançamento da Fase 2 conforme previsto em BP (mar/25), devido ao esgotamento do estoque da Fase 1.

[2] Custo de Construção

- O custo está marginalmente melhor que o apresentado no comitê de lançamento da Fase 1 (-R$ 669/uh).

[3] Precificação

- O preço está compatível com o que está sendo praticado na Fase 1, com diferença apenas no psol (22 meses vs 21 meses) e no VSO (51 vs 18), conforme detalhado abaixo.

Projeto	Tipologia	Preço Nominal	Preço Raso	ΔPSOL	ΔElastic	Preço Nominal	Preço Raso
Vale dos Lírios F2	Sem Vaga	226.213	200.588	-1.027	4,67%	235.695	208.873
Vale dos Lírios F2	Com Vaga	237.471	214.799	-1.098	4,67%	247.404	223.674

Segue comparativo em relação ao aprovado no Comitê da Fase 01.

Laçto Ago/2024	Consolidado	Vale dos Lirios
LI da Fase	21,3%	24,00%
folga consolidada	1,3%	1,3%
LI (tirando a folga)		22,7%
Régua	20,0%	20,0%
Distância régua anterior:		2,74%
Lançamento Atual:		
LI atual:		23,71%
Régua atual:		20,00%
Distância régua atual:		3,71%
Distância Entre Réguas		0,97%

One Page – Vale dos Lírios F2 - Real

Cidade	Salvador	**Mancha de demanda**	BA - Salvador - Alta
Regional	BA	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Vale dos Lírios F1	**Aprovação Fase Anterior**	Consolidado
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Fev

Unidades (% Vagas)	316 (35%)	**CA Máx | Proj**	3,0 | 1,5
Tipologia	F2E - Concreto	**Escritura**	jul-24
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	mar/25 | 19

Valor Terreno (% VGV)	5.626 (8,0%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (IPCA)	**%VGV Perm Fin (% Ter)**	8,0% (100,0%)
Valor R$/m²	436	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[1]

Custo Construção (%VGV)	29.690 (42,2%)	**Indireto Unit.**	14.547
Prazo da Obra (meses)	14	**Torre Unit.**	57.416
Custo Total Unit. (LPU):	93.957 (87)	**Infra Unit.**	9.335
Início de Obra	jun-25	**Fundação Unit.**	7.355

[2]

Preço Nominal Unit.	222.567	**VSO**	55
Preço Raso Unit.	197.433	**Referência**	Referência
Avaliação Unit.	224.993	**Renda (% em RET 1%)**	3.357 (39,9%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	199.160
Preço Inf. Médio Unit.	224.413	**Margem Bruta REF (%)**	43,8%
Custo Inf. Médio Unit.	126.039	**Margem Rasa REF (%)**	36,7%



LI (Régua):	**24,2% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	42,3%
LI Marginal:	26,9%	**Margem Rasa Econômica:**	34,3%
Margem Bruta REF:	43,8%	**Margem Contribuição Econômica:**	30,4%
Margem Rasa REF:	**36,7%**	**Exposição (% VGV):**	8.709 (12,3%)
TIR:	186,2%	**VGV Total:**	70.331
Payback Contingente (21 m) :	**9 m/ (-12 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	4.616
Payback Consolidado:	9	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	16.042

[1] Cenário considerando data de IO conforme PCP 161, onde as fases já estão unificadas, e VSO de 55 conforme cravado em BP.

[2] O preço está compatível com o que está sendo praticado na Fase 1, com diferença apenas no psol (22 meses vs 18 meses) e no VSO (51 vs 55), conforme detalhado abaixo.

Projeto	Tipologia	Preço Nominal	Preço Raso	ΔPSOL	ΔElastic	Preço Nominal	Preço Raso
Vale dos Lírios F2	Sem Vaga	226.213	200.588	-4.108	-0,96%	219.969	194.590
Vale dos Lírios F2	Com Vaga	237.471	214.799	-4.392	-0,96%	230.838	208.384

Segue comparativo em relação ao aprovado no Comitê da Fase 01.

Laçto Ago/2024	Consolidado	Vale dos Lirios
LI da Fase	21,5%	24,37%
folga consolidada	1,5%	1,5%
LI (tirando a folga)		22,9%
Régua	20,0%	20,0%
Distância régua anterior:		2,88%
Lançamento Atual:		
LI atual:		24,21%
Régua atual:		20,00%
Distância régua atual:		4,21%
Distância Entre Réguas		1,33%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Farol Pareceres – Vale dos Lírios F2

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico Imobiliário	Registro da Escritura de Compra e Venda: 17/07/2024 Data do Registro da Incorporação: 06/08/2024 Data do Registro do Patrimônio de Afetação: 06/08/2024 Data da Averbação da Retificação da Incorporação: 20/09/2024	Ok	
Legalização	**Licenças emitidas:** Alvará de Construção - Emitido em 17/05/2024; Autorização de Supressão Vegetal Empreendimento - Emitida em 18/09/2023 - Válida até 18/09/2025; Autorização de Supressão Vegetal Viário - Emitida em 17/10/2023 - Válida até 17/10/2025; Dispensa de Licença Ambiental - Emitida em 06/11/2023; Licença para Terraplanagem – Emitida em 01/04/2024 - Válida até 01/04/2026; Obra em Logradouro Público de Pavimentação e Drenagem - Emitida em 14/12/2023 - Válida até 14/12/2024; Obra em Logradouro Público de Esgoto - Emitida em 22/03/2024 - Válida até 22/03/2025. **Licenças a serem emitidas para inicio de obras:** Autorização de Manejo de Fauna - Previsão de emissão em 17/02/2025; Obra em Logradouro Público de Drenagem Interna - Previsão de emissão em 28/03/2025; Obra em Logradouro Público de Água - Previsão de emissão em 28/03/2025.	Ok com ressalvas	
Produto	Sem riscos	Ok	
GETEC	Considerado junção de fases de acordo com PCP 161.	Ok	
Logística	Sem riscos	Ok	
Contratação	Laudo de Engenharia Ok (10/06/24), Risco Ok (20/08/24), Jurídico Ok (20/08/24)	Ok	
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Referência como factível.	Ok	
Comercial/Ciclo	Parecer favorável.	Ok	
Estudos Econômicos	Sem riscos	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

SSA – Salvador

Lançamento

1. Farol de Itapuã | Ponta Humaitá
2. Parque Topázio
3. Vista Salvador Norte
4. Reserva Piatã
5. Encanto Piatã
6. Vale dos Lírios
7. Jardim Armação Prime
8. Morada das Estações

LandBank

9. Torres Vila Laura
10. Vale das Tulipas
11. Vista Serena
12. Vivenda Real
13. Portal de Salvador
14. Solar Patamares
15. Solar e Mar de Itapagipe
16. Paralela Sun Prime
17. Vale das Orquídeas
18. Privilege Salvador Norte
19. Mirante Verona (Veneza)

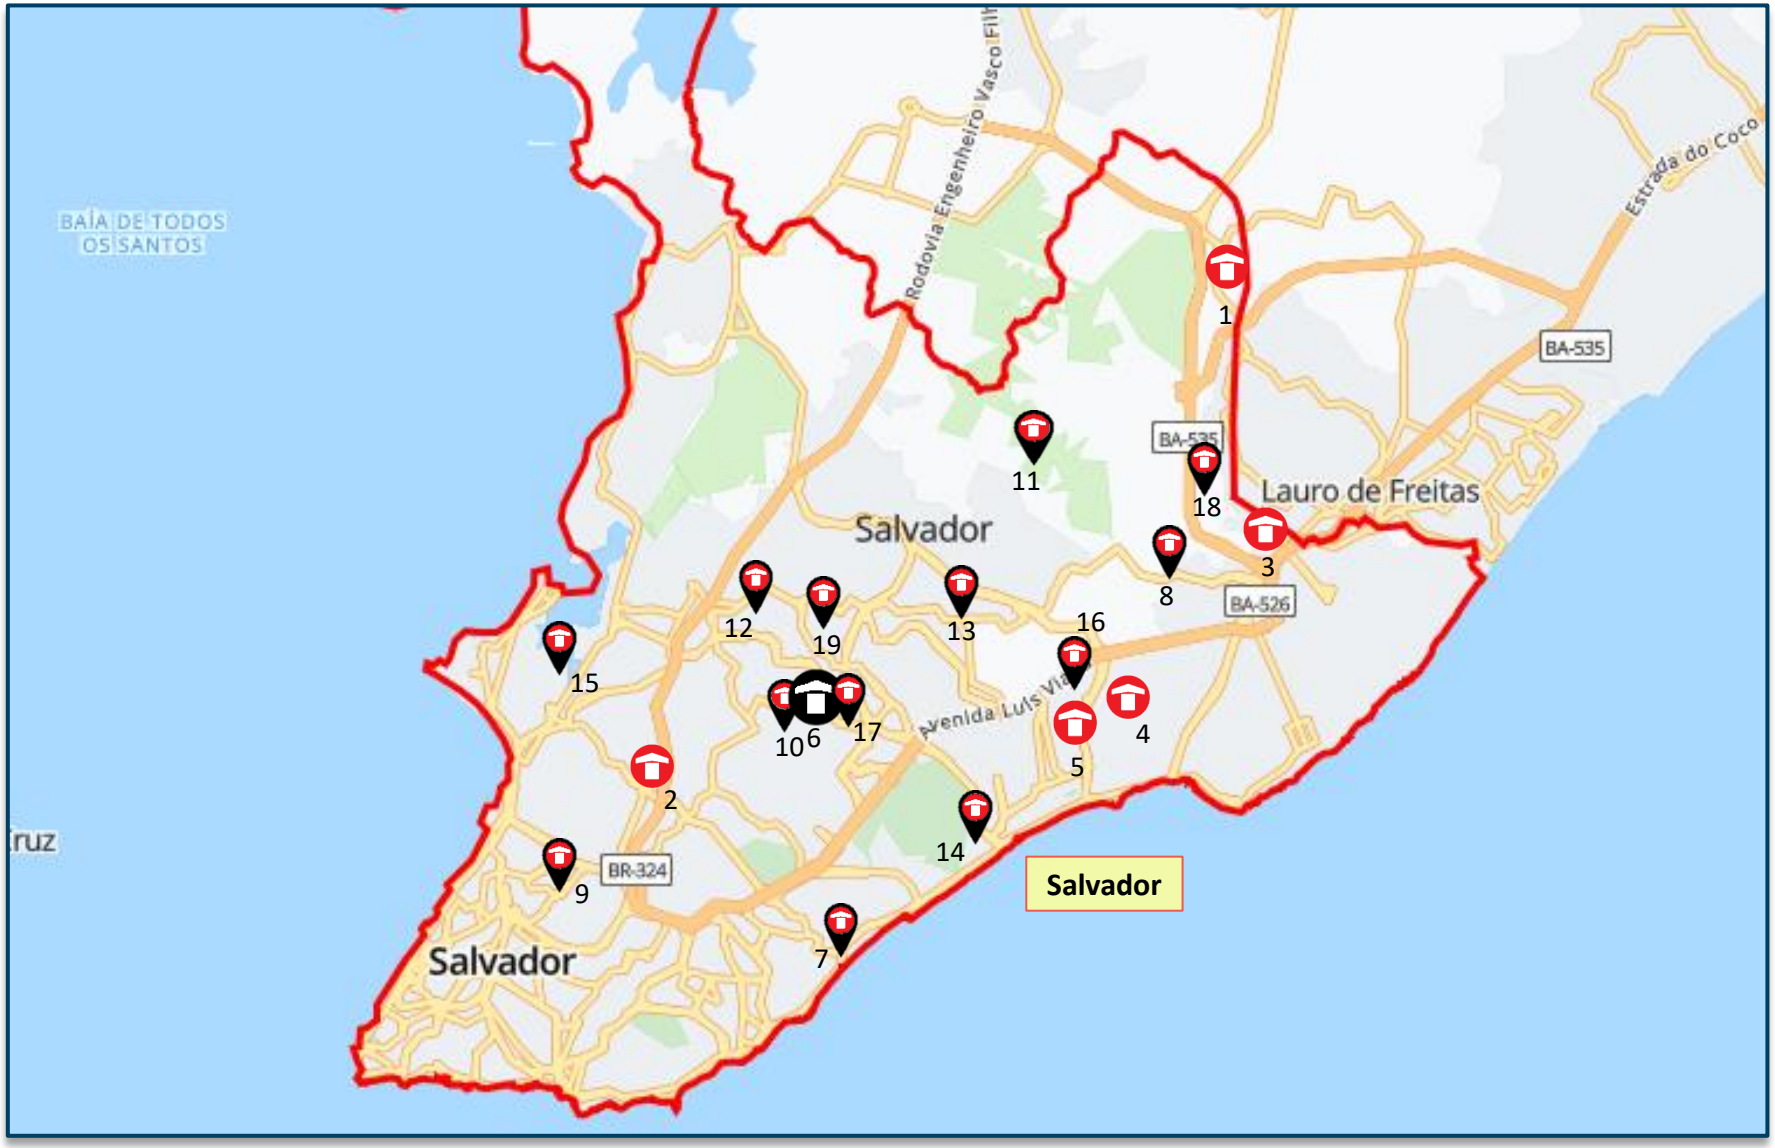

Lançados LandBank Comitê

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 3 - Verde

Região

Capital

PRODUTO

Empreendimento Vale dos Lírios
Lançamento

Informações Gerais – Condomínio 01		
Terreno	**Área terreno**	18.583,19m²
	Menor poligonal	18.583,19m²
	App/fna	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Não/Sim
	Área liquida	12.912,14m²
	Zoneamento	ZPR 3
	Ca máximo	3,00
	Ca básico	1,50
	Ca projetado	1,52
	Gabarito máximo	159,24m (comar)
Geral	**Total uh**	759
	Total de vagas	209
Tipologia	**Tipologia**	Pct com elevador
	Gabarito	T+15
	Lâmina	02 10PP e 02 14PP
	Área privativa	38,54m² | 38,70m² e 38,73m²
Condomínio	**Unidade pcd**	39
	Unidade lazer|técnica	09|04
	Torre	04
	Fase	02
Lazer	**Lazer coberto**	Slfe com churr., quadras cobertas M, fitness, esp. saúde, esp. office, brinquedoteca, esp. delivery, esp. oficina, esp. teen, slfe gourmet.
	Lazer descoberto	Play baby, play kids, play pet, espaço relax, espaço cultivo, fitness e funcional externo e praça dos sabores

PRODUTO

Empreendimento Vale dos Lírios
Lançamento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	**Supercondomínio**		
	Acesso Empreendimento		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Atributos Infra**	Sim	Quadra coberta M e vaga compartilhada
	Atributos Torre	Não	
	Edifício Garagem	Não	

Empreendimento Vale dos Lírios
Lançamento

Fase 02: 316UH (sendo 16 U.A) - 110 vagas (01 emb./des. e 70 motos)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 03	01 Bloco (T+15)	158 UH (Sendo 08 U.A)	110 vagas , sendo 01 emb. e des. e 70 motos	
Módulo 04	01 Bloco (T+15)	158 UH (Sendo 08 U.A)		

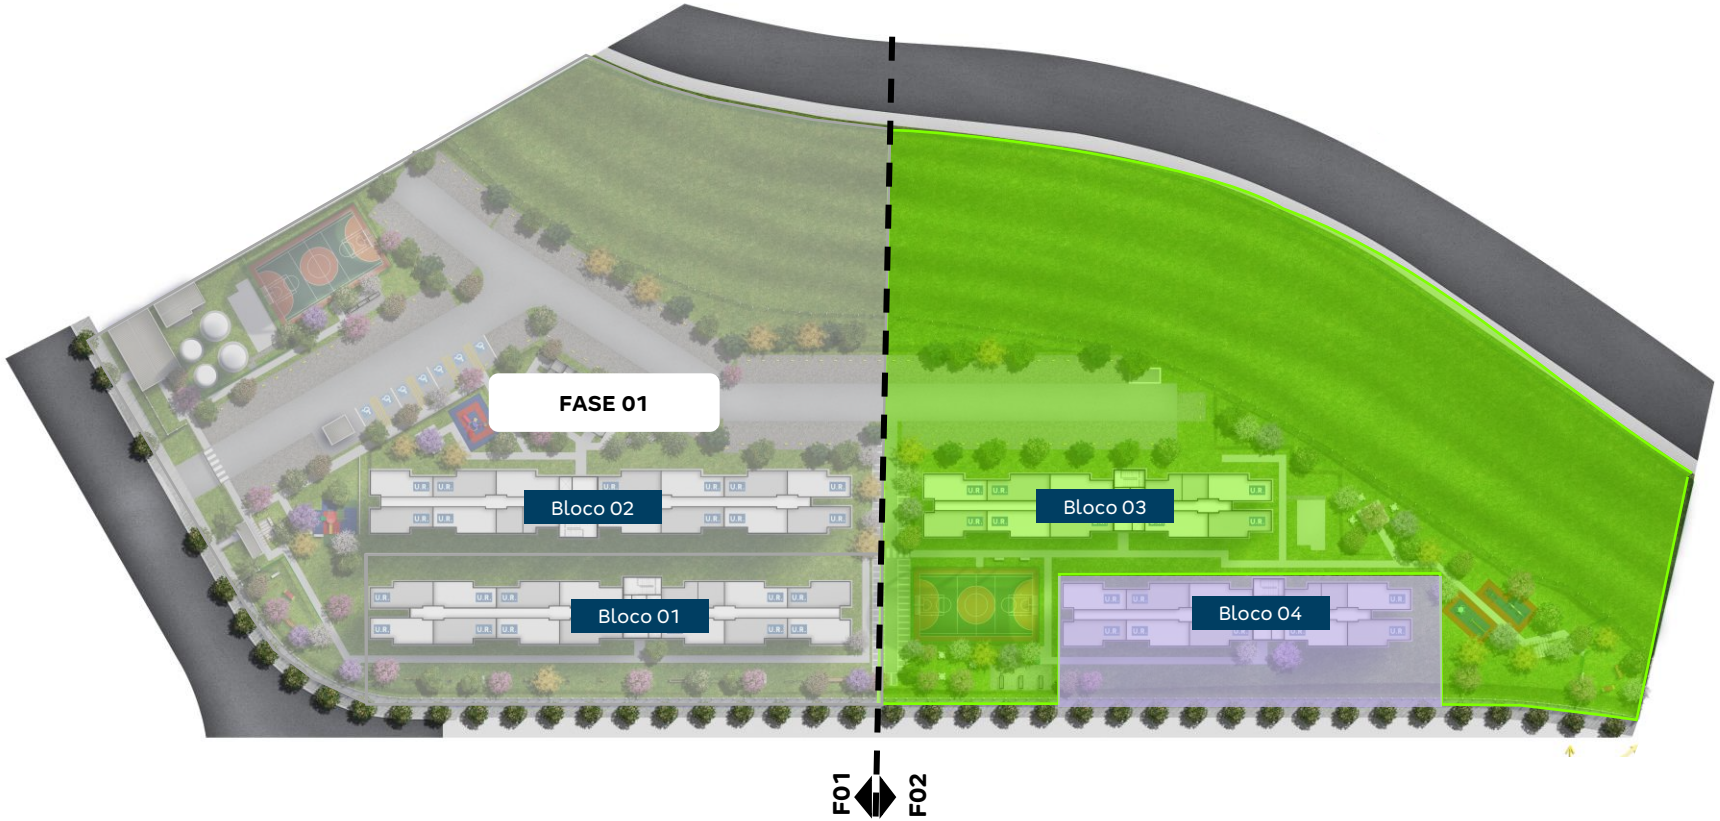

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Custo de Construção

	R06 VALE DOS LÍRIOS FASE 2	R05 VALE DOS LÍRIOS FASE 2	BP25 VALE DOS LÍRIOS FASE 2	LVS PARQUE TOPÁZIO F2
Torres	2	2	2	3
Unidades Construídas	320	320	320	504
Unidades Vendidas	316	316	316	495
Condomínios (qta.)	1	1	1	1
Cidade	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E Modular	F2E MODULAR
Tipologia	2 Torres | T+15 | 10PP | C1A	2 Torres | T+15 | 10PP | C1A	2 Torres | T+15 | 10PP | C1A	3 Torres | T+13 | 12PP | C1A
Projeto Infra	LO	PE	PE	
Projeto Torre	LO	LO	LO	
Mês Base	fevereiro-25	julho-24	setembro-24	dezembro-24
Incc	1.159,536	1.110,887	1.134,775	
LVS	dezembro-24	maio-24	agosto-24	
Indiretos	dezembro-24	maio-24	agosto-24	
Base de Preço	LPU 87	LPU 80	LPU 83	
Takt	2x2	2x2	2x2	
Prazo (mês)	16	14	15	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 88.778	R$ / UND R$ 86.657	R$ / UND R$ 83.462	R$ / UND R$ 86.058
Indireto	R$ 14.547	R$ 15.887	R$ 15.087	R$ 14.069
Torre	R$ 57.416	R$ 54.614	R$ 53.314	R$ 55.906
Infra	R$ 9.335	R$ 8.945	R$ 7.850	R$ 7.046
Fundação	R$ 7.355	R$ 7.132	R$ 7.132	R$ 8.738
EEE				
ETE				
Contenção				R$ 171
Terraplenagem	R$ 125	R$ 79	R$ 79	R$ 127
CUSTO TOTAL II	R$ 5.179	R$ 3.998	R$ 4.085	R$ 877
Urbanização	R$ 2.159	R$ 2.159	R$ 2.159	R$ 29
Drenagem		R$ 367		R$ 79
Extensão de Rede Elétrica		R$ 546		
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 3.020	R$ 927	R$ 1.926	R$ 769
CUSTO TOTAL III				
Incorridos				
CUSTO TOTAL IV		R$ 3.970	R$ 1.910	
Atualização por INCC		R$ 3.970	R$ 1.910	
CUSTO TOTAL I+II	R$ 93.957	R$ 90.656	R$ 87.547	R$ 86.935
CUSTO TOTAL I AO IV	**R$ 93.957**	**R$ 94.626**	**R$ 89.458**	**R$ 86.935**

Custo de Construção

	R06 VALE DOS LÍRIOS FASE 2	R05 VALE DOS LÍRIOS FASE 2	
Torres	2	2	
Unidades Construídas	320	320	
Unidades Vendidas	316	316	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Salvador - BA	Salvador - BA	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	2 Torres | T+15 | 10PP | C1A	2 Torres | T+15 | 10PP | C1A	
Projeto Infra	LO	PE	
Projeto Torre	LO	LO	
Mês Base	fevereiro-25	julho-24	
Incc	1159,536	1110,887	
LVS	dezembro-24	maio-24	
Indiretos	dezembro-24	maio-24	
Base de Preço	LPU 87	LPU 80	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	16	14	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 88.778	R$ / UND R$ 86.657	DIF R$ 2.121
INDIRETO	R$ 14.547	R$ 15.887	-R$ 1.340
TORRE	R$ 57.416	R$ 54.614	R$ 2.802
INFRA	R$ 9.335	R$ 8.945	R$ 390
FUNDAÇÃO	R$ 7.355	R$ 7.132	R$ 224
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CONTENÇÃO	R$ 0	R$ 0	R$ 0
TERRAPLENAGEM	R$ 125	R$ 79	R$ 46
CUSTO TOTAL II	R$ 5.179	R$ 3.998	R$ 1.180
VIÁRIO	R$ 2.159	R$ 2.159	R$ 0
DRENAGEM	R$ 0	R$ 367	-R$ 367
EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	R$ 0	R$ 546	-R$ 546
EXTENSÃO DE REDE HIDRÁULICA	R$ 3.020	R$ 927	R$ 2.093
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
INCORRIDOS	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
APRENDIZADO	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 3.970	-R$ 3.970
ATUALIZAÇÃO POR INCC	R$ 0	R$ 3.970	-R$ 3.970
CUSTO TOTAL	R$ 93.957	R$ 94.626	-R$ 669

VARIAÇÕES

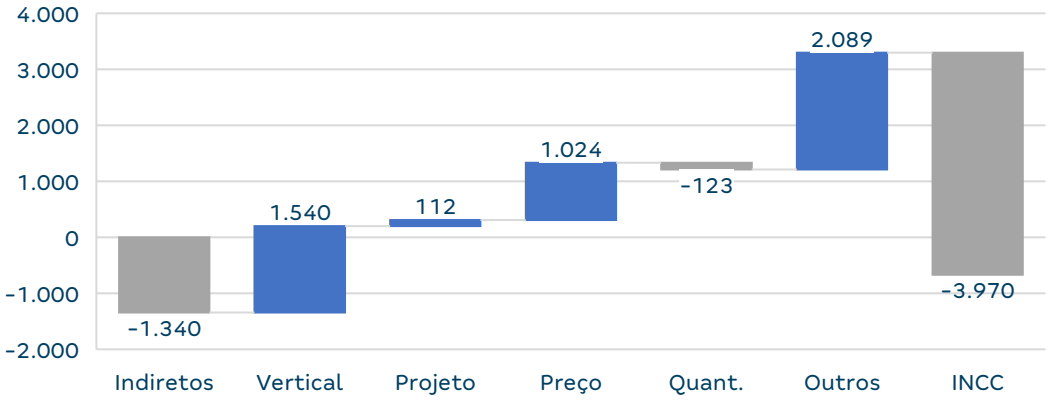

INDIRETOS
-1395 | Junção de Fases

VERTICAL
+1540 | Retroalimentação

PREÇO
+928 | Concreto Torre
+229 | Esquadrias de Ferro
+224 | Fundação
+185 | Paisagismo
-959 | Elevador

OUTROS
+1180 | Extensão de Rede
+823 | Instalações Torre

Custo de Construção

	R06 VALE DOS LÍRIOS FASE 2	BP25 VALE DOS LÍRIOS FASE 2	
Torres	2	2	
Unidades Construídas	320	320	
Unidades Vendidas	316	316	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Salvador - BA	Salvador - BA	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E Modular	
Tipologia	2 Torres | T+15 | 10PP | C1A	2 Torres | T+15 | 10PP | C1A	
Projeto Infra	LO	PE	
Projeto Torre	LO	LO	
Mês Base	fevereiro-25	setembro-24	
Incc	1159,536	1134,775	
LVS	dezembro-24	agosto-24	
Indiretos	dezembro-24	agosto-24	
Base de Preço	LPU 87	LPU 83	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	16	15	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 88.778	S$ / UND R$ 83.462	DIF R$ 5.316
INDIRETO	R$ 14.547	R$ 15.087	-R$ 540
TORRE	R$ 57.416	R$ 53.314	R$ 4.102
INFRA	R$ 9.335	R$ 7.850	R$ 1.485
FUNDAÇÃO	R$ 7.355	R$ 7.132	R$ 224
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CONTENÇÃO	R$ 0	R$ 0	R$ 0
TERRAPLENAGEM	R$ 125	R$ 79	R$ 46
CUSTO TOTAL II	R$ 5.179	R$ 4.085	R$ 1.094
VIÁRIO	R$ 2.159	R$ 2.159	R$ 0
DRENAGEM	R$ 0	R$ 0	R$ 0
EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	R$ 0	R$ 0	R$ 0
EXTENSÃO DE REDE HIDRÁULICA	R$ 3.020	R$ 1.926	R$ 1.094
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
INCORRIDOS	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
APRENDIZADO	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 1.910	-R$ 1.910
ATUALIZAÇÃO POR INCC	R$ 0	R$ 1.910	-R$ 1.910
CUSTO TOTAL	R$ 93.957	R$ 89.458	R$ 4.499

VARIAÇÕES

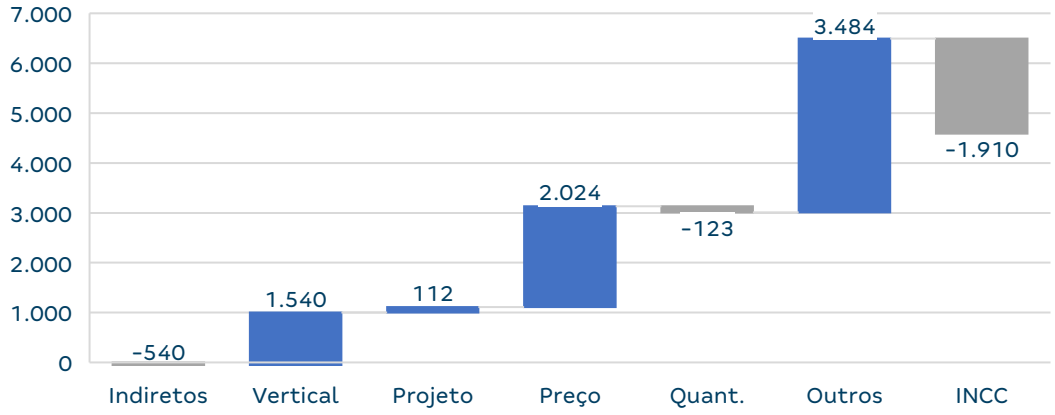

VERTICAL
+1540 | Retroalimentação

PREÇO
+928 | Concreto Torre
+229 | Esquadrias de Ferro
+224 | Fundação
+185 | Paisagismo

OUTROS
+1181 | Instalações Infra
+1180 | Extensão de Rede
+1123 | Instalações Torre

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Considerado rede de extensão de água com comprimento de 642m na Avenida Ulysses Guimarães.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Considerado rede de extensão com comprimento de 241m, com desaguamento em PV existente atrás do Condomínio Residencial Life III.

SISTEMA DE DRENAGEM
Considerado rede de extensão com comprimento de 214m, com lançamento em corpo hídrico atrás do Condomínio Residencial Life III.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento feito através de GLP.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Passeio e pavimento em asfalto na testada do empreendimento, recapeamento em asfalto na Rua Vale do Abaré.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 2
Esgoto	Nível 2
Drenagem	Nível 1
Elétrica	Nível 1
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:

- Obras já executadas.

Esgoto:

- Obras em execução.

Drenagem:

- Obras em execução.

Elétrica:

- Cond. I: Viabilidade validada com orçamento estimado da concessionária em Maio/2024.

Gás:

- Abastecimento feito através de GLP.

Logística

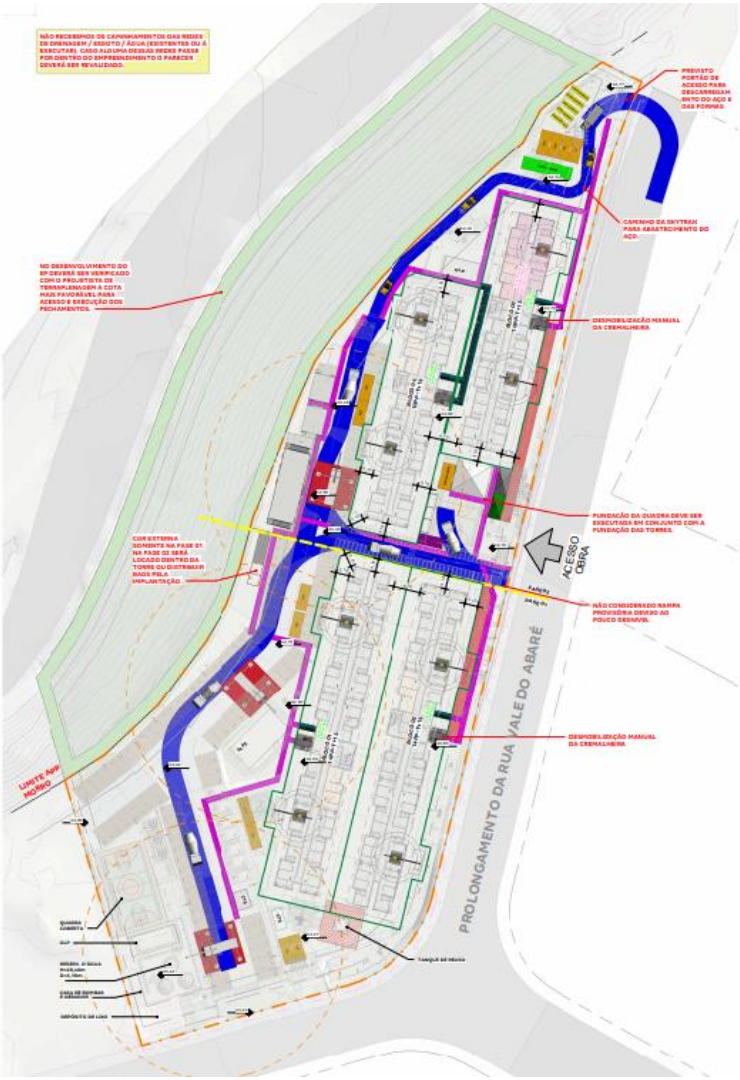

IMPLANTAÇÃO

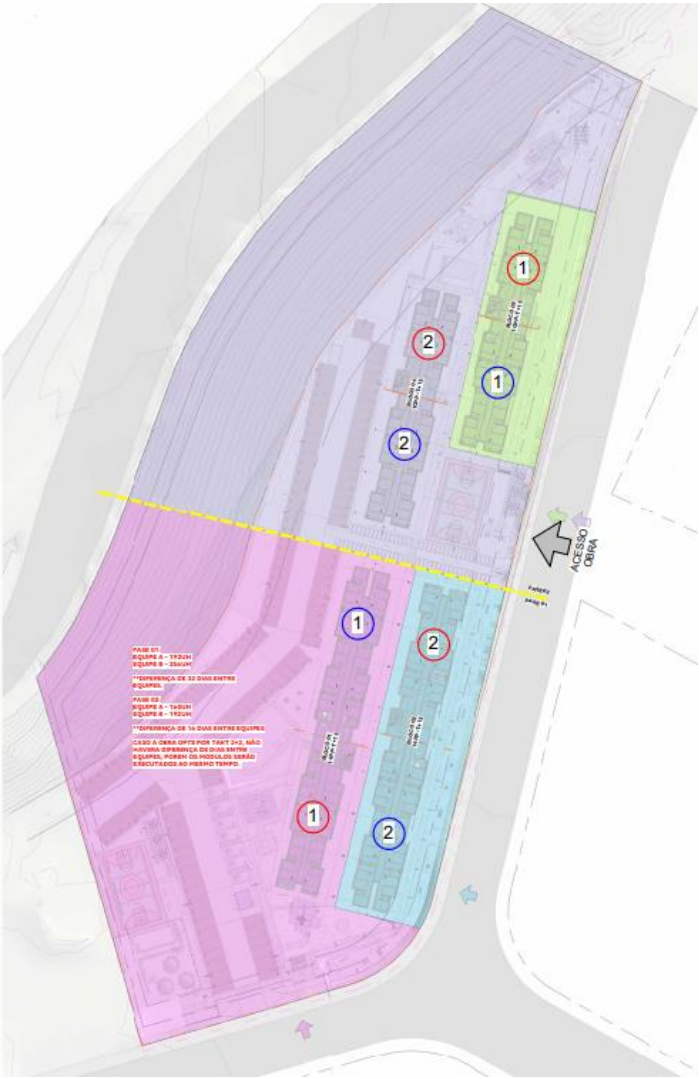

MODULAÇÃO E TOMBAMENTO

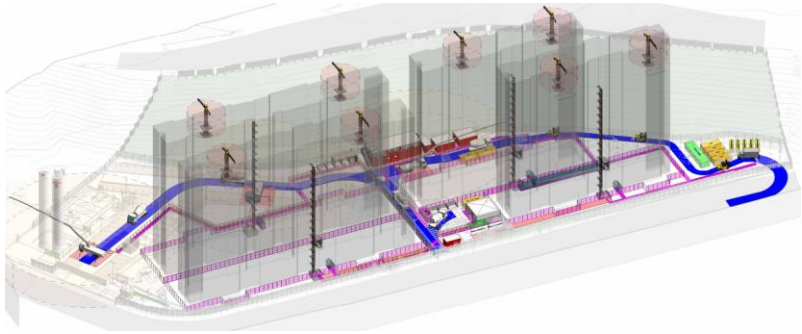

PARECER DE LOGISTICA EM EP

SISTEMA TENDA DE PROJETOS

CONSTRUÇÃO	GERENCIAMENTO EXTERNO	EMPREENDIMENTO-OBRA
Tenda		LOTE 01 - MDA SALVADOR - BA

ASSUNTO/ FASE DO PROJETO

PARECER DE LOGISTICA EM EP

(CENÁRIO 01) 14PP - 10PP/ T+15

ÁREA/SUB-AREA	SAP	REG.-MUNICIP.-FAIXA	MET.CONST.	CORE	UNID.HABIT.	ETAPA	DISCIP.	FOLHA	ASSUNTO/SETOR	Nº REV.
LG-UT40	1	BA-GRA-F02E	PCT	C00	00PP	EP	LOG	803	C01-PAAP	R00

GERENTE TÉCNICO	PROJETISTA
ARQª/ENGªDOMENICO JOSE	LOG LOGÍSTICA
COORDENADOR TÉCNICO: ARQª/ENGªDÉBORA PAN	

COORDENADOR DE PROJETO	DATA	ESCALA
ARQª/ENGªDÉBORA PAN	10/07/2023	1:INDICADA

ANALISTA DE PROJETO	ARQUIVO
ARQª/ENGªBRUNA ABUHAB	C:\Users\bcarvalho\OneDrive - tenda.com\Área de Trabalho\PROVISÓRIO\MDA 1_BA\EP\LG-UT40-1-BA-GRA-F02E-PCT-C00-00PP-EP-LOG-803-C01-PAAP-R00.rvt

Logística

CONDIÇÕES DETERMINANTES:

- **CUSTOS / OBRA**: A VIA PROJETADA DA TESTADA DO TERRENO (FUTURO VIÁRIO PÚBLICO), DEVERÁ SER EXECUTADA ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS E DEVERÁ SUPORTAR CARGA MÍNIMA DE 35 TON (BETONEIRA CARREGADA, GUINDASTE PARA IÇAMENTO DOS RESERVATÓRIOS E CARRETA), PARA VIABILIZAR O ACESSO DE VEÍCULOS AO EMPREENDIMENTO. CASO NÃO SEJA POSSIVEL A ANTECIPAÇÃO, DEVERÁ SER PREVISTA CAMADA DE SACRIFÍCIO, PARA QUE O ACESSO DE CAMINHÕES SEJA POSSÍVEL, EM PERÍODOS CHUVOSOS.
- **CUSTOS / OBRA**: PREVER CUSTO PARA SECCIONAMENTO DOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS (CASTELOS) EM DUAS PARTES, NÃO MAIORES QUE 20.00 METROS CADA (GABARITO MÁXIMO DA CARRETA DE TRANSPORTE), DEVIDO À ALTURA DOS MESMOS, PARA ACESSO DA CARRETA AO EMPREENDIMENTO
- **CUSTOS / OBRA / LEGALIZAÇÃO**: PREVISTA FAIXA DE TRABALHO DE 3M PARA EXECUÇÃO DO FECHAMENTO DO CONDOMÍNIO NA APP.
- **CUSTOS / OBRA / PLANEJAMENTO:** PRIORIZAR A EXECUÇÃO NO PERÍODO DE PRÉ-FORMA DO ENTERRADO DE REUSO

SOLUÇÕES TÉCNICAS:

- **CUSTOS / OBRA** : POSTERGAR A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DO SALÃO DE FESTAS, VISTO QUE O ACESSO PARA A CREMALHEIRA DO BLOCO 01 INTERFERE COM A ESTRUTURA DO SALÃO DE FESTAS
- **CUSTOS / OBRA** PREVER CUSTO ADICIONAL DE 6K/BLOCO PARA BLOCO 2 EM FASE 1 (TOTAL 6K), E BLOCOS 3 EM FASE 2 (TOTAL 6K) PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE REMOÇÃO PARA MOB. E DESM. MANUAL DA CREMALHEIRA.

CONDIÇÕES DETERMINANTES: DETERMINAM A VIABILIDADE DE EXECUÇÃO DA OBRA ,TÉCNICA E FINANCEIRA. SEM O CUMPRIMENTO DELAS, A OBRA NÃO CONSEGUE SER EXECUTADA.
SOLUÇÕES TÉCNICAS: INDICAM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU PROCESSOS PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL.
PONTO DE ATENÇÃO: DEMONSTRA POSSÍVEIS RISCOS À OPERAÇÃO.

PCP 161

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI	Folga Inicio
Reserva Piatã - F4	mai/23	352	2	B	01/11/23	17/02/24	17/02/24		12/06/24	14/06/24		abr/25	5,67
Parque Topázio - F1	abr/23	504	2	B	17/12/23	13/06/24	15/06/24		08/11/24	11/11/24		out/25	8,20
Parque Topázio - F2	nov/23	504	2	B	01/07/24	09/11/24	12/11/24		26/04/25	23/04/25		jan/26	7,63
Vista Salvador Norte	dez/23	420	2	A	19/06/24	01/11/24	02/12/24		29/03/25	01/04/25		dez/25	6,23
Encanto Piatã - F1	jun/24	576	2	A	25/09/24	30/03/25	02/04/25		29/09/25	05/10/25		jul/26	3,43
Vale dos Lírios F1	ago/24	448	2	B	11/12/24	24/04/25	27/04/25		13/09/25	18/09/25		jun/26	4,40
Vale dos Lírios F2	mar/25	316	2	B	04/06/25	14/09/25	19/09/25		24/12/25	31/12/25		set/26	2,73
Jardim Armação Prime	dez/24	380	2	A	18/04/25	30/09/25	06/10/25		30/01/26	06/02/26		nov/26	4,16
Morada das Estações	dez/24	679	2	B	25/07/25	25/12/25	01/01/26		30/07/26	09/08/26		mai/27	7,43
Vivenda Real I	jan/25	571	2	A	10/08/25	31/01/26	07/02/26		01/08/26	11/08/26		mai/27	6,90
Encanto Piatã - F2	jun/25	664	2	B	30/03/26	31/07/26	10/08/26		28/02/27	13/03/27		dez/27	9,63
Vila Laura Prime	ago/25	538	2	A	24/02/26	02/08/26	12/08/26		21/01/27	02/02/27		out/27	6,46
Sol Nascente Tower	dez/25	322	2	A	19/08/26	22/01/27	03/02/27		05/05/27	18/05/27		fev/28	8,25

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Salvador	SSA	45%	4.595	383	5.514	460

Empreendimento	Renda	Lançamento	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26
Encanto Piatã - F1	3.945	jun-24	49	49	3																
Vale Dos Lírios	3.307	ago-24	46	46	46	4															
Morada Das Estações	2.818	dez-24	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	8		
Jardim Armação Prime	7.496	dez-24	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20								
Vivenda Real Cond I	3.151	jan-25	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	13	
Vale dos Lírios - F2	**3.254**	**mar-25**		**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**41**												
V Salvador - Farol Da Barra	1.877	abr-25			130	90	90	90	90	90	90	90									
Encanto Piatã F2	3.557	ago-25							37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Vila Laura Prime	4.363	nov-25										30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Paralela Sun Prime - F1	4.286	nov-25										28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
V Salvador - Forte Sao Marcelo	1.877	jan-26												70	70	70	70	70	70	70	10
Vale Das Tulipas F1	3.217	fev-26													30	30	30	30	30	30	30
Mirante Veneza F1	3.577	mai-26																32	32	32	32
Vale das Orquídeas - F1	2.817	jun-26																	32	32	32
Vivenda Real Cond II	3.171	jul-26																		24	24
V Salvador - Parque Da Cidade	1.877	ago-26																			60
Privilege Salvador Norte	3.023	nov-26																			
Total de Vendas Lançados			**153**	**153**	**107**	**62**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**57**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**8**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**184**	**239**	**323**	**238**	**234**	**234**	**257**	**216**	**216**	**274**	**183**	**233**	**263**	**263**	**263**	**295**	**298**	**296**	**283**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Vale dos Lírios – F2 | Mapa Concorrência

		Vale dos Lírios – F2	Residencial Reserva Da Mata
		TENDA	MRV
	Distância Tenda (km)		1km
Região 1 Km	População	56.392	39.407
	Dens. Demográfica	18.062	12.625
	Renda (R$)	2.526	2.736
	Classe Social	C2 (1.5k a 2.7k)	C2 (1.5k a 2.7k)
	PEA Dia	22.508	17.843
Quantitativo	Lançamento	mar/25	jul/24
	Unidades	316	408
	Estoque	316	213
	VSO	55	39
	Stockout	6	5
	Preço Nominal (R$)	222.567	252.990
	Preço CEF (R$)	174.983	202.392
	Renda Comprador (R$)	3.254	2.900* Encash
	Dif Tenda (R$)		354
	Factibilidade		●
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	2	3
	Gabarito	T+15	T+17
	Plantas (m²)	38,7m²	36,92m² e 36,92m²
	Tipologia	2 Dorms	1 e 2 Dorms
	Opções	Não	Não
	Varanda	Não	Não
	Suite	Não	Não
	Dif. Entrega	Não	Equipado e Decorado
	Vagas	28% de Vagas	Sem Vaga
	Lazer	Quadras cobertas, Salão de Festas com churrasqueira.	Bicicletário, Brinquedoteca, Espaço Gourmet, Pet Place, Piscina, Piscina infantil, Playground, Salão de Festas,

Farol Renda
● Acima de 300
● Entre 0 e 300
● Abaixo de 0

*Encash – Financiadora MRV

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência possui target de preço de preço superior a Tenda, porém conta com a Encash para seu fluxo de pagamento, trazendo uma renda inferior ao previsto para o Vale dos Lirios – F2.
- Entendemos que não deve impactar devido a performance da F1 na região.

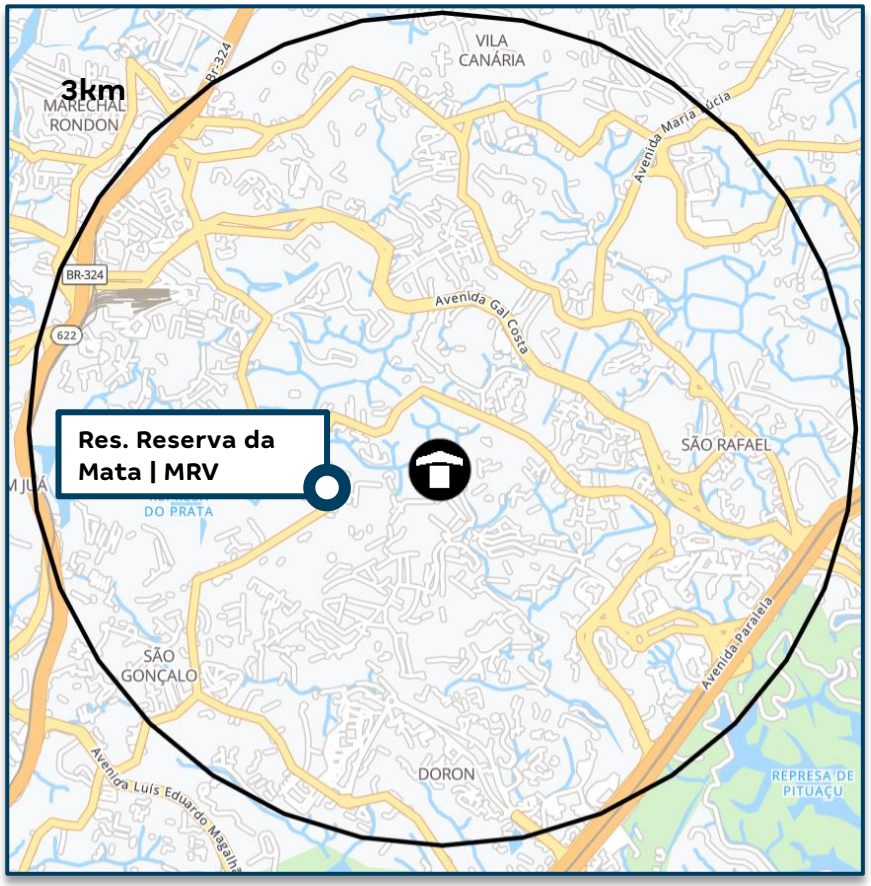

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vale dos Lírios - F2			
Tipo:	**Faixa 2 - Sem Vaga**		**Faixa 2 - Sem Vaga**	
Método	**Referência**		**Vision**	
Avaliação	220.137		220.137	
Renda Inicial (VF)	3.215		3.210	
Renda Final*	3.100		-	
% RET1	50%		-	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,26	4.024	0,95	3.012
FGTS	0,91	2.886	1,05	3.341
Financiamento	91,28%	156.627	92,13%	157.957
Subsídio	260,45%	12.745	231,69%	11.456
Prazo de Pró-soluto	18	18	18	18
Pró-Soluto	87,08%	18.308	88,81%	18.647
Preço Raso (RS)	194.590	194.590	194.413	194.413
TCD	78,32%	25.379	78,62%	25.442
VSO	40	40	40	40
Preço de Venda	**222.105**	**222.105**	**221.990**	**221.990**
Elasticidade	-0,962%	-0,962%	-0,962%	-0,962%
Preço de Venda Final	**219.969**	**219.969**	**219.855**	**219.855**
Preço Raso (R$)	**194.590**		**194.413**	
% de Raso	**88,46%**		**88,43%**	
BP25 - Não Inflacionado	**199.910**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**206.538**		**-**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vale dos Lírios - F2			
Tipo:	**Faixa 2 - Vaga Moto**		**Faixa 2 - Vaga Moto**	
Método	**Referência**		**Vision**	
Avaliação	230.000		230.000	
Renda Inicial (VF)	3.387		3.399	
Renda Final*	3.280		-	
% RET1	25%		-	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,13	3.774	1,12	3.774
FGTS	1,05	3.535	1,05	3.535
Financiamento	92,28%	164.280	91,80%	163.913
Subsídio	321,69%	10.667	330,27%	10.667
Prazo de Pró-soluto	18	18	18	18
Pró-Soluto	88,29%	19.556	89,58%	19.913
Preço Raso (RS)	201.811	201.811	201.801	201.801
TCD	76,75%	26.201	76,48%	26.201
VSO	8	8	8	8
Preço de Venda	**230.226**	**230.226**	**230.216**	**230.216**
Elasticidade	-0,962%	-0,962%	-0,962%	-0,962%
Preço de Venda Final	**228.012**	**228.012**	**228.002**	**228.002**
Preço Raso (R$)	**201.811**		**201.801**	
% de Raso	**88,51%**		**88,51%**	
BP25 - Não Inflacionado	**206.910**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**213.773**		**-**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vale dos Lírios - F2			
Tipo:	**Faixa 2 - Vaga Auto**		**Faixa 2 - Vaga Auto**	
Método	**Referência**		**Vision**	
Avaliação	246.667		246.667	
Renda Inicial (VF)	4.131		4.283	
Renda Final*	4.100		-	
% RET1	0%		-	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,61	2.493	0,73	3.081
FGTS	0,84	3.425	0,95	4.030
Financiamento	98,43%	181.352	95,97%	181.837
Subsídio	78,98%	1.540	105,47%	1.631
Prazo de Pró-soluto	18	18	18	18
Pró-Soluto	72,45%	19.574	71,60%	20.055
Preço Raso (RS)	208.384	208.384	210.634	210.634
TCD	53,93%	22.454	60,69%	26.201
VSO	7	7	7	7
Preço de Venda	**233.079**	**233.079**	**239.134**	**239.134**
Elasticidade	-0,962%	-0,962%	-0,962%	-0,962%
Preço de Venda Final	**230.838**	**230.838**	**236.834**	**236.834**
Preço Raso (R$)	**208.384**		**210.634**	
% de Raso	**90,27%**		**88,94%**	
BP25 - Não Inflacionado	**211.978**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**219.007**		**-**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vale dos Lírios - F2
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Referência**
Avaliação	224.993
Renda Inicial (VF)	3.357
Renda Final*	3.254

Tipo:	VF	R$
Ato	1,16	3.792
FGTS	0,92	3.053
Financiamento	92,34%	160.919
Subsídio	246,78%	11.011
Prazo de Pró-soluto	18	18
Pró-Soluto	85,41%	18.658
Preço Raso (RS)	197.433	197.433
TCD	74,99%	25.134
VSO	55	55
Preço de Venda	**224.707**	**224.707**
Elasticidade	-0,962%	-0,962%
Preço de Venda Final	**222.567**	**222.567**
Preço Raso (R$)	**197.433**	
% de Raso	**88,71%**	
Raso Todas as Fases	**197.433**	
Nominal Todas as Fases	**222.567**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Referência como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço referência, visto que, esse preço reflete a performance da fase anterior ajustando o preço apenas conforme os novos parâmetros da fase atual.

Além disso, conforme consta no slide “Panorama de Concorrência”, a concorrência possuí renda competitiva ao Produto Tenda, porém já temos performance estabelecida na região.

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vale dos Lírios - F2			
Tipo:	**Faixa 2 - Sem Vaga**		**Faixa 2 - Sem Vaga**	
Método	**Referência**		**Vision**	
Avaliação	220.137		220.137	
Renda Inicial (VF)	3.215		3.210	
Renda Final*	3.621		-	
% RET1	25%		-	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,26	4.252	0,95	3.183
FGTS	0,91	3.050	1,05	3.531
Financiamento	91,28%	165.528	92,13%	166.934
Subsídio	260,45%	13.469	231,69%	12.107
Prazo de Pró-soluto	21	21	21	21
Pró-Soluto	92,02%	22.573	93,86%	22.991
Preço Raso (RS)	208.873	208.873	208.746	208.746
TCD	82,77%	26.821	83,09%	26.888
VSO	13	13	13	13
Preço de Venda	**225.186**	**225.186**	**225.128**	**225.128**
Elasticidade	4,667%	4,667%	4,667%	4,667%
Preço de Venda Final	**235.695**	**235.695**	**235.634**	**235.634**
Preço Raso (R$)	**208.873**		**208.746**	
% de Raso	**88,62%**		**88,59%**	
BP25 - Não Inflacionado	**203.150**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**210.179**		**-**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vale dos Lírios - F2			
Tipo:	**Faixa 2 - Vaga Moto**		**Faixa 2 - Vaga Moto**	
Método	**Referência**		**Vision**	
Avaliação	230.000		230.000	
Renda Inicial (VF)	3.387		3.399	
Renda Final*	3.987		-	
% RET1	0%		-	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,13	3.988	1,12	3.988
FGTS	1,05	3.735	1,05	3.735
Financiamento	92,28%	173.616	91,80%	173.228
Subsídio	321,69%	11.273	330,27%	11.273
Prazo de Pró-soluto	21	21	21	21
Pró-Soluto	93,31%	24.112	94,67%	24.552
Preço Raso (RS)	216.724	216.724	216.777	216.777
TCD	81,11%	27.690	80,82%	27.690
VSO	3	3	3	3
Preço de Venda	**233.517**	**233.517**	**233.567**	**233.567**
Elasticidade	4,667%	4,667%	4,667%	4,667%
Preço de Venda Final	**244.414**	**244.414**	**244.467**	**244.467**
Preço Raso (R$)	**216.724**		**216.777**	
% de Raso	**88,67%**		**88,67%**	
BP25 - Não Inflacionado	**210.150**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**217.179**		**-**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Vale dos Lírios - F2			
Tipo:	**Faixa 2 - Vaga Auto**		**Faixa 2 - Vaga Auto**	
Método	**Referência**		**Vision**	
Avaliação	246.667		246.667	
Renda Inicial (VF)	4.131		4.283	
Renda Final*	4.820		-	
% RET1	0%		-	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,61	2.634	0,73	3.256
FGTS	0,84	3.620	0,95	4.259
Financiamento	97,33%	191.658	94,86%	192.170
Subsídio	78,98%	1.628	105,47%	1.724
Prazo de Pró-soluto	21	21	21	21
Pró-Soluto	76,57%	24.134	75,67%	24.728
Preço Raso (RS)	223.674	223.674	226.136	226.136
TCD	56,99%	23.730	64,14%	27.690
VSO	2	2	2	2
Preço de Venda	**236.373**	**236.373**	**242.509**	**242.509**
Elasticidade	4,667%	4,667%	4,667%	4,667%
Preço de Venda Final	**247.404**	**247.404**	**253.826**	**253.826**
Preço Raso (R$)	**223.674**		**226.136**	
% de Raso	**90,41%**		**89,09%**	
BP25 - Não Inflacionado	**210.838**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**217.867**		**-**	

Entorno

Distâncias POI Mobilidade

- Ponto de ônibus – 700m;
- Metrô – 3,6 KM
- Av. Gal Costa – 2,3 KM
- Centro comercial de Sussuarana – 2,1 KM
- Atacadão – 900 m
- Atakarejo – 2,6 KM
- UNEB – 3,1 KM
- Escola Bahiana de Medicina e Saúde – 4,3Km
- Drogasil – 2,6 KM
- Pague Menos – 2,7 KM

Percepção Comercial

Concorrência

Lançamentos na região (Raio de 5KM)

RESIDENCIAL RESERVA DA MATA

1. Avaliação Media: 265.726
2. Preço Médio: 269.845

Percepção Comercial

Parecer: O Parecer do ciclo é favorável a seguir com o projeto, mesmo com a concorrência direta da MRV, estamos em uma localização muito melhor, e com preço e condições mais competitivas.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Informações Gerais – Cenário aprovação

Vale dos Lirios - BA - Salvador Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	dez-22							
Vale dos Lírios F2 sem vaga		mar-25	set-25	jan-27	6 meses	16 meses	mar-28	36 meses
Vale dos Lírios F2 vaga moto		mar-25	set-25	jan-27	6 meses	16 meses	mar-28	36 meses
Vale dos Lírios F2 vaga carro		mar-25	set-25	jan-27	6 meses	16 meses	mar-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	6,03 MM	Incorrido Terreno:	0,00 MM	Área do Terreno (100%):	18.000 m²
Cash:	0,00 MM			Custo de terreno m²:	335,0
Permuta Financeira:	6,03 MM (8,00%)			VaR 25 (R$ mil):	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			VaR 26 (R$ mil):	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			Incorrido de Construção:	0,84 MM

Área Líquida do Terreno:	12.912 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	467,0
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	8,0% / 47,4%
CA Máx/Proj.	3,0 / 1,5
Incorridos de Incorporação:	0,79 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Vale dos Lírios F2 sem vaga	T+15	208.873	228	235.695	220.137	91,3%	92,0%	82,8%
Vale dos Lírios F2 vaga moto	T+15	216.724	48	244.414	230.000	92,3%	93,3%	81,1%
Vale dos Lírios F2 vaga carro	T+15	223.674	40	247.404	246.667	97,3%	76,6%	57,0%

Unidades Totais:	316	Preço Médio:	238.501	Renda Média:	3.357	ITBI+Emol. Unit.:	8.203
Unidades Tenda:	316	Avaliação Média:	224.993	Ato:	3.893 (1,16 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	14.102
VSO:	23 Unit.s.	VGV Total:	75.366.442	FGTS:	3.089 (0,92 Salários)	Preço Raso Médio:	211.939
RET Médio:	3,5%	VGV Tenda:	75.366.442	% em RET 1%:	18%		

Construção

Custo Total Unit.:	93.957	Eventuais:	4,00%	Área priv (m²):	38,66	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	13.074.388	LI:	23,71%	Exposição de Caixa (R$):	9.159.034	Margem Bruta Econômica:	44,02%
TIR:	119,84%	LI Aprovação:	20,00%	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(7.778.946)	Margem Bruta REF:	47,31%
Exposição de Caixa:	12,25%	Δ LI:	3,71%	Ger. Caixa 24 meses (R$):	16.890.399	Margem Rasa Econômica:	36,22%
Payback Contingente (21 m):	17 m/ (-4 m)	LI Marginal:	26,42%	Ger. Caixa Marginal (R$):	23.452.341	Margem Rasa REF:	40,71%
Payback Consolidado:	17 meses					Margem de Contribuição Econômica:	31,71%

DRE – Cenário aprovação

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Vale dos Lirios		Vale dos Lírios F2 sem vaga		Vale dos Lírios F2 vaga moto		Vale dos Lírios F2 vaga carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	74.784	100,0%	53.355	100,0%	11.658	100,0%	9.771	100,0%
PIS/COFINS	(1.420)	1,9%	(950)	1,8%	(256)	2,2%	(214)	2,2%
Custo Total	(41.066)	56,0%	(29.548)	56,4%	(6.301)	55,3%	(5.218)	54,6%
Custo Terreno	(5.983)	8,2%	(4.268)	8,1%	(933)	8,2%	(782)	8,2%
Custo Relacionados a Terreno	(437)	0,6%	(316)	0,6%	(66)	0,6%	(55)	0,6%
Custos de Incorporação	(1.355)	1,8%	(943)	1,8%	(245)	2,1%	(167)	1,7%
Custo de Construção	(33.291)	45,4%	(24.020)	45,8%	(5.057)	44,3%	(4.214)	44,1%
Lucro Bruto Econômico	32.298	44,0%	22.857	43,6%	5.102	44,7%	4.339	45,4%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	32.298	44,0%	22.857	43,6%	5.102	44,7%	4.339	45,4%
Despesas de Selling	(7.313)	10,0%	(5.223)	10,0%	(1.133)	9,9%	(957)	10,0%
Contingência	(1.720)	2,3%	(1.227)	2,3%	(268)	2,4%	(225)	2,4%
Margem de Contribuição	23.265	31,7%	16.408	31,3%	3.701	32,5%	3.157	33,0%
IR e CSLL	(1.162)	1,6%	(778)	1,5%	(209)	1,8%	(175)	1,8%
Margem Líquida	22.104	30,1%	15.630	29,8%	3.492	30,6%	2.982	31,2%
Lucro Bruto REF Unit.	115.309	47,3%	112.777	46,8%	120.728	48,3%	124.700	49,1%
Lucro Raso REF Unit.	88.138	40,7%	85.343	39,9%	92.441	41,7%	100.366	43,7%

R$ Mil - VPL - Compra	Vale dos Lirios		Vale dos Lírios F2 sem vaga		Vale dos Lírios F2 vaga moto		Vale dos Lírios F2 vaga carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	55.150	100,0%	39.416	100,0%	8.605	100,0%	7.129	100,0%
PIS/COFINS	(1.031)	1,9%	(692)	1,8%	(186)	2,2%	(154)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(41.045)	74,4%	(29.466)	74,8%	(6.341)	73,7%	(5.238)	73,5%
Custo Terreno	(4.223)	7,7%	(3.018)	7,7%	(659)	7,7%	(546)	7,7%
Custo Relacionados a Terreno	(492)	0,9%	(355)	0,9%	(75)	0,9%	(62)	0,9%
Custos de Incorporação	(1.336)	2,4%	(932)	2,4%	(239)	2,8%	(166)	2,3%
Custo de Construção	(27.197)	49,3%	(19.623)	49,8%	(4.131)	48,0%	(3.443)	48,3%
Despesas de Selling	(6.259)	11,3%	(4.477)	11,4%	(977)	11,4%	(805)	11,3%
Contingência	(694)	1,3%	(495)	1,3%	(108)	1,3%	(91)	1,3%
IR e CSLL	(844)	1,5%	(566)	1,4%	(152)	1,8%	(126)	1,8%
Lucro Imobiliário	13.074	23,7%	9.259	23,5%	2.078	24,2%	1.737	24,4%

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Lançamento Anterior	BP - 2025	Atual	Atual vs BP - 2025	Δ%
Data Estudo:	julho-24	setembro-24	fevereiro-25	5 Meses	N/A
Lançamento:	fevereiro-26	março-25	março-25	0 Meses	N/A
Uhs:	316	316	316	-	0,0%
Preço Nominal:	232.823	255.377	238.501	(16.876)	-6,6%
Preço Raso:	207.055	226.462	211.939	(14.522)	-6,4%
Preço Nominal Inflacionado:	256.199	269.071	244.131	(24.941)	-9,3%
Preço Raso Inflacionado:	227.838	238.628	216.959	(21.669)	-9,1%
Renda Média:	2.954	3.272	3.357	85	2,6%
RET Médio:	n/a	4,0%	3,5%	-0,5 p.p.	
% em RET 1%:	n/a	0,0%	18,0%	18,0 p.p.	
VSO:	18	18	18	-	0,0%
ITBI/Emol. (Unit):	7.749	10.714	8.203	(2.511)	-23,4%
Prazo construção F1:	14	15	16	1	6,7%
Prazo de Pró-Soluto F1:	19	20	21	1	5,0%
Custo Total Inf (uh):	143.379	127.730	129.956	2.226	1,7%
Custo Construção:	90.655	87.547	93.957	6.410	7,3%
Fração de construção:	39%	33%	39,4%	6,1 p.p.	18,2%
Custo Terreno:	6.890.242	6.586.420	5.982.741	(603.680)	-9,2%
Custo Relacionados a Terreno (uh):	699	2.846	1.384	(1.462)	-51,4%
Fração do Terreno[1]:	8,34%	8,0% / 42,3%	8,0% / 47,4%	0,0 p.p.	0,0%
ITBI/Emol. (Total):	2.448.634	3.385.748	2.592.284	(793.463)	-23,4%
Custo do Ciclo:	13.195	15.100	14.102	(998)	-6,6%
Lucro Imobiliário:	24,4%	26,9%	23,7%	-3,2 p.p.	-11,9%
Exposição de caixa:	20,8%	13,1%	12,2%	-0,8 p.p.	-6,3%
TIR:	87,8%	90,4%	119,8%	29,4 p.p.	32,5%
Margem Bruta REF:	n/a	53,1%	47,3%	-5,8 p.p.	
Margem Bruta Econômica:	40,8%	49,9%	44,0%	-5,9 p.p.	-11,7%
Margem Rasa REF:	n/a	47,1%	40,7%	-6,4 p.p.	
Margem Rasa Econômica:	33,1%	42,8%	36,2%	-6,6 p.p.	-15,3%
Margem Contribuição Econômica:	32,6%	36,4%	31,7%	-4,7 p.p.	-12,8%
Payback Contingente (Régua 21 m):	n/a	16 m/ (-5 m)	17 m/ (-4 m)	1,0 p.p.	6,3%
Payback Consolidado:	16 meses (Fase)	16 Meses	17 Meses	1 Meses	6,3%

[1] Valor do terreno contratual

Informações Gerais – Cenário Real

Vale dos Lírios - BA - Salvador Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	dez-22							
Vale dos Lírios F2 sem vaga		mar-25	jun-25	out-26	3 meses	16 meses	mar-28	36 meses
Vale dos Lírios F2 vaga moto		mar-25	jun-25	out-26	3 meses	16 meses	mar-28	36 meses
Vale dos Lírios F2 vaga carro		mar-25	jun-25	out-26	3 meses	16 meses	mar-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	5,63 MM	Incorrido Terreno: 0,00 MM	Área do Terreno (100%):	18.000 m²	Área Líquida do Terreno: 12.912 m²
Cash:	0,00 MM		Custo de terreno m²:	312,6	Custo de terreno m² Área Líquida: 435,8
Permuta Financeira:	5,63 MM (8,00%)		VaR 25 (R$ mil):	0	Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV): 8,0% / 50,2%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		VaR 26 (R$ mil):	0	CA Máx/Proj. 3,0 / 1,5
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%		Incorrido de Construção:	0,84 MM	Incorridos de Incorporação: 0,79 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Vale dos Lírios F2 sem vaga	T+15	194.590	228	219.969	220.137	91,3%	87,1%	78,3%
Vale dos Lírios F2 vaga moto	T+15	201.811	48	228.012	230.000	92,3%	88,3%	76,7%
Vale dos Lírios F2 vaga carro	T+15	208.384	40	230.838	246.667	98,4%	72,5%	53,9%

Unidades Totais:	316	Preço Médio:	222.567	Renda Média:	3.357	ITBI+Emol. Unit.:	7.426
Unidades Tenda:	316	Avaliação Média:	224.993	Ato:	3.893 (1,16 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	13.160
VSO:	55 Unit.s.	VGV Total:	70.331.133	FGTS:	3.089 (0,92 Salários)	Preço Raso Médio:	197.433
RET Médio:	2,8%	VGV Tenda:	70.331.133	% em RET 1%:	40%		

Construção

Custo Total Unit.:	93.957	Eventuais:	4,00%	Área priv (m²):	38,66	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	13.588.605	LI:	24,21%	Exposição de Caixa (R$):	8.708.767	Margem Bruta Econômica:	42,30%
TIR:	186,20%	LI Aprovação:	20,00%	Ger. Caixa 12 meses (R$):	4.616.322	Margem Bruta REF:	43,84%
Exposição de Caixa:	12,29%	Δ LI:	4,21%	Ger. Caixa 24 meses (R$):	16.041.561	Margem Rasa Econômica:	34,26%
Payback Contingente (21 m):	9 m/ (-12 m)	LI Marginal:	26,87%	Ger. Caixa Marginal (R$):	21.634.007	Margem Rasa REF:	36,71%
Payback Consolidado:	9 meses					Margem de Contribuição Econômica:	30,36%

DRE – Cenário Real

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Vale dos Lírios		Vale dos Lírios F2 sem vaga		Vale dos Lírios F2 vaga moto		Vale dos Lírios F2 vaga carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	70.841	100,0%	50.535	100,0%	11.020	100,0%	9.286	100,0%
PIS/COFINS	(1.092)	1,5%	(692)	1,4%	(196)	1,8%	(204)	2,2%
Custo Total	(40.245)	57,7%	(28.957)	58,1%	(6.173)	57,0%	(5.115)	56,3%
Custo Terreno	(5.667)	8,1%	(4.043)	8,1%	(882)	8,1%	(743)	8,2%
Custo Relacionados a Terreno	(390)	0,6%	(281)	0,6%	(59)	0,5%	(49)	0,5%
Custos de Incorporação	(1.337)	1,9%	(930)	1,9%	(242)	2,2%	(165)	1,8%
Custo de Construção	(32.852)	47,1%	(23.703)	47,6%	(4.990)	46,1%	(4.158)	45,8%
Lucro Bruto Econômico	29.503	42,3%	20.885	41,9%	4.651	43,0%	3.967	43,7%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	29.503	42,3%	20.885	41,9%	4.651	43,0%	3.967	43,7%
Despesas de Selling	(6.695)	9,6%	(4.781)	9,6%	(1.039)	9,6%	(875)	9,6%
Contingência	(1.629)	2,3%	(1.162)	2,3%	(253)	2,3%	(214)	2,4%
Margem de Contribuição	21.179	30,4%	14.942	30,0%	3.358	31,0%	2.879	31,7%
IR e CSLL	(894)	1,3%	(567)	1,1%	(161)	1,5%	(167)	1,8%
Margem Líquida	20.285	29,1%	14.375	28,8%	3.198	29,5%	2.712	29,9%
Lucro Bruto REF Unit.	98.189	43,8%	95.911	43,2%	103.577	45,0%	106.171	45,6%
Lucro Raso REF Unit.	72.935	36,7%	70.413	35,9%	77.240	37,9%	83.609	39,8%

R$ Mil - VPL - Compra	Vale dos Lírios		Vale dos Lírios F2 sem vaga		Vale dos Lírios F2 vaga moto		Vale dos Lírios F2 vaga carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	56.133	100,0%	40.033	100,0%	8.704	100,0%	7.396	100,0%
PIS/COFINS	(853)	1,5%	(540)	1,3%	(153)	1,8%	(160)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(41.692)	74,3%	(29.903)	74,7%	(6.422)	73,8%	(5.366)	72,6%
Custo Terreno	(4.298)	7,7%	(3.065)	7,7%	(666)	7,7%	(566)	7,7%
Custo Relacionados a Terreno	(448)	0,8%	(323)	0,8%	(68)	0,8%	(57)	0,8%
Custos de Incorporação	(1.331)	2,4%	(928)	2,3%	(239)	2,7%	(165)	2,2%
Custo de Construção	(27.996)	49,9%	(20.199)	50,5%	(4.253)	48,9%	(3.544)	47,9%
Despesas de Selling	(6.235)	11,1%	(4.456)	11,1%	(965)	11,1%	(814)	11,0%
Contingência	(687)	1,2%	(490)	1,2%	(107)	1,2%	(90)	1,2%
IR e CSLL	(698)	1,2%	(442)	1,1%	(125)	1,4%	(131)	1,8%
Lucro Imobiliário	13.589	24,2%	9.589	24,0%	2.129	24,5%	1.870	25,3%

Obrigada!
