Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento

Regional: PR

Projeto: Elevato Miraggio (Ativo NT)

Data Comitê: 24/03/2025

Questionamentos

Nome	Elevato Miraggio - Investimento	Observação - Elevato Mirragio
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	Ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Discutir em Comitê	queria entender melhor pq MRV consegue um preço tão melhor em "região parecida" e por quanto ela precificou os atributos vc nossa proposta?
Rodrigo Osmo	Discutir em Comitê	(1) Por que corretagem é paga a vista se permuta é paga a prazo?

Questionamentos

Luiz Mauricio – Queria entender melhor porque a MRV consegue um preço tão melhor em uma "região parecida" e quanto ela precificou vs. nossa proposta

Resposta – produto da MRV com melhores atributos de produto: maior área privativa, 100% de vagas, churrasqueira em todas as varandas e acabamento em pintura lisa nas paredes.

Atributo	Tenda	MRV
Área privativa [m²]	35	37-42
% vagas	13%	100%
% uhs com varanda	71%	66%
Churrasqueira na varanda	Não	Sim
Garden no térreo	Não	Sim
Acabamento paredes	Texturizada	Lisa
Preço médio	**R$ 252.601**	**R$ 321.827**

Tenda		MRV		Dif. atributos	Dif. Preço
Sem varanda Sem vaga	R$ 237.605	**Sem varanda com vaga**	R$ 310.165	2 m² privativos, acabamento paredes & vaga	R$ 72.560
Com varanda com vaga	R$ 274.734	**Com varanda Com vaga**	R$ 325.064	7 m² privativos, acabamento paredes & churrasqueira na varanda	R$ 50.330

Questionamentos

Luiz Mauricio – Queria entender melhor porque a MRV consegue um preço tão melhor em uma “região parecida” e quanto ela precificou vs. nossa proposta

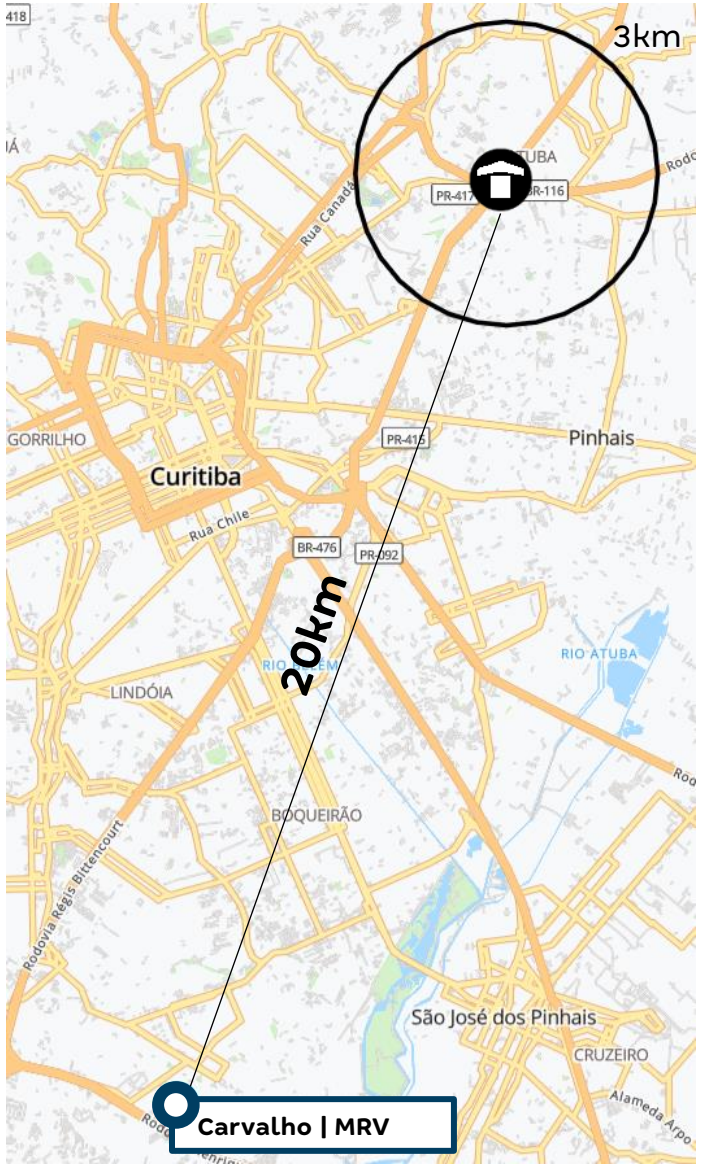

		Elevato Miraggio	Carvalho
		TENDA	MRV
	Distância Tenda (km)		20KM
Região 1 Km	População	13.032	14.104
	Dens. Demográfica	4.175	4.518
	Renda (R$)	8.016	4.332
	Classe Social	B2 (4.6k a 8.1k)	C1 (2.7k a 4.6k)
	PEA Dia	8.680	7.869
Quantitativo	Lançamento	set/26	mar/25
	Unidades	400	360
	Estoque	400	306
	VSO	22	54
	Stockout	18	6
	Avaliação	240.000	301.740
	Preço Nominal (R$)	237.605	301.240
	Preço CEF (R$)	190.432	240.992
	Renda Comprador (R$)	3.597	5.650
	Dif Tenda (R$)		-2.053
	Factibilidade		●
	Avaliação	258.649	343.760
	Preço Nominal (R$) - Varanda	258.652	321.290
	Preço CEF (R$) - Varanda	206.143	257.032
	Renda Comprador (R$) - Varanda	5.053	6.050
	Dif Tenda (R$)		-997
	Factibilidade		●
Qualitativo	Condomínios	1	3
	Torres	2	2
	Gabarito	T+16	T+13
	Plantas (m²)	35m²	42m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Garden
	Varanda	71% - Varanda	66% - Varanda C/ Churras
	Suite	Não	Não
	Dif. Entrega	Não	Equipado e Decorado
	Vagas	13% de Vagas	100% de Vagas
	Lazer	Quadra Poliesportiva, Salão De Festas, Gourmet Interno, Fiitness Interno, Coworking, Brinquedoteca, Playkids, Playbaby, Playpet	Academia Coberta, Espaço Gourmet, Pet Place, Playground, Quadra Recreativa, Salão de Festas.

Segue em anexo as informações referente ao lançamento da MRV, vale ressaltar que no parecer de IM não consta o concorrente, devido a distância de preço e localização **(20km)** que os mesmos possuem.
A MRV possui avaliação superior tendo em vista os diferenciais de produto.

** Projeto com cálculo de renda considerando negociação padrão, sem consideração de Encash.

Questionamentos

Rodrigo Osmo – Porque a corretagem é paga a vista se permuta é paga a prazo

Resposta – Os pagamentos de corretagem costumam descolar do formato de remuneração aplicado aos terrenos. Nesse negócio, o Intermediador conseguiu convencer o Fundo proprietário do imóvel a aceitar **permuta financeira ao invés de cash**, e isso foi fundamental para viabilizarmos. Nós negociamos uma redução no percentual da intermediação (de 6% para 5%) porém, por se tratar do **1° negócio** com ele, **não conseguimos o parcelamento** dessa intermediação. Na Regional PR, costumamos pagar entre 3-5% sobre o valor em permuta, em alguns casos parcelado e, dependendo da relevância quanto ao valor, pagando com apartamentos no próprio empreendimento. Abaixo histórico das ultimas baixas no PR e BR:

Regional PR - 2024

Últimos projetos baixados PR vs. Elevato Miraggio

Projeto	Intermediação	Pgto intermediação	Fixo e irreajustável	Momento
E. Andaluz/Lusitano	3,75%	100% cash	Sim	30d da ECV em 6x
E. Nord	3,00%	30% cash / 70% aptos	Sim	30d da ECV em 1x
E. Uno	5,00%	100% cash	Sim	30d da ECV em 1x
G. Nebbiolo/Trebbiano	0,00%	-	-	
E. Miraggio	5,00%	100% cash	Sim	30d da ECV em 1x

Amostragem BR

Últimos 23 projetos

		Nominal	%
Amostragem Total		23	100%
Negócios com corretagem		19	83%
Percentual médio corret.			4,4%
N° de parcelas pagto corret.	1x	11	58%
	2x	2	11%
	5x	2	11%
	6x	3	15%
	10x	1	5%
Pagto na ECV		2	11%
Pagto na ECV+1		13	68%
Pagto Lançamento		1	5%
Pagto no repasse CEF		2	11%
Pagto ECV+Perm. Fisica		1	5%
Corretagem c/correção		7	37%
Corretagem s/correção		12	63%

One Page – Elevato Miraggio

Cidade	Curitiba	**Mancha de demanda**	PR - CWBS - Curitiba Sul
Regional	PR	**Cluster MPR**	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Investimento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Mar

Unidades (% Vagas)	400 (13%)	**CA Máx | Proj**	1,9 | 1,9
Tipologia	F2E Plus - Concreto	**Escritura**	jun-26
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	set/26 | 24

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	14.146 (14,0%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	14,0% (100,0%)
Valor R$/m²	3.344	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	38.828 (38,4%)	**Indireto Unit.**	18.800
Prazo da Obra (meses)	18	**Torre Unit.**	56.221
Custo Total Unit. (LPU):	97.070 (88)	**Infra Unit.**	15.878
Início de Obra	mar-27	**Fundação Unit.**	4.690

Preço Nominal Unit.	252.601	**VSO**	22
Preço Raso Unit.	232.905	**Referência**	VISION
Avaliação Unit.	253.288	**Renda (% em RET 1%)**	4.420 (0,0%)



LI (Régua):	**20,0% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	38,5%
LI Resiliência:	14,2% (N/A)	**Margem Rasa Econômica:**	32,7%
Margem Bruta REF:	42,6%	**Margem Contribuição Econômica:**	25,9%
Margem Rasa REF:	**37,7%**	**Exposição (% VGV):**	9.278 (8,6%)
TIR:	164,6%	**VGV Total:**	101.041
Payback Contingente (21 m) :	**18 m/ (-3 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	-
Payback Consolidado:	18	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	(4.251)

Destaques

Terreno para verticalização (T+16), 400 uhs em condomínio único, sem COHAB

Localizado no Atuba, bairro residencial de médio padrão em expansão. Projeto com duas testadas, sendo uma para a Linha Verde e Estação Tubo Atuba (ônibus), com ligação direta ao Centro de Curitiba através de via expressa. A outra, ao lado do Parque Atuba (pista de caminhada, lago, quadras, playgrounds) e da Pedreira do Atuba, futuro local de shows e exposições do Governo do Estado. Negócio fechado com fundo de investimento (SB Crédito) que arrematou o terreno em abr/2023. **CVC assinado em 15/12/24**.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

- Total de contrato = 12,35 MM, sendo 100% em permuta financeira e referente a uma fração de 14,0% do VGV, **sem descontos e sem preço mínimo garantido.**
- Negócio idealizado com 360 uhs e 20% de vagas – AP com 400 uhs e 13% de vagas
- Caso seja constatado VGV do empreendimento inferior a R$83,8MM fica a Tenda obrigada a negociar e revalidar os termos do instrumento com a permutante. VGV atual em R$101,0MM (para R$ 83,8MM preço médio teria que ser 209k)
- *Way-out* por resolutivas padrão de viabilidade técnica, jurídica, legal e/ou financeira.
- Superação das resolutivas: 18 meses da assinatura do CVC
- Prazo máximo para lançamento: Não há
- Prazo máximo para início de obra: Não há
- Intermediação: 617,4 k em parcela única, fixa e irreajustável, 30 dias após a ECV (equivalente a 5,0% do valor do CVC – Na VF 4,4%).

GARANTIA:

- Apólice de Seguro Garantia ou Carta fiança, a critério da Tenda. A garantia terá o prazo de 12 meses e será anualmente renovada ou repactuada, por iguais e sucessivos períodos, até a conclusão dos pagamentos. Caso não seja apresentada, há multa de 0,033% ao dia (limitada a 5%) + juros de 1% ao mês até adimplemento.

DEMAIS CONSIDERAÇÕES:

- Produto contará com 29% de unidades sem varanda e sem vaga (preço 238k), 58% de unidades com varanda e sem vaga (preço 255k) e 13% de unidades com varanda e vaga (preço 275k).
- Ciclo entende ser adequado o preço sugerido por IM para a renda e região frente a concorrência. **Não considerado cheque estadual CASAFÀCIL/COHAPAR de 20k**. Produto da MRV com 42m², 100% de vagas e varanda sendo comercializado a 320k em região similar.
- Não foi considerado eventual ganho com a implementação de churrasqueira nas varandas.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro
- Pareceres anexos

Farol Pareceres – Elevato Miraggio

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Due diligence - previsão de conclusão em 31/03. Análise da solvência e situação jurídica da Vendedora e seus sócios foi concluída e não foram apontados óbices ao negócio, porém estão pendentes alguns extratos de débitos para conclusão documental.	Ok com ressalvas	
Legalização	Necessidade de visto do DNIT para aprovação do projeto (etapa adicional na esteira de legalização).	Ok com ressalvas	
Produto	Sem riscos	Ok	
GETEC	As diretrizes de concessionária estão com 60 UHS abaixo do cenário atual	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos	Ok	
Contratação	Sem riscos	Ok	
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Ciclo entende ser adequado o preço sugerido por IM para a renda e região frente a concorrência. Não considerado cheque estadual CASAFÀCIL/COHAPAR de 20k. Produto da MRV com 42m², 100% de vagas e varanda sendo comercializado a 320k em região similar.	Ok	
Estudos Econômicos	Sem riscos	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- CWBN – Curitiba Norte + Alm. Tamandaré

LandBank

1. Reserva Esmeralda
2. Elevato Miraggio

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 4 - Azul

Região

Capital

Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Elevato Miraggio
Investimento

Informações Gerais – Condomínio Único		
Terreno	**Área terreno**	8.183,38m²
	Menor poligonal	8.056,26m²
	Área Verde Incentivo	Sim – 3.779,70m²
	Reserva de Calçada/ Melhoramento Viário	Sim – 127,12m²
	Área Liquida	4.229,89m²
	Zoneamento	POLO –LINHA VERDE
	CA Básico	1,00
	CA máximo (Incentivo Área Verde)	1,94
	CA projetado	1,94
	Gabarito máximo	Livre
Geral	**Total UH**	400
	Total de vagas	52 vagas (13%)
Tipologia	**Tipologia**	PR-0200-LF-PC10 – COM ELEVADOR
	Gabarito	T+16
	Lâmina	10PP | 14PP
	Área privativa	34,99m²
Condomínio	**Unidade PCD**	12
	Unidade lazer | área técnica - adm	04| 02
	Torre	02
	Fase	Única
Lazer	**Lazer coberto**	Salão de Festas Externo, Salão de Festas Gourmet, Brinquedoteca, Fitness, Espaço Office, Espaço Saúde, Espaço Teen.
	Lazer descoberto	PlayKids e PlayBaby

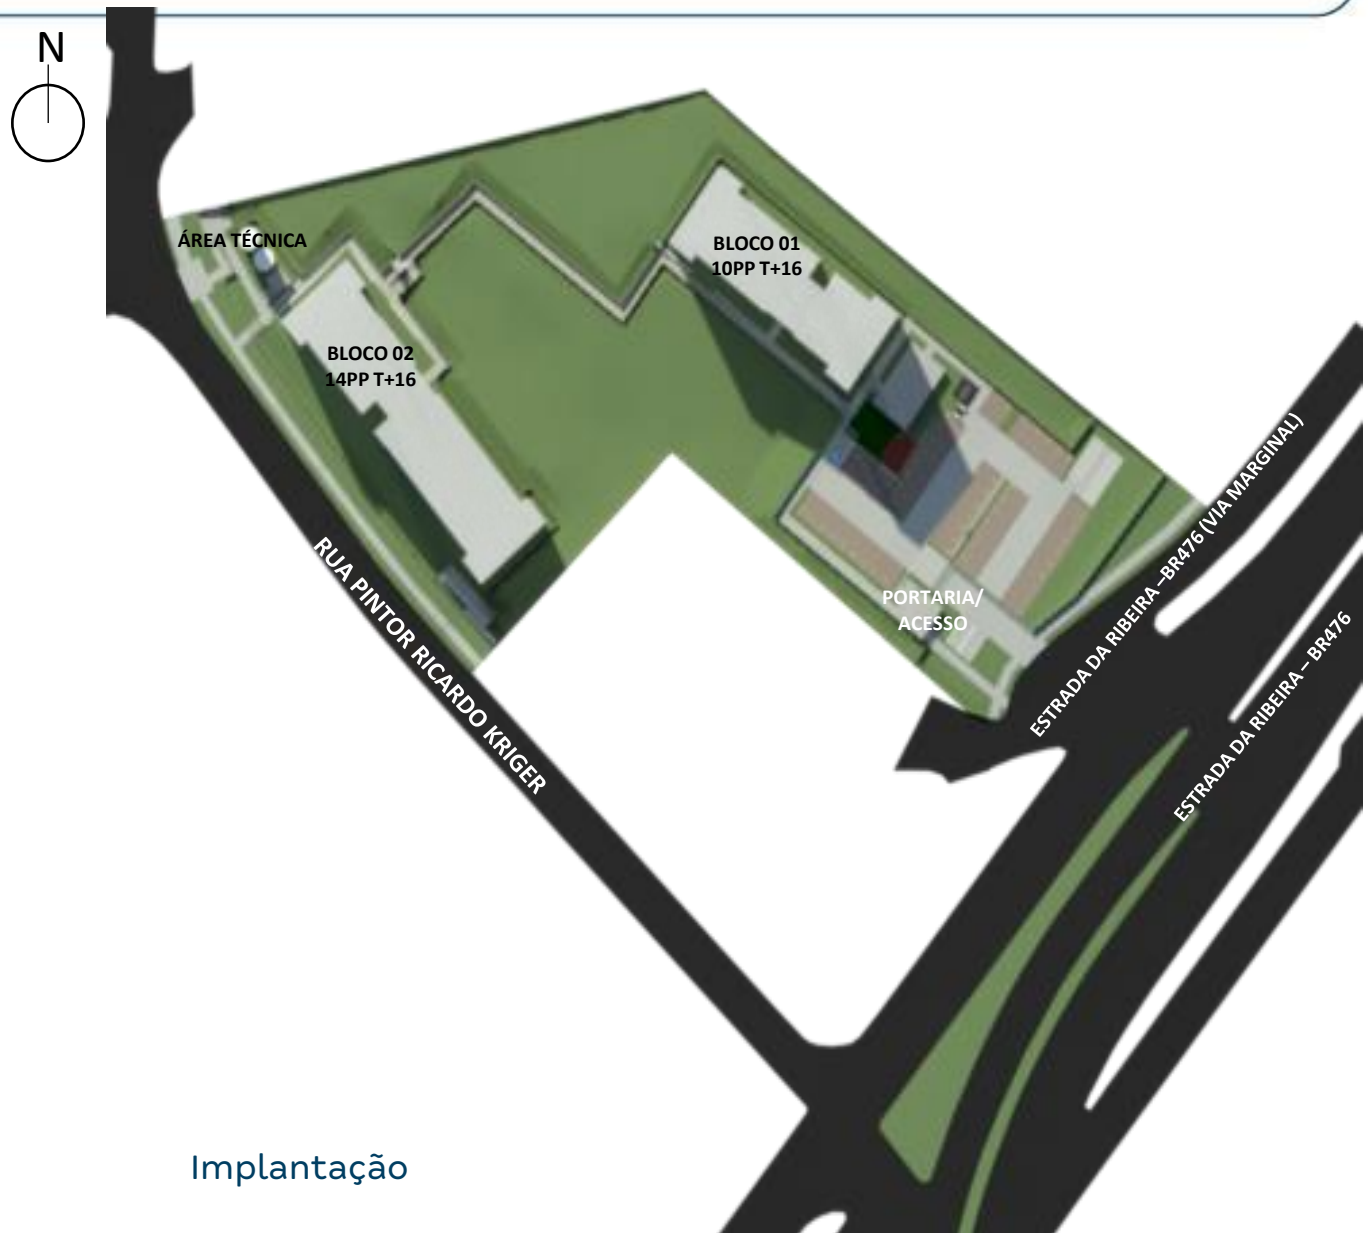

Implantação

PRODUTO

Empreendimento Elevato Miraggio
Investimento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	Limite supercondomínio	●	-
	Acesso	●	-
	Percurso do pedestre até torre	●	
Diferencial produto	Atributos Infra	Não	-
	Atributos Torre	Sim	Varanda nos apartamentos
	Edifício Garagem	Não	-

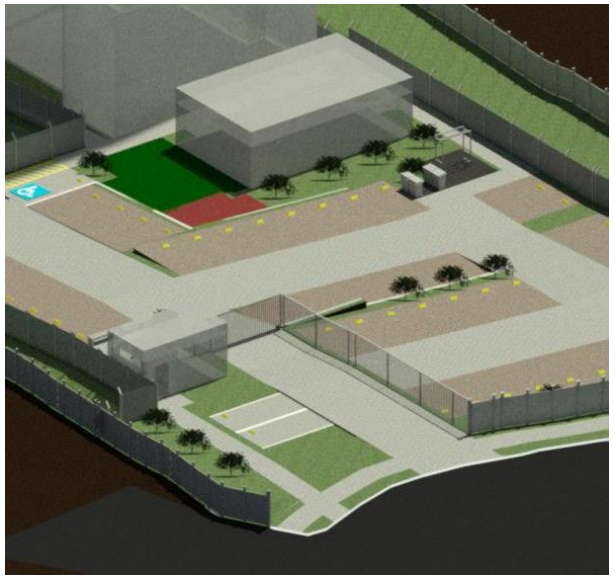

Portaria

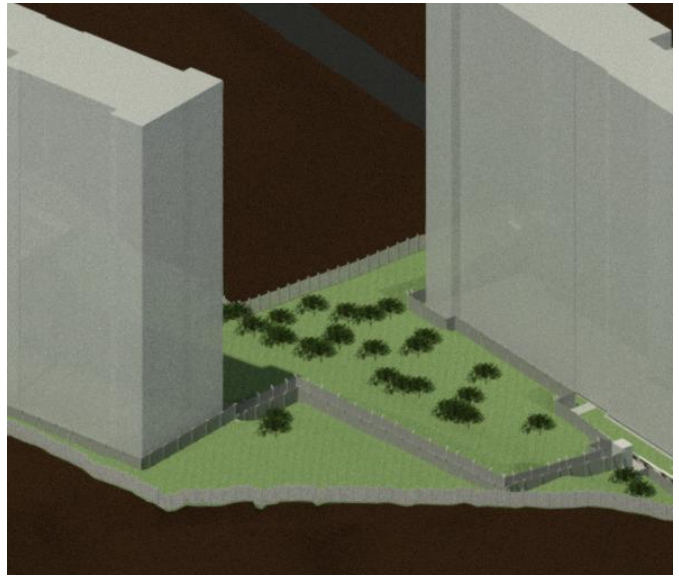

Maciço de Árvores Preservadas

Vista aérea

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Condições do Negócio

VALOR DO NEGÓCIO

- Valor Total: R$ 12.348.000**.** Na VF: R$ 14.145.671 (diferença entre preço de venda entre estimado CVC = 245k e parecer IM = 252,6k);

FORMA DE PAGAMENTO

- Permuta financeira de 14,0% do VGV, sem aplicação de descontos.
- O VGV estimado do empreendimento estabelecido pelas partes é de R$ 88,2MM, sendo que caso a Tenda constate a qualquer momento variação a menor, superior a 5% frente ao VGV estimado, ficará esta obrigada a negociar e revalidar os termos deste instrumento com a permutante, que decidirá de forma autônoma acerca da aceitação dos novos valores. VGV atual: R$ 101MM

- **PRAZOS CONTRATUAIS**
- Superação das condições resolutivas: 18 meses da assinatura da CVC;
- **NÃO HÁ** prazo limite para Lançamento, Início de Obras, Conclusão de Obras e quitação da permuta financeira.

GARANTIAS

- **Em favor da Tenda:** N/A;
- **Em favor dos Permutantes:** Apólice de Seguro Garantia ou Carta fiança, a critério da Tenda. A garantia terá o prazo de 12 meses e será anualmente renovada ou repactuada, por iguais e sucessivos períodos, até o cumprimento integral das obrigações assumidas pela Tenda, tomando-se sempre por referência, para o valor a ser coberto pela apólice, o saldo devido na época e de acordo com a variação do VGV do Empreendimento. Caso não apresentada, multa de 0,033% ao dia (limitada a 5%) + juros de 1% ao mês até adimplemento. Em VF: considerado Seguro Permuta para a Permuta Financeira e taxa de 1,5% a.a.

CORREÇÃO MONETÁRIA

- Para fins de penalidade ou multa será aplicado IPCA.

INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA

- R$ 617.400,00 em dinheiro - equivalente a 5% do valor do CVC- em parcela única, fixa e irreajustável, paga em 30 dias da escritura de compra e venda e através de emissão de nota fiscal. Na VF, com o incremento de valor do negócio, a fração reduziu para 4,4%.

Demais Considerações

- Mantidas todas as condições resolutivas padrão Tenda na minuta do CVC, com exceção da aprovação em Comitê de Lançamento.
- CVC assinado pela permutante em **15/12/24.**

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Custo de Construção

	ELEVATO MIRAGGIO ATIVO NT CEN02 | REV03	ANDALUZ CEN02 | REV01	LUSITANO CEN02 | REV01
Torres	2	2	2
Unidades Construídas	408	420	320
Unidades Vendidas	400	414	314
Unidades Varada	285	202	152
Unidades Varada e Churrasqueira		198	152
Condomínios (qta.)	1	1	1
Cidade	Curitiba - PR	Curitiba - PR	Curitiba - PR
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	1 Torre | T+16| 10PP | CE1A	2 Torres | T+14 | 14PP | CE2A	2 Torres | T+15 | 10PP | CE2A
Tipologia	1 Torre | T+16| 14PP | CE1A		
Atributos de Projeto	Varanda	Varanda | Varanda c/ Churrasqueira	Varanda | Varanda c/ Churrasqueira
Projeto Infra	AP	AP	AP
Projeto Torre	AP	EM	EM
Mês Base	março-25	dezembro-24	dezembro-24
Incc	1.173,775	1.149,170	1.149,170
LVS	novembro-24	outubro-24	outubro-24
Indiretos	novembro-24	outubro-24	outubro-24
Base de Preço	LPU 86	LPU 85	LPU 85
Takt	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	18	19	17
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 97.070	R$ / UND R$ 94.972	R$ / UND R$ 100.592
Indireto	R$ 18.800	R$ 17.161	R$ 19.349
Torre	R$ 56.221	R$ 57.230	R$ 59.279
Infra	R$ 15.878	R$ 13.958	R$ 15.964
Fundação	R$ 4.690	R$ 5.931	R$ 5.491
EEE			
ETE			
Contenção	R$ 777	R$ 19	
Terraplenagem	R$ 704	R$ 674	R$ 510
CUSTO TOTAL II			
Urbanização			
Drenagem			
Extensão de Rede Elétrica			
Extensão de Rede Hidráulica			
CUSTO TOTAL III			
Incorridos			
CUSTO TOTAL IV			
Aprendizado			
CUSTO TOTAL V		R$ 2.033	R$ 2.154
Atualização por INCC		R$ 2.033	R$ 2.154
CUSTO TOTAL I+II	R$ 97.070	R$ 94.972	R$ 100.592
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 97.070	R$ 97.006	R$ 102.746

Custo de Construção

	ELEVATO MIRAGGIO ATIVO NT CEN02 | REV03	ANDALUZ CEN02 | REV01	
Torres	2	2	
Unidades Construídas	408	420	
Unidades Vendidas	400	414	
Unidades Varada	285	202	
Unidades Varada e Churrasqueira	0	198	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Curitiba - PR	Curitiba - PR	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	1 Torre | T+16| 10PP | CE1A	2 Torres | T+14 | 14PP | CE2A	
Tipologia	1 Torre | T+16| 14PP | CE1A		
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	EM	
Mês Base	março-25	dezembro-24	
Incc	1173,775	1149,170	
LVS	novembro-24	outubro-24	
Indiretos	novembro-24	outubro-24	
Base de Preço	LPU 86	LPU 85	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	18	19	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 97.070	R$ / UND R$ 94.972	DIF R$ 2.098
Indireto	R$ 18.800	R$ 17.161	R$ 1.639
Torre	R$ 56.221	R$ 57.230	-R$ 1.009
Infra	R$ 15.878	R$ 13.958	R$ 1.920
Fundação	R$ 4.690	R$ 5.931	-R$ 1.240
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 777	R$ 19	R$ 759
Terrapplenagem	R$ 704	R$ 674	R$ 30
CUSTO TOTAL II	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Urbanização	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Drenagem	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Eletrica	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 2.033	-R$ 2.033
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 2.033	-R$ 2.033
CUSTO TOTAL	R$ 97.070	R$ 97.006	R$ 64

INDIRETOS

+367 | G13 – Pessoal Permanente (Inclusão GAPE)
+137 | G14 – Administração (Preço)
+190 | G15 – Canteiro (Preço Container – Maior quantidade de tapume)
+1.287 | G16 – SSO (R$916/uh de SLQA | R$280/uh formiguinha)
-252 | G18 – Ensaios (Ensaio da Fundação)

TORRE

+304 | Vertical (LVS Jan/25 x Out/24)
+146 | Concreto (Preço e projeto)
Miraggio: 12,94 m³/uh (10PP T+16)
12,73 m³/uh (14PP T+16)
Andaluz: 12,73 m³/uh (14PP T+16)
-209 | Drywall (Redução de sanca conforme eng. produto)
-751 | Esq Alumínio (Preço e projeto)
Miraggio: 70% apto c/ varanda – porta de correr R$1349
Andaluz: 90% apto c/ varanda – porta de correr R$2016
-1.597 | Churrasqueira (Projeto)
+922| Elevador (Projeto)
Miraggio: 10PP T+16 – 3 unidades – R$6.338/Uh
14PP T+16 – 4 unidades – R$6.036/Uh
Andaluz: 14PP T+14 – 3 unidades – R$5.634/Uh

INFRA

+294 | Muro de divisa (Miraggio: 417m | Andaluz: 270m)
-277 | Pisos (Miraggio: 502m² pavimentação | Andaluz: 270m)
+730 | Esq Ferro (Miraggio: 503m | Andaluz: 290m)
+869 | Reservatório Metálico (Projeto)
Miraggio: Ø3,18m – 10,20m e 22,53m (2 unid)
Andaluz: Ø3,80m – 16, 93m (1 unid)

FUNDAÇÃO

-1.240 | Projeto
Miraggio: Ø50, 60 e 70cm – L=11~15m
Andaluz: Ø50, 60 e 70cm – L=15~17m

CONTENÇÃO

+759 | Projeto

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Há viabilidade. Ligação na porta do empreendimento.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Há viabilidade. Existe previsão de extensão de rede de 120m, mas segundo a Regional, esta será toda custeada pela concessionária.

SISTEMA DE DRENAGEM
Descarte na rede pública em frente ao terreno.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado trecho de reconstituição do passeio na testada do terreno.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 12/2024, com validade em 12/2025 para 360 UH, o cenário atual apresenta 400UH.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 12/2024, com validade em 12/2025 para 360 UH, o cenário atual apresenta 400UH. Aponta necessidade de extensão de rede, mas conforme artigo 57 da Resolução N°003 da Agepar, quando o ponto de entrega de água ou de coleta de esgoto estiver a uma distância máxima de 20 (vinte) metros das respectivas redes públicas e não houver a necessidade de reforço de capacidade, o prestador de serviços tomará a seu total encargo a expansão das redes de água e de esgoto.

Drenagem:
- Não se aplica.

Elétrica:
- Viabilidade emitida em 11/2024.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Descrever itens a urbanizar.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 9 furos.
- Considerada Estaca hélice, com diâmetros de 50, 60 e 70cm e profundidade de 11, 14 e 15m.

Logística

VIVÊNCIA – CONTAINERS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.
CONTAINER ALMOXARIFADO (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO COM SANITÁRIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	CONSIDERAR DEFINITIVA	CONSIDERAR DEFINITIVA
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-
CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER (EQUIPE VERTICAL)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	-
CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER (EQUIPE VERTICAL)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	-
CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	CONSIDERAR 14 MÓDULOS COM 2 ESCADAS (7 MÓDULOS NO PAV. T E 7 MÓDULOS NO PAV SUPERIOR)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO

TENDAS_PERÍODOS						
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	-
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	6,00	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
TENDA ARMADOR (LOG)	2	4,00	<varia>	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-
TENDA BANHEIRO QUÍMICO E BEBEDOURO (LOG)	1	3,00	3,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	12,00	6,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
TENDA LAZER (LOG)	1	2,00	6,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	3,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS						
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-
BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_R01	1 EQUIP PARA O BLOCO X	-	-	-	TODO PERÍODO	-
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-
CREMALHEIRA CDW (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
MINIGRUA (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-

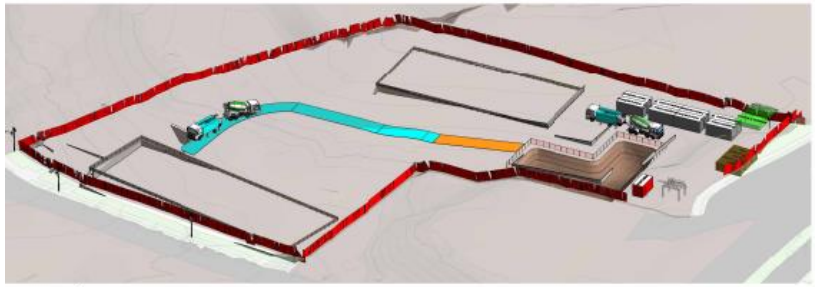

'ISTA 3D – PRÉ FORMA

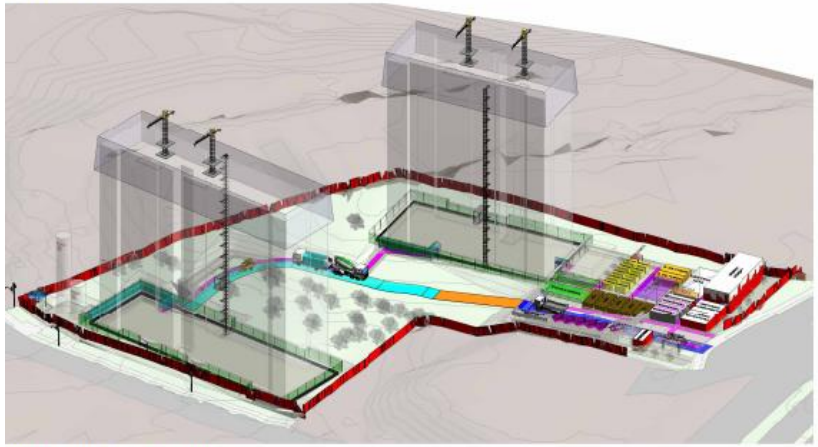

VISTA 3D – ESTRUTURA E ACABAMENTO

OBS.: 01

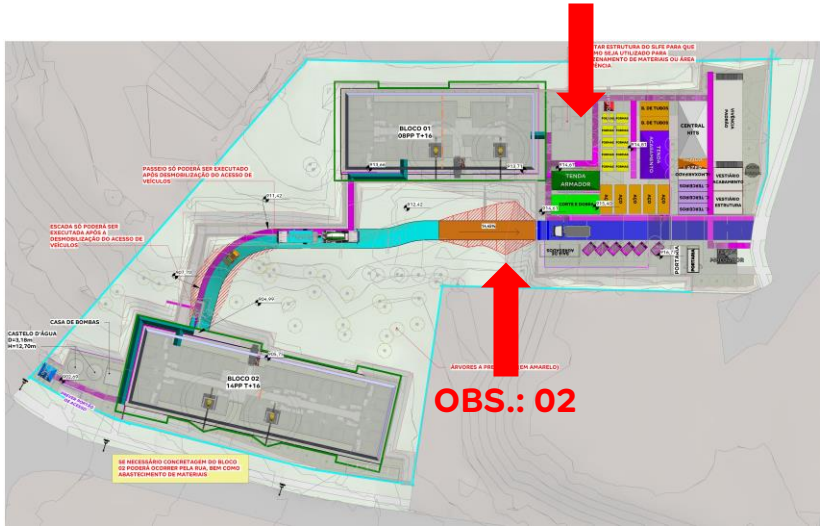

OBS.: 02

➢ OBS. 01	PPREVER PRAZO PARA EXECUÇÃO DO ENTERRADO NO INÍCIO DO PERÍODO DE PRÉ FORMA
➢ OBS. 02	PREVER CUSTOS COM RAMPA PROVISÓRIA PARA ACESSO AO BLOCO 02.

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CUSTO E PRAZO PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS PROVISÓRIAS, CONFORME INDICADAS NA IMPLANTAÇÃO, PARA VIABILIZAR ACESSOS NO EMPREENIMENTO, GARANTINDO ASSIM A EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO/TERRAPLENAGEM. AS RAMPAS DEVERÃO SER ABSORVIDAS NO PROJETO DE TERRAPLENAGEM PROVISÓRIA, CONSIDERANDO O REFORÇO DE BASE PARA A PISTA PROVISÓRIA (CAMADA DE SACRIFÍCIO). PREVER CUSTO PARA EQUIPE DE MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE MATERIAIS "FORMIGUINHAS" (2 FUNCIONÁRIOS ESTRUTURA, 2 FUNCIONÁRIOS ACABAMENTO E 2 FUNCIONÁRIOS PARA TRANSPORTE DE AÇO), DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DE MAQUINÁRIOS AO LONGO DA IMPLANTAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO/DESCARGA DE MATERIAIS. PREVER CUSTO PARA PERDA DE CONCRETO DURANTE O PERÍODO PRÉ FORMA E ESTRUTURA COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA ESTACIONÁRIA PARA A CONCRETAGEM DOS BLOCOS, NECESSÁRIO DEVIDO AO GABARITO.
➢ **PRAZO DE OBRA**	PRIORIZAR A EXECUÇÃO DOS ENTERRADOS SOB O VIÁRIO NO INÍCIO DO PERÍODO DE PRÉ-FORMA, PARA VIABILIZAR A CIRCULAÇÃO DE CAMINHÕES.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Curitiba Norte + Alm. Tamandaré	CWBN	37%	629	52	754	63

Empreendimento	Renda	Lançamento	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28
Elevato Miraggio	4.913	set-26		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	4
Total de Vendas Lançados			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Vendas Lançados + Landbank			0	22	22	22	22	22	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	33	4

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está acima do potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Elevato Miraggio | Mapa Concorrência

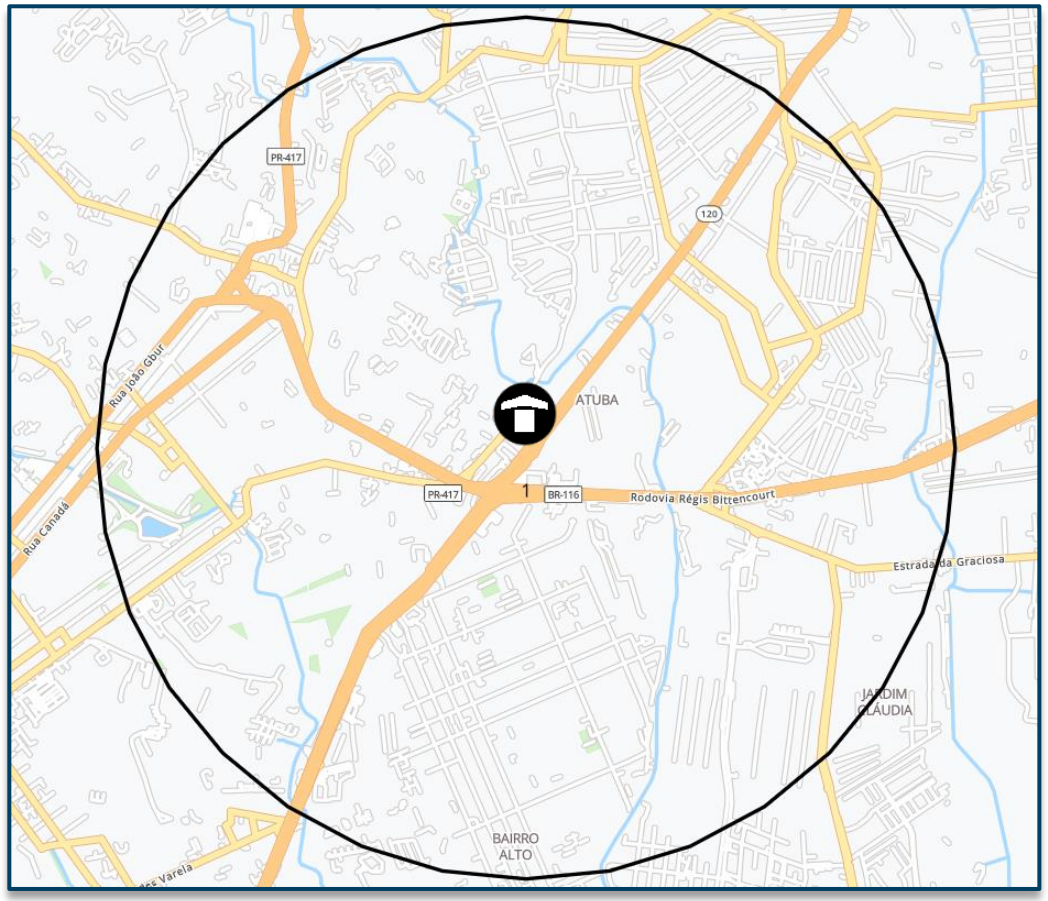

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- Não mapeamos nenhum lançamento da concorrência dentro do MCMV na região.

		Elevato Miraggio
		TENDA
Região 1 Km	População	13.032
	Dens. Demográfica	4.175
	Renda (R$)	8.016
	Classe Social	B2 (4.6k a 8.1k)
	PEA Dia	8.680

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Elevato Miraggio					
Tipo:	**Faixa 2**		**Varanda**		**Varanda + Vaga**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	240.000		255.000		275.000	
Renda Inicial (VF)	3.597		4.698		4.992	
Renda Final*	4.400		4.998		5.298	
% RET1	0%		0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,77	2.888	0,62	3.025	0,62	3.233
FGTS	0,74	2.772	0,51	2.517	0,48	2.517
Financiamento	97,10%	183.734	98,65%	201.295	97,42%	214.075
Subsídio	162,75%	3.926	0,00%	0	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	23	23	23	23	23	23
Pró-Soluto	76,75%	23.073	76,46%	30.020	76,46%	31.897
Preço Raso (RS)	216.393	216.393	236.856	236.856	251.721	251.721
TCD	58,50%	21.213	38,45%	18.208	45,74%	23.012
VSO	6	6	13	13	3	3
Preço de Venda	**227.494**	**227.494**	**244.210**	**244.210**	**263.043**	**263.043**
Elasticidade	4,444%	4,444%	4,444%	4,444%	4,444%	4,444%
Preço de Venda Final	**237.605**	**237.605**	**255.064**	**255.064**	**274.734**	**274.734**
Preço Raso (R$)	**216.393**		**236.856**		**251.721**	
% de Raso	**91,07%**		**92,86%**		**91,62%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Elevato Miraggio	
Tipo:	**Faixa 2**	
Método	**Vision**	
Avaliação	253.288	
Renda Inicial (VF)	4.420	
Renda Final*	4.865	
Tipo:	**VF**	**R$**
Ato	0,66	3.012
FGTS	0,57	2.590
Financiamento	98,05%	197.907
Subsídio	46,79%	1.129
Prazo de Pró-soluto	23	23
Pró-Soluto	76,55%	28.266
Preço Raso (RS)	232.905	232.905
TCD	45,16%	19.696
VSO	22	22
Preço de Venda	**241.375**	**241.375**
Elasticidade	4,444%	4,444%
Preço de Venda Final	**252.601**	**252.601**
Preço Raso (R$)	**232.905**	
% de Raso	**92,20%**	
Raso Todas as Fases	**232.905**	
Nominal Todas as Fases	**252.601**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região com bons indicadores sociodemográficos, como renda e PEA/Dia, o mesmo também se encontra próximo de pontos de interesses como Estação de Trem, Terminal de Ônibus, hospital, escola, mercado e etc.

O Elevato Miraggio contará com diferenciais de produto como varanda e vaga o que destaca o aumento de preço.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", Não mapeamos nenhum lançamento da concorrência dentro do MCMV na região.

	Preço Real					Preço Normalizado (23m)		
	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso	Gabarito	Avaliação
Reserva Esmeralda *	**212.505**	**3.800**	**22**	**15**	**6.498**	**219.003**	**T+3**	**198.000**
Elevato Miraggio	**232.905**	**4.865**	**22**	**23**	**-**	**232.905**	**T+16**	**253.288**

- * Projeto com previsão de preço BP.
- Reserva Esmeralda possui gabarito de T+3 e sem inclusão de atributos como Varanda e Vaga.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Elevato Miraggio – PR – Curitiba Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	dez-24							
Elevato Miraggio		set-26	mar-27	set-28	6 meses	18 meses	set-29	36 meses
Elevato Miraggio Varanda		set-26	mar-27	set-28	6 meses	18 meses	set-29	36 meses
levato Miraggio Varanda+Vaga		set-26	mar-27	set-28	6 meses	18 meses	set-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	14,15 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	8.183 m²	**Área Líquida do Terreno:**	4.230 m²
Cash:	0,00 MM			**Custo de terreno m²:**	1.728,6	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	3.344,2
Permuta Financeira:	14,15 MM (14,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):**	14,0% / 52,4%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.**	1,9 / 1,9
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,00 MM	**Incorridos de Incorporação:**	0,02 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Elevato Miraggio	T+16	216.392	115	237.605	240.000	97,1%	76,8%	58,5%
Elevato Miraggio Varanda	T+16	236.856	233	255.063	255.000	98,6%	76,5%	38,4%
levato Miraggio Varanda+Vaga	T+16	251.721	52	274.733	275.000	97,4%	76,5%	45,7%

Unidades Totais:	400	**Preço Médio:**	252.601	**Renda Média:**	4.420	**ITBI+Emol. Unit.:**	8.328
Unidades Tenda:	400	**Avaliação Média:**	253.288	**Ato:**	2.920 (0,66 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	15.739
VSO:	22 Unidades	**VGV Total:**	101.040.508	**FGTS:**	2.535 (0,57 Salários)	**Preço Raso Médio:**	232.905
RET Médio:	4,0%	**VGV Tenda:**	101.040.508	**% em RET 1%:**	0%		

Construção

Custo Total Unit.:	97.070	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	35,00	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**12.494.856**	**LI:**	**20,04%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**9.278.227**	**Margem Bruta Econômica:**	**38,52%**
TIR:	**164,63%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**0**	**Margem Bruta REF:**	**42,56%**
Exposição de Caixa:	**8,57%**	**Δ LI:**	**0,04%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(4.250.619)**	**Margem Rasa Econômica:**	**32,71%**
Payback Contingente (21 m):	**18 m/ (-3 m)**	**LI Resiliência:**	**14,24%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**25.536.479**	**Margem Rasa REF:**	**37,71%**
Payback Consolidado:	**18 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**25,93%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Elevato Miraggio		Elevato Miraggio		Elevato Miraggio Varanda		Elevato Miraggio Varanda+Vaga	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	108.284	100,0%	29.437	100,0%	63.540	100,0%	15.307	100,0%
PIS/COFINS	(2.374)	2,2%	(645)	2,2%	(1.393)	2,2%	(336)	2,2%
Custo Total	(65.112)	61,5%	(18.456)	64,1%	(37.981)	61,1%	(8.675)	57,9%
Custo Terreno	(15.160)	14,3%	(4.121)	14,3%	(8.896)	14,3%	(2.143)	14,3%
Custo Relacionados a Terreno	(1.348)	1,3%	(372)	1,3%	(786)	1,3%	(190)	1,3%
Custos de Incorporação	(1.438)	1,4%	(403)	1,4%	(825)	1,3%	(210)	1,4%
Custo de Construção	(47.166)	44,5%	(13.560)	47,1%	(27.474)	44,2%	(6.132)	41,0%
Lucro Bruto Econômico	40.798	38,5%	10.335	35,9%	24.166	38,9%	6.297	42,1%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	40.798	38,5%	10.335	35,9%	24.166	38,9%	6.297	42,1%
Despesas de Selling	(10.847)	10,2%	(3.002)	10,4%	(6.328)	10,2%	(1.518)	10,1%
Contingência	(2.491)	2,4%	(677)	2,4%	(1.461)	2,4%	(352)	2,4%
Margem de Contribuição	27.461	25,9%	6.656	23,1%	16.377	26,4%	4.427	29,6%
IR e CSLL	(1.942)	1,8%	(528)	1,8%	(1.140)	1,8%	(275)	1,8%
Margem Líquida	25.518	24,1%	6.128	21,3%	15.237	24,5%	4.153	27,7%
Lucro Bruto REF Unit.	119.073	42,6%	105.370	39,8%	121.888	43,0%	140.411	46,0%
Lucro Raso REF Unit.	97.203	37,7%	81.787	34,0%	101.682	38,6%	114.866	41,1%

R$ Mil - VPL - Compra	Elevato Miraggio		Elevato Miraggio		Elevato Miraggio Varanda		Elevato Miraggio Varanda+Vaga	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	62.362	100,0%	16.767	100,0%	36.818	100,0%	8.778	100,0%
PIS/COFINS	(1.347)	2,2%	(362)	2,2%	(795)	2,2%	(190)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(48.521)	77,8%	(13.650)	81,4%	(28.352)	77,0%	(6.519)	74,3%
Custo Terreno	(8.357)	13,4%	(2.247)	13,4%	(4.934)	13,4%	(1.176)	13,4%
Custo Relacionados a Terreno	(1.000)	1,6%	(274)	1,6%	(585)	1,6%	(141)	1,6%
Custos de Incorporação	(1.055)	1,7%	(296)	1,8%	(606)	1,6%	(153)	1,7%
Custo de Construção	(29.019)	46,5%	(8.343)	49,8%	(16.904)	45,9%	(3.772)	43,0%
Despesas de Selling	(7.226)	11,6%	(1.986)	11,8%	(4.226)	11,5%	(1.014)	11,5%
Contingência	(762)	1,2%	(207)	1,2%	(447)	1,2%	(108)	1,2%
IR e CSLL	(1.102)	1,8%	(296)	1,8%	(650)	1,8%	(155)	1,8%
Lucro Imobiliário	12.495	20,0%	2.754	16,4%	7.671	20,8%	2.069	23,6%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Obrigado
