Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento

Regional: PE

Projeto: Boa Viagem Prime

Data Comitê: 28/03/2025

Comitê Digital – 24/03/2025

Nome	Boa Viagem Prime - Investimento	Observação - Boa Viagem Prime
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	Ok
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Discutir em Comitê	perigoso esse precedente de % de fração.
Rodrigo Osmo	Discutir em Comitê	(1) Se ganharmos unidades, a permuta física aumenta ou fica travada em 90 unidades?

Pergunta de Luiz Mauricio

Luiz Mauricio

Perigoso esse precedente de % de fração.

Resposta:
Existem algumas justificativas para o % de fração mais elevado que estamos pagando por este terreno, em comparação com o habitual:
1.**Localização privilegiada**: O terreno é extremamente bem localizado, fazendo divisa com um dos bairros de maior renda da cidade (Boa Viagem). Como resultado, o preço do m² (3.300 R$/m²) na região é naturalmente mais alto.
2.**Modelo de permuta física**: Estamos negociando o terreno em um modelo de permuta física, o que, por sua natureza, tende a resultar em frações de preço mais altas.
3.**Negociação recente**: O proprietário do terreno que estamos adquirindo recentemente vendeu um lote vizinho com um preço por m² equivalente ao que estamos pagando.
4.**Competição no mercado**: O terreno é altamente valorizado pelo mercado, tendo sido alvo de uma disputa comercial intensa, na qual conseguimos superar a concorrência. Caso não tivéssemos fechado o negócio, naturalmente, um empreendimento concorrente seria instalado no local.
5.**Intermediação imobiliária**: A intermediação imobiliária ficará a cargo do vendedor, o que implica que ele absorveu esse custo no preço do terreno.
Embora estejamos cientes de que estamos pagando uma fração elevada, temos confiança no negócio, pois não esperamos surpresas no custo de construção do projeto ao longo da execução. Este é um projeto sem grandes complexidades, como urbanização, supressão, demolição, movimentações de terra ou contenções, o que nos dá uma maior segurança quanto ao controle dos custos. Esse conjunto de fatores oferece previsibilidade quanto ao resultado final do projeto, e tudo isso é considerado no custo total do terreno.

Pergunta de Rodrigo Osmo.

Rodrigo Osmo

Se ganharmos unidades, a permuta física aumenta ou fica travada em 90 unidades

Resposta:

O que foi negociado com o terrenista foram as 90 Unidades, e não um percentual. Então ganhando unidades conseguiremos diminuir a fração do terreno. Segue texto do contrato.

b) A **TENDA**, por sua vez, em contrapartida ao recebimento do **IMÓVEL**, obriga-se a fazer e entregar à **PERMUTANTE**, em correspondente troca, o correspondente a 90 (noventa) unidades das futuras unidades autônomas integrantes do futuro empreendimento imobiliário a ser construído no local do **IMÓVEL**, observando-se o que segue:

Comitê Digital – 17/03/2025

Nome	Boa Viagem Prime - Investimento	Observação - Boa Viagem Prime
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	Ok
Renan Barbosa Sanches	Discutir em Comitê	Poderíamos agendar mais para diluir melhor a fração?
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	Projeto com localização inimaginável. Importante criarmos convicção na atuação em rendas mais altas na praça para poder praticar um preço maior no lançamento e solidificar nossa atuação em tickets mais altos.
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	Ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	como estamos melhorando o produto (piscina e varanda) não tem como renegociar a permuta ou mesmo converter para um valor financeiro que represente um % menor?
Rodrigo Osmo	Aprovado	N/A

Pergunta de Renan Sanchez e Luiz Mauricio

Renan Sanches

Poderíamos adensar mais para diluir melhor a fração?

Resposta:
Conseguimos a obtenção da carta de viabilidade de esgoto junto à Compesa, o que permitiu a retirada da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do projeto. Com essa mudança, permitira realizar ajustes na implantação, resultando na adição de 32 Unidades Habitacionais (Uh) atingindo um CA de 3,34, durante o desenvolvimento de EP, exploraremos mais oportunidades.
Com essa atualização, o novo cenário do projeto contempla um total de 603 Uh e uma fração de terreno de 14,9%.

Luiz Mauricio

Como estamos melhorando o produto (piscina e varanda) não tem como renegociar a permuta ou mesmo converter para um valor financeiro que represente um % menor?
Resposta:
Este foi o melhor valor obtido em nossas negociações. O terrenista utilizou como referência o terreno vizinho, também de sua propriedade, que foi vendido para uma construtora local. Com base nessa negociação, ele estabeleceu a exigência de 90 Unidades Habitacionais (Uh), a fim de garantir que o preço do metro quadrado do terreno fosse equivalente ao valor do terreno vizinho anteriormente vendido.

One Page – Boa Viagem Prime

[1

Cidade	Recife	Mancha de demanda	PE - REC - Recife + Camaragibe
Regional	PE	Cluster MPR	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Aprovação	Tipo de Aprovação	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Investimento	Versão da VF	Versão 1.0: Mar

[2]

Unidades (% Vagas)	571 (10%)	CA Máx | Proj	5,0 | 3,2
Tipologia	F2E - Concreto	Escritura	set-26
Fases	1 fases	Lçto | Duração (m)	out/26 | 26

[3]

Valor Líquido do Terreno (% VG	21.705 (15,8%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	90 (100,0%)
Cash (Correção)	0 (N/A)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	3.306	VAR (%VGV)	000 (0,0%)

[4

Custo Construção (%VGV)	57.205 (41,6%)	Indireto Unit.	18.785
Prazo da Obra (meses)	20	Torre Unit.	56.247
Custo Total Unit. (LPU):	99.940 (87)	Infra Unit.	12.644
Início de Obra	abr-27	Fundação Unit.	9.434

Preço Nominal Unit.	240.696	VSO	27
Preço Raso Unit.	221.835	Referência	Vision
Avaliação Unit.	241.821	Renda (% em RET 1%)	3.605 (26,4%)



[5]

LI (Régua):	20,1% (20,0%)	Margem Bruta Econômica:	34,8%
LI Resiliência:	14,2% (N/A)	Margem Rasa Econômica:	29,6%
Margem Bruta REF:	38,9%	Margem Contribuição Econômica:	25,1%
Margem Rasa REF:	33,7%	Exposição (% VGV):	9.041 (6,1%)
TIR:	194,7%	VGV Total:	137.437
Payback Contingente (21 m) :	18 m/ (-3 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	-
Payback Consolidado:	18	Ger. Caixa 24 meses (R$):	(2.351)

Destaques

[1]
O terreno possui uma área total de **6.565,91 m²** e está localizado na cidade do Recife no bairro de Boa Viagem, em uma região em desenvolvimento habitacional com outros condomínios próximos.

[2]
O projeto é composto por 571 unidades habitacionais, sendo 270 com varanda e 301 sem varanda, seguindo a tipologia F2E. O empreendimento contará com três torres de 16 andares (T+15). O terreno, com um coeficiente de aproveitamento máximo de 5,0, atingiu um coeficiente de construção de 3,16, otimizando significativamente o potencial da área. Além disso, o projeto dispõe de 36 vagas de garagem para carros e 18 vagas para motos.
Atualmente, trabalhamos com duas faixas de precificação: uma para unidades com varanda e outra para unidades sem varanda. No momento, as vagas de garagem não estão sendo precificadas, pois essa definição será feita no comitê de lançamento. Seguimos analisando a captação do valor das vagas para, no lançamento, propor um preço mais adequado.
Inicialmente, o projeto não contempla piscina. No entanto, identificamos a possibilidade de incluí-la no local originalmente destinado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Durante a parametrização de custos, atualizamos a carta de viabilidade de esgoto, que retornou positiva, eliminando a necessidade da ETE e permitindo uma solução mais econômica. Com isso, incluiremos a piscina como um novo atributo diferencial do empreendimento.

[3]
- O valor total do negócio é de **R$ 21.705.360,00,** pagos com 90 unidades do próprio condomínio. Compõe uma fração de 15,8% do negócio.
- O terreno possui uma fração alta em comparação à média da região. Durante a negociação, sabíamos que o valor era elevado, porém identificamos que o custo de construção seria competitivo, pois o terreno apresenta poucas complexidades: é plano, possui um solo de boa qualidade e não exige supressão vegetal. Estrategicamente, apostamos que a soma do custo do terreno com o custo da construção resultaria em um valor competitivo, viabilizando o projeto. Negociamos o terreno com uma abordagem focada na engenharia de custos.
- O projeto tem como garantia ao vendedor a contratação de um seguro permuta
- Contrato assinado em 02/2025.
- PVC possui todas as resolutivas padrão de saída

[4] Custo
R$ 98.748 UH / Infra externa: R$ 1.192 UH / Custo total: R$ 99.941 UH
VSO conforme regra de ouro

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Boa Viagem Prime

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	**a) Due Diligence do Imóvel - Em andamento, previsão de conclusão em mar/25: i)** Negócio é constituído de 01 imóvel do 5º Registro Geral de Imóveis de Recife/PE, o qual precisará ser retificado; **ii)** A certidão de desapropriação municipal do imóvel está em andamento; **iii)** Imóvel não possui débitos de IPTU, CND está sendo emitida; **b) Due Diligence dos pesquisados - Em andamento, previsão de conclusão em mar/25: i)** Levantamento de patrimônio e passivo da Vendedora está em andamento. Há certidões pendentes, cuja emissão está em andamento; **ii)** Não foram verificados, até o presente momento, processos que tenham por objeto o Imóvel pretendido pela Tenda, bem como processos que envolvam pedido ou reconhecimento de grupo econômico ou de desconsideração da personalidade jurídica, que venham a trazer risco ao negócio jurídico almejado; **iii)** Há certidões fiscais da vendedora pendente, as quais são necessárias para a escritura, devendo ser apresentadas pela vendedora antes da escritura para a TENDA, conforme PVC; **iv)** Houve o falecimento de uma das sócias da empresa VENDEDORA. Ainda está pendente a conclusão do inventário e a emissão do formal de partilha, o que é necessário para regularizar a situação das cotas da sociedade perante a Junta Comercial. De acordo com a PVC, é responsabilidade da VENDEDORA regularizar essa pendência antes da data prevista para a escritura com a Tenda.; **v)** PVC assinada em fev/25.	Ok com ressalvas	
Legalização	Para a implantação do empreendimento, é necessária a aprovação do projeto de demarcação para compatibilização com a área real do terreno. Considerando que a Rua Manoel Didier e a Rua Jorge de Lima possuem imóveis ocupados por terceiros no fechamento da poligonal para as faces citadas, o alinhamento seguiu os limites físicos existentes. Além disso, o terreno está inserido em dois zoneamentos: Zona de Reestruturação Urbana (ZRU 1), que abrange 79% da área, e Zona Especial de Interesse Social (ZEIS 1), que corresponde a 21% do terreno. A ZEIS 1 é destinada a assentamentos habitacionais de população de baixa renda, incentivando a construção de Habitações de Interesse Social (HIS). No entanto, seu uso está sujeito a restrições, como a destinação máxima de 20% da área total construída para uso comercial e o mínimo de 80% para habitação exclusivamente de interesse social nas faixas 1 e 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, conforme entendimento do município, o gabarito deve ser limitado a 5 pavimentos, por analogia às regras aplicáveis à ZEIS 2, uma vez que não há definição de gabarito para a ZEIS 1. A confirmação desses zoneamentos ocorrerá após a emissão da Certidão de Parâmetros, prevista até 31/03. Entretanto, não se pretende aplicar as restrições da ZEIS a esta área, uma vez que não existem ocupações irregulares no terreno e foi identificado, em conversa com a Prefeitura, um erro no georreferenciamento que resultou na inclusão indevida dessa área como ZEIS. Além disso, já existe um projeto aprovado no terreno em área ZRU, o que reforça a aplicabilidade desse parâmetro urbanístico. Diante disso, considerando que o empreendimento é classificado como de impacto, a definição quanto à aplicação dos parâmetros urbanísticos será discutida formalmente no processo de Viabilidade de Empreendimento de Impacto, com a emissão do Certificado de Aprovação Preliminar, cujo deferimento está previsto para ocorrer em até 120 dias, garantindo a adoção da solução mais adequada para a implantação do projeto. Além disso, para o cálculo do Coeficiente de Aproveitamento (CA), a área originalmente identificada como ZEIS será desconsiderada do cômputo, reforçando a adequação do projeto aos parâmetros da ZRU 1.	Ok com ressalvas	
Produto	Rua de acesso ao condomínio será executada por terceiros podendo impactar em área e nível do condomínio.	Ok com ressalvas	
GETEC	Execução de viário de acesso e callçadas será de responsabilidade do empreendimento siturado no final do nosso terreno. Caso haja alguma mudança nessa definição, todo custo de urbanização deverá ser considerado e o custo revisado.	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos	Ok	
Contratação	NA	Ok	
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Parecer: Ciclo está de acordo com o preço e VSO citados, visto que, trata-se de uma área nobre e aspiracional da cidade (zona Sul do Recife), sem concorrência dentro do MCMV e próximo a diversos pontos de interesse e lazer, como mercados, escolas, faculdades, shopping, e a orla da Praia de Boa Viagem.	Ok	
Estudos Econômicos	Sem riscos	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- REC – Recife

Lançamento

1. Alameda dos Pássaros
2. Parque Recife
3. Morada Capibaribe
4. Vista do Golf

LandBank

5. Mirante Belvedere
6. Morada Beberibe
7. Aurora Prime
8. Viva Casa Amarela | Luiz Cesário
9. Bosque Recife | Jardins Recife
10. Boa Viagem Prime

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 4 - Azul

Região

Capital

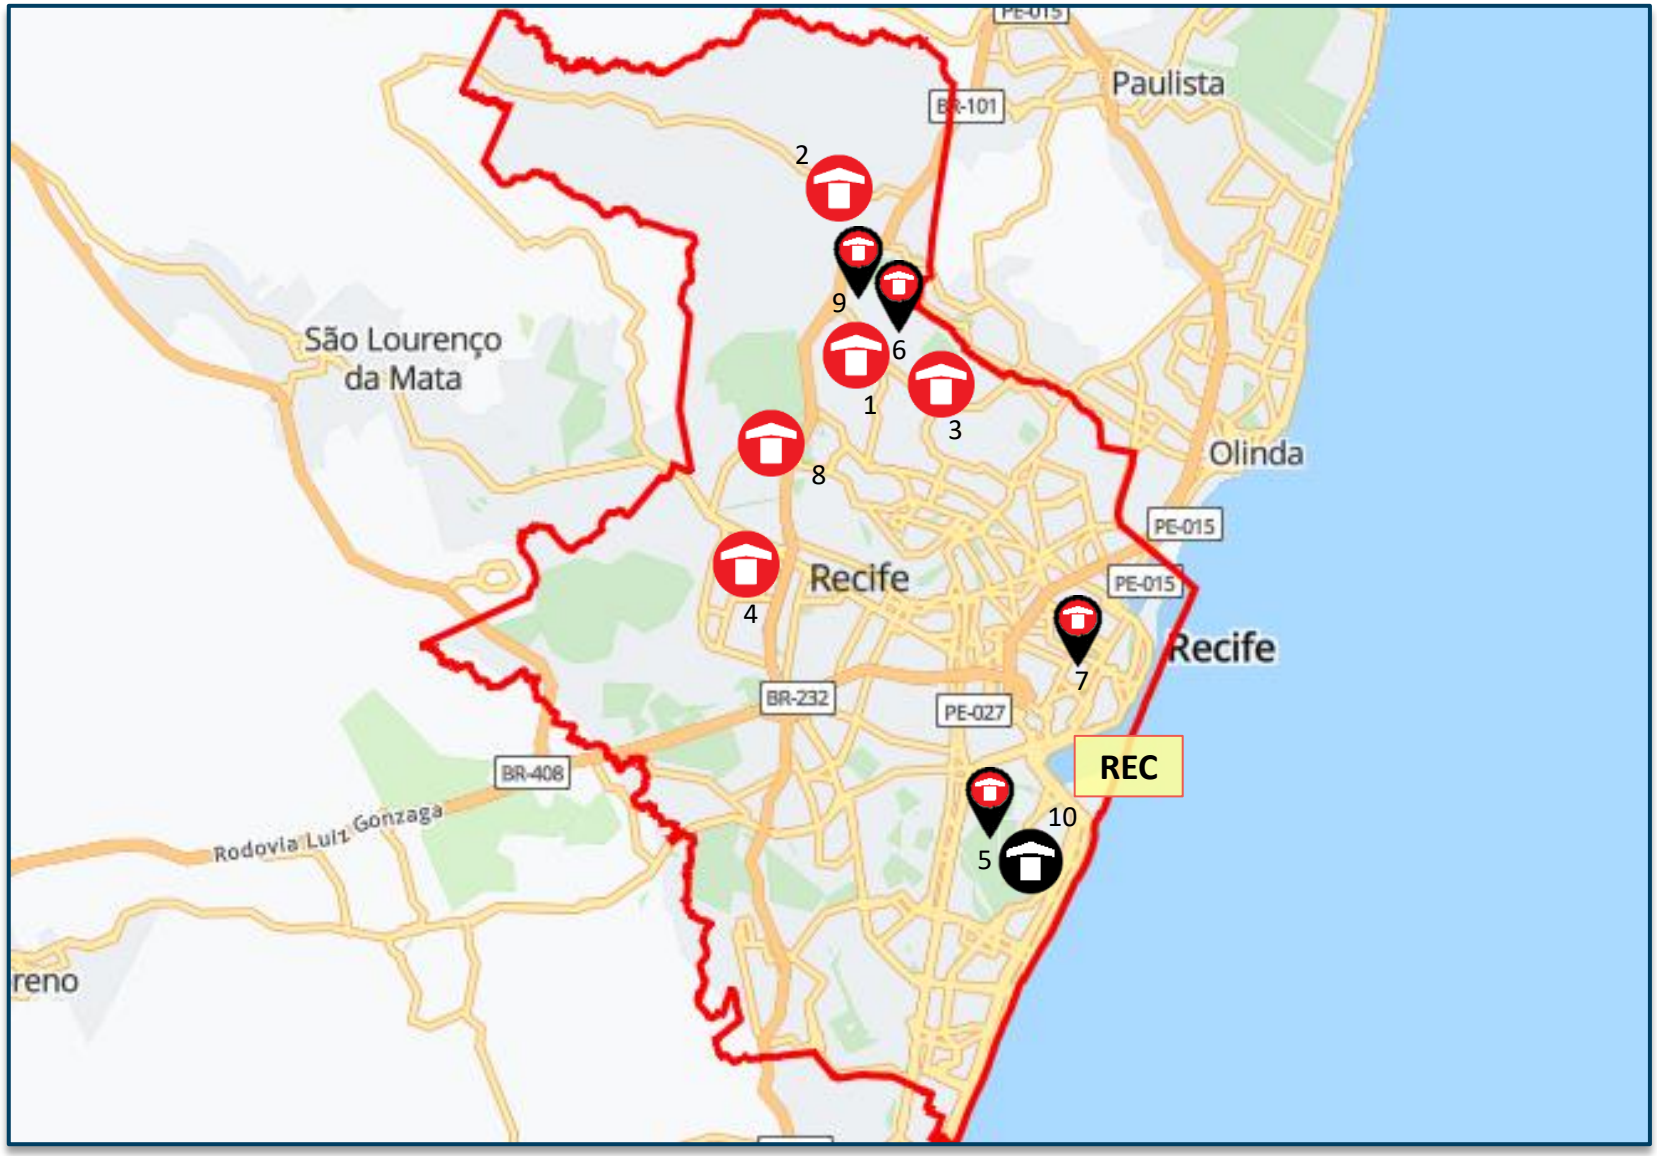

Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Boa Viagem Prime Investimento

Informações Gerais – Condomínio Único		
Terreno	Área terreno	6.565,91m²
	Menor poligonal	6.565,91m²
	App/fna	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Não
	Área liquida	6.565,91m²
	Zoneamento	ZRU-1
	Ca máximo	5,0
	Ca projetado	3,16
	Gabarito máximo	T+15
Geral	Total uh	571
	Total de vagas (auto|motos)	40 | 18
Tipologia	Tipologia	Modular com elevador
	Gabarito	T+15
	Lâmina	01 10PP | 01 12PP | 01 14PP
	Área privativa	36,45 m²
Condomínio	Unidade pcd	18
	Unidade lazer|Técnica	2 | 3
	Torre	3
	Fase	Não faseado
Lazer	Lazer coberto	Salão de Festas sem Churrasqueira, Churrasqueira Gourmet, Espaço Office, Salão de Festa Gourmet, Brinquedoteca.
	Lazer descoberto	Praça de chegada, Praça dos Sabores, Playkids, Playbaby, Fitness externo, Funcional externo, Playpet

IMPLANTAÇÃO

PRODUTO

Empreendimento Boa Viagem Prime Investimento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	Limite supercondomínio		
	Acesso		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	Atributos Infra	Não	
	Atributos Torre	Sim	Varandas em uma das faces das torres, somando 270 UH
	Edifício Garagem	Não	

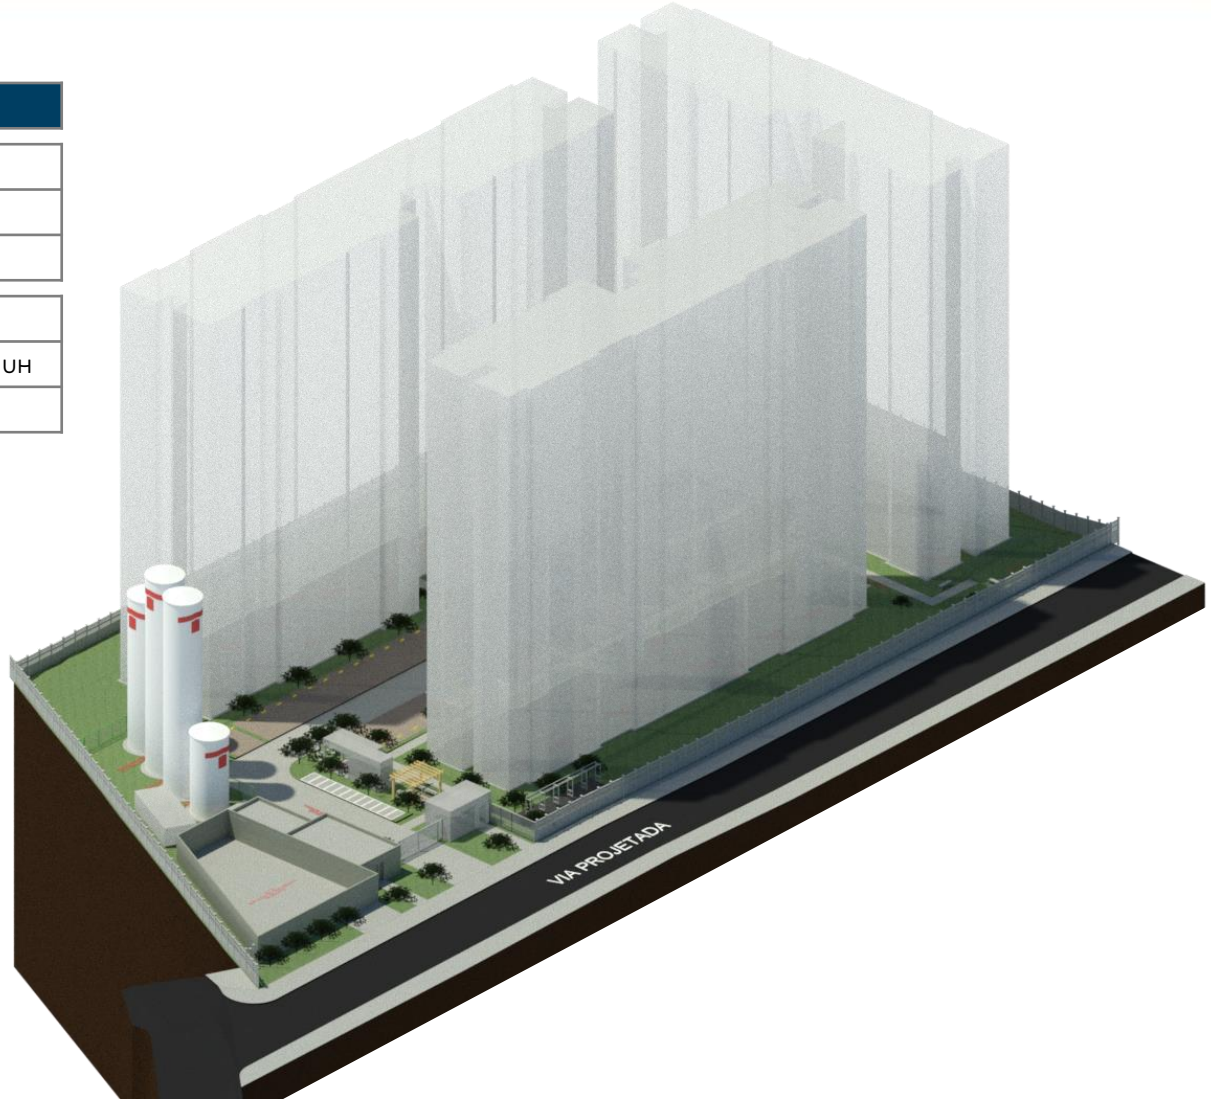

IMPLANTAÇÃO

Empreendimento Boa Viagem Prime
Lançamento

Fase 1: 568 uh (sendo 28 U.R) - 273 vagas (sendo 08 pcd e 92 motos)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	01 Bloco (T+15)	190 Uh (Sendo 6 U.A)	58 Vagas (Sendo 02 PCD, 02 Idosos E 18 motos)	
Módulo 02	01 Bloco (T+15)	223 UH (sendo 07 U.A.)	0 vagas	
Módulo 03	01 Bloco (T+15)	158 UH (sendo 05 U.A)	0 vagas	

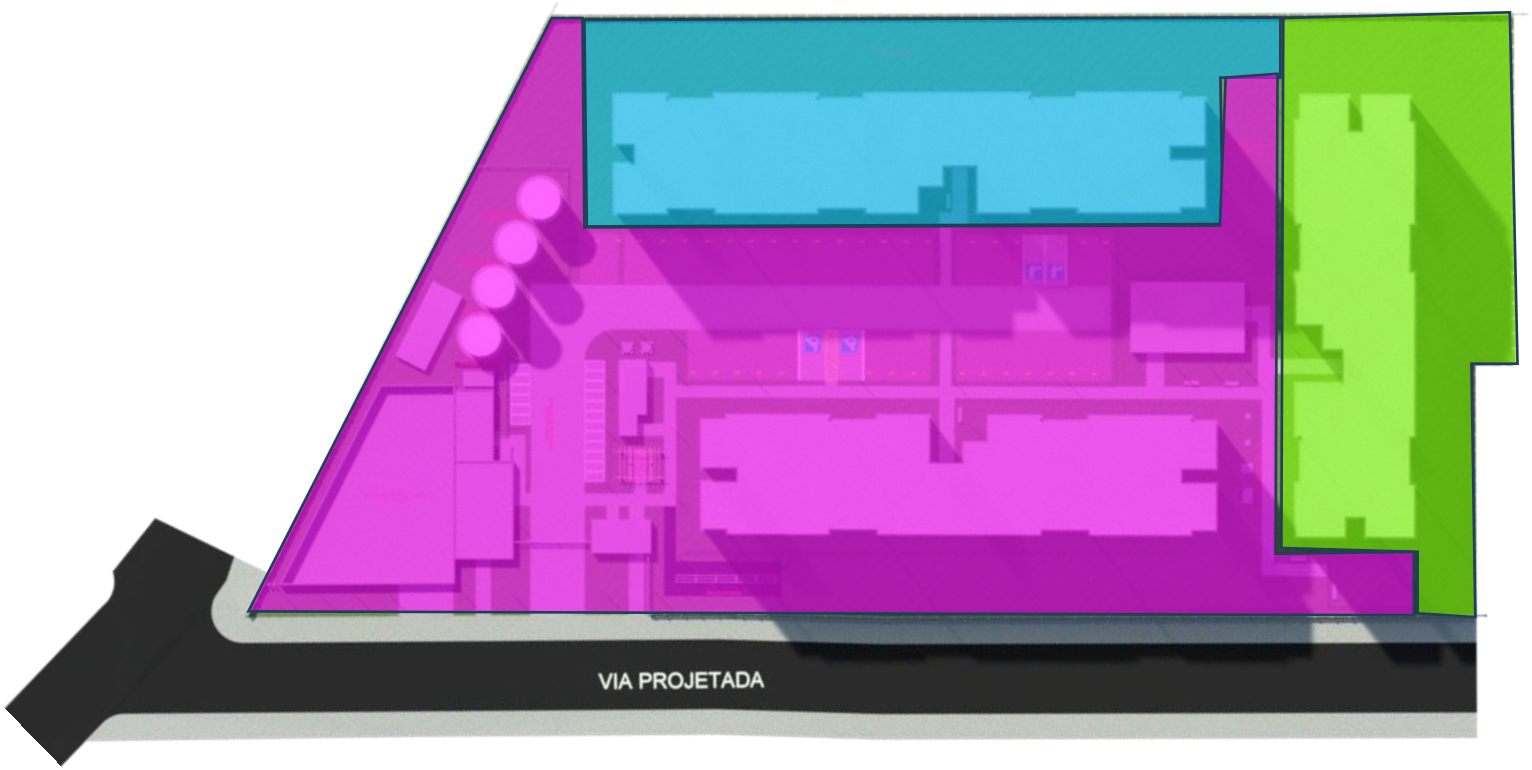

Empreendimento Boa Viagem Prime

Empreendimento Boa Viagem Prime

Empreendimento Boa Viagem Prime

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Condições do Negócio

➢ **VALOR DO NEGÓCIO**

- Valor do negócio**: R$ 21.705.360,00.**
- Esse valor representa 15,8% de fração sobre a receita.

➢ **CONDIÇÃO**

- 90 unidades em permuta física, de um total de 571 unidades, representando uma fração de 15,93%

➢ **PRAZOS CONTRATUAIS**

- Existe o prazo de 19 meses contados da assinatura da PVC para outorga da ECV do imóvel, desde que superadas todas as condições resolutivas e cumpridas as obrigações do contrato.
- Existe um prazo de 36 meses contados do registro de incorporação, com 180 dias de tolerância, para a entrega das unidades ou 48 meses contados da assinatura do contrato.
- Todas as clausulas resolutivas de saídas estão presentes no contrato.

➢ **GARANTIAS**

- Seguro Permuta (0,9%)

Condições do Negócio

➢ **CORREÇÃO MONETÁRIA**

- Não se aplica

➢ **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA**

- Valor: R$ 500.000,00 sendo o valor dividido igualmente para M&M IMÓVEIS CORPORATIVOS e NEGOCIAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
- **O pagamento será de responsabilidade dos vendedores.**

➢ **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Assinatura do contrato: 02/2025;
- Previsão de assinatura de Escritura: 09/2026;
- Previsão de Lançamento: 10/2026.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Custo de Construção

	BOA VIAGEM PRIME CEN1 | REV00	CAMPO DE POUSO CEN01 | REV00	CAMINHO DO MAR CEN1 | REV01	BOSQUE RECIFE CEN1 | REV01	BOSQUE RECIFE CEN1 | REV00	MORADA BEBERIBE CEN1 | REV02
Torres	3	2	2	6	6	4
Unidades Construídas	576	448	476	1.280	1.280	748
Unidades Vendidas	571	444	470	444 | 379 | 444	444 | 379 | 444	371 | 372
Total Unidades Vendidas	571	444	470	1.267	1.267	743
Condomínios (qta.)	2	1	1	2	2	1
Cidade	Recife - PE	Paulista - PE	Paulista - PE	Recife - PE	Recife - PE	Recife - PE
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Atributos de Projeto	VARANDA	-	-	-	-	-
Tipologia	1 Torre | T+15 | 10PP | C2A	2 Torres | T+15 | 14PP | C2A	1 Torre | T+15 | 14PP | C2A	4 Torres | T+15 | 14PP | C2A	4 Torres | T+15 | 14PP | C2A	2 Torres | T+16 | 10PP | C2A
Tipologia	1 Torre | T+15 | 12PP | C2A	-	1 Torre | T+17 | 14PP | C3A	1 Torre | T+17 | 10PP | C3A	1 Torre | T+17 | 10PP | C3A	2 Torres | T+16 | 12PP | C2A
Tipologia	1 Torre | T+15 | 14PP | C2A	-	-	1 Torre | T+16 | 12PP | C2A	1 Torre | T+16 | 12PP | C2A	-
Projeto Infra	AP	AP	AP	AP	AP	AP
Projeto Torre	AP	LO	AP	ED | LO	ED | LO	AP | LO
Mês Base	março-25	novembro-24	novembro-24	setembro-24	setembro-24	agosto-24
Incc	1.169,116	1.141,398	1.149,170	1.134,775	1.134,775	1.118,827
LVS	janeiro-25	setembro-24	outubro-24	julho-24	julho-24	junho-24
Indiretos	janeiro-25	setembro-24	outubro-24	julho-24	julho-24	maio-24
Base de Preço	LPU 87	LPU 84	LPU 84	LPU 82	LPU 82	LPU 81
Takt	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	20	18	22	17 | 16 | 16	17 | 16 | 16	17 | 15
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 98.748	R$ / UND R$ 92.273	R$ / UND R$ 93.894	R$ / UND R$ 92.099	R$ / UND R$ 94.141	R$ / UND R$ 94.209
Indireto	R$ 18.785	R$ 17.765	R$ 17.749	R$ 17.373	R$ 17.716	R$ 18.713
Torre	R$ 56.247	R$ 52.721	R$ 53.124	R$ 54.016	R$ 55.715	R$ 55.220
Infra	R$ 12.644	R$ 12.944	R$ 13.660	R$ 12.063	R$ 12.063	R$ 11.773
Fundação	R$ 9.434	R$ 6.363	R$ 8.803	R$ 7.158	R$ 7.158	R$ 7.318
EEE	R$ 62	R$ 671		R$ 63	R$ 63	R$ 549
ETE	R$ 919			R$ 855	R$ 855	
Contenção				R$ 4	R$ 4	
Terraplenagem	R$ 657	R$ 1.810	R$ 557	R$ 566	R$ 566	R$ 636
CUSTO TOTAL II	R$ 1.192	R$ 534	R$ 6.725	R$ 3.873	R$ 3.873	R$ 254
Urbanização		R$ 76	R$ 508	R$ 1.571	R$ 1.571	
Drenagem	R$ 239			R$ 993	R$ 993	R$ 42
Extensão de Rede Elétrica	R$ 175	R$ 225	R$ 213	R$ 79	R$ 79	R$ 135
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 778	R$ 233	R$ 6.004	R$ 1.230	R$ 1.230	R$ 78
CUSTO TOTAL III						
Incorridos						
CUSTO TOTAL IV						
Aprendizado						
CUSTO TOTAL V		R$ 2.254	R$ 1.746	R$ 2.904	R$ 2.966	R$ 4.246
Atualização por INCC		R$ 2.254	R$ 1.746	R$ 2.904	R$ 2.966	R$ 4.246
CUSTO TOTAL I+II	R$ 99.941	R$ 92.807	R$ 100.619	R$ 95.972	R$ 98.013	R$ 94.463
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 99.941	R$ 95.061	R$ 102.365	R$ 98.876	R$ 100.980	R$ 98.709

Custo de Construção

	BOA VIAGEM PRIME CEN1 | REV00	CAMINHO DO MAR CEN1 | REV01	
Torres	3	2	
Unidades Construídas	576	476	
Unidades Vendidas	571	470	
Condomínios (qta.)	2	1	
Cidade	Recife - PE	Paulista - PE	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Atributo de Projetos	VARANDA	-	
Tipologia	1 Torre | T+15 | 10PP | C2A	1 Torre | T+15 | 14PP | C2A	
Tipologia	1 Torre | T+15 | 12PP | C2A	1 Torre | T+17 | 14PP | C3A	
Tipologia	1 Torre | T+15 | 14PP | C2A	-	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	março-25	novembro-24	
Incc	1169,116	1149,170	
LVS	janeiro-25	outubro-24	
Indiretos	janeiro-25	outubro-24	
Base de Preço	LPU 87	LPU 84	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	20	22	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 98.748	R$ / UND R$ 93.894	DIF R$ 4.854
Indireto	R$ 18.785	R$ 17.749	R$ 1.035
Torre	R$ 56.247	R$ 53.124	R$ 3.124
Infra	R$ 12.644	R$ 13.660	-R$ 1.017
Fundação	R$ 9.434	R$ 8.803	R$ 631
EEE	R$ 62	R$ 0	R$ 62
ETE	R$ 919	R$ 0	R$ 919
Contenção	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Terrapplenagem	R$ 657	R$ 557	R$ 100
CUSTO TOTAL II	R$ 1.192	R$ 6.725	-R$ 5.533
Urbanização	R$ 0	R$ 508	-R$ 508
Drenagem	R$ 239	R$ 0	R$ 239
Extensão de Rede Eletrica	R$ 175	R$ 213	-R$ 38
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 778	R$ 6.004	-R$ 5.226
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 1.746	-R$ 1.746
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 1.746	-R$ 1.746
CUSTO TOTAL	R$ 99.941	R$ 102.365	-R$ 2.425

INDIRETOS

+874 | G16 – SSO (Acréscimo de SLQA em todas as torres conforme nova premissa de LOG – R$782/UH)

+481 | G18 – Ensaios (Ensaio das estacas mais caro devido solução de fundação + Acréscimo de ensaios de recalque para as torres)

-179 | G11 – Projetos (Diluição)

TORRE

+443 | Concreto (Fcks diferentes devido estar < 5km do mar + concretagem noturna atualizada)

Boa Viagem Prime:
30MPa | R$496,22/m³
35MPa | R$540,00/m³
40MPa | R$560,00/m³

Caminho do Mar:
25MPa | R$478,33/m³
30MPa | R$496,22/m³
35MPa | R$540,00/m³
40MPa | R$560,00/m³

+1.073 | Esquadria de Ferro (Acréscimo guarda-corpo das varandas)

+632 | Elevador (Quantidades diferentes + atualização de preço)

Boa Viagem Prime: 9 elevadores – R$330.000

Caminho do Mar: 7 elevadores – R$300.000

+763 | Pintura (Revisão do consumo de argamassa do QC Padrão – 2,94kg/m² para 3,44kg/m² + acréscimo das varandas)

+138 | Cerâmica (Acréscimo da varanda)

INFRA

-1.214 | Outros revest. – pisos (Projeto)

Boa Viagem Prime:
Passeio: 226,86m²
Viário: 443,02,²

Caminho do Mar:
Passeio: 381,12m²
Viário: 1.691,68m²

+207 | Outros instal. – anexos (Projeto)

FUNDAÇÃO

+631 | Preço do concreto + Soluções de fundações diferentes – R$457/m³ para R$484/m³

Boa Viagem Prime: EHC Ø40, 50 e 60cm – L=25 a 28m + lajão tx aço 95,0kg/m³

Caminho do Mar: Pré Moldadas – Ø35, 40, 50 e 60cm – L=18m + lajão tx aço 88,5kg/m²

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Viabilidade técnica considerando extensão de rede de aproximadamente 200 m até rede existente na R. Jorge de Lima.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Considerado ETE com emissário de aproximadamente 918m de extensão de rede até curso d'água existente.

SISTEMA DE DRENAGEM
Necessário a execução de extensão de rede de aproximadamente 104m até rede existente na Av. Sul.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Urbanização será executada pelo empreendimento localizado atrás do terreno.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 02/2025, com validade até 02/2027.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 12/2024, com validade em 12/2026.

Drenagem:
- Não se aplica.

Elétrica:
- Viabilidade emitida em 12/2024.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Urbanização será executada pelo empreendimento localizado atrás do terreno.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 12 furos.
- Considerada Estaca Hélice Continua, com diâmetros de Ø40, 50 e 60cm, profundidade de 25 a 28m.

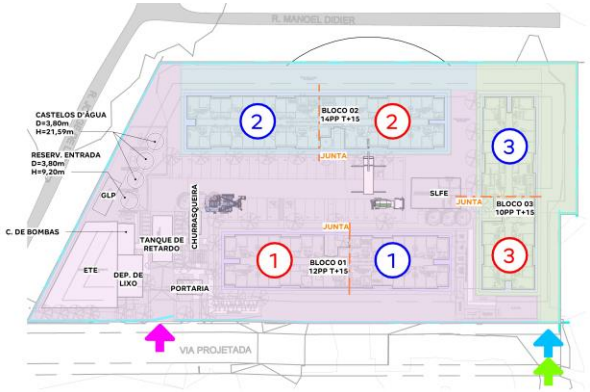

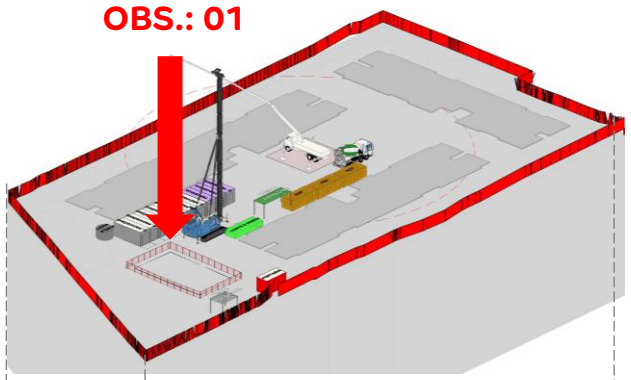

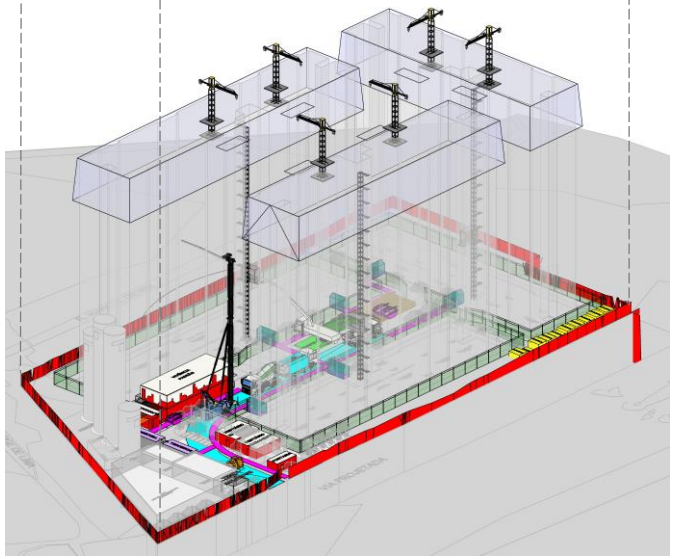

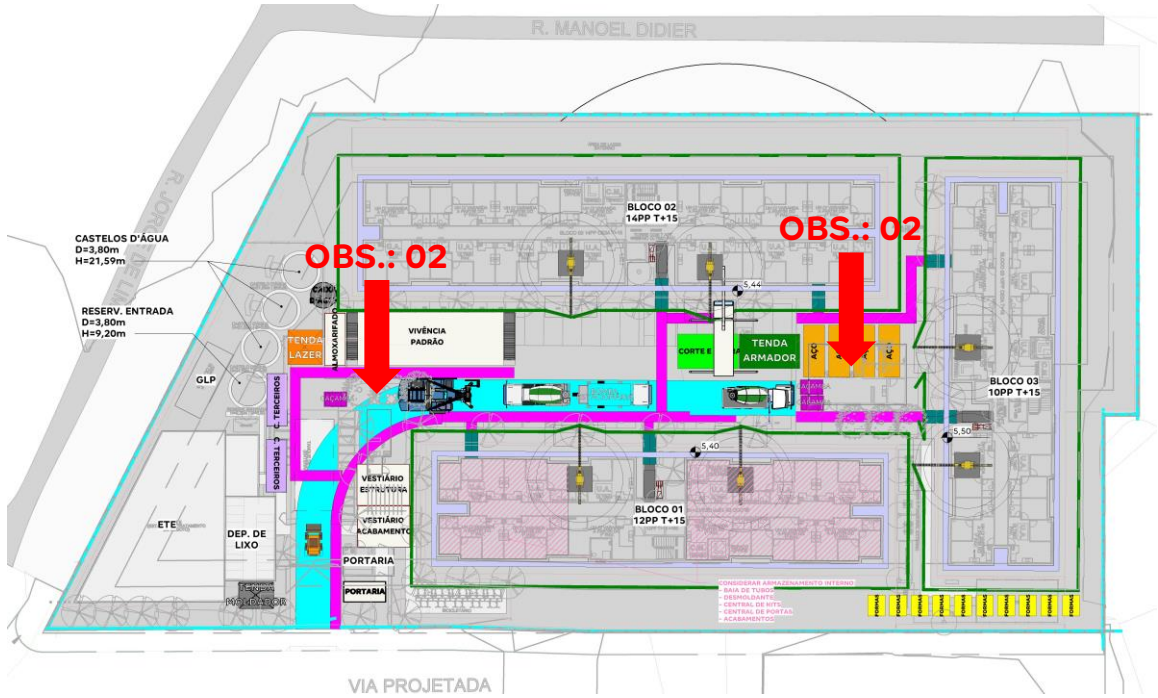

➢ OBS. 01	ENTERRADO SOB O VIÁRIO DEVERÁ SER EXEUTADO NO INÍCIO DO PERÍODO DE PRÉ-FORMA, PODENDO SER EXECUTADO CONCOMITANTEMENTE A 1ª FUNDAÇÃO DE TORRE
➢ OBS. 02	ESTRUTURA DO SALÃO DE FESTAS E CHURRASQUEIRA DEVERÃO SER POSTERGADAS

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	NÃO HÁ ALCANCE DO RAIO DO MUNCK PARA MOBILIZAR E DESMOBILIZAR A CREMALHEIRA DO BLOCO 03. ASSIM, A MOBILIZAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM A BOBCAT. PREVER LARGURA SUFICIENTE PARA PASSAGEM DESTE MAQUINÁRIO E PREVER COM SUPRIMENTOS CONTRATAÇÃO DE CREMALHEIRA COM CABINE DESMONTÁVEL. CASO A CABINE NÃO SEJA DESMONTÁVEL, SERÁ NECESSÁRIO CONTRATAR UM GUINDASTE DE GRANDE PORTE.
	PREVER CUSTO PARA ANTECIPAÇÃO DA VIA PROJETADA (FUTURO VIÁRIO PÚBLICO), PARA VIABILIZAR O ACESSO DE VEÍCULOS AO EMPREENDIMENTO.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Recife	REC	30%	1.989	166	2.387	199

Empreendimento	Renda	Lançamento	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28
Aurora Prime	3.095	jul-25	8																		
Mirante Belvedere F1	3.254	ago-25	22	22	22	22	22														
Bosque Recife	2.500	jan-26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	19									
Morada Beberibe F1	2.654	fev-26	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	15								
Boa Viagem Prime	**3.930**	**out-26**		**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
Mirante Belvedere F2	3.254	fev-27						23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Parque Recife - II - F1	1.992	abr-27								24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Morada Beberibe F2	2.654	jul-27											6	21	21	21	21	21	21	21	21
Jardins Recife - F1	2.506	jul-27											22	22	22	22	22	22	22	22	22
Total de Vendas Lançados			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**76**	**95**	**95**	**95**	**95**	**96**	**96**	**120**	**120**	**114**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está acima do potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Boa Viagem Prime | Mapa Concorrência

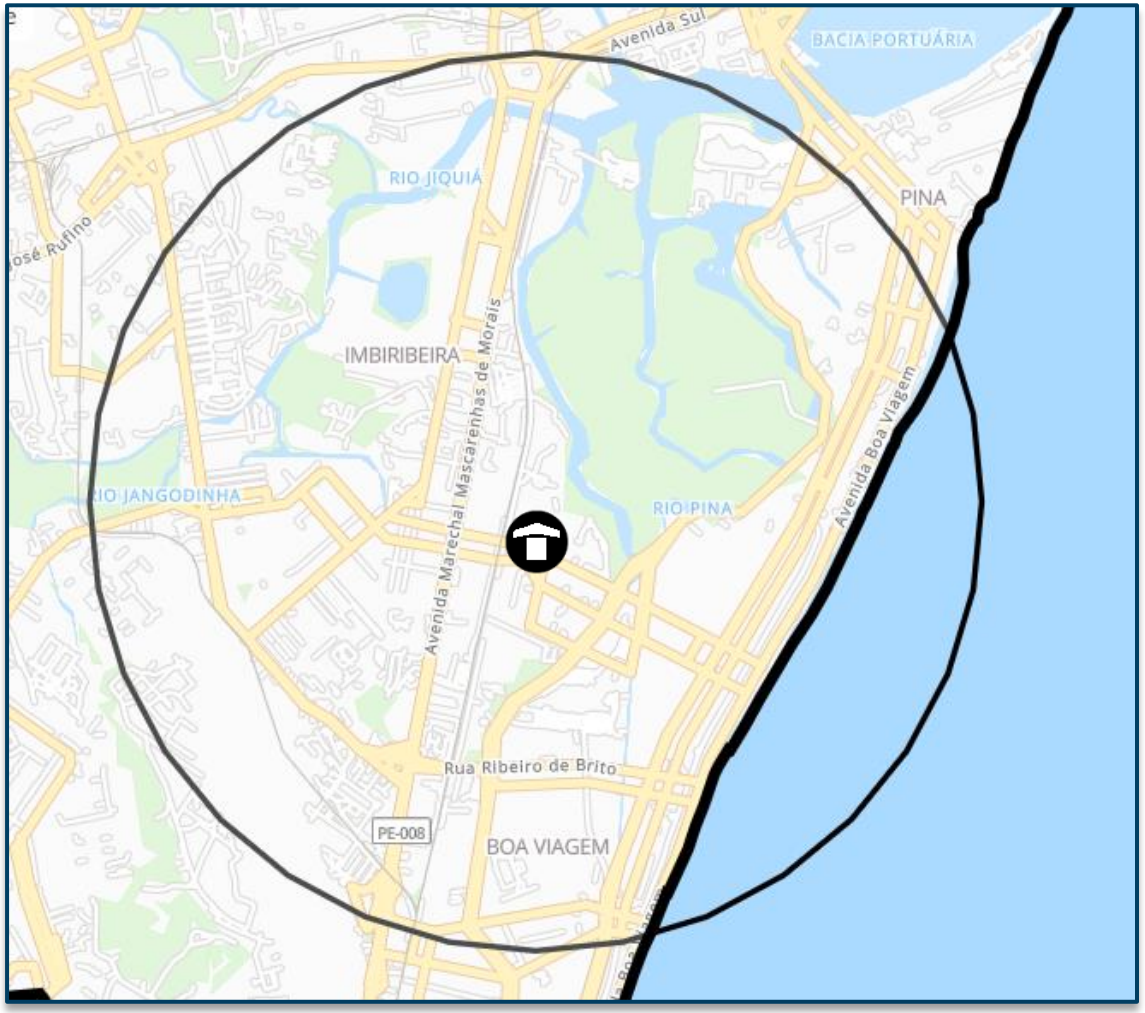

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- Não mapeamos nenhum lançamento da concorrência dentro do MCMV na região.

		Boa Viagem Prime
		TENDA
Região 1 Km	População	21.173
	Dens. Demográfica	6.783
	Renda (R$)	4.882
	Classe Social	C1 (2.7k a 4.6k)
	PEA Dia	48.181

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Boa Viagem Prime			
Tipo:	**Sem Varanda**		**Sem Varanda**	
Método	**Ref. Vista do Golf**		**Vision**	
Avaliação	230.000		230.000	
Renda Inicial (VF)	2.618		2.997	
Renda Final*	-		3.150	
% RET1	50%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	2,63	7.151	1,06	3.290
FGTS	1,45	3.947	0,88	2.730
Financiamento	97,62%	158.296	97,05%	171.590
Subsídio	90,75%	15.202	114,31%	9.408
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25
Pró-Soluto	107,27%	25.511	93,71%	25.511
Preço Raso (RS)	210.107	210.107	212.529	212.529
TCD	75,37%	19.890	65,84%	19.890
VSO	14	14	14	14
Preço de Venda	**221.557**	**221.557**	**223.890**	**223.890**
Elasticidade	3,810%	3,810%	3,810%	3,810%
Preço de Venda Final	**229.998**	**229.998**	**232.419**	**232.419**
Preço Raso (R$)	**210.107**		**212.529**	
% de Raso	**91,35%**		**91,44%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Boa Viagem Prime			
Tipo:	**Com Varanda**		**Com Varanda**	
Método	**Ref. Vista do Golf**		**Vision**	
Avaliação	255.000		255.000	
Renda Inicial (VF)	5.429		4.283	
Renda Final*	-		4.800	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,73	4.142	0,93	4.142
FGTS	0,53	2.973	0,62	2.755
Financiamento	99,95%	199.744	99,27%	198.280
Subsídio	0,00%	957	105,47%	1.704
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25
Pró-Soluto	49,21%	24.265	65,11%	25.330
Preço Raso (RS)	232.082	232.082	232.210	232.210
TCD	32,37%	17.712	41,03%	17.712
VSO	13	13	13	13
Preço de Venda	**240.627**	**240.627**	**240.751**	**240.751**
Elasticidade	3,810%	3,810%	3,810%	3,810%
Preço de Venda Final	**249.794**	**249.794**	**249.922**	**249.922**
Preço Raso (R$)	**232.082**		**232.210**	
% de Raso	**92,91%**		**92,91%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Boa Viagem Prime
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	241.821
Renda Inicial (VF)	3.605
Renda Final*	3.930

Tipo:	VF	R$
Ato	1,00	3.693
FGTS	0,76	2.741
Financiamento	98,10%	184.211
Subsídio	110,13%	5.765
Prazo de Pró-soluto	25	25
Pró-Soluto	80,19%	25.425
Preço Raso (RS)	221.835	221.835
TCD	54,11%	18.860
VSO	27	27
Preço de Venda	**231.526**	**231.526**
Elasticidade	3,810%	3,810%
Preço de Venda Final	**240.696**	**240.696**
Preço Raso (R$)	**221.835**	
% de Raso	**92,16%**	
Raso Todas as Fases	**221.835**	
Nominal Todas as Fases	**240.696**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região com bons indicadores sociodemográficos, como renda e PEA/Dia, localizado na região nobre de Recife, e também se encontra próximo de pontos de interesses como estação de metrô, hospital, escola, mercado, shopping, aeroporto e etc.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", não mapeamos nenhum lançamento da concorrência dentro do MCMV na região.

	Preço Real					Preço Normalizado (25m)		
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Δ Elastic.	Preço Raso
Alameda dos Pássaros	207.418	174.944	2.158	25	22	1.767	-1,333%	174.355
Morada Capibaribe	212.698	180.934	2.318	25	20	3.655	-1,333%	182.128
Vista do Golf	240.830	215.180	4.156	35	28	-2.882	3,810%	220.386
Boa Viagem Prime	241.821	221.835	3.930	27	25	-	-	221.835

*Preços normalizados sem cheque-moradia, normalizando PSOL.

Percepção Comercial

Entorno

Distâncias POI Mobilidade

- Estação de Metrô Antônio Falcão – 300m
- Av. Mascarenhas de Morais – 700m
- Av. Antônio Falcão – 1,1km
- Av. Domingos Ferreira – 1,8 km

Raio 2 Km

- Colégio Cognitivo – 700m
- Supermercado Mix Matheus – 1,1km
- Faculdade Universo – 1,3km
- Supermercado Carrefour – 1,6km
- Shopping Center Recife – 1,8km
- Praia de Boa Viagem – 2km

*Imagem ilustrativa

Boa Viagem Prime

Parecer: Ciclo está de acordo com o preço e VSO citados, visto que, trata-se de uma área nobre e aspiracional da cidade (zona Sul do Recife), sem concorrência dentro do MCMV e próximo a diversos pontos de interesse e lazer, como mercados, escolas, faculdades, shopping, e a orla da Praia de Boa Viagem.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Informações Gerais – Consolidado

Boa Viagem Prime – PE – Recife Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	fev-25							
Boa viagem com Varanda		out-26	abr-27	dez-28	6 meses	20 meses	out-29	36 meses
Boa Viagem Sem Varanda		out-26	abr-27	dez-28	6 meses	20 meses	out-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	21,71 MM	Incorrido Terreno: 0,00 MM	Área do Terreno (100%):	6.566 m²	Área Líquida do Terreno: 6.566 m²
Cash:	0,00 MM		Custo de terreno m²:	3.305,8	Custo de terreno m² Área Líquida: 3.305,8
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)		VaR 25 (R$ mil):	0	Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV): 15,8% / 57,4%
Permuta Física:	21,71 MM (15,79%) - Unidades Permuta 90,00		VaR 26 (R$ mil):	0	CA Máx/Proj. 5,0 / 3,2
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%		Incorrido de Construção:	0,00 MM	Incorridos de Incorporação: 0,14 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Boa viagem com Varanda	T+15	232.210	270	249.922	255.000	99,3%	65,1%	41,0%
Boa Viagem Sem Varanda	T+15	212.529	301	232.419	230.000	97,1%	93,7%	65,8%

Unidades Totais:	571	Preço Médio:	240.696	Renda Média:	3.605	ITBI+Emol. Unit.:	6.045
Unidades Tenda:	481	Avaliação Média:	241.821	Ato:	3.598 (1 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	13.515
VSO:	14 Unidades	VGV Total:	137.437.161	FGTS:	2.723 (0,76 Salários)	Preço Raso Médio:	221.835
RET Médio:	3,2%	VGV Tenda:	115.774.561	% em RET 1%:	26%		

Construção

Custo Total Unit.:	99.940	Eventuais:	4,00%	Área priv (m²):	36,45	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	16.737.527	LI:	20,13%	Exposição de Caixa (R$):	9.040.676	Margem Bruta Econômica:	34,79%
TIR:	194,69%	LI Aprovação:	20,00%	Ger. Caixa 12 meses (R$):	0	Margem Bruta REF:	38,85%
Exposição de Caixa:	6,15%	Δ LI:	0,13%	Ger. Caixa 24 meses (R$):	(2.351.094)	Margem Rasa Econômica:	29,57%
Payback Contingente (21 m):	18 m/ (-3 m)	LI Resiliência:	14,24%	Ger. Caixa Marginal (R$):	34.666.160	Margem Rasa REF:	33,66%
Payback Consolidado:	18 meses					Margem de Contribuição Econômica:	25,08%

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Boa Viagem Prime		Boa viagem com Varanda		Boa Viagem Sem Varanda	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	147.096	100,0%	72.263	100,0%	74.833	100,0%
PIS/COFINS	(2.219)	1,5%	(1.337)	1,9%	(882)	1,2%
Custo Total	(94.469)	65,2%	(45.684)	64,4%	(48.785)	66,0%
Custo Terreno	(21.705)	15,0%	(11.246)	15,9%	(10.459)	14,1%
Custo Relacionados a Terreno	(259)	0,2%	(127)	0,2%	(132)	0,2%
Custos de Incorporação	(2.540)	1,8%	(1.228)	1,7%	(1.312)	1,8%
Custo de Construção	(69.965)	48,3%	(33.083)	46,6%	(36.882)	49,9%
Lucro Bruto Econômico	50.408	34,8%	25.242	35,6%	25.166	34,0%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	50.408	34,8%	25.242	35,6%	25.166	34,0%
Despesas de Selling	(10.682)	7,4%	(5.171)	7,3%	(5.511)	7,5%
Contingência	(3.383)	2,3%	(1.662)	2,3%	(1.721)	2,3%
Margem de Contribuição	36.342	25,1%	18.409	26,0%	17.934	24,3%
IR e CSLL	(1.816)	1,2%	(1.094)	1,5%	(722)	1,0%
Margem Líquida	34.527	23,8%	17.314	24,4%	17.212	23,3%
Lucro Bruto REF Unit.	104.023	38,9%	110.877	39,8%	98.540	38,0%
Lucro Raso REF Unit.	83.003	33,7%	91.148	35,2%	76.361	32,2%

R$ Mil - VPL - Compra	Boa Viagem Prime		Boa viagem com Varanda		Boa Viagem Sem Varanda	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	83.149	100,0%	41.109	100,0%	42.039	100,0%
PIS/COFINS	(1.237)	1,5%	(749)	1,8%	(488)	1,2%
Custos e Despesas Totais	(65.174)	78,4%	(31.675)	77,0%	(33.499)	79,7%
Custo Terreno	(12.273)	14,8%	(6.398)	15,6%	(5.876)	14,0%
Custo Relacionados a Terreno	(193)	0,2%	(95)	0,2%	(98)	0,2%
Custos de Incorporação	(1.699)	2,0%	(820)	2,0%	(879)	2,1%
Custo de Construção	(41.964)	50,5%	(19.843)	48,3%	(22.121)	52,6%
Despesas de Selling	(7.040)	8,5%	(3.419)	8,3%	(3.621)	8,6%
Contingência	(991)	1,2%	(487)	1,2%	(504)	1,2%
IR e CSLL	(1.012)	1,2%	(613)	1,5%	(399)	0,9%
Lucro Imobiliário	16.738	20,1%	8.685	21,1%	8.052	19,2%

Obrigado
