Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento

Regional: BA

Projeto: Torres de Pirajá

Data Comitê: 07/04/2025

Comitê Digital 31.03.25

Nome	Torres de Pirajá - Investimento	Observação - Torres de Pirajá
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	Ok
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Rodrigo Osmo	Discutir em Comitê	(1) Do ponto de vista financeiro, seria melhor para o proprietário jogar a dívida de IPTU para a Tenda pagar. Além disso, a dívida já está maior que a permuta (R$5,5M x R$5M). Seria correto assumirmos que nós quitarmos o IPTU seria o cenário base? O que acontece se o valor da dívida de IPTU for maior do que o valor definido para as permutas (R$5M)?
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	parabéns pela lista de atributos. Nosso caminho para novo patamar de margens.

Atualização de Material

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Anterior	Atual	Atual vs Anterior	Δ%
Data Estudo:	março-25	março-25	0 Meses	N/A
Lançamento:	abril-26	abril-26	0 Meses	N/A
Custo Total Inf (uh):	145.285	144.155	(1.130)	-0,8%
Custo Terreno:	15.969.960	15.000.000	(969.960)	-6,1%
LI Resiliência:	13,8%	13,2%	-0,6 p.p.	-4,2%
Lucro Imobiliário:	21,8%	20,4%	-1,4 p.p.	-6,3%
Exposição de caixa:	8,7%	11,5%	2,7 p.p.	31,2%
TIR:	102,6%	76,9%	-25,7 p.p.	-25,1%
Margem Bruta REF:	45,6%	46,1%	0,5 p.p.	
Margem Bruta Econômica:	42,6%	42,8%	0,2 p.p.	0,6%
Margem Rasa REF:	40,2%	40,7%	0,5 p.p.	
Margem Rasa Econômica:	36,4%	36,5%	0,1 p.p.	0,2%
Margem Contribuição Econômica:	30,2%	30,1%	0,0 p.p.	-0,2%
Payback Contingente (Régua 21 m):	20 m/ (-1 m)	21 m/ (0 m)	1 Meses	5,0%
Payback Consolidado:	20 Meses	21 Meses	1 Meses	5,0%

Atualização do preço terreno.
Com o cenário 2: Tenda quitando o IPTU no valor de 5.5 MM no momento da escritura e descontando da permuta física e das últimas parcelas do Cash.

Respostas comitê

Questionamento Comitê Osmo: (1) Do ponto de vista financeiro, seria melhor para o proprietário jogar a dívida de IPTU para a Tenda pagar. Além disso, a dívida já está maior que a permuta (R$5,5M x R$5M). Seria correto assumirmos que nós quitarmos o IPTU seria o cenário base? O que acontece se o valor da dívida de IPTU for maior do que o valor definido para as permutas (R$5M)?

R1: O proprietário não quis jogar a dívida diretamente para a Tenda pagar, por entender que tem possibilidade de reduzi-la, contratou um advogado que já está trabalhando nessa questão.

Paralelamente ao trabalho iniciado pelo vendedor vamos acompanhar com consultoria específica que já nos apontou a real possibilidade de redução de no mínimo **1,5MM** sobre os processos em dívida ativa (até 2020) e com um trabalho mais direcionado, pós baixa, existe a possibilidade de reduções sobre o saldo. Por isso entendemos que o valor será inferior a permuta.

Outrossim, vamos assinar um aditamento incluindo novas obrigações apontadas na due aproveitaremos para inserir a possibilidade de abater qualquer valor excedente da parte em cash.

Entendemos também ser correto assumirmos o cenário base quitando a dívida. Não levamos anteriormente como um cenário "aprovável" por entendermos que a regional não está aprovando antecipadamente uma exposição de caixa tão relevante na "cabeça" sabendo que existe um trabalho a ser feito para reduzir este valor, bem como o vendedor também poder resolver por conta própria (obrigação contratual).

Como prática levaremos novamente para futura aprovação dos valores reais a serem pagos referente as dívidas. O cenário real deverá ser algo entre o 1º e o 2º.

Adiante o cenário 2 a disposição para nova aprovação, se for o caso:

One page – Torres de Pirajá (Cenário 2)

Cidade	Salvador	**Mancha de demanda**	BA - Salvador - Alta
Regional	BA	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Investimento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Mar

Unidades (% Vagas)	858 (11%)	**CA Máx | Proj**	4,0 | 1,7
Tipologia	F2E - Concreto	**Escritura**	mar-26
Fases	2 fases	**Lçto | Duração (m)**	abr/26 | 39

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	15.000 (7,4%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	15.000 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	1.226	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	83.471 (41,1%)	**Indireto Unit.**	18.372
Prazo da Obra (meses)	20	**Torre Unit.**	55.230
Custo Total Unit. (LPU):	97.286 (88)	**Infra Unit.**	14.148
Início de Obra	out-26	**Fundação Unit.**	7.130

Preço Nominal Unit.	236.762	**VSO**	24
Preço Raso Unit.	215.425	**Referência**	1.174
Avaliação Unit.	239.815	**Renda (% em RET 1%)**	3.253 (29,0%)



LI (Régua):	**20,4% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	42,8%
LI Resiliência:	13,8% (N/A)	**Margem Rasa Econômica:**	36,5%
Margem Bruta REF:	46,1%	**Margem Contribuição Econômica:**	30,1%
Margem Rasa REF:	**40,7%**	**Exposição (% VGV):**	25.252 (11,5%)
TIR:	76,9%	**VGV Total:**	203.141
Payback Contingente (21 m) :	**21 m/ (0 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(705)
Payback Consolidado:	21	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	(23.449)

[1] Localização

- Localizado na mancha de Salvador que tem como principal via a BR 324, este empreendimento encontra-se a 2 min da Estação de Metrô Pirajá, 10 min do Shopping Bela Vista, 7 min do Mercado Mercantil Rodrigues, 4 min da Upa de Pirajá, além de ter em suas proximidades escolas, farmácias e um centro comercial diverso que circunda esta região.
- Área de grande demanda populacional onde já lançamos 8 empreendimentos Tenda com sucesso em vendas em um raio de 3 km do empreendimento.
- Terreno com alta visibilidade comercial sendo disputado ao longo das negociações com a Stanza.

[2] Condição Comercial

- Valor do negócio fechado de 15 MM totais, sendo 10 MM em cash dividido em 36 parcelas de R$277.777 e 5MM em permuta física, distribuídas em 22 unidades (sem vagas e sem varanda vinculadas) a serem entregues na primeira fase do empreendimento.
- Há uma divida de IPTU e foro perante a prefeitura sobre responsabilidade contratual de quitação pelo proprietário no valor de 5,5MM. Há a previsão em contrato que na celebração da escritura, caso o mesmo não a honre, poderá a Tenda pagar a divida e abater das unidades da Permuta Física. Caso o valor da dívida seja superior ao valor da Permuta, a diferença a maior será abatida do parte em cash.
- **Cenário para aprovação** sendo levado com pagamento da dívida full (5,5MM) pela Tenda na escritura, levando em consideração o cenário do proprietário não cumprir a obrigação contratual, e abatimento dos 5MM das unidades da permuta física conforme já estabelecido em contrato e os 500 mil excedentes abatidos das últimas duas parcelas a serem pagas, apesar de acreditarmos que o valor a ser pago da dívida será reduzido de no mínimo 1,5MM, com proprietário cumprindo a obrigação contratual de quitar esse valor.
- Não há previsão de reajuste das parcelas em Cash do contrato, também não há prazo contratual para escritura. Quanto as unidades, foram fixadas a entrega de 22 unidades independente do valor de venda das mesmas.
- Após aprovação em comitê um escritório especializado será contratado para atuar em conjunto com o vendedor para redução dessa dívida e/ou parcelamento da mesma como já realizado em outros empreendimentos .

[3] Projeto

- Embora o CA máximo do terreno seja de 4, conseguimos chegar a 2,5 na área líquida devido a uma área de declividade acentuada de 3.914m² e a quantidade de taludes para vencer os desníveis do terreno.
- Em relação a atributos de produto, está prevista a venda das 11% de vagas vinculadas (93 vagas), e varanda em 48% das unidades (408 unidades), piscina adulto e infantil, quadra poliesportiva gramada, Salão de festas e três churrasqueiras (uma a cada 250 unidades).

Torres de Pirajá – Implantação

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Farol Pareceres – Torres de Pirajá

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	**Due diligence concluída positivamente**. Do imóvel; i) Necessário regularizar a propriedade da vendedora através da usucapião extrajudicial **(em trâmite no RGI, pressuposto para baixa)**, bem como realizar o resgate de enfiteuse por se tratar de imóvel foreiro ao município de Salvador/BA; ii) Imóvel possui débitos de IPTU e FORO no valor aproximado de 5.1MM e R$400.000,00 respectivamente, que deverão ser quitados até a data de escritura; iii) Há 18 locações vigentes no imóvel, contudo, fora consignado no contrato que a vendedora deverá desocupar o imóvel até 01/01/2026, **precisaremos da renúncia dos direitos de preferência de todos para baixa**; iv) Há **02 ações monitórias, ajuizadas pela Caixa Econômica Federal em face da vendedora e sócias**, no valor total de R$186.131,12 (sem atualização). Necessária o encerramento das ações antes da aquisição do IMÓVEL para não prejudicar a contratação; v) Certidão positiva da receita federal, necessário a regularização para a escritura; vi) identificamos **passivos para a vendedora e sua sócias no valor aproximado de R$2.5MM**, contudo, como a aquisição do imóvel será parte em dinheiro e parte em permuta física, **recomendamos a retenção de tantas unidades quanto bastem para garantir o passivo fiscal** (aproximadamente 1,2MM), a serem liberadas para a vendedora somente após a quitação dos débitos.	Ok com ressalvas	
Legalização	O terreno encontra-se em um zoneamento que exige a fachada ativa em, no mínimo, 40% (quarenta por cento) da testada da edificação. O terreno não possui testada suficiente para absorção da fachada ativa, atendendo apenas à testada mínima exigida pela zona. Vamos protocolar uma defesa para isenção de Fachada Ativa, considerando as características e os usos comerciais no entorno do terreno, seguindo a argumentação de defesa aprovada em outros empreendimentos.	Ok com ressalvas	
Produto	Zoneamento tem a exigência de facahda ativa, será pleiteada a isenção em função do tamanho da testada que não viabiliza a Implantação. Terreno com área de restrição de implantação por escavação existente.	Ok com ressalvas	
GETEC	Viabilidade de água e esgoto emitida 72 UH a menos em relação ao projeto emitido. Custo de drenagem conforme o alinhamento entre a regional e o consultor local	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos	Ok	
Contratação	N/A		
Inteligência de mercado	IM Avalia o preço como fáctivel	Ok	
Comercial/Ciclo	Favorável, mesmo com a concorrência da MRV e da Contrix, todos em final de estoque, e estamos com o preço mais acessível	Ok	
Estudos Econômicos	Ok	Ok	

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

SSA – Salvador

Lançamento

1. Farol de Itapuã | Ponta Humaitá
2. Parque Topázio
3. Vista Salvador Norte
4. Reserva Piatã
5. Encanto Piatã
6. Vale dos Lírios
7. Jardim Armação Prime
8. Morada das Estações

LandBank

9. Torres Vila Laura
10. Vale das Tulipas
11. Vista Serena
12. Vivenda Real
13. Portal de Salvador
14. Solar Patamares
15. Solar e Mar de Itapagipe
16. **Torres de Pirajá**
17. Paralela Sun Prime
18. Vale das Orquídeas
19. Privilege Salvador Norte
20. Mirante Verona (Veneza)

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 3 - Verde

Região

Capital

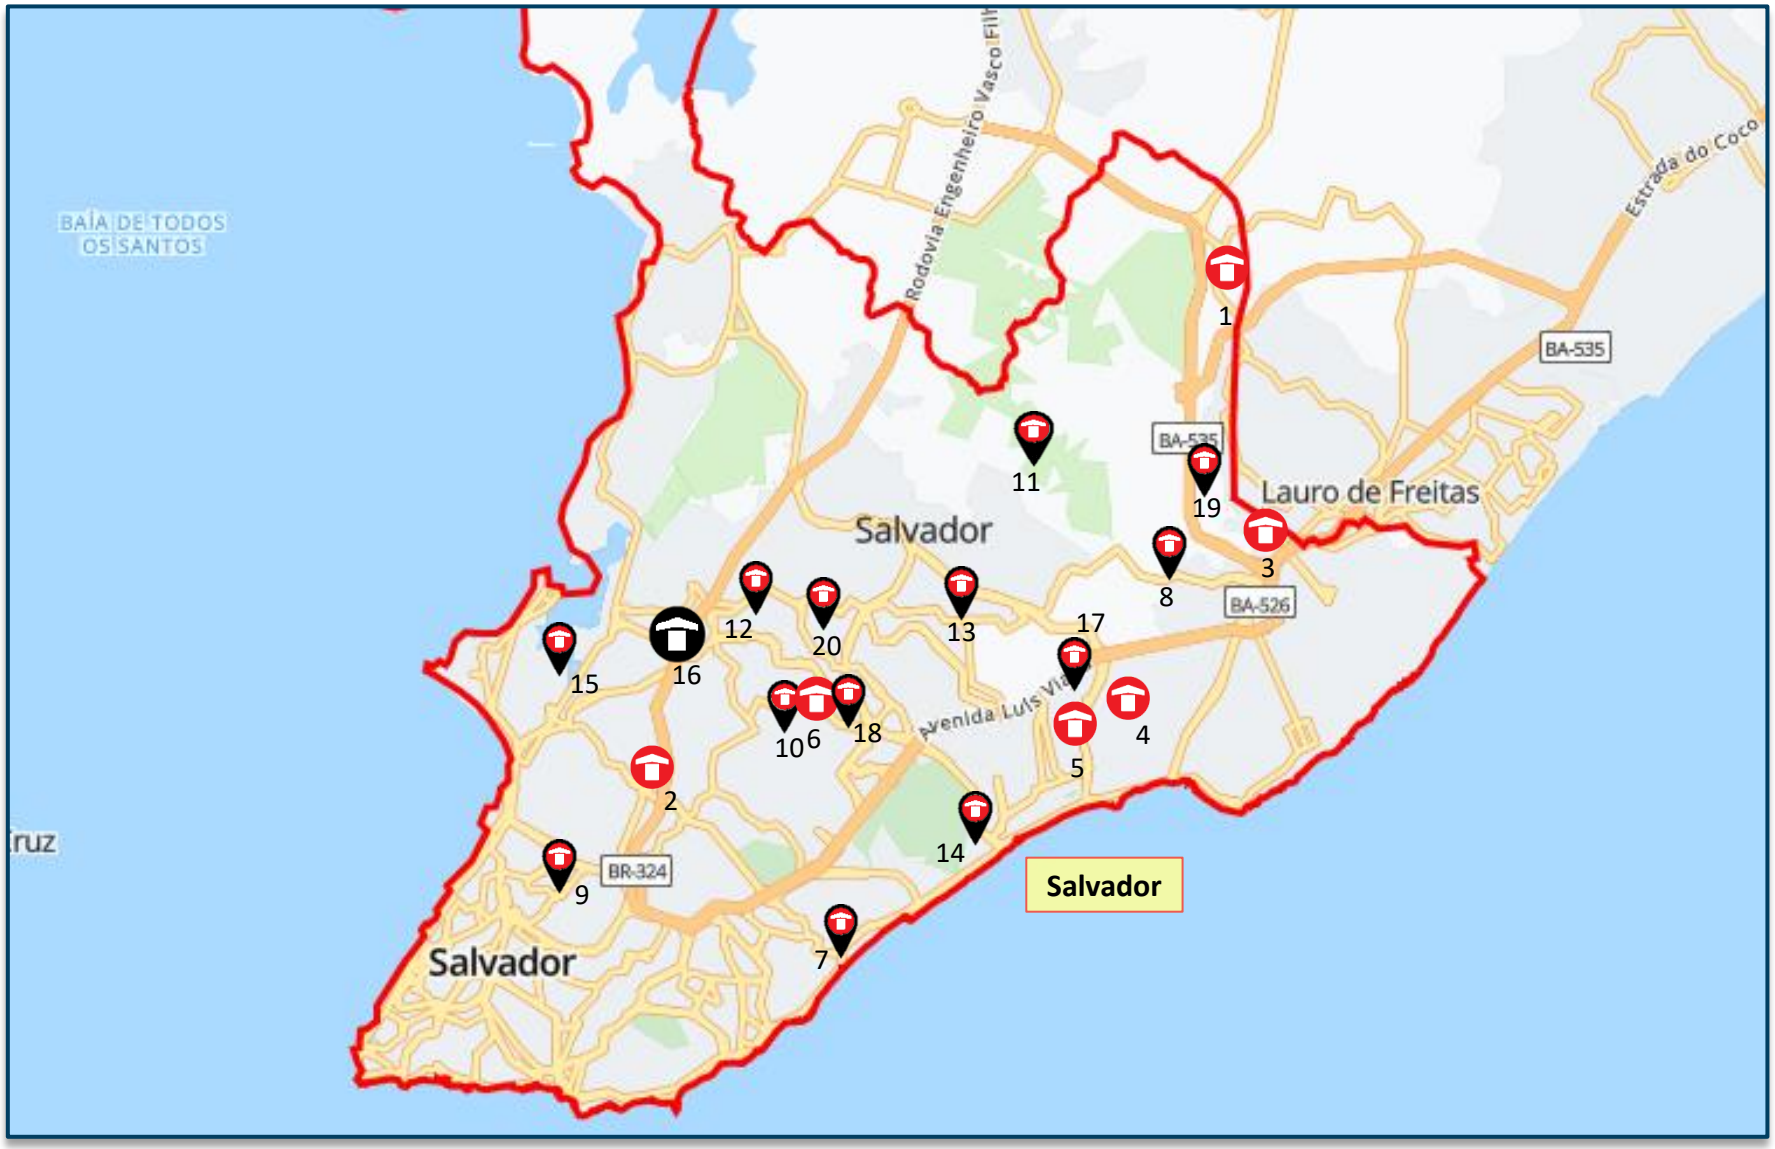

Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Torres Pirajá
Investimento e Escritura

Informações Gerais – Condomínio Torres Pirajá		
Terreno	**Área terreno**	16.147,57 m²
	Menor poligonal	16.147,57 m²
	FNA	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento viário	Sim
	Área liquida	12.232,51 m²
	Zoneamento	ZCMe-2 (Zona Centralidade Metropolitana)
	Ca máximo	4,00
	Ca básico	2,00
	Ca projetado	1,67
	Gabarito máximo	Não há restrição
Geral	**Total uh**	858
	Total de vagas (autos|motos)	80 | 13
Tipologia	**Tipologia**	BA-0201-LF-PC10-CE2B
	Gabarito	T+17
	Lâmina	03 16pp
	Área privativa	35,21 m²
Condomínio	**Unidade pcd**	43
	Unidade lazer|técnica	03 | 03
	Torre	03
	Fase	02
Lazer	**Lazer coberto**	Salão de festas c/ Churrasqueira, Churrasqueira c/ Banheiro, Brinquedoteca, Espaço Office, Fitness
	Lazer descoberto	Playgrounds, quadra, Fitness, Funcional, Petplace, Praça dos Sabores

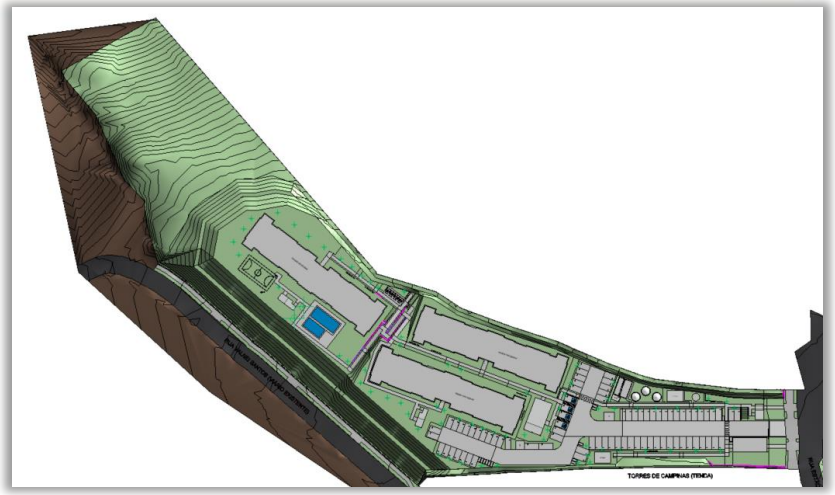

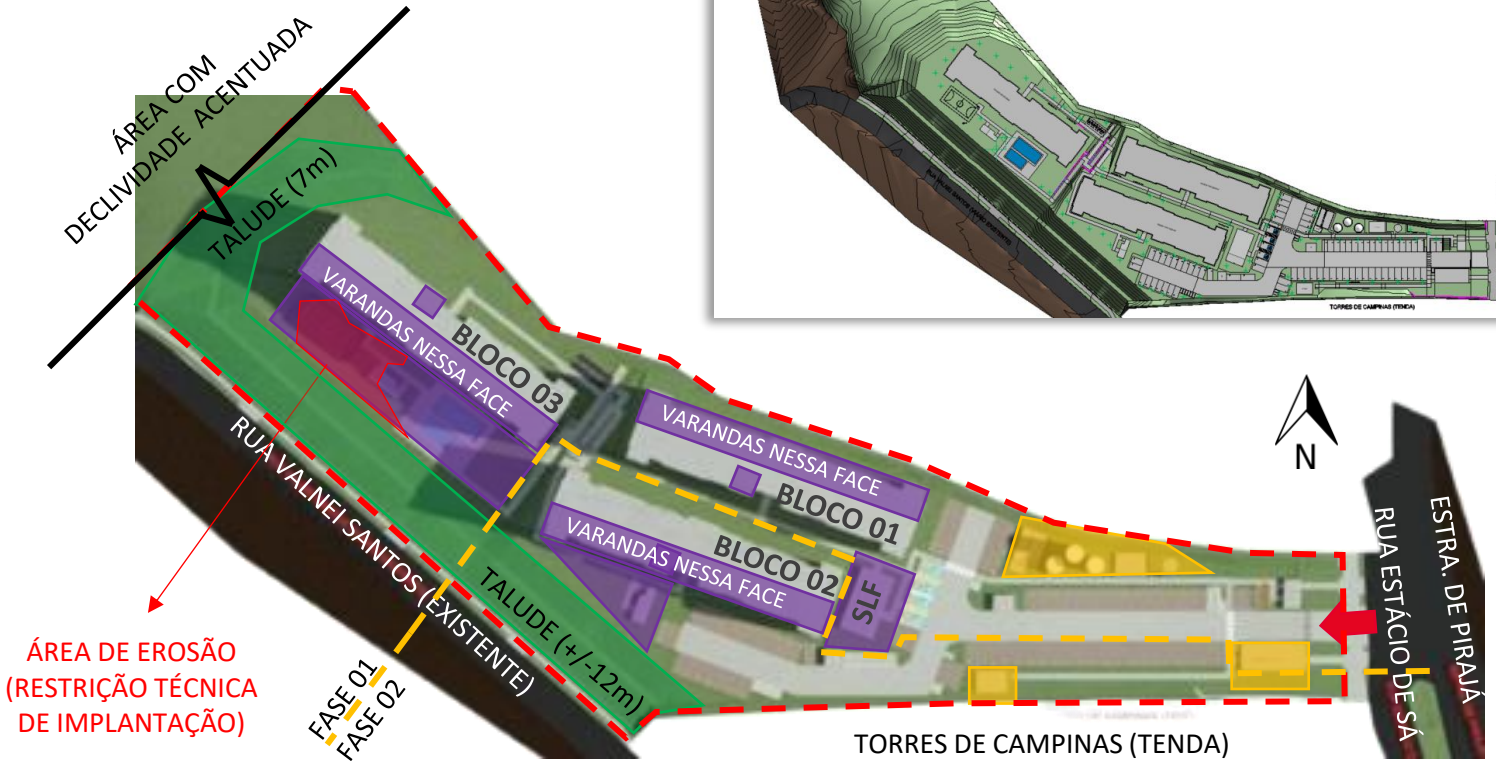

IMPLANTAÇÃO

PRODUTO

Empreendimento Torres Pirajá
Investimento e Escritura

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	Limite supercondomínio		
	Acesso		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	Atributos Infra	Sim	Quadra/Piscina
	Atributos Torre	Sim	408 UH com varanda
	Edifício Garagem	Não	

PISCINA/ QUADRA

DECLIVIDADE

IMPLANTAÇÃO GERAL

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Condições do Negócio

➢ **VALOR DO NEGÓCIO**

a) Valor do negócio de 15MM, equivalente a 7,4% de VGV.
b) 10 MM em Cash e 5MM em Permuta Física (equivalente a 22 unidades)

➢ **CONDIÇÃO DO NEGÓCIO E PRAZOS CONTRATUAIS**

a) 10 MM em cash em 36 parcelas mensais, no valor de R$ 277.777,78 cada, com vencimento da primeira parcela na lavratura da escritura pública de compra e venda do IMÓVEL, desde que superado todas as resolutivas contratuais.
b) 5MM em permuta física, distribuídos em 22 unidades (sem vaga e sem varanda vinculada), a serem entregues na primeira fase.
c) Não há prazo estabelecido para a escritura, estando vinculada tão somente a aprovação de projeto e superação de todas as resolutivas.
d) Prazo de 72 meses para a entrega das unidades após o registro da incorporação imobiliária.
e) Cenário base considerado para aprovação pagando na escritura além da primeira parcela de R$277.777,78, a divida de IPTU dos 5,5 MM e não entregando as 22 unidades da Permuta Física além do abatimento dos 500 mil das últimas duas parcelas em cash.

➢ **CORREÇÃO MONETÁRIA**

a) Não se aplica.

➢ **OUTRAS INFORMAÇÕES**

a) Promessa de compra e venda assinada em Dez/24.
b) Todas as clausulas resolutivas padrões da Tenda estão previstas no instrumento.
c) Há um processo de usucapião extrajudicial em curso que estamos acompanhando junto ao cartório de registro de imóveis para regularização do imóvel em nome da proprietária. Entendemos que os documentos reunidos e enviados ao cartório são suficientes para essa regularização.
d) Há uma divida de IPTU e Foro no valor de 5,5MM sobre responsabilidade do proprietário paga-la até a data da escritura. Caso o mesmo não realize o pagamento, poderá a Tenda pagar a divida em vias de celebração da escritura e abater este valor das unidades da permuta física.
e) Há 18 contratos de aluguel vigentes no imóvel cujo os termos de renúncia a compra estão sendo recolhidos junto aos proprietários (pressuposto para baixa). Há a obrigação contratual do vendedor de entregar o terreno livre e desimpedido de pessoas e coisas até a data da escritura.

➢ **GARANTIAS**

a) Tenda: N/A
b) Vendedor: Aval Tenda

➢ **CORRETAGEM**

a) A obrigação do pagamento da corretagem é da VENDEDORA.

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Custo de Construção

	TORRES DE PIRAJÁ CEN01 | REV03 FASE 1	TORRES DE PIRAJÁ CEN01 | REV03 FASE 2	TORRES DE PIRAJÁ CEN01 | REV03 CONSOLIDADO	TORRES DE PIRAJÁ CEN01 | REV02 CONSOLIDADO	TORRES DE PIRAJÁ CEN01 | REV01 CONSOLIDADO	TORRES DE PIRAJÁ CEN01 | REV00 CONSOLIDADO
Torres	2	1	3	3	3	3
Unidades Construídas	576	288	576 | 288	576 | 288	576 | 288	576 | 288
Unidades Vendidas	572	286	572 | 286	572 | 286	572 | 286	572 | 286
Total Unidades Vendidas	572	286	858	858	858	858
Condomínios (qta.)	1	1	1	1	1	1
Cidade	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	2 Torres | T+17 | 16PP | C2B	1 Torre | T+17 | 16PP | C2B	3 Torres | T+17 | 16PP | C2B	3 Torres | T+17 | 16PP | C2B	3 Torres | T+17 | 16PP | C2B	3 Torres | T+17 | 16PP | C2B
Tipologia						
Atributos de Projeto	Piscina | Varanda	Piscina | Varanda	Piscina | Varanda	Piscina	Piscina	Piscina
Projeto Infra	AP	AP	AP	AP	AP	AP
Projeto Torre	EP	EP	EP	EP	EP	EP
Mês Base	março-25	março-25	março-25	março-25	fevereiro-25	dezembro-24
Incc	1.173,775	1.173,775	1.173,775	1.169,116	1.159,536	1.153,725
LVS	fevereiro-25	fevereiro-25	fevereiro-25	janeiro-25	dezembro-24	outubro-24
Indiretos	fevereiro-25	fevereiro-25	fevereiro-25	janeiro-25	dezembro-24	outubro-24
Base de Preço	LPU 88	LPU 88	LPU 88	LPU 88	LPU 86	LPU 85
Takt	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	20	15	20 | 15	20 | 15	20 | 15	20 | 15
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 97.692	R$ / UND R$ 91.404	R$ / UND R$ 95.596	R$ / UND R$ 94.189	R$ / UND R$ 93.623	R$ / UND R$ 92.555
Indireto	R$ 18.386	R$ 18.345	R$ 18.372	R$ 18.529	R$ 17.563	R$ 16.960
Torre	R$ 55.228	R$ 55.235	R$ 55.230	R$ 54.474	R$ 54.805	R$ 54.274
Infra	R$ 15.921	R$ 10.602	R$ 14.148	R$ 13.340	R$ 13.422	R$ 13.522
Fundação	R$ 7.157	R$ 7.075	R$ 7.130	R$ 7.130	R$ 7.118	R$ 7.118
EEE						
ETE						
Contenção	R$ 461		R$ 308	R$ 308	R$ 307	R$ 272
Terraplenagem	R$ 539	R$ 146	R$ 408	R$ 408	R$ 408	R$ 408
CUSTO TOTAL II	R$ 1.690	R$ 1.690	R$ 1.690	R$ 1.686	R$ 1.686	R$ 1.459
Urbanização	R$ 98	R$ 98	R$ 98	R$ 93	R$ 93	R$ 93
Drenagem	R$ 53	R$ 53	R$ 53	R$ 53	R$ 53	R$ 53
Extensão de Rede Elétrica						
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.539	R$ 1.539	R$ 1.539	R$ 1.539	R$ 1.539	R$ 1.313
CUSTO TOTAL III						
Incorridos						
CUSTO TOTAL IV						
Aprendizado						
CUSTO TOTAL V				R$ 382	R$ 1.170	R$ 1.634
Atualização por INCC				R$ 382	R$ 1.170	R$ 1.634
CUSTO TOTAL I+II	R$ 99.382	R$ 93.094	R$ 97.286	R$ 95.874	R$ 95.309	R$ 94.014
CUSTO TOTAL I AO V	R$ 99.382	R$ 93.094	R$ 97.286	R$ 96.256	R$ 96.479	R$ 95.648

Custo de Construção

	TORRES DE PIRAJÁ CEN01 | REV03 CONSOLIDADO	TORRES DE PIRAJÁ CEN01 | REV02 CONSOLIDADO	
Torres	3	3	
Unidades Construídas	576 | 288	576 | 288	
Unidades Vendidas	572 | 286	572 | 286	
Total Unidades Vendidas	858	858	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Salvador - BA	Salvador - BA	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	3 Torres | T+17 | 16PP | C2B	3 Torres | T+17 | 16PP | C2B	
Tipologia			
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	EP	EP	
Atributos de Projeto	Piscina | Varanda	Piscina	
Mês Base	março-25	março-25	
Incc	1.173,775	1.169,116	
LVS	fevereiro-25	janeiro-25	
Indiretos	fevereiro-25	janeiro-25	
Base de Preço	LPU 88	LPU 88	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	20 | 15	20 | 15	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 95.596	R$ / UND R$ 94.189	DIF R$ 1.407
Indireto	R$ 18.372	R$ 18.529	-R$ 157
Torre	R$ 55.230	R$ 54.474	R$ 756
Infra	R$ 14.148	R$ 13.340	R$ 808
Fundação	R$ 7.130	R$ 7.130	R$ 0
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 308	R$ 308	R$ 0
Terrapplenagem	R$ 408	R$ 408	R$ 0
CUSTO TOTAL II	R$ 1.690	R$ 1.686	R$ 5
Urbanização	R$ 98	R$ 93	R$ 5
Drenagem	R$ 53	R$ 53	R$ 0
Extensão de Rede Eletrica	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.539	R$ 1.539	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 382	-R$ 382
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 382	-R$ 382
CUSTO TOTAL	R$ 97.286	R$ 96.256	R$ 1.030

INDIRETOS

+244 | G13 – Pessoal Permanente (Simulador GR13 R12 - GAPE)
-339 | G15 – Canteiro (Preço – Ref. Jardim Armação Prime)

TORRE

-256 | Gesso (Preço)
+163 | Impermeabilização (Tipologia – UH com varanda)
+110 | Revestimento cerâmico (Tipologia – UH com varanda)
+410 | Esquadria de alumínio (Tipologia – UH com varanda)
+193 | Esquadria de ferro (Tipologia – UH com varanda)

INFRA

+756 | Instalações elétrica (Subestação CTS - Instalações)
+52 | Anexos (Subestação CTS – Civil)

Operações

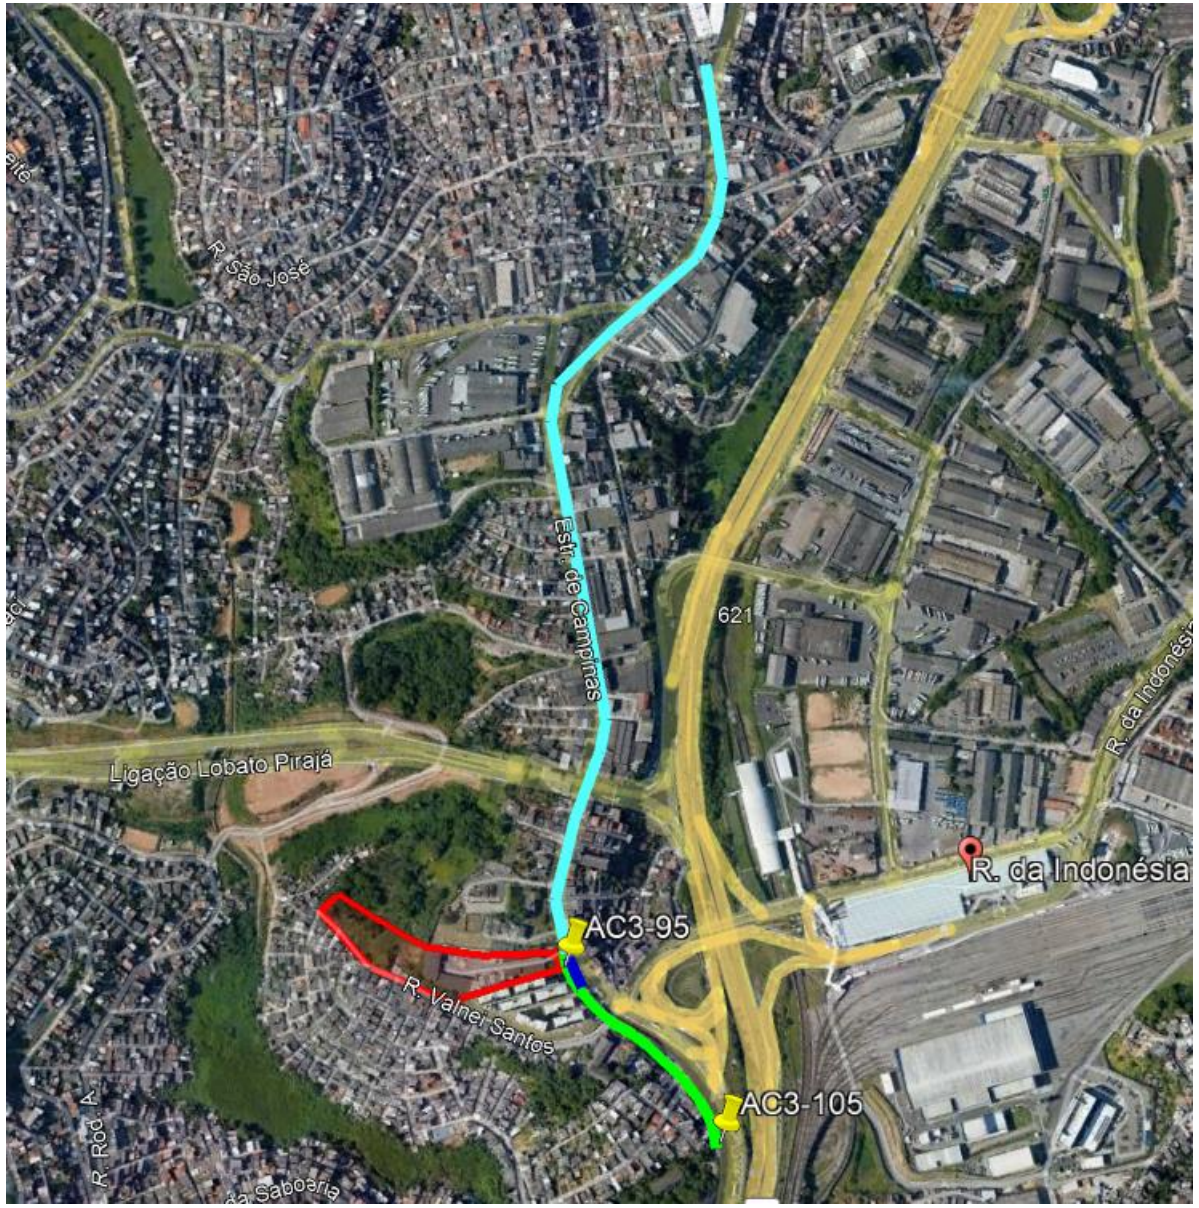

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Há viabilidade técnica para o abastecimento de água por meio da execução de uma rede LD DN 300 FoFo, com extensão de 1.275 metros, na Estrada de Campinas.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Há viabilidade técnica para lançamento de esgoto. Necessário a ampliação de 330 m rede de esgoto de 150mm para 200mm.

SISTEMA DE DRENAGEM
Será realizado o descarte parcial na rede pública em frente ao terreno. Outro trecho será direcionado para a rede existente que conecta ao córrego, com a ligação sendo executada por meio de uma escada hidráulica de 90 metros de extensão, superando 30 metros de altura.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado apenas a execução das calçadas conforme projeto.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 08/2024, com validade de 12 meses, apresentando 72 UH a menos em relação ao projeto emitido.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 08/2024, com validade de 12 meses, apresentando 72 UH a menos em relação ao projeto emitido.

Drenagem:
- Não se aplica.

Elétrica:
- Há viabilidade emitida.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado apenas a execução das calçadas conforme projeto.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 06 furos.
- Considerada Estaca Hélice, com diâmetros de 50, 60 e 70cm e profundidade de 26 e 28m.

Logística

VIVENCIA - CONTAINERS								
DESCRIÇAO	QUANTIDADE	TAMANHO MODULOS	MOBILIZAÇAO	DESMOBILIZAÇAO	PREFORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MODULO COM SANITARIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇAO	1 DESMOBILIZAÇAO	TODO PERIODO	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE01
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MODULO COM SANITARIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇAO	1 DESMOBILIZAÇAO	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	FASE02
CONTAINER PROVISORIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MODULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇAO	1 DESMOBILIZAÇAO	TODO PERIODO	-	-	FASES01 E 02
CONTAINER PROVISORIO (LOG)	CONSIDERAR 20 MODULOS DE CONTAINER (T+1)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇAO	1 DESMOBILIZAÇAO	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASES01 E 02

TENDAS_PERIODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PREFORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERIODO	-	FASE 01
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERIODO	-	FASE 02
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	6,00	10,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE 01
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	6,00	8,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE 02
TENDA ARMADOR (LOG)	3	<varia>	<varia>	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	FASE 01
TENDA ARMADOR (LOG)	1	3,00	7,00	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	FASE 02
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	6,00	10,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE 01
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	6,00	8,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE 02
TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	6,00	10,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE 01
TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	6,00	8,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE 02
TENDA EXTRA (LOG)	2	8,00	10,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE 01
TENDA LAZER (LOG)	1	3,00	3,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASES01 E 02
TENDA MOLDADOR (LOG)	2	3,00	4,00	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	FASE 01
TENDA MOLDADOR (LOG)	2	2,00	5,00	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	FASE 02

EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇAO	DESMOBILIZAÇAO	PREFORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
BETONEIRA (LOG)	VARIAVEL	-	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	FASES01 E 02
BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇAO	1 DESMOBILIZAÇAO	TODO PERIODO	TODO PERIODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERIODO DE ACABAMENTO	FASES01 E 02
BOMBA ESTACIONARIA PADRAO (LOG)_R01	1 EQUIPAMENTO	-	-	-	TODO PERIODO	-	FASES01 E 02
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIAVEL	-	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	FASES01 E 02
CAMINHAO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇAO	1 DESMOBILIZAÇAO	-	CONSIDERAR MEIO PERIODO DE ESTRUTURA	-	FASES01 E 02
CREMALHEIRA PCT (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOBILIZAÇAO POR EQUIPAMENTO	1 DESMOBILIZAÇAO POR EQUIPAMENTO	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE 01
CREMALHEIRA PCT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇAO POR EQUIPAMENTO	1 DESMOBILIZAÇAO POR EQUIPAMENTO	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE 02
MINIGRUA (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERIODO	-	FASE 01
MINIGRUA (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERIODO	-	FASE 02
PERFURATRIZ (LOG)		1 MOBILIZAÇAO	1 DESMOBILIZAÇAO	CONSIDERAR PERIODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-	FASES01 E 02

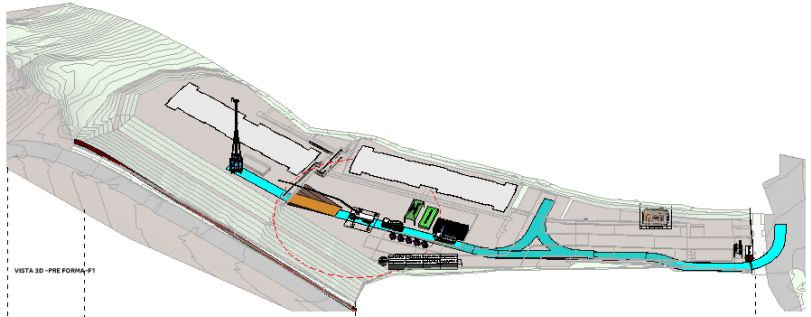

VISTA 3D - PRE FORMA-F1

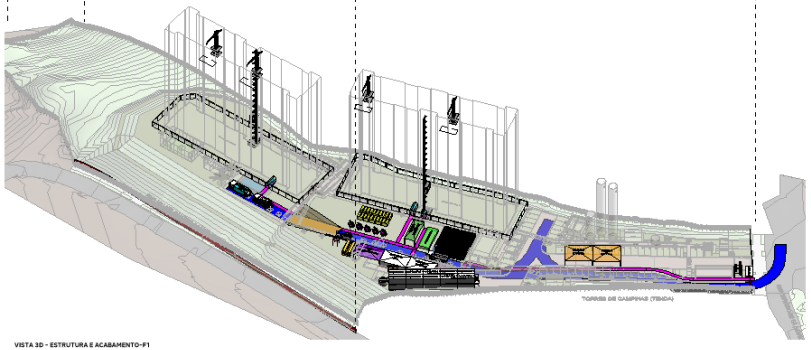

VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO-F1

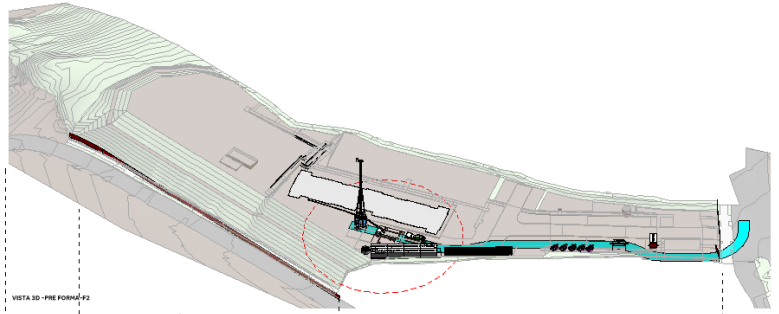

VISTA 3D - PRE FORMA-F2

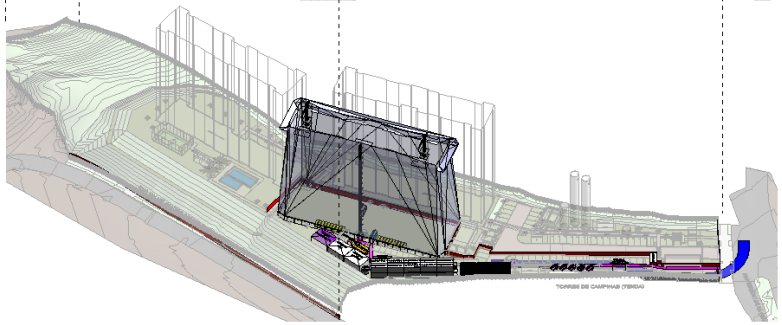

VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO-F2

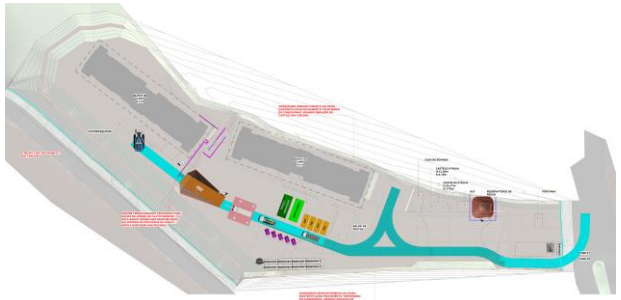

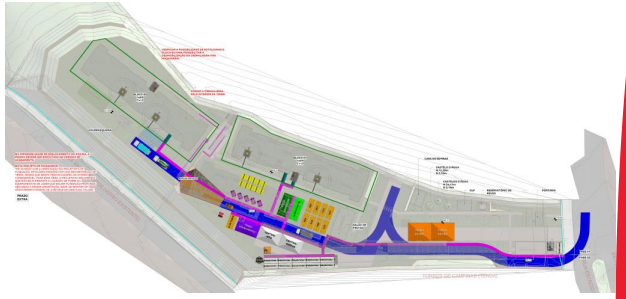

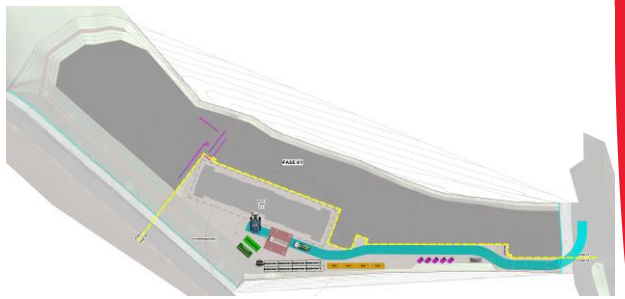

Logística

TORRES PIRAJÁ-BA

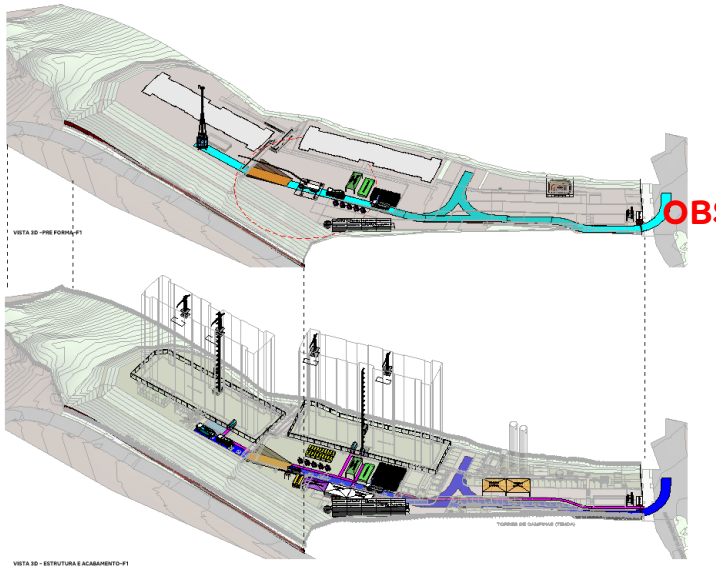

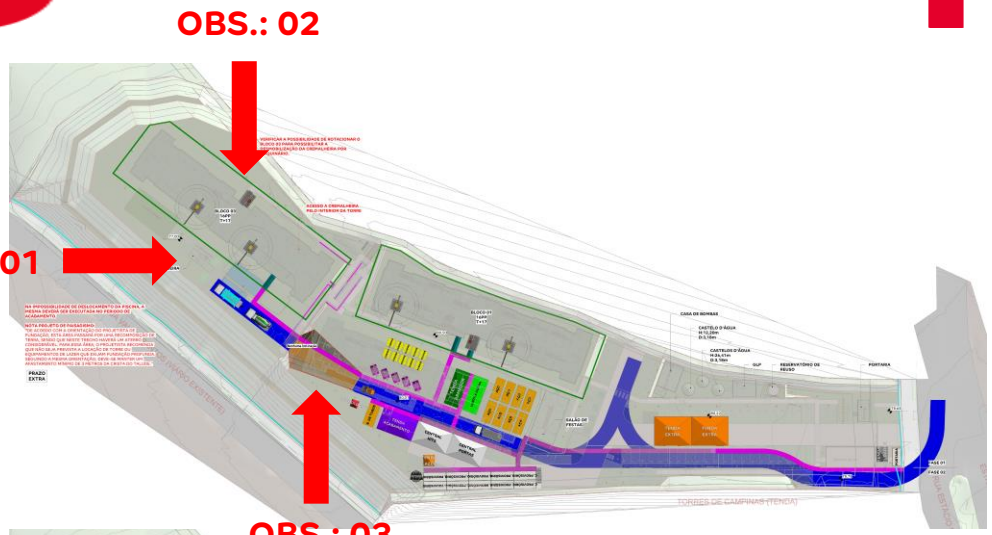

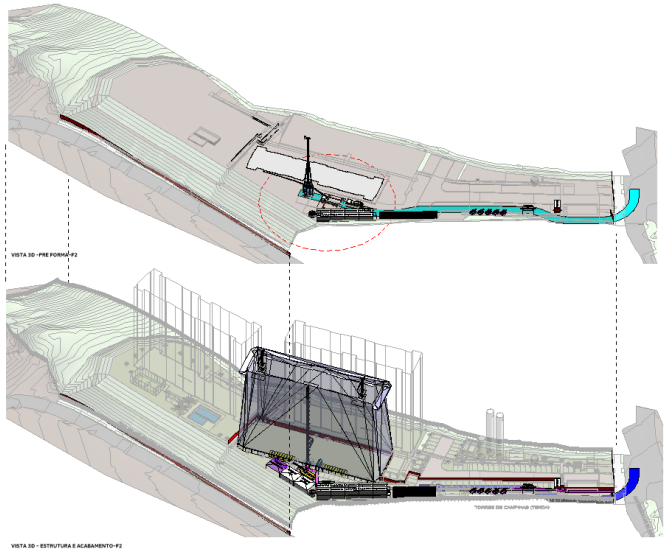

➢ OBS. 01	NA IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA PISCINA, A MESMA DEVERÁ SER EXECUTADA NO PERIODO DE ACABAMENTO.
➢ OBS. 02	VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ROTACIONAR O BLOCO 03 PARA POSSIBILITAR A DESMOBILIZAÇÃO DA CREMALHEIRA POR MAQUINÁRIO.
➢ OBS. 03	PREVER TERRAPLENAGEM PROVISÓRIA PARA RAMPA DE ACESSO AO PLATÔ INFERIOR. ESTA RAMPA DEVERÁ SER DESMOBILIZADA NO PERÍODO DE PÓS FORMA DA FASE 01, APÓS A EXECUÇÃO DAS PISCINAS.

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CUSTO E PRAZO PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS PROVISÓRIAS, CONFORME INDICADAS NA IMPLANTAÇÃO, PARA VIABILIZAR ACESSOS NO EMPREENIMENTO, GARANTINDO ASSIM A EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO/TERRAPLENAGEM DA FASE 01. AS RAMPAS DEVERÃO SER ABSORVIDAS NO PROJETO DE TERRAPLENAGEM PROVISÓRIA, CONSIDERANDO O REFORÇO DE BASE PARA A PISTA PROVISÓRIA (CAMADA DE SACRIFÍCIO). NÃO HÁ ALCANCE DO RAIO DO MUNCK PARA MOBILIZAR E DESMOBILIZAR A CREMALHEIRA DO BLOCO 03. ASSIM, A MOBILIZAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM A BOBCAT. PREVER LARGURA SUFICIENTE PARA PASSAGEM DESTE MAQUINÁRIO E PREVER COM SUPRIMENTOS CONTRATAÇÃO DE CREMALHEIRA COM CABINE DESMONTÁVEL.

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Salvador	SSA	45%	4.595	383	5.514	460

Empreendimento	Renda	Lançamento	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28
Morada Das Estações	2.818	dez-24	37	37	37	8																		
Vivenda Real Cond I	3.151	jan-25	31	31	31	31	13																	
Encanto Piatã F2	3.557	ago-25	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	35											
Vila Laura Prime	4.363	nov-25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28								
Paralela Sun Prime - F1	4.286	nov-25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	4							
V Salvador - Forte Sao Marcelo	1.877	jan-26	70	70	70	70	70	10																
Vale Das Tulipas F1	3.217	fev-26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24					
Torres de Pirajá F1	**3.235**	**abr-26**		**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**23**			
Torres de Pirajá F2	**3.235**	**out-27**																				**13**	**13**	**13**
Mirante Veneza F1	3.577	mai-26			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	26		
Vale das Orquídeas - F1	2.817	jun-26				32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	28	
Vivenda Real Cond II	3.171	jul-26					24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
V Salvador - Parque Da Cidade	1.877	ago-26						60	70	70	70	70	70	30										
Privilege Salvador Norte	3.023	nov-26									33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Vista Serena F1	2.030	dez-26										28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Encanto Piatã F3	3.616	fev-27												25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Paralela Sun Prime - F2	4.071	mai-27															27	27	27	27	27	27	27	27
Solar De Itapagipe	3.700	jul-27																	23	23	23	23	23	23
Vale Das Tulipas F2	3.217	ago-27																		16	16	16	16	16
Portal Salvador I F1	2.933	set-27																			30	30	30	30
Total de Vendas Lançados			**37**	**37**	**37**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**263**	**294**	**326**	**329**	**327**	**314**	**314**	**314**	**347**	**375**	**373**	**323**	**293**	**291**	**266**	**262**	**279**	**271**	**293**	**277**	**247**	**219**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Torres de Pirajá F1 | Mapa Concorrência

		Torres de Pirajá F1	Reserva Do Mar	Residencial Reserva Da Mata	Vila Jamari
		TENDA	MRV	MRV	Contrix
	Distância Tenda (km)		2,96 Km	2,06 Km	1,45 Km
Região 1 Km	População	46.356	27.390	39.407	30.491
	Dens. Demográfica	14.851	8.775	12.625	9.768
	Renda (R$)	2.234	2.795	2.736	2.538
	Classe Social	E (Até 1,4k)	E (Até 1,4k)	E (Até 1,4k)	E (Até 1,4k)
	PEA Dia	24.376	23.336	17.843	21.516
Quantitativo	Lançamento	abr/26	09/2022	07/2024	07/2022
	Unidades	550	420	408	96
	Estoque	550	29	106	10
	VSO	31	14	60	3
	Stockout	18	2	2	3
	Preço Nominal (R$)	234.590	279.370	270.018	255.000
	Preço CEF (R$)	185.212	205.825	216.015	204.000
	Renda Comprador (R$)	3.235	4400 - Encash	5.050	4.698
	Dif Tenda (R$)		-1.165	-1.815	-1.463
	Factibilidade		●	●	●
Qualitativo	Condomínios	1	1	1	1
	Torres	3	1	3	3
	Gabarito	T+17	T+15	T+17	T+8
	Plantas (m²)	34,3m²	40m²	36.92m²	57m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Não	Não	Não
	Varanda	Não	Não	Não	Não
	Suite	Não	Não	Não	Não
	Dif. Entrega	Não	Equipado e Decorado	Equipado e Decorado	Equipado e Decorado
	Vagas	5% de Vagas	Com vaga	Com vaga	88% Com vaga
	Lazer	Piscina ; Quadra Gramada	Espaço Gourmet, Pet Place, Piscina Adulto, Piscina Infantil, Playground, Salão de Festas com Copa.	Espaço Gourmet, Espaço Kids, Pet Place, Piscina Adulto, Piscina Infantil, Playground, Salão de Festas com Copa.	Bicicletário, Churrasqueria, Espaço Gourmet, Fitness Center, Pet Place, Piscina, Playground, Salão de Festas, Salão de Jogos.

Farol Renda
● Acima de 300
● Entre 0 e 300
● Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência mapeada possui target de preço e renda acima do previsto para o Torres de Pirajá e os projetos concorrentes já estão próximos do fim de estoque.
- Embora o Reserva do Mar tenha o preço mais elevado entre os empreendimentos mapeados, ele só consegue captar renda de R$ 4,4 mil devido à aplicação do Encash. Por outro lado, o Reserva da Mata não utilizou o Encash em suas vendas.

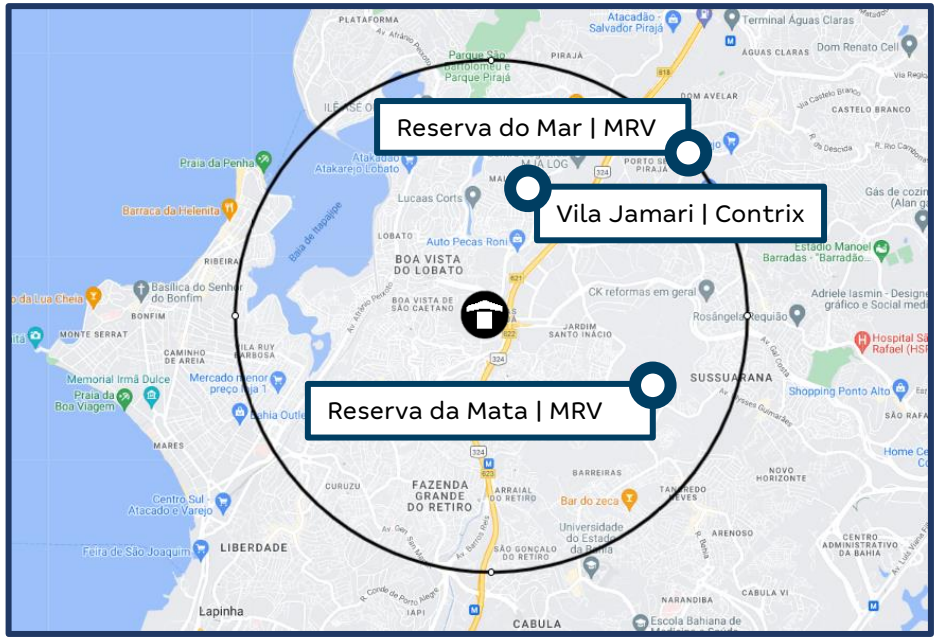

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Torres de Pirajá F1			
Tipo:	**Sem Vaga**		**Sem Vaga**	
Método	**Ref - Vivenda Real**		**Vision**	
Avaliação	235.000		235.000	
Renda Inicial (VF)	2.757		2.898	
Renda Final*	-		-	
% RET1	50%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,87	2.451	0,85	2.520
FGTS	0,98	2.748	0,96	2.843
Financiamento	101,74%	165.506	101,02%	169.959
Subsídio	87,13%	11.327	108,71%	10.820
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25
Pró-Soluto	105,39%	26.393	85,65%	22.546
Preço Raso (RS)	208.426	208.426	208.689	208.689
TCD	78,94%	21.938	75,31%	21.999
VSO	15	15	15	15
Preço de Venda	**226.057**	**226.057**	**226.376**	**226.376**
Elasticidade	1,905%	1,905%	1,905%	1,905%
Preço de Venda Final	**230.363**	**230.363**	**230.688**	**230.688**
Preço Raso (R$)	**208.426**		**208.689**	
% de Raso	**90,48%**		**90,46%**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Torres de Pirajá F1			
Tipo:	**Com varanda**		**Com varanda**	
Método	**Ref - Vivenda Real**		**Vision**	
Avaliação	242.000		242.000	
Renda Inicial (VF)	4.000		3.498	
Renda Final*	-		-	
% RET1	0%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,61	2.493	1,04	3.719
FGTS	0,57	2.310	1,01	3.583
Financiamento	91,51%	172.986	96,51%	177.850
Subsídio	175,99%	3.544	140,70%	3.870
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25
Pró-Soluto	99,15%	36.025	86,84%	27.591
Preço Raso (RS)	217.358	217.358	216.612	216.612
TCD	49,07%	19.783	55,17%	19.452
VSO	14	14	14	14
Preço de Venda	**232.708**	**232.708**	**231.651**	**231.651**
Elasticidade	1,905%	1,905%	1,905%	1,905%
Preço de Venda Final	**237.141**	**237.141**	**236.063**	**236.063**
Preço Raso (R$)	**217.358**		**216.612**	
% de Raso	**91,66%**		**91,76%**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Torres de Pirajá F1			
Tipo:	**Com vaga e varanda**		**Com vaga e varanda**	
Método	**Ref - Vivenda Real**		**Vision**	
Avaliação	259.000		259.000	
Renda Inicial (VF)	4.349		4.298	
Renda Final*	-		-	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,23	1.019	1,02	4.475
FGTS	1,45	6.445	1,07	4.680
Financiamento	94,81%	191.940	95,77%	193.859
Subsídio	99,67%	1.186	105,56%	1.678
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25
Pró-Soluto	95,38%	37.677	85,36%	33.323
Preço Raso (RS)	238.268	238.268	238.015	238.015
TCD	52,40%	22.970	51,85%	22.464
VSO	2	2	2	2
Preço de Venda	**256.354**	**256.354**	**255.611**	**255.611**
Elasticidade	1,905%	1,905%	1,905%	1,905%
Preço de Venda Final	**261.237**	**261.237**	**260.480**	**260.480**
Preço Raso (R$)	**238.268**		**238.015**	
% de Raso	**91,21%**		**91,38%**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Torres de Pirajá F1
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	239.327
Renda Inicial (VF)	3.235
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,95	3.151
FGTS	0,99	3.265
Financiamento	98,75%	174.676
Subsídio	122,74%	7.271
Prazo de Pró-soluto	25	25
Pró-Soluto	86,16%	25.333
Preço Raso (RS)	213.697	213.697
TCD	65,18%	20.893
VSO	31	31
Preço de Venda	**230.121**	**230.121**
Elasticidade	1,905%	1,905%
Preço de Venda Final	**234.590**	**234.590**
Preço Raso (R$)	**213.697**	
% de Raso	**91,09%**	
Raso Todas as Fases	**215.603**	
Nominal Todas as Fases	**236.921**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, considerando que o Vivenda Real o projeto mais recente da regional já performou rendas próximas ao estimado no parecer. Além disso, o empreendimento contará com o atributo piscina e varanda.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes da região vendem em um target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda e estão próximos do fim de estoque.

	Preço Real					Preço Normalizado (25m)		
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Δ Elastic.	Preço Raso
Viver Salvador	195.289	190.548	2.333	60	24	1.021	0,0000	191.569
Morada das Estações	228.978	200.899	2.579	34	25	1.036	0,0147	203.853
Vale dos Lirios	223.967	206.689	3.107	41	25	1.038	0,0407	215.091
Torres de Pirajá	234.590	213.697	3.235	31	25	-	-	213.697
Vivenda Real	237.662	210.882	3.278	49	26	1.147	0,0612	222.576
Encanto Piatã	264.880	221.840	4.044	33	24	1.052	0,0101	225.143
Jardim Armação Prime	294.674	261.142	7.504	51	24	1.525	0,0654	279.835

Resumo de Preços

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pós	PSOL (m)	RET1
Torres de Pirajá F2	Sem Vaga	2.898	0,85	0,96	101,0%	108,7%	89,1%	78,3%	8	221.951	235.000	6,0000%	235.268	212.385	20	25%
Torres de Pirajá F2	Com varanda	3.498	1,04	1,01	97,7%	140,7%	90,3%	57,4%	5	226.236	242.000	6,0000%	239.810	219.577	20	
Torres de Pirajá F2	Com vaga e varanda	4.298	1,02	1,07	96,6%	105,6%	88,8%	53,9%	3	249.071	259.000	6,0000%	264.015	240.648	20	

Percepção Comercial

Entorno

Distâncias POI Mobilidade

- Estação de Ônibus e Metro: Pirajá
- Próximo a BR 324
- Shopping Bela Vista
- Atacadão
- Atakarejo
- Açaí

Percepção Comercial

Parecer: O Parecer do ciclo e favorável, mesmo com a concorrência da MRV e da Contrix, todos em final de estoque, e mesmo assim estamos com preço mais acessível.

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Resumo

Torres de Pirajá – BA – Salvador Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	mar-25							
F1 - Unidade Tipo		abr-26	out-26	jun-28	6 meses	20 meses	abr-29	36 meses
F1 - C/ Varanda		abr-26	out-26	jun-28	6 meses	20 meses	abr-29	36 meses
F1 - C/ Varanda + Vaga		abr-26	out-26	jun-28	6 meses	20 meses	abr-29	36 meses
F2 - Unidade Tipo		out-27	abr-28	jul-29	6 meses	15 meses	out-30	36 meses
F2 - C/ Varanda		out-27	abr-28	jul-29	6 meses	15 meses	out-30	36 meses
F2 - C/ Varanda + Vaga		out-27	abr-28	jul-29	6 meses	15 meses	out-30	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	15,00 MM	Incorrido Terreno:	0,00 MM	Área do Terreno (100%):	16.148 m²
Cash:	15,00 MM			Custo de terreno m²:	928,9
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			VaR 25 (R$ mil):	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			VaR 26 (R$ mil):	2.500
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			Incorrido de Construção:	0,00 MM

Área Líquida do Terreno:	12.233 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	1.226,2
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	7,4% / 48,5%
CA Máx/Proj.	4,0 / 1,7
Incorridos de Incorporação:	0,23 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
F1 - Unidade Tipo	T+17	208.689	300	230.688	235.000	101,0%	85,7%	75,3%
F1 - C/ Varanda	T+17	216.612	244	236.063	242.000	96,5%	86,8%	55,2%
F1 - C/ Varanda + Vaga	T+17	238.015	28	260.480	259.000	95,8%	85,4%	51,9%
F2 - Unidade Tipo	T+17	212.385	150	235.268	235.000	101,0%	89,1%	78,3%
F2 - C/ Varanda	T+17	219.577	89	239.810	242.000	97,7%	90,3%	57,4%
F2 - C/ Varanda + Vaga	T+17	240.648	47	264.015	259.000	96,6%	88,8%	53,9%

Unidades Totais:	858	Preço Médio:	236.762	Renda Média:	3.253	ITBI+Emol. Unit.:	8.962
Unidades Tenda:	858	Avaliação Média:	239.815	Ato:	3.064 (0,94 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	14.001
VSO:	31 Unidades	VGV Total:	203.141.476	FGTS:	3.216 (0,99 Salários)	Preço Raso Médio:	215.425
RET Médio:	3,1%	VGV Tenda:	203.141.476	% em RET 1%:	29%		

Construção

Custo Total Unit.:	97.286	Eventuais:	4,00%	Área priv (m²):	35,21	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	25.233.261	LI:	20,38%	Exposição de Caixa (R$):	25.251.935	Margem Bruta Econômica:	42,80%
TIR:	76,93%	LI Aprovação:	20,00%	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(704.844)	Margem Bruta REF:	46,08%
Exposição de Caixa:	11,48%	Δ LI:	0,38%	Ger. Caixa 24 meses (R$):	(23.449.202)	Margem Rasa Econômica:	36,48%
Payback Contingente (21 m):	21 m/ (0 m)	LI Resiliência:	13,80%	Ger. Caixa Marginal (R$):	62.299.509	Margem Rasa REF:	40,74%
Payback Consolidado:	21 meses					Margem de Contribuição Econômica:	30,15%

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Torres de Pirajá		Primeira Fase		Demais Fases	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	220.042	100,0%	141.728	100,0%	78.314	100,0%
PIS/COFINS	(3.806)	1,7%	(2.255)	1,6%	(1.552)	2,0%
Custo Total	(123.685)	57,2%	(82.387)	59,1%	(41.297)	53,8%
Custo Terreno	(15.000)	6,9%	(10.000)	7,2%	(5.000)	6,5%
Custo Relacionados a Terreno	(871)	0,4%	(570)	0,4%	(301)	0,4%
Custos de Incorporação	(6.192)	2,9%	(3.932)	2,8%	(2.260)	2,9%
Custo de Construção	(101.623)	47,0%	(67.886)	48,7%	(33.737)	43,9%
Lucro Bruto Econômico	92.551	42,8%	57.085	40,9%	35.465	46,2%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	92.551	42,8%	57.085	40,9%	35.465	46,2%
Despesas de Selling	(22.302)	10,3%	(14.250)	10,2%	(8.052)	10,5%
Contingência	(5.061)	2,3%	(3.260)	2,3%	(1.801)	2,3%
Margem de Contribuição	65.188	30,1%	39.576	28,4%	25.612	33,4%
IR e CSLL	(3.114)	1,4%	(1.845)	1,3%	(1.269)	1,7%
Margem Líquida	62.074	28,7%	37.731	27,1%	24.343	31,7%

R$ Mil - VPL - Compra	Torres de Pirajá		Primeira Fase		Demais Fases	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	123.790	100,0%	86.037	100,0%	37.753	100,0%
PIS/COFINS	(2.087)	1,7%	(1.350)	1,6%	(737)	2,0%
Custos e Despesas Totais	(96.470)	77,9%	(67.599)	78,6%	(28.871)	76,5%
Custo Terreno	(10.948)	8,8%	(7.299)	8,5%	(3.649)	9,7%
Custo Relacionados a Terreno	(750)	0,6%	(492)	0,6%	(258)	0,7%
Custos de Incorporação	(4.744)	3,8%	(3.119)	3,6%	(1.625)	4,3%
Custo de Construção	(62.186)	50,2%	(44.365)	51,6%	(17.821)	47,2%
Despesas de Selling	(14.616)	11,8%	(10.178)	11,8%	(4.437)	11,8%
Contingência	(1.519)	1,2%	(1.042)	1,2%	(477)	1,3%
IR e CSLL	(1.708)	1,4%	(1.104)	1,3%	(603)	1,6%
Lucro Imobiliário	25.233	20,4%	17.088	19,9%	8.145	21,6%

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Anterior	Atual	Atual vs Anterior	Δ%
Data Estudo:	março-25	março-25	0 Meses	N/A
Lançamento:	abril-26	abril-26	0 Meses	N/A
Uhs:	858	858	-	0,0%
Preço Nominal:	236.762	236.762	-	0,0%
Preço Raso:	215.425	215.425	-	0,0%
Preço Nominal Inflacionado:	264.547	264.681	135	0,1%
Preço Raso Inflacionado:	240.724	240.845	121	0,1%
Renda Média:	3.253	3.253	-	0,0%
RET Médio:	0	3,1%	0,0 p.p.	
% em RET 1%:	0	29,0%	0,0 p.p.	
Ato:	0,9	0,9	-	0,0%
FGTS:	1,0	1,0	0,0	0,0%
VSO:	24	24	-	0,0%
VSO2:	24	24	-	0,0%
ITBI/Emol. (Unit):	8.962	8.962	-	0,0%
Avaliação:	239.815	239.815	-	0,0%
Cond. Financiamento:	99,0%	99,0%	0,0 p.p.	0,0%
Subsídio Utilizado:	120,8%	120,8%	0,0 p.p.	0,0%
Percentual Pró-Soluto:	87,2%	87,2%	0,0 p.p.	0,0%
Percentual utilização TCD:	66,3%	66,3%	0,0 p.p.	0,0%
Prazo construção F1:	20	20	-	0,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	25	25	-	0,0%
Custo Total Inf (uh):	145.285	144.155	(1.130)	-0,8%
Custo Construção:	97.286	97.286	-	0,0%
Custo Construção Corrigido:	97.286	97.286	-	0,0%
Fração de construção:	41%	41,1%	0,0 p.p.	0,0%
INCC Folha Rosto:	1.173,78	1.173,78	-	0,0%
Custo Terreno:	15.969.960	15.000.000	(969.960)	-6,1%
Custo Relacionados a Terreno (uh):	1.015	1.015	-	0,0%
Fração do Terreno[1]:	7,4% / 48,5%	7,4% / 48,5%	0,0 p.p.	0,0%
Custo de Incorp. por uh:	7.216	7.216	-	0,0%
ITBI/Emol. (Total):	7.689.602	7.689.602	-	0,0%
Custo do Ciclo:	14.001	14.001	-	0,0%
Lucro Imobiliário:	21,8%	20,4%	-1,4 p.p.	-6,3%
LI Resiliência:	13,8%	13,8%	0,0 p.p.	0,0%
Exposição de caixa:	8,7%	11,5%	2,7 p.p.	31,2%
TIR:	102,6%	76,9%	-25,7 p.p.	-25,1%
Margem Bruta REF:	45,6%	46,1%	0,5 p.p.	
Margem Bruta Econômica:	42,6%	42,8%	0,2 p.p.	0,6%
Margem Rasa REF:	40,2%	40,7%	0,5 p.p.	
Margem Rasa Econômica:	36,4%	36,5%	0,1 p.p.	0,2%
Margem Contribuição Econômica:	30,2%	30,1%	0,0 p.p.	-0,2%
Payback Contingente (Régua 21 m):	20 m/ (-1 m)	21 m/ (0 m)	1 Meses	5,0%
Payback Consolidado:	20 Meses	21 Meses	1 Meses	5,0%

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

One page – Torres de Pirajá (Cenário 1)

Cidade	Salvador	**Mancha de demanda**	BA - Salvador - Alta
Regional	BA	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Investimento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Mar

Unidades (% Vagas)	858 (11%)	**CA Máx | Proj**	4,0 | 1,7
Tipologia	F2E - Concreto	**Escritura**	mar-26
Fases	2 fases	**Lçto | Duração (m)**	abr/26 | 39

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	15.075 (7,4%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	22 (33,7%)
Cash (Correção)	10.000 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	1.232	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	83.471 (41,1%)	**Indireto Unit.**	18.372
Prazo da Obra (meses)	20	**Torre Unit.**	55.230
Custo Total Unit. (LPU):	97.286 (88)	**Infra Unit.**	14.148
Início de Obra	out-26	**Fundação Unit.**	7.130

Preço Nominal Unit.	236.762	**VSO**	24
Preço Raso Unit.	215.425	**Referência**	1.174
Avaliação Unit.	239.815	**Renda (% em RET 1%)**	3.253 (29,0%)



LI (Régua):	**21,8% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	42,6%
LI Resiliência:	13,8% (N/A)	**Margem Rasa Econômica:**	36,4%
Margem Bruta REF:	45,6%	**Margem Contribuição Econômica:**	30,2%
Margem Rasa REF:	**40,2%**	**Exposição (% VGV):**	19.311 (8,7%)
TIR:	102,6%	**VGV Total:**	203.141
Payback Contingente (21 m) :	**20 m/ (-1 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(705)
Payback Consolidado:	20	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	(17.567)

Destaques

[1] Localização

- Localizado na mancha de Salvador que tem como principal via a BR 324, este empreendimento encontra-se a 2 min da Estação de Metrô Pirajá, 10 min do Shopping Bela Vista, 7 min do Mercado Mercantil Rodrigues, 4 min da Upa de Pirajá, além de ter em suas proximidades escolas, farmácias e um centro comercial diverso que circunda esta região.
- Área de grande demanda populacional onde já lançamos 8 empreendimentos Tenda com sucesso em vendas em um raio de 3 km do empreendimento.
- Terreno com alta visibilidade comercial sendo disputado ao longo das negociações com a Stanza.

[2] Condição Comercial

- Valor do negócio fechado de 15 MM totais, sendo 10 MM em cash dividido em 36 parcelas de R$277.777 e 5MM em permuta física, distribuídas em 22 unidades (sem vagas e sem varanda vinculadas) a serem entregues na primeira fase do empreendimento.
- Não há previsão de reajuste das parcelas em Cash do contrato, também não há prazo contratual para escritura. Quanto as unidades, foram fixadas a entrega de 22 unidades independente do valor de venda das mesmas.
- Há uma divida de IPTU e foro perante a prefeitura sobre responsabilidade contratual de quitação pelo proprietário no valor de 5,5MM. Há a previsão em contrato que na celebração da escritura, caso o mesmo não a honre, poderá a Tenda pagar a divida e abater das unidades da Permuta Física. Segue os indicadores financeiros desse cenário pessimista abaixo:

LI (Régua):	**20,1% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	42,3%
LI Resiliência:	15,0% (N/A)	**Margem Rasa Econômica:**	35,9%
Margem Bruta REF:	45,5%	**Margem Contribuição Econômica:**	29,7%
Margem Rasa REF:	**40,1%**	**Exposição (% VGV):**	24.486 (11,2%)
TIR:	78,1%	**VGV Total:**	201.888
Payback Contingente (21 m) :	**20 m/ (-1 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(705)
Payback Consolidado:	20	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	(23.100)

- Envidaremos esforços em conjunto ao vendedor para cumprimento dessa obrigação contratual e com escritório especializado para redução dessa dívida e/ou parcelamento da mesma como já realizado em outros empreendimentos .

[3] Projeto

- Embora o CA máximo do terreno seja de 4, conseguimos chegar a 2,5 na área líquida devido a uma área de declividade acentuada de 3.914m² e a quantidade de taludes para vencer os desníveis do terreno.
- Em relação a atributos de produto, está prevista a venda das 11% de vagas vinculadas (93 vagas), e varanda em 48% das unidades (408 unidades), piscina adulto e infantil, quadra poliesportiva gramada, Salão de festas e três churrasqueiras (uma a cada 250 unidades).

Resumo Torres de Pirajá (Cenário 1)

Torres de Pirajá - BA - Salvador Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	mar-25							
F1 - Unidade Tipo		abr-26	out-26	jun-28	6 meses	20 meses	abr-29	36 meses
F1 - C/ Varanda		abr-26	out-26	jun-28	6 meses	20 meses	abr-29	36 meses
F1 - C/ Varanda + Vaga		abr-26	out-26	jun-28	6 meses	20 meses	abr-29	36 meses
F2 - Unidade Tipo		out-27	abr-28	jul-29	6 meses	15 meses	out-30	36 meses
F2 - C/ Varanda		out-27	abr-28	jul-29	6 meses	15 meses	out-30	36 meses
F2 - C/ Varanda + Vaga		out-27	abr-28	jul-29	6 meses	15 meses	out-30	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	15,08 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	16.148 m²
Cash:	10,00 MM			**Custo de terreno m²:**	933,6
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	5,08 MM (2,50%) - Unidades Permuta 22,00			**VaR 26 (R$ mil):**	926
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,00 MM

Área Líquida do Terreno:	12.233 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	1.232,4
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	7,4% / 48,5%
CA Máx/Proj.	4,0 / 1,7
Incorridos de Incorporação:	0,23 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
F1 - Unidade Tipo	T+17	208.689	300	230.688	235.000	101,0%	85,7%	75,3%
F1 - C/ Varanda	T+17	216.612	244	236.063	242.000	96,5%	86,8%	55,2%
F1 - C/ Varanda + Vaga	T+17	238.015	28	260.480	259.000	95,8%	85,4%	51,9%
F2 - Unidade Tipo	T+17	212.385	150	235.268	235.000	101,0%	89,1%	78,3%
F2 - C/ Varanda	T+17	219.577	89	239.810	242.000	97,7%	90,3%	57,4%
F2 - C/ Varanda + Vaga	T+17	240.648	47	264.015	259.000	96,6%	88,8%	53,9%

Unidades Totais:	858	**Preço Médio:**	236.762	**Renda Média:**	3.253	**ITBI+Emol. Unit.:**	8.962
Unidades Tenda:	836	**Avaliação Média:**	239.815	**Ato:**	3.064 (0,94 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.001
VSO:	31 Unidades	**VGV Total:**	203.141.476	**FGTS:**	3.216 (0,99 Salários)	**Preço Raso Médio:**	215.425
RET Médio:	3,1%	**VGV Tenda:**	197.932.720	**% em RET 1%:**	29%		

Construção

Custo Total Unit.:	97.286	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	35,21	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**27.084.527**	**LI:**	**21,76%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**19.310.767**	**Margem Bruta Econômica:**	**42,56%**
TIR:	**102,64%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(704.844)**	**Margem Bruta REF:**	**45,62%**
Exposição de Caixa:	**8,75%**	**Δ LI:**	**1,76%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(17.566.507)**	**Margem Rasa Econômica:**	**36,42%**
Payback Contingente (21 m):	**20 m/ (-1 m)**	**LI Resiliência:**	**13,80%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**62.702.164**	**Margem Rasa REF:**	**40,24%**
Payback Consolidado:	**20 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,20%**

DRE Torres de Pirajá (Cenário 1)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Torres de Pirajá		Primeira Fase		Demais Fases	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	220.042	100,0%	141.728	100,0%	78.314	100,0%
PIS/COFINS	(3.806)	1,7%	(2.255)	1,6%	(1.552)	2,0%
Custo Total	(123.685)	57,2%	(82.387)	59,1%	(41.297)	53,8%
Custo Terreno	(15.000)	6,9%	(10.000)	7,2%	(5.000)	6,5%
Custo Relacionados a Terreno	(871)	0,4%	(570)	0,4%	(301)	0,4%
Custos de Incorporação	(6.192)	2,9%	(3.932)	2,8%	(2.260)	2,9%
Custo de Construção	(101.623)	47,0%	(67.886)	48,7%	(33.737)	43,9%
Lucro Bruto Econômico	92.551	42,8%	57.085	40,9%	35.465	46,2%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	92.551	42,8%	57.085	40,9%	35.465	46,2%
Despesas de Selling	(22.302)	10,3%	(14.250)	10,2%	(8.052)	10,5%
Contingência	(5.061)	2,3%	(3.260)	2,3%	(1.801)	2,3%
Margem de Contribuição	65.188	30,1%	39.576	28,4%	25.612	33,4%
IR e CSLL	(3.114)	1,4%	(1.845)	1,3%	(1.269)	1,7%
Margem Líquida	62.074	28,7%	37.731	27,1%	24.343	31,7%

R$ Mil - VPL - Compra	Torres de Pirajá		Primeira Fase		Demais Fases	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	123.790	100,0%	86.037	100,0%	37.753	100,0%
PIS/COFINS	(2.087)	1,7%	(1.350)	1,6%	(737)	2,0%
Custos e Despesas Totais	(96.470)	77,9%	(67.599)	78,6%	(28.871)	76,5%
Custo Terreno	(10.948)	8,8%	(7.299)	8,5%	(3.649)	9,7%
Custo Relacionados a Terreno	(750)	0,6%	(492)	0,6%	(258)	0,7%
Custos de Incorporação	(4.744)	3,8%	(3.119)	3,6%	(1.625)	4,3%
Custo de Construção	(62.186)	50,2%	(44.365)	51,6%	(17.821)	47,2%
Despesas de Selling	(14.616)	11,8%	(10.178)	11,8%	(4.437)	11,8%
Contingência	(1.519)	1,2%	(1.042)	1,2%	(477)	1,3%
IR e CSLL	(1.708)	1,4%	(1.104)	1,3%	(603)	1,6%
Lucro Imobiliário	25.233	20,4%	17.088	19,9%	8.145	21,6%

Obrigado
