Tenda

sua próxima conquista

Book de Lançamento

Regional: BA

Projeto: Encanto Piatã - F2

Data Comitê: 19/05/2025

# Comitê Digital – 12/05/25

| Nome | Encanto Piatã F2 - Lançamento | Observação - Encanto Piatã |
|---|---|---|
| Renan Barbosa Sanches | Aprovado | Ok |
| Fabricio Quesiti Arrivabene | Aprovado | Ok |
| Alejandro Octavio Abiusi | Aprovado | Ok |
| Alexandre Regis de Oliveira | Aprovado | ok |
| Rodrigo Osmo | Discutir em Comitê | (1) Por que a MRV está com preço tão pior do que o nosso no Portal de Piatã? |
| Amanda da Silva Bezerra | Aprovado | ok |
| Andre Luis Menegazzo Padilha | Aprovado | ok |
| Luiz Mauricio de Garcia Paula | Aprovado | dada a renda esperada, uma piscina (mesmo que reduzindo tamanho da quadra) não tem potencial para gerar mais valor no projeto? Entendo que varanda e maior verticalização (para otimizar CA) ainda não estava disponíveis quando da aprovação do mesmo, certo? |

**1. Por que a MRV está com preço tão pior que o nosso no Portal de Piatã? (Rodrigo Osmo)**
Na verdade, o valor do Portal de Piatã, da MRV, está 5k acima do nosso produto, conforme demonstrado no slide 23. O empreendimento da MRV que apresenta preço inferior é o Cidade Sete Sóis, o que se justifica por ser um projeto T+4 e estar localizado em uma região menos valorizada.

**2. Dada a renda esperada, uma piscina não tem potencial para gerar mais valor no projeto? (Luiz Maurício)**
Este projeto corresponde à Fase 2, sendo que a Fase 1 foi lançada em junho de 2024, quando ainda não contávamos com a validação para a implantação da piscina. Devido à complexidade envolvida na retificação da incorporação e reaprovação do projeto, a inclusão da piscina nesta etapa se torna inviável.

**3. Entendo que a varanda e verticalização ainda não estavam disponíveis quando da aprovação do projeto, certo? (Luiz Maurício)**
Exatamente. No momento da aprovação do projeto, ainda não contávamos com a validação da varanda, e a altura máxima permitida para verticalização era de T+15.

# One Page – Encanto Piatã F2 - Aprovação

[1]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cidade** | Salvador | **Mancha de demanda** | BA - Salvador - Alta |
| **Regional** | BA | **Cluster MPR** | 4 - Azul |
| **Cenário de Aprovação** | Aprovação | **Tipo de Aprovação** | Consolidado |
| **Fase Anterior** | Encanto Piatã F1 | **Aprovação Fase Anterior** | Consolidado |
| **Tipo de Comitê** | Lançamento | **Versão da VF** | Versão 1.0: Mai |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unidades (% Vagas)** | 1043 (15%) | **CA Máx \| Proj** | 3,0 \| 2,4 |
| **Tipologia** | F2E - Concreto | **Escritura** | mai-24 |
| **Fases** | 2 fases | **Lçto \| Duração (m)** | mai/25 \| 41 |

[2]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Líquido do Terreno (% VGV)** | 17.744 (6,7%) | **Un. Perm. Fís (% Ter)** | 0 (0,0%) |
| **Cash (Correção)** | 17.744 (INCC) | **%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)** | 0,0% (0,0%) |
| **Valor R$/m²** | 1.139 | **VAR (%VGV)** | 2637 (1,0%) |

[3]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Custo Construção (%VGV)** | 91.594 (34,7%) | **Indireto Unit.** | 12.919 |
| **Prazo da Obra (meses)** | 21 | **Torre Unit.** | 57.323 |
| **Custo Total Unit. (LPU):** | 87.818 (90) | **Infra Unit.** | 9.626 |
| **Início de Obra** | nov-25 | **Fundação Unit.** | 7.236 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Preço Nominal Unit.** | 253.150 | **VSO** | 29 |
| **Preço Raso Unit.** | 229.232 | **Referência** | Encanto Piatã F1 |
| **Avaliação Unit.** | 263.317 | **Renda (% em RET 1%)** | 4.693 (0,0%) |

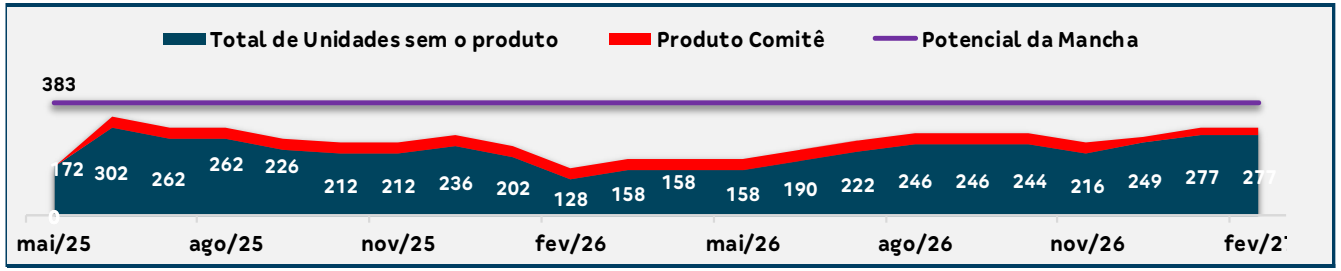


| | | | |
|---|---|---|---|
| **LI (Régua):** | **30,4% (20,0%)** | **Margem Bruta Econômica:** | 51,5% |
| **LI Marginal:** | 34,1% | **Margem Rasa Econômica:** | 45,9% |
| **Margem Bruta REF:** | 54,5% | **Margem Contribuição Econômica:** | 39,2% |
| **Margem Rasa REF:** | **49,7%** | **Exposição (% VGV):** | 18.808 (7,0%) |
| **TIR:** | 118,0% | **VGV Total:** | 264.036 |
| **Payback Contingente (21 m) :** | **18 m/ (-3 m)** | **Ger. Caixa 12 meses (R$):** | (12.785) |
| **Payback Consolidado:** | 18 | **Ger. Caixa 24 meses (R$):** | 32.899 |

## [1] Destaques

- Lançamos o Encanto Piatã F1 em jun/24 e ele tem apresentado uma performance de vendas acima do esperado. Estamos antecipando o Lançamento da Fase 2 em relação ao BP (jul/25), devido ao esgotamento do estoque da Fase 1.

## [2] Custo de Construção

- O custo está menor que o orçado em BP (-R$ 2.791/uh).

## [3] Precificação

- O preço está compatível com o que está sendo praticado na Fase 1, considerando apenas a normalização dos parâmetros conforme prazo de obras e VSO.

Segue comparativo em relação ao aprovado no Comitê da Fase 01.

| Lçto Jun/2024 | Consolidado | Encanto Piatã F2 |
|---|---|---|
| LI da Fase | 27,1% | 29,65% |
| folga consolidada | 7,1% | 7,1% |
| LI (tirando a folga) | | 22,5% |
| Régua | 20,0% | 20,0% |
| Distância régua anterior: | | 2,53% |
| **Lançamento Atual:** | | |
| LI atual: | | 30,39% |
| Régua atual: | | 20,00% |
| Distância régua atual: | | 10,39% |
| | | |
| Distância Entre Réguas | | 7,86% |

# One Page – Encanto Piatã F2 - Real

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cidade** | Salvador | **Mancha de demanda** | BA - Salvador - Alta |
| **Regional** | BA | **Cluster MPR** | 4 - Azul |
| **Cenário de Aprovação** | Real | **Tipo de Aprovação** | Consolidado |
| **Fase Anterior** | Encanto Piatã F1 | **Aprovação Fase Anterior** | Consolidado |
| **Tipo de Comitê** | Lançamento | **Versão da VF** | Versão 1.0: Mai |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unidades (% Vagas)** | 1043 (15%) | **CA Máx \| Proj** | 3,0 \| 2,4 |
| **Tipologia** | F2E - Concreto | **Escritura** | mai-24 |
| **Fases** | 2 fases | **Lçto \| Duração (m)** | mai/25 \| 41 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Líquido do Terreno (% VGV)** | 17.744 (6,6%) | **Un. Perm. Fís (% Ter)** | 0 (0,0%) |
| **Cash (Correção)** | 17.744 (INCC) | **%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)** | 0,0% (0,0%) |
| **Valor R$/m²** | 1.139 | **VAR (%VGV)** | 2637 (1,0%) |

[1]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Custo Construção (%VGV)** | 91.594 (34,3%) | **Indireto Unit.** | 12.919 |
| **Prazo da Obra (meses)** | 21 | **Torre Unit.** | 57.323 |
| **Custo Total Unit. (LPU):** | 87.818 (90) | **Infra Unit.** | 9.626 |
| **Início de Obra** | mar-26 | **Fundação Unit.** | 7.236 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Preço Nominal Unit.** | 255.972 | **VSO** | 29 |
| **Preço Raso Unit.** | 231.996 | **Referência** | Encanto Piatã F1 |
| **Avaliação Unit.** | 263.317 | **Renda (% em RET 1%)** | 4.194 (0,0%) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro | | **Preço Raso Inf. Médio Unit.** | 237.584 |
| **Preço Inf. Médio Unit.** | 261.764 | **Margem Bruta REF (%)** | 54,6% |
| **Custo Inf. Médio Unit.** | 118.783 | **Margem Rasa REF (%)** | 50,0% |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **LI (Régua):** | **30,5% (20,0%)** | **Margem Bruta Econômica:** | 51,7% |
| **LI Marginal:** | 34,3% | **Margem Rasa Econômica:** | 46,0% |
| **Margem Bruta REF:** | 54,6% | **Margem Contribuição Econômica:** | 39,3% |
| **Margem Rasa REF:** | **49,9%** | **Exposição (% VGV):** | 16.646 (6,1%) |
| **TIR:** | 112,4% | **VGV Total:** | 266.979 |
| **Payback Contingente (21 m) :** | **20 m/ (-1 m)** | **Ger. Caixa 12 meses (R$):** | (9.473) |
| **Payback Consolidado:** | 20 | **Ger. Caixa 24 meses (R$):** | 20.729 |

**[1]** Cenário considerando data de IO conforme PCP 164.

Segue comparativo em relação ao aprovado no Comitê da Fase 01.

| **Laçto Jun/2024** | **Consolidado** | **Encanto Piatã F2** |
|---|---|---|
| LI da Fase | 26,9% | 29,70% |
| folga consolidada | 6,9% | 6,9% |
| LI (tirando a folga) | | 22,8% |
| Régua | 20,0% | 20,0% |
| Distância régua anterior: | | 2,80% |
| **Lançamento Atual:** | | |
| LI atual: | | 30,51% |
| Régua atual: | | 20,00% |
| Distância régua atual: | | 10,51% |
| Distância Entre Réguas | | 7,71% |

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

# Farol Pareceres – Encanto Piatã F2

| Área | Riscos Associados | Parecer | Criticidade |
|---|---|---|---|
| Jurídico Imobiliário | **Lavratura da escritura de venda e compra**: 23/05/2024;<br>**Registro da escritura de venda e compra**: 12/06/2024;<br>**Registro de Incorporação**: 21/06/2024;<br>**Averbação do patrimônio de afetação**: 21/06/2024.<br><br>Resta pendente a instituição de **servidão de passagem de rede de esgoto e servidão administrativa de uma galeria de drenagem**. Constamos no Memorial de Incorporação, na Convenção de Condomínio e nos Contratos PF e PJ a previsão de instituição de futuras servidões. | Ok | |
| Legalização | **Licenças emitidas:**<br>Alvará de Construção - Emitida em 14/06/2024 - Válida até 14/06/2028;<br>Autorização de Supressão Vegetal - Emitida em 27/10/2023 - Válida até 27/10/2025;<br>**Licenças a serem emitidas para inicio de obras:**<br>- Obra em Logradouro Público de Esgoto - Protocolado 30/07/2024 - Previsão de emissão em 15/05/2025;<br>- Licença para Demolição do Pórtico - Protocolado 20/01/2025 - Previsão de emissão em 30/05/2025;<br>- Autorização de Supressão Vegetal do Talude - Protocolado 03/02/2025 - Previsão de emissão em 30/06/2025;<br>- Obra em Logradouro Público de Água - Protocolado 25/03/2025 - Previsão de emissão em 30/08/2025.<br>Licença Ambiental - Emitida em 25/03/2024 - Válida até 25/03/2029;<br>Inexigibilidade da COMAER - Emitida em 28/04/2022;<br>Autorização do IPHAN - Emitida em 19/03/2024;<br>Licença para Terraplanagem - Emitida em 05/08/2024 - Válida até 05/08/2026;<br>Obra em Logradouro Público de Drenagem - Emitida em 18/11/2024 - Válida até 18/05/2025; | Ok com ressalvas | |
| Produto | Sem riscos | Ok | |
| GETEC | Sem riscos | Ok | |
| Logística | Necessário prever custos com tela fachadeira + SLQA no Bloco 07 e isolamento com tapume na Fase 02 até a fase de acabamento do Bloco 07 da Fase 03, devido linha de fases estar com menos de 3,10m (premissa SSO). | Ok | |
| Contratação | Laudo de engenharia sem pendência em 23/12/2024, risco 20/12/2024 e conclusão da análise jurídica em 23/12/2024 | Ok | |
| Inteligência de mercado | IM avalia o preço referência como factível | Ok | |
| Comercial/Ciclo | Parecer favorável | Ok | |
| Estudos Econômicos | Sem riscos | Ok | |

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

# Mancha de Demanda

| MANCHAS DE DEMANDA |
|---|
| SSA – Salvador |

Lançamento

1. Farol de Itapuã | Ponta Humaitá | Lagoa Abaeté
2. Jardim Armação Prime
3. Vivenda Real (Morada Real)
4. Morada das Estações
5. Encanto Piatã
6. Vale dos Lírios

LandBank

7. Vale das Orquídeas
8. Jaguaribe Prime
9. Solar de Itapagipe
10. Vila Laura Prime
11. Mirante Verona (Veneza)
12. Vista Serena
13. Vale das Tulipas
14. Portal de Salvador
15. Solar Patamares
16. Paralela Sun Prime
17. Privilege Salvador Norte

| Cluster MPR – (Comitê) |
|---|
| Cluster 4 - Azul |
| **Região** |
| Capital |

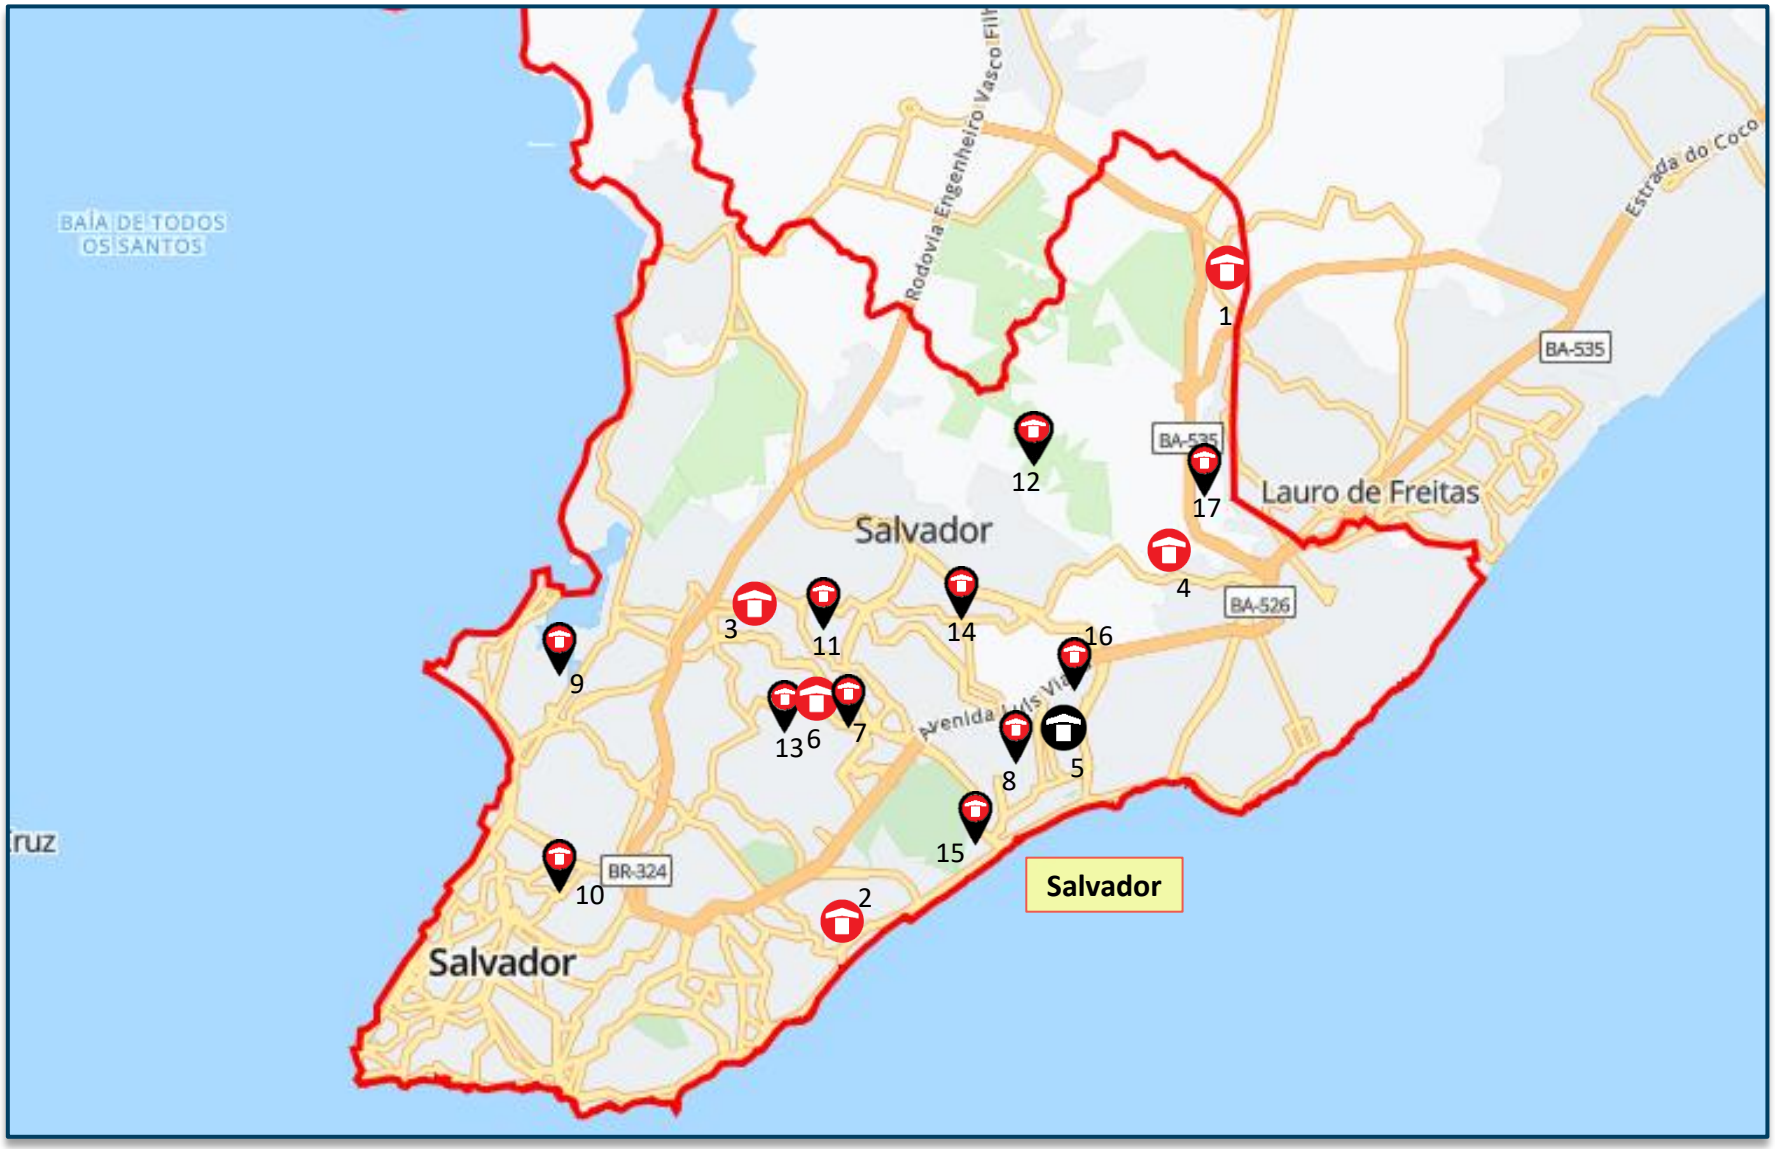


Lançados LandBank Comitê

# PRODUTO

## Empreendimento Encanto Piatã
## Descritivo - Escritura | Lançamento

| Informações Gerais | | |
|---|---|---|
| Terreno | Área terreno | 24.061,27m² |
| | Menor poligonal | 24.002,19m² |
| | App/fna | Não \| Não |
| | Reserva de calçada/ melhoramento víario | Sim: 59.08m² \| Não |
| | Área liquida | 24.002,19m² |
| | Zoneamento | ZPR-3 |
| | Ca básico | 1,50 |
| | Ca máximo | 3,00 |
| | Ca projetado | 2,36 |
| | Gabarito máximo | N/A |
| Geral | Total uh | 1611 |
| | Total de vagas | 425, sendo 17 PCD e 98 motos (26,38%) |

| Informações Gerais | | |
|---|---|---|
| Tipologia | Tipologia | Modular com elevador |
| | Gabarito | T+15 |
| | Lâmina | 05 14pp, 01 12pp e 02 10pp |
| | Área privativa | 38,54m², 38,70 e 38,73m² |
| Condomínio | Unidade pcd | 81 |
| | Unidade lazer\|técnica | 21 \| 08 |
| | Torre | 08 |
| | Fase | 3 |
| Lazer | Lazer Interno | 01-Salão de festas, 02-Brinquedoteca, 03-Espaço Delivery, 04-Espaço Oficina, 05-Espaço Teen, 06-Espaço Office, 07 Espaço saúde, 08-Fitness e 09-Sport Bar |
| | Lazer Externo | 10-Salão de festas externo, 11- Quadra Coberta P, 12-Quadra Coberta M, 13- Play Kids, 14-Play Baby, 15-Play Pet, 16-Fitness externo, 17- Praça de Jogos, 18-Espaço Cultivo, 19- Praça dos sabores e 20-Espaço relax |

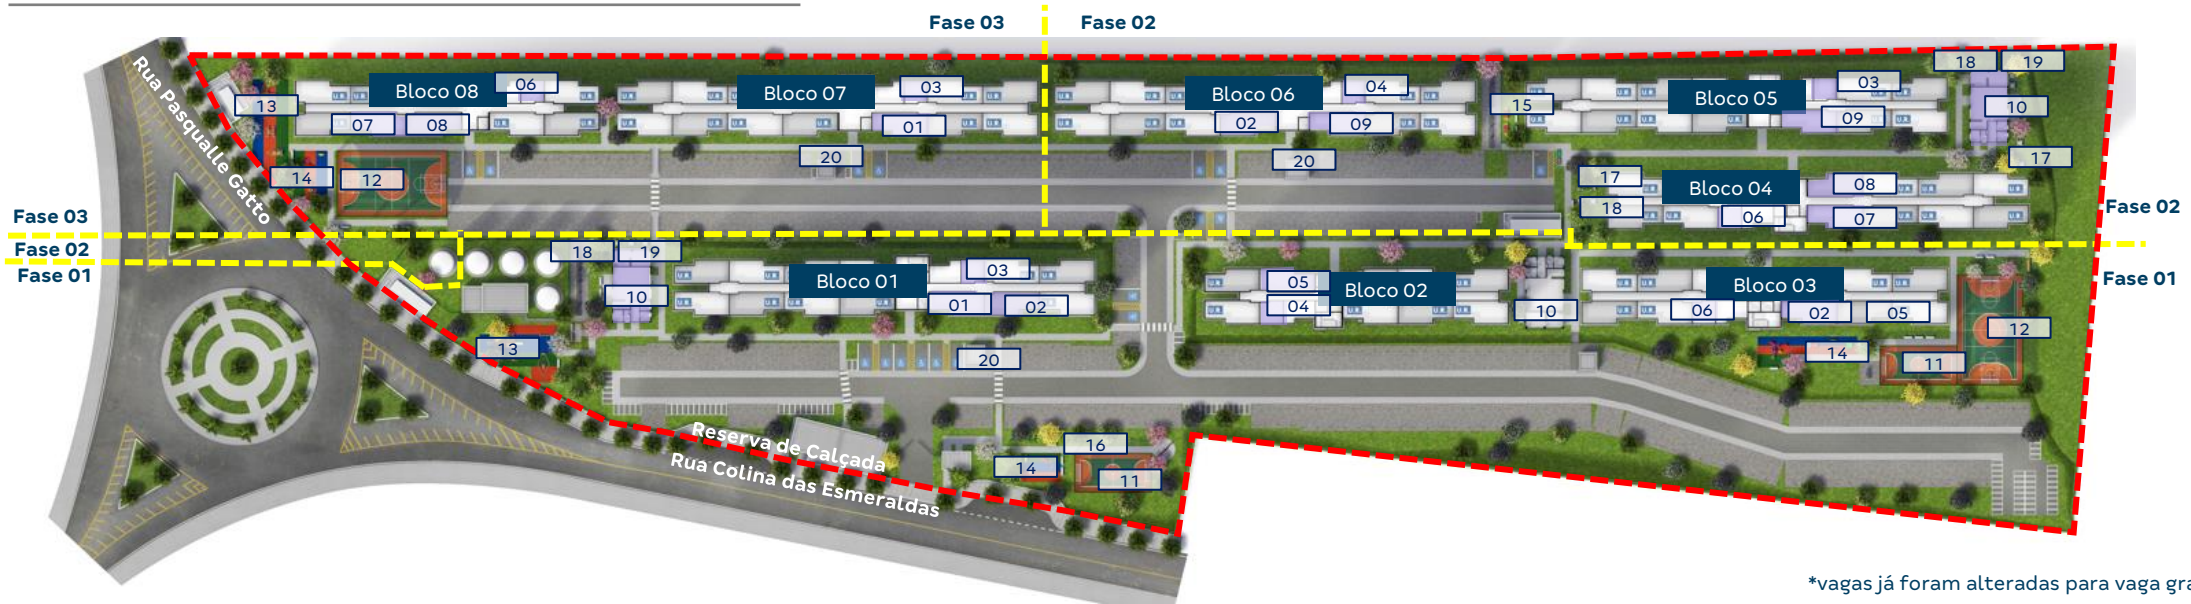


*vagas já foram alteradas para vaga gramada com plaqueado

# PRODUTO

## Empreendimento Encanto Piatã
## Atributos de produto - Escritura | Lançamento

| | Descrição | Criticidade | Parecer |
|---|---|---|---|
| Usabilidade | **Acesso Empreendimento** | | |
| | **Percurso do pedestre até torre** | | |
| Diferencial produto | **Prime** | Não | |
| | **Supercondomínio** | Sim | 1611uhs ( Fase 01: 568uh, fase 02: 664uh, fase03: 379uh) |
| | **Atributos Infra** | Sim | Vaga de carro compartilhado – Sugestão de uso, 24 unidades de lazer externo: 03 Salões de festas externo, 02 Quadras Coberta P, 02 Quadras Coberta M, 02 Plays Kids, 02 Plays Baby, 01 Play Pet, 01 Fitness externo, 02 Praças de Jogos, 03 Espaços Cultivo, 02 Praça dos sabores e 04 Espaços relax |
| | **Atributos Torre** | Sim | 21 unidades de lazer interno (sugestões de uso): 02 Salões de festas, 03 Brinquedotecas, 03 Espaços Deliverys, 02 Espaços Oficina, 02 Espaço Teen, 03 Espaços Offices, 02 Espaços saúde, 02 Fitness e 02 Sport Bar |
| | **Edifício Garagem** | Não | |

| | Riscos associados | Parecer | Criticidade |
|---|---|---|---|
| **Produto** | Não há riscos associados | ok | |

Perspectiva

Quadra Coberta

Vaga de carro compartilhado – Sugestão de uso

# Empreendimento Encanto Piatã
## Modulação - Escritura | Lançamento

| Fase 2: 664uh (sendo 34U.R) - 61 vagas (Sendo 5 PCD e 4 de moto) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| módulo | Blocos | UH | Vagas | Parecer |
| Módulo 04 | 01 Bloco (T+15) | 221Uh (Sendo 11U.R) | - | Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 04 a Praça de jogos e espaço cultivo |
| Módulo 05 | 01 Bloco (T+15) | 222Uh (Sendo 12U.R) | 27 vagas (Sendo 03 PCD e 03 Moto) | Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 05 o salão de festas externo, praça dos sabores, espaço cultivo e play pet |
| Módulo 06 | 01 Bloco (T+15) | 221Uh (Sendo 11U.R) | 34 vagas (Sendo 02 PCD e 01 Moto) | Dos Lazeres, esta contemplado no módulo 06 o espaço relax |

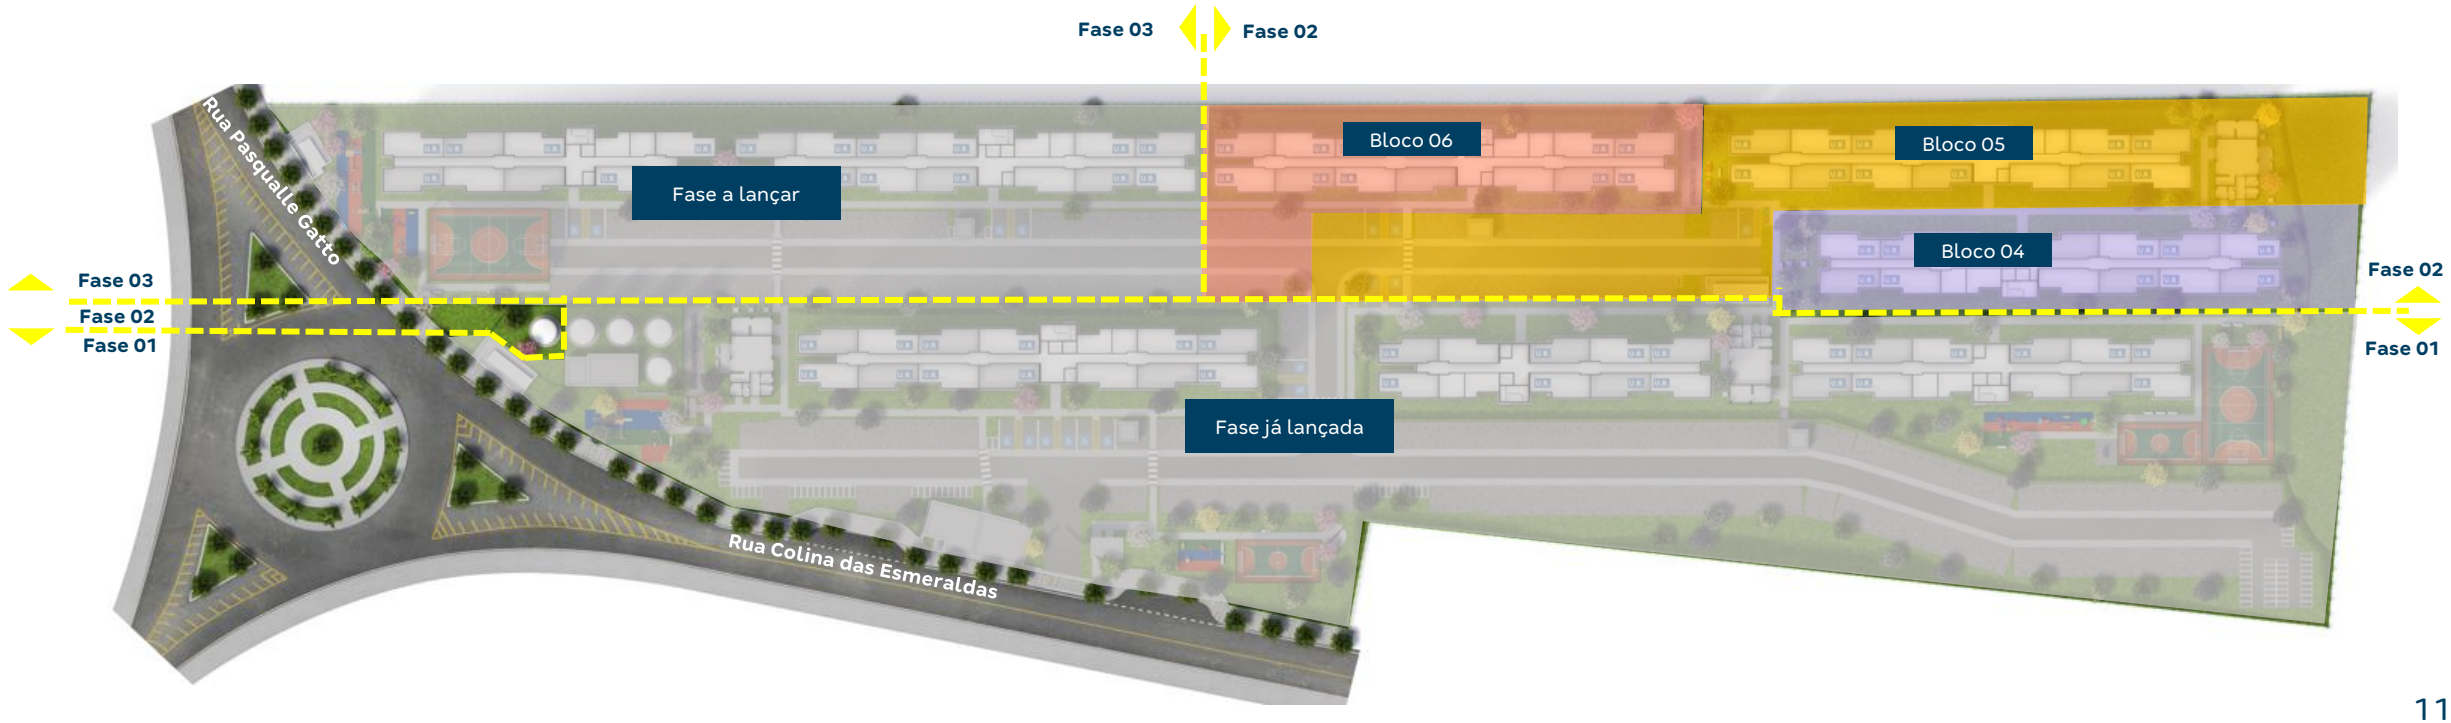

# Empreendimento Encanto Piatã
## Modulação - Escritura | Lançamento

| Fase 3: 379uh (sendo 19U.R) - 91 vagas (Sendo 4 PCD e 2 de moto) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| módulo | Blocos | UH | Vagas | Parecer |
| Módulo 07 | 01 Bloco (T+15) | 222Uh (Sendo 12U.R) | 66 vagas (Sendo 02 PCD e 02 Moto) | Dos Lazeres, esta contemplado no módulo 07 o Espaço Relax |
| Módulo 08 | 01 Bloco (T+15) | 157Uh (Sendo 7U.R) | 25 vagas (Sendo 02 PCD) | Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 08 o Play baby, play kids, fitness externo e quadra coberta |

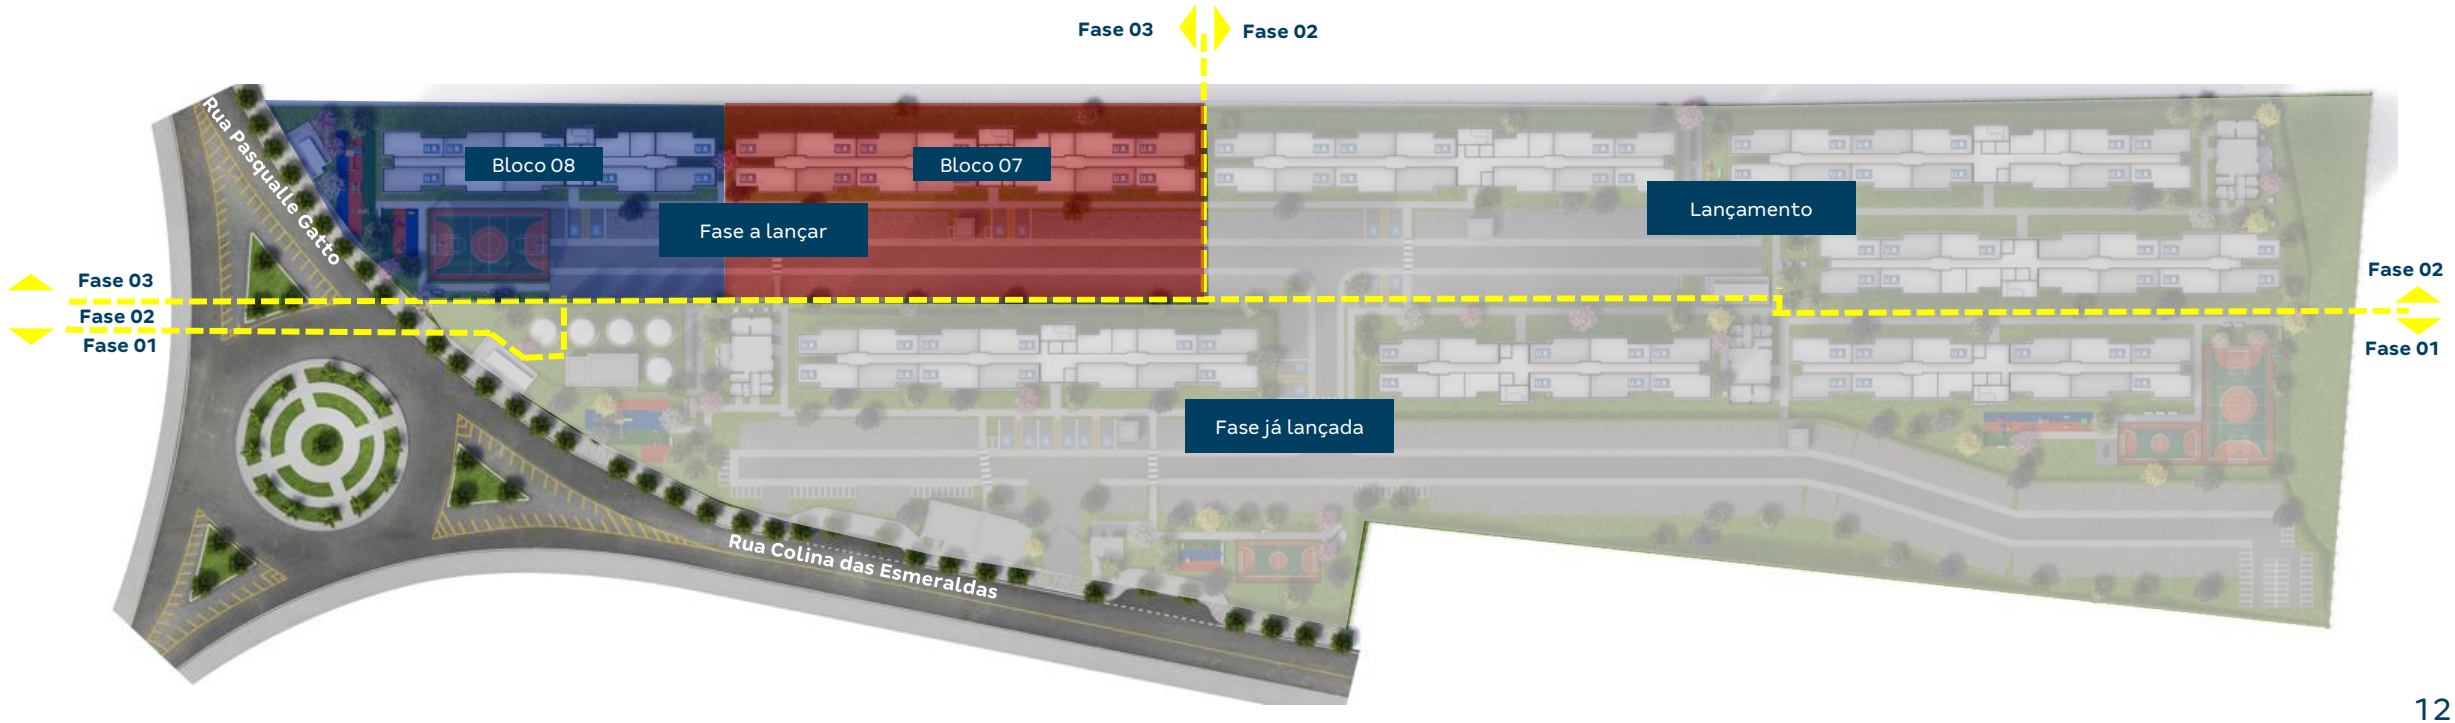

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

# Custo de Construção

| | R06 ENCANTO PIATÃ FASE 2 | R06 ENCANTO PIATÃ FASE 3 | BP25 ENCANTO PIATÃ FASE 2 | BP25 ENCANTO PIATÃ FASE 3 | LVS ENCANTO PIATÃ F1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torres | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Unidades Construídas | 672 | 384 | 672 | 384 | 576 |
| Unidades Vendidas | 664 | 379 | 664 | 379 | 568 |
| Condomínios (qta.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cidade | Salvador - BA | Salvador - BA | Salvador - BA | Salvador - BA | Salvador - BA |
| Produto / Selo | F2E MODULAR | F2E MODULAR | F2E MODULAR | F2E MODULAR | F2E MODULAR |
| Tipologia | 3 Torres \| T+15 \| 14PP \| C2A | 1 Torre \| T+15 \| 14PP \| C2A | 3 Torres \| T+15 \| 14PP \| C2A | 1 Torre \| T+15 \| 14PP \| C2A | 1 Torre \| T+15 \| 14PP \| C2A |
| Tipologia | - | 1 Torre \| T+15 \| 12PP \| C2A | - | 1 Torre \| T+15 \| 10PP \| C1A | 1 Torre \| T+15 \| 12PP \| C2A |
| Tipologia | - | - | - | - | 1 Torre \| T+15 \| 10PP \| C1A |
| Projeto Infra | LO | LO | EP | EP | |
| Projeto Torre | LO | LO | LO | LO | |
| Mês Base | maio-25 | maio-25 | outubro-24 | outubro-24 | março-25 |
| Incc | 1.178,386 | 1.178,386 | 1.149,170 | 1.149,170 | |
| LVS | março-25 | março-25 | agosto-24 | agosto-24 | |
| Indiretos | março-25 | março-25 | agosto-24 | agosto-24 | |
| Base de Preço | LPU 90 | LPU 90 | LPU 83 | LPU 83 | |
| Takt | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Prazo (mês) | 21 | 17 | 20 | 16 | 21 |
| CUSTO TOTAL I | R$ / UND R$ 85.641 | R$ / UND R$ 89.995 | R$ / UND R$ 86.210 | R$ / UND R$ 92.652 | R$ / UND R$ 101.149 |
| Indireto | R$ 12.276 | R$ 14.046 | R$ 12.634 | R$ 16.265 | R$ 18.412 |
| Torre | R$ 57.149 | R$ 57.627 | R$ 57.461 | R$ 57.438 | R$ 56.001 |
| Infra | R$ 9.115 | R$ 10.522 | R$ 9.064 | R$ 10.458 | R$ 17.118 |
| Fundação | R$ 6.969 | R$ 7.705 | R$ 6.958 | R$ 8.415 | R$ 8.103 |
| EEE | | | | | |
| ETE | | | | | |
| Contenção | | | | | R$ 16 |
| Terraplenagem | R$ 131 | R$ 95 | R$ 94 | R$ 77 | R$ 1.499 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 595 | R$ 595 | R$ 610 | R$ 610 | R$ 596 |
| Urbanização | R$ 60 | R$ 60 | | | R$ 60 |
| Drenagem | | | R$ 130 | R$ 130 | |
| Extensão de Rede Elétrica | | | R$ 55 | R$ 55 | |
| Extensão de Rede Hidráulica | R$ 535 | R$ 535 | R$ 424 | R$ 424 | R$ 535 |
| CUSTO TOTAL III | | | | | |
| Incorridos | | | | | |
| CUSTO TOTAL IV | | | R$ 2.207 | R$ 2.371 | |
| Atualização por INCC | | | R$ 2.207 | R$ 2.371 | |
| CUSTO TOTAL I+II | R$ 86.236 | R$ 90.590 | R$ 86.820 | R$ 93.262 | R$ 101.745 |
| CUSTO TOTAL I AO IV | R$ 86.236 | R$ 90.590 | R$ 89.028 | R$ 95.633 | R$ 101.745 |

# Custo de Construção

| | R06 ENCANTO PIATÃ FASE 2 | BP25 ENCANTO PIATÃ FASE 2 | |
|---|---|---|---|
| Torres | 3 | 3 | |
| Unidades Construídas | 672 | 672 | |
| Unidades Vendidas | 664 | 664 | |
| Condomínios (qta.) | 1 | 1 | |
| Cidade | Salvador - BA | Salvador - BA | |
| Produto / Selo | F2E MODULAR | F2E MODULAR | |
| Tipologia | 3 Torres \| T+15 \| 14PP \| C2A | 3 Torres \| T+15 \| 14PP \| C2A | |
| Projeto Infra | LO | EP | |
| Projeto Torre | LO | LO | |
| Mês Base | maio-25 | outubro-24 | |
| Incc | 1178,386 | 1149,170 | |
| LVS | março-25 | agosto-24 | |
| Indiretos | março-25 | agosto-24 | |
| Base de Preço | LPU 90 | LPU 83 | |
| Takt | 2x2 | 2x2 | |
| Prazo (mês) | 21 | 20 | |
| CUSTO TOTAL I | R$ / UND R$ 85.641 | R$ / UND R$ 86.210 | DIF -R$ 569 |
| Indireto | R$ 12.276 | R$ 12.634 | -R$ 357 |
| Torre | R$ 57.149 | R$ 57.461 | -R$ 312 |
| Infra | R$ 9.115 | R$ 9.064 | R$ 51 |
| Fundação | R$ 6.969 | R$ 6.958 | R$ 11 |
| EEE | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| ETE | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Contenção | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Terraplenagem | R$ 131 | R$ 94 | R$ 37 |
| CUSTO TOTAL II | R$ 595 | R$ 610 | -R$ 15 |
| Urbanização | R$ 60 | R$ 0 | R$ 60 |
| Drenagem | R$ 0 | R$ 130 | -R$ 130 |
| Extensão de Rede Elétrica | R$ 0 | R$ 55 | -R$ 55 |
| Extensão de Rede Hidráulica | R$ 535 | R$ 424 | R$ 111 |
| CUSTO TOTAL III | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Incorridos | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CUSTO TOTAL IV | R$ 0 | R$ 2.207 | -R$ 2.207 |
| Atualização por INCC | R$ 0 | R$ 2.207 | -R$ 2.207 |
| CUSTO TOTAL | R$ 86.236 | R$ 89.028 | -R$ 2.791 |

## VARIAÇÕES

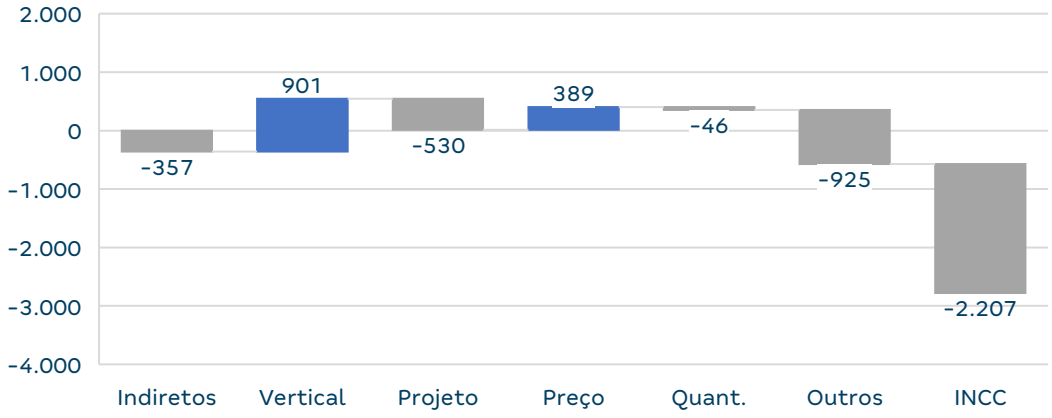


**INDIRETOS**
+315 | SSO
-225 | Administração
-208 | Operação de Canteiro
-197 | Implantação de Canteiro

**VERTICAL**
+901 | Dissídio

**PROJETO**
-328 | Reservatório Metálico

**PREÇO**
+374 | Concreto Torre
+161 | Esquadrias de Ferro Torre
+115 | Pintura
-700 | Elevador

**OUTROS**
+262 | Rateio Forma
+261 | Instalações Infra
-1548 | Instalações Torre

# Operações

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
Considerado de acordo com projeto, extensão de aproximadamente 360m até PV na Rua da Gratidão.

**SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**
Segundo diretriz, será necessária uma extensão de aproximadamente 60m, a ser executada na Rua Pasqualle Gatto e dentro do empreendimento haverá a necessidade de deslocamento da rede de esgoto.

**SISTEMA DE DRENAGEM**
Não se aplica.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS**
Não se aplica.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO**
Há viabilidade.

**TERRENO**

**URBANIZAÇÃO**
Não se aplica.

# Operações

| Matriz Risco Concessionária | |
|---|---|
| Água | Nível 2 |
| Esgoto | Nível 2 |
| Drenagem | NA |
| Elétrica | Nível 1 |
| Gás | NA |
| Urbanização | NA |

| LEGENDA | | |
|---|---|---|
| Nível | Tipo | Status |
| 1 | Com Diretriz | Conclusiva |
| 2 | | Conclusiva com projeto aprovado |
| 3 | | Conclusiva sem projeto aprovado |
| 4 | | Não Conclusiva |
| 5 | Sem Diretriz | - |
| NA | - | Não aplicável |

**Água:**
- Projeto aprovado 10/2024.

**Esgoto:**
- Projeto aprovado 09/2024.

**Drenagem:**
- Não se aplica.

**Elétrica:**
- Projeto aprovado 09/2024. .

**Gás:**
- Não se aplica.

**Urbanização:**
- Não se aplica.

# Logística

## IMPLANTAÇÃO

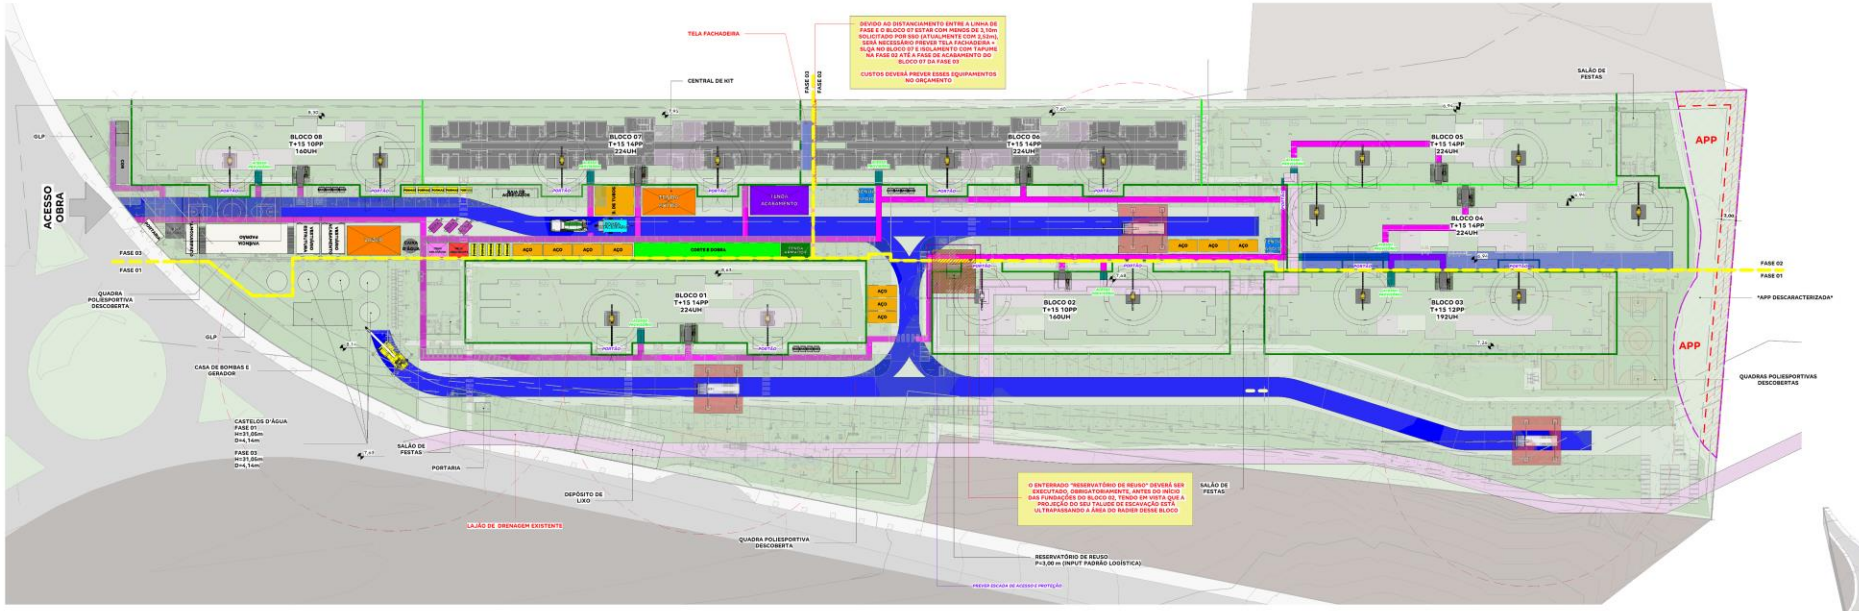




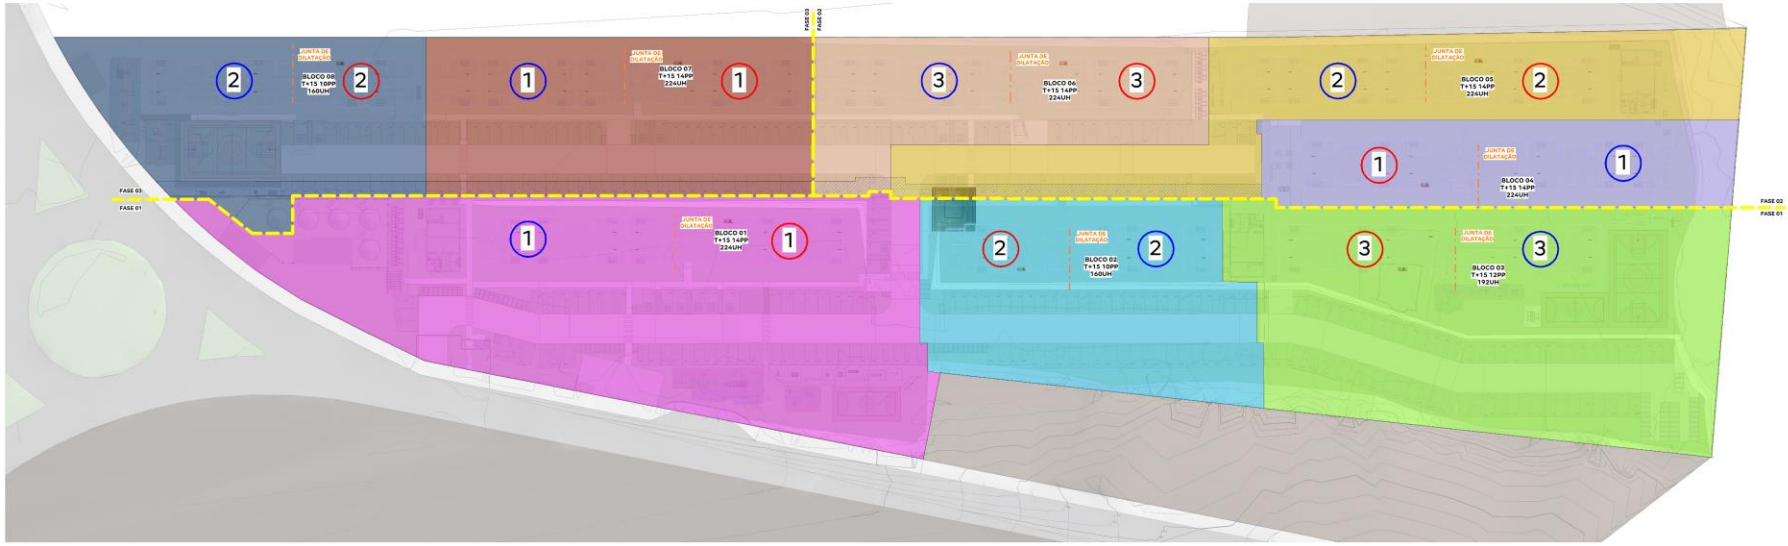

## MODULAÇÃO E TOMBAMENTO

# Logística

**CONDIÇÕES DETERMINANTES:**

- **LEGALIZAÇÃO / OBRA / CUSTOS** ***LEGALIZAÇÃO DEVERÁ SOLICITAR LICENÇA PARA FAIXA DE INTERVENÇÃO EM APP (3,00m)***
  RECOMENDAMOS QUE O FECHAMENTO SEJA EXECUTADO DURANTE A FASE 01.
- **SSO / GETEC/ OBRA / CUSTOS** DEVIDO AO DISTANCIAMENTO ENTRE A LINHA DE FASE E O BLOCO 07 ESTAR COM MENOS DE 3,10m SOLICITADO POR SSO (ATUALMENTE COM 2,52m), SERÁ NECESSÁRIO PREVER TELA FACHADEIRA + SLQA NO BLOCO 07 E ISOLAMENTO COM TAPUME NA FASE 02 ATÉ A FASE DE ACABAMENTO DO BLOCO 07 DA FASE 03

  CUSTOS DEVERÁ PREVER ESSES EQUIPAMENTOS NO ORÇAMENTO.
- **OBRA / GETEC (ESTRUTURA)** PREVER CUSTO PARA SECCIONAMENTO DOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS (CASTELOS) EM DUAS PARTES, NÃO MAIORES QUE 20,00m CADA (GABARITO MÁXIMO DA CARRETA DE TRANSPORTE), DEVIDO À ALTURA DOS MESMOS, PARA ACESSO DA CARRETA AO EMPREENDIMENTO. CASO A ALTURA ESTEJA PRÓXIMA A 20,00m, PODERÁ SER VERIFICADO COM O FORNECEDOR O CUSTO DE PRANCHA ALONGADA.
  DIÂMETRO: 4,14m / ALTURA: 31,05m
  ALÉM DISSO, MESMO QUE JÁ TENHA SIDO ALINHADO E VALIDADO COM O FORNECEDOR "DIPAWA RESERVATÓRIOS " O DIÂMETRO DE 4,14m, É IMPRESCÍNDIVEL QUE SEJA AGENDADO COM O MESMO UMA VISITA AO TERRENO, PARA QUE O MESMO VERIFIQUE SE É POSSÍVEL O TRANSPORTE (ACESSOS, FIAÇÃO BAIXA, PEQUENA ÁREA DE MANOBRA, ALTURA MÁXIMAS DE VIADUTOS). CASO SEJA NECESSÁRIA A MONTAGEM IN LOCO, LOGÍSTICA DEVERÁ SER ACIONADA E CUSTOS DEVERÁ VERIFICAR SE É VIAVEL O CUSTO DA MÃO DE OBRA DE MONTAGEM.

**SOLUÇÕES TÉCNICAS:**

- **OBRA / CUSTOS / SSO** PREVER CUSTO DE SLQA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA, E DE TELA FACHADEIRA DURANTE A EXECUÇÃO DO ACABAMENTO DO BLOCO 04 DA FASE 02 E BLOCO 07 DA FASE 03. SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO ADOTADA EM RAZÃO DO GABARITO, ACIMA DE 60,00m, DEVIDO AO RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS EM PASSEIO, VIÁRIOS, VIZINHOS EXTERNOS, ÁREA DE VIVÊNCIA E CAMINHO SEGURO DEFINITIVO. **ATENÇÃO A EMPREENDIMENTOS FASEADOS, APÓS ENTREGA DA FASE 1, ELA SE TORNA VIZINHO CRÍTICO***
- **CUSTOS / OBRA** PREVER CUSTO PARA PERDA DE CONCRETO DURANTE O PERÍODO ESTRUTURA COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA ESTACIONÁRIA PARA A CONCRETAGEM DE TODOS OS BLOCOS, NECESSÁRIO DEVIDO AO GABARITO (T+15).
- **CUSTOS / PLANEJAMENTO / OBRA / LEGALIZAÇÃO** DEVERÁ SER PRIORIZADA A INSTALAÇÃO DOS CASTELOS D'ÁGUA NA ETAPA DE PRÉ-FORMA, PARA EVITAR SEU ENCLAUSURAMENTO APÓS INÍCIO DA ETAPA DA ESTRUTURA E LOCAÇÃO DA ÁREA DE VIVÊNCIA. CASO CONTRÁRIO, DEVERÁ SER PREVISTO CUSTO E PRAZO PARA SEU IÇAMENTO PELO VIÁRIO EXTERNO.

*CONDIÇÕES DETERMINANTES: DETERMINAM A VIABILIDADE DE EXECUÇÃO DA OBRA ,TÉCNICA E FINANCEIRA. SEM O CUMPRIMENTO DELAS, A OBRA NÃO CONSEGUE SER EXECUTADA.*
*SOLUÇÕES TÉCNICAS: INDICAM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU PROCESSOS PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL.*
*PONTO DE ATENÇÃO: DEMONSTRA POSSÍVEIS RISCOS À OPERAÇÃO.*

# PCP 164

| Empreendimento | Lançto. | Unidades | # jogos | Equipes de forma | Início Obra | Início Forma 1 | Início Forma 2 | Início Forma 3 | Término Forma 1 | Término Forma 2 | Término Forma 3 | Previsão AGI | Folga Inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parque Topázio - F1 | abr/23 | 504 | 2 | B | 17/12/23 | 13/06/24 | 15/06/24 | | 08/11/24 | 11/11/24 | | out/25 | 8,20 |
| Parque Topázio - F2 | nov/23 | 504 | 2 | B | 01/07/24 | 09/11/24 | 12/11/24 | | 24/04/25 | 26/04/25 | | jan/26 | 7,63 |
| Vista Salvador Norte | dez/23 | 420 | 2 | A | 19/06/24 | 01/11/24 | 02/12/24 | | 31/03/25 | 02/04/25 | | dez/25 | 6,23 |
| Encanto Piatã - F1 | jun/24 | 576 | 2 | A | 25/09/24 | 01/04/25 | 03/04/25 | | 22/09/25 | 24/09/25 | | jun/26 | 3,43 |
| Vale dos Lírios F1 | ago/24 | 448 | 2 | B | 11/12/24 | 25/04/25 | 27/04/25 | | 16/09/25 | 18/09/25 | | jun/26 | 4,40 |
| Vale dos Lírios F2 | mar/25 | 320 | 2 | B | 07/06/25 | 17/09/25 | 19/09/25 | | 30/12/25 | 01/01/26 | | set/26 | 2,83 |
| Jardim Armação Prime | dez/24 | 380 | 2 | A | 11/04/25 | 23/09/25 | 25/09/25 | | 23/01/26 | 25/01/26 | | out/26 | 3,90 |
| Morada das Estações | dez/24 | 679 | 2 | B | 31/07/25 | 31/12/25 | 02/01/26 | | 08/08/26 | 10/08/26 | | mai/27 | 7,62 |
| Vivenda Real I | jan/25 | 571 | 2 | A | 18/08/25 | 24/01/26 | 26/01/26 | | 29/07/26 | 31/07/26 | | abr/27 | 7,20 |
| Encanto Piatã - F2 | mai/25 | 664 | 2 | A | 29/03/26 | 30/07/26 | 01/08/26 | | 01/03/27 | 03/03/27 | | nov/27 | 10,60 |
| Vila Laura Prime | mai/25 | 538 | 2 | B | 03/03/26 | 09/08/26 | 11/08/26 | | 30/01/27 | 01/02/27 | | out/27 | 9,75 |
| Veneza Prime F1 | out/25 | 570 | 2 | B | 03/09/26 | 31/01/27 | 02/02/27 | | 04/08/27 | 06/08/27 | | abr/28 | 10,79 |

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

# Demanda e Distribuição da Mancha

| Potencial de Demanda | | | Lançados | | Lançados + Landbank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mancha | CÓD. | Shr. | ANO | MÊS | ANO | MÊS |
| Salvador | SSA | 45% | 4.595 | 383 | 5.514 | 460 |

| Empreendimento | Renda | Lançamento | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | ##### | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale Dos Lírios | 3.794 | ago-24 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| Morada Das Estações | 3.119 | dez-24 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| Vivenda Real Cond I | 3.928 | jan-25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vale Dos Lirios F2 | 2.954 | mar-25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| Vila Laura Prime | 4.711 | abr-25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | | | | |
| V Salvador - Farol Da Barra | 1.877 | mai-25 | | 130 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| **Encanto Piatã - F2** | **4.195** | **mai-25** | | **37** | **37** | **37** | **37** | **37** | **37** | **37** | **37** | **37** | **37** | **37** | **37** | **37** | **37** | **37** | **37** | **37** | **35** | | | |
| **Encanto Piatã - F3** | **4.195** | **nov-26** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **21** | **21** | **21** |
| Paralela Sun Prime - F1 | 4.286 | nov-25 | | | | | | | | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| V Salvador - Forte Sao Marcelo | 1.877 | jan-26 | | | | | | | | | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 10 | | | | | |
| Vale Das Tulipas F1 | 3.217 | fev-26 | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Mirante Veneza F1 | 3.577 | mai-26 | | | | | | | | | | | | | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Vale das Orquídeas - F1 | 2.817 | jun-26 | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Vivenda Real Cond II | 3.171 | jul-26 | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| V Salvador - Parque Da Cidade | 1.877 | ago-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Privilege Salvador Norte | 3.023 | nov-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 33 | 33 |
| Vista Serena F1 | 2.030 | dez-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 28 |
| **Total de Vendas Lançados** | | | **172** | **172** | **172** | **172** | **136** | **122** | **122** | **118** | **84** | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** | **28** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Total de Vendas Lançados + Landbank** | | | **172** | **339** | **299** | **299** | **263** | **249** | **249** | **273** | **239** | **165** | **195** | **195** | **195** | **227** | **259** | **283** | **283** | **281** | **251** | **270** | **298** | **298** |

**Parecer de I.M sobre a mancha:**

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

**Canibalização:**

Sem Risco de Canibalização

# Encanto Piatã | Mapa Concorrência

| | | Encanto Piatã | Cidade Sete Sóis | Portal de Piatã |
|---|---|---|---|---|
| | | TENDA | MRV | MRV |
| | Distância Tenda (km) | | 2,73km | 500m |
| Região 1 Km | População | 28.612 | 9.529 | 31.296 |
| | Dens. Demográfica | 9.164 | 3.053 | 10.024 |
| | Renda (R$) | 5.973 | 2.903 | 4.914 |
| | Classe Social | E (Até 1,4k) | E (Até 1,4k) | C2 (1.4k até 2.6k) |
| | PEA Dia | 12.686 | 3.462 | 13.276 |
| Quantitativo | Lançamento | mai/25 | 12/2023 | mar/24 |
| | Unidades | 664 | 1.000 | 720 |
| | Estoque | 664 | 231 | 113 |
| | VSO | 37 | 45 | 43 |
| | Stockout | 18 | 5 | 3 |
| | Preço Nominal (R$) | 250.647 | N/A | 271.990 |
| | Preço CEF (R$) | 188.788 | N/A | 217.592 |
| | Renda Comprador (R$) | 4.010 | N/A | 4.325 |
| | Dif Tenda (R$) | | N/A | -315 |
| | Factibilidade | | ● | ● |
| | Preço Nominal (R$) - Com Vaga | 284.353 | 251.090 | 289.590 |
| | Preço CEF (R$) - Com Vaga | 216.731 | 200.872 | 210.740 |
| | Renda Comprador (R$) - Com Vaga | 5.141 | 3.875 | 4.750 |
| | Dif Tenda (R$) | | 1.266 | 391 |
| | Factibilidade | | ● | ● |
| Qualitativo | Condomínios | 1 | 1 | 1 |
| | Torres | 3 | 15 | 5 |
| | Gabarito | T+15 | T+4 | T+17 |
| | Plantas (m²) | 38m² | 41,4m² | 45m² |
| | Tipologia | 2 Dorms | Não | 2 Dorms |
| | Opções | Não | Garden | Garden |
| | Varanda | Não | Não | Não |
| | Suite | Não | Não | Sim |
| | Dif. Entrega | Não | Não | Não |
| | Vagas | 18% de Vagas | 100% | 68% Com Vaga |
| | Lazer | Quadras Cobertas, Salões De Festa Com Churrasqueira, Play Baby, Play Kids, Play Pet, Fitness, Funcional Externo E Mini Market | Tem Garden, Bicicletário, Brinquedoteca, Churrasqueria, Espaço Gourmet, Pet Place, Piscina, Piscina infantil, Playground, Salão de Festas, | Salão de Festas, Playground, Pet Place, Área de Convivência, Piscina Adulto, Churrasqueira, Espaço Gourmet, Quadra, Pomar, Bicicletário. |

| Farol Renda |
|---|
| ● Acima de 300 |
| ● Entre 0 e 300 |
| ● Abaixo de 0 |

*Encash é a financiadora dos 20% do valor residual do imóvel.

## Diagnóstico Concorrência

- Apesar do projeto Cidade Sete Sóis possuir preço competitivo ao previsto para o Encanto Piatã – F2, já possuímos relevância na região com o projeto antecessor. Projetos da MRV consideram fluxo de pagamentos com Encash*.

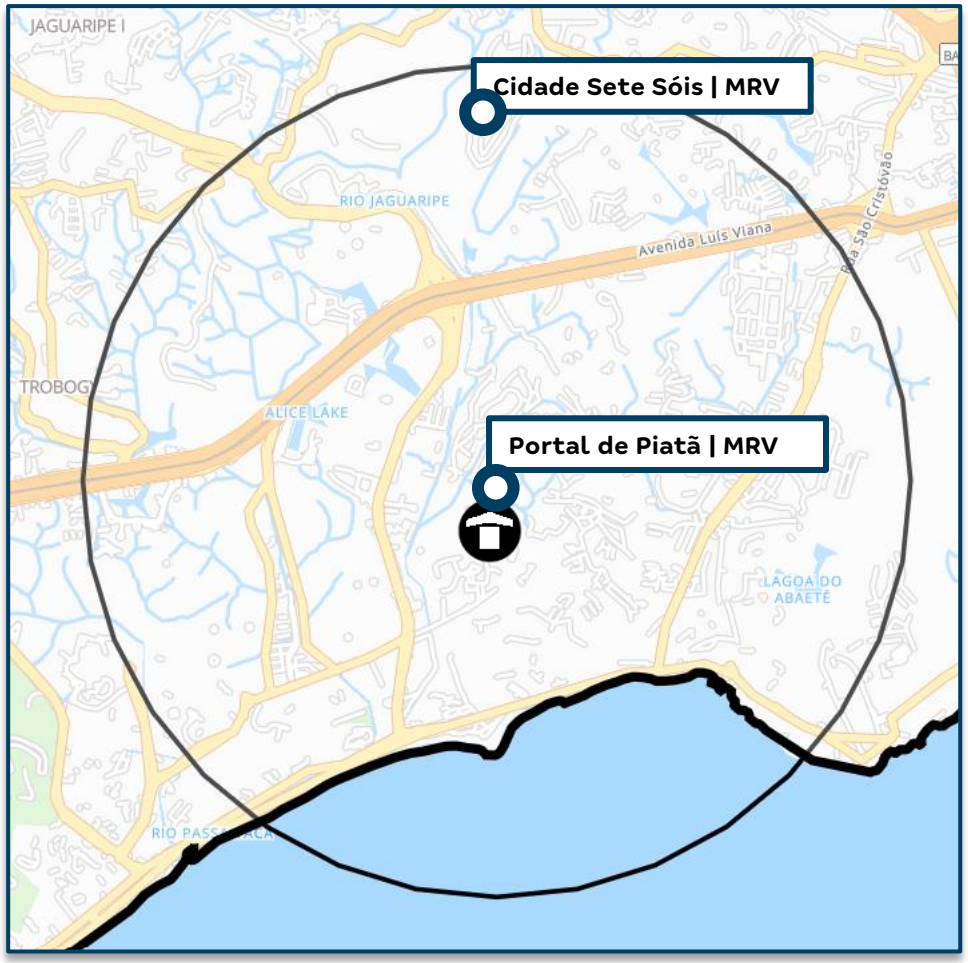

# Simulação de Preço – Sem Vaga

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Encanto Piatã | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **Sem Vaga** | | **Sem Vaga** | |
| Método | **Ref - Encanto Piatã - F1** | | **Vision** | |
| Avaliação | 260.000 | | 260.000 | |
| Renda Inicial (VF) | 4.010 | | 4.003 | |
| Renda Final* | - | | - | |
| % RET1 | 0% | | 0% | |
| **Tipo:** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** |
| Ato | 1,36 | 5.502 | 0,82 | 3.325 |
| FGTS | 0,76 | 3.087 | 0,71 | 2.889 |
| Financiamento | 96,65% | 183.986 | 95,49% | 181.461 |
| Subsídio | 85,00% | 1.715 | 227,93% | 4.601 |
| Prazo de Pró-soluto | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pró-Soluto | 73,87% | 32.289 | 77,20% | 33.686 |
| Preço Raso (RS) | 226.579 | 226.579 | 225.962 | 225.962 |
| TCD | 59,55% | 24.069 | 59,53% | 24.019 |
| VSO | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Preço de Venda | **247.552** | **247.552** | **246.894** | **246.894** |
| Elasticidade | 1,250% | 1,250% | 1,250% | 1,250% |
| Preço de Venda Final | **250.648** | **250.648** | **249.980** | **249.980** |
| Preço Raso (R$) | **226.579** | | **225.962** | |
| % de Raso | **90,40%** | | **90,39%** | |
| BP25 - Não Inflacionado | **211.179** | | **-** | |
| BP25 - Inflacionado | **217.138** | | **-** | |

# Simulação de Preço – Vaga Moto

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Encanto Piatã | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **Vaga Moto** | | **Vaga Moto** | |
| Método | **Ref - Encanto Piatã - F1** | | **Vision** | |
| Avaliação | 270.000 | | 270.000 | |
| Renda Inicial (VF) | 4.443 | | 4.294 | |
| Renda Final* | - | | - | |
| % RET1 | 0% | | 0% | |
| **Tipo:** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** |
| Ato | 1,36 | 6.111 | 0,76 | 3.325 |
| FGTS | 0,68 | 3.058 | 0,66 | 2.889 |
| Financiamento | 95,71% | 192.840 | 94,79% | 190.163 |
| Subsídio | 0,00% | 0 | 105,54% | 1.667 |
| Prazo de Pró-soluto | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pró-Soluto | 66,30% | 32.106 | 75,24% | 35.216 |
| Preço Raso (RS) | 234.115 | 234.115 | 233.260 | 233.260 |
| TCD | 45,76% | 20.491 | 55,49% | 24.019 |
| VSO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Preço de Venda | **251.463** | **251.463** | **254.102** | **254.102** |
| Elasticidade | 1,250% | 1,250% | 1,250% | 1,250% |
| Preço de Venda Final | **254.606** | **254.606** | **257.278** | **257.278** |
| Preço Raso (R$) | **234.115** | | **233.260** | |
| % de Raso | **91,95%** | | **90,66%** | |
| BP25 - Não Inflacionado | **216.065** | | **-** | |
| BP25 - Inflacionado | **222.144** | | **-** | |

# Simulação de Preço – Vaga Auto

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Encanto Piatã | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **Vaga Auto** | | **Vaga Auto** | |
| Método | **Ref - Encanto Piatã - F1** | | **Vision** | |
| Avaliação | 280.000 | | 280.000 | |
| Renda Inicial (VF) | 5.141 | | 5.033 | |
| Renda Final* | - | | - | |
| % RET1 | 0% | | 0% | |
| **Tipo:** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** |
| Ato | 1,33 | 6.946 | 1,02 | 5.173 |
| FGTS | 0,91 | 4.758 | 0,77 | 3.901 |
| Financiamento | 94,27% | 211.973 | 95,53% | 210.265 |
| Subsídio | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| Prazo de Pró-soluto | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pró-Soluto | 68,73% | 38.516 | 69,47% | 38.108 |
| Preço Raso (RS) | 262.193 | 262.193 | 257.447 | 257.447 |
| TCD | 42,76% | 22.160 | 39,99% | 20.289 |
| VSO | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Preço de Venda | **280.843** | **280.843** | **274.308** | **274.308** |
| Elasticidade | 1,250% | 1,250% | 1,250% | 1,250% |
| Preço de Venda Final | **284.353** | **284.353** | **277.737** | **277.737** |
| Preço Raso (R$) | **262.193** | | **257.447** | |
| % de Raso | **92,21%** | | **92,69%** | |
| BP25 - Não Inflacionado | **232.969** | | **-** | |
| BP25 - Inflacionado | **239.531** | | **-** | |

# Preço Referência

| | Encanto Piatã - F1 | | Normalização | | Encanto Piatã - F2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nominal | Raso | ΔPSOL | ΔElasticidade | Nominal | Raso |
| Sem Vaga | 234.764 | 210.992 | 12.756 | 1,25% | 250.647 | 226.578 |
| Vaga Moto | 238.761 | 218.523 | 12.684 | 1,25% | 254.606 | 234.115 |
| Vaga Auto | 264.999 | 243.112 | 15.216 | 1,25% | 284.353 | 262.193 |

As componentes de PSOL foram normalizadas conforme prazo de obras e elasticidade limitada de acordo com a avaliação do projeto.

# Análise de Preço

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Encanto Piatã |
|---|---|
| **Tipo:** | **Ponderado** |
| Método | **Ref - Encanto Piatã - F1** |
| Avaliação | 263.343 |
| Renda Inicial (VF) | 4.195 |
| Renda Final* | - |

| Tipo: | VF | R$ |
|---|---|---|
| Ato | 1,38 | 5.740 |
| FGTS | 0,78 | 3.343 |
| Financiamento | 96,26% | 188.525 |
| Subsídio | 69,64% | 1.405 |
| Prazo de Pró-soluto | 30 | 30 |
| Pró-Soluto | 72,88% | 33.241 |
| Preço Raso (RS) | 232.254 | 232.254 |
| TCD | 56,60% | 23.679 |
| VSO | 37 | 37 |
| Preço de Venda | **252.734** | **252.734** |
| Elasticidade | 1,250% | 1,250% |
| Preço de Venda Final | **255.933** | **255.933** |
| Preço Raso (R$) | **232.254** | |
| % de Raso | **90,75%** | |
| Raso Todas as Fases | **231.977** | |
| Nominal Todas as Fases | **255.972** | |

1

| Análise de Riscos | Farol IM |
|---|---|
| IM avalia o Preço Referência como **factível**. | |

1) I.M está de acordo com o preço referência, visto que, esse preço reflete a performance da fase anterior ajustando o preço apenas conforme os novos parâmetros da fase atual.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", a concorrência possuí renda competitiva ao Produto Tenda, porém já temos performance estabelecida na região.

| | Preço Real | | | | | Preço Normalizado (30m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Avaliação | Preço Raso | Renda Média | VSO | PSOL | Δ PSOL | Preço Raso |
| Lagoa de Abaeté | 195.739 | 176.868 | 2.332 | 55 | 18 | 7.847 | 184.715 |
| Morada das Estações | 228.539 | 204.393 | 3.119 | 43 | 29 | 932 | 205.325 |
| Vale dos Lírios | 225.901 | 201.856 | 3.794 | 49 | 19 | 11.036 | 212.892 |
| Vivenda Real | 236.329 | 215.779 | 3.928 | 50 | 28 | 2.279 | 218.059 |
| Encanto Piatã | 263.343 | 232.254 | 4.195 | 37 | 30 | - | 232.253 |
| Vila Laura Prime | 264.796 | 242.442 | 4.711 | 30 | 30 | - | 242.442 |
| Jardim Armação Prime | 298.102 | 280.444 | 10.993 | 39 | 23 | 15.785 | 296.229 |

# Simulação de Preço – Fases Futuras

## Referência

| Nome Fase | Tipologia | Renda | Ato | FGTS | Cond. | Subsídio | PSOL | TCD | VSO | Nom. Pré | Avali. | Elast. | Nom. Pós | Raso Pós | PSOL (m) | RET1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encanto Piatã - F3 | Sem Vaga | 4.010 | 1,40 | 0,76 | 97,5% | 85,0% | 76,6% | 61,8% | 17 | 239.048 | 260.000 | 5,0000% | 251.001 | 226.041 | 22 | 0% |
| Encanto Piatã - F3 | Vaga Moto | 4.443 | 1,40 | 0,68 | 98,0% | 0,0% | 68,8% | 47,5% | 1 | 243.007 | 270.000 | 5,0000% | 255.157 | 233.906 | 22 | 0% |
| Encanto Piatã - F3 | Vaga Auto | 5.141 | 1,30 | 0,91 | 96,7% | 0,0% | 71,3% | 44,4% | 3 | 270.699 | 280.000 | 5,0000% | 284.234 | 261.251 | 22 | 0% |

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

# Simulação de Preço – Sem Vaga

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Encanto Piatã | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **Sem Vaga** | | **Sem Vaga** | |
| Método | **Ref - Encanto Piatã - F1** | | **Vision** | |
| Avaliação | 260.000 | | 260.000 | |
| Renda Inicial (VF) | 4.010 | | 4.003 | |
| Renda Final* | - | | - | |
| % RET1 | 0% | | 0% | |
| **Tipo:** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** |
| Ato | 1,40 | 5.502 | 0,82 | 3.325 |
| FGTS | 0,76 | 3.087 | 0,71 | 2.889 |
| Financiamento | 96,97% | 183.986 | 95,85% | 181.461 |
| Subsídio | 85,00% | 1.715 | 227,93% | 4.601 |
| Prazo de Pró-soluto | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Pró-Soluto | 73,87% | 27.983 | 77,20% | 29.194 |
| Preço Raso (RS) | 222.273 | 222.273 | 221.470 | 221.470 |
| TCD | 59,55% | 24.069 | 59,53% | 24.019 |
| VSO | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Preço de Venda | **243.300** | **243.300** | **242.458** | **242.458** |
| Elasticidade | 1,250% | 1,250% | 1,250% | 1,250% |
| Preço de Venda Final | **246.342** | **246.342** | **245.489** | **245.489** |
| Preço Raso (R$) | **222.273** | | **221.470** | |
| % de Raso | **90,23%** | | **90,22%** | |
| BP25 - Não Inflacionado | **209.334** | | **-** | |
| BP25 - Inflacionado | **215.293** | | **-** | |

# Simulação de Preço – Vaga Moto

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Encanto Piatã | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **Vaga Moto** | | **Vaga Moto** | |
| Método | **Ref - Encanto Piatã - F1** | | **Vision** | |
| Avaliação | 270.000 | | 270.000 | |
| Renda Inicial (VF) | 4.443 | | 4.294 | |
| Renda Final* | - | | - | |
| % RET1 | 0% | | 0% | |
| **Tipo:** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** |
| Ato | 1,40 | 6.111 | 0,76 | 3.325 |
| FGTS | 0,68 | 3.058 | 0,66 | 2.889 |
| Financiamento | 96,62% | 192.840 | 95,36% | 190.163 |
| Subsídio | 0,00% | 0 | 105,54% | 1.667 |
| Prazo de Pró-soluto | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Pró-Soluto | 66,30% | 27.826 | 75,24% | 30.521 |
| Preço Raso (RS) | 229.835 | 229.835 | 228.564 | 228.564 |
| TCD | 45,76% | 20.491 | 55,49% | 24.019 |
| VSO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Preço de Venda | **247.235** | **247.235** | **249.465** | **249.465** |
| Elasticidade | 1,250% | 1,250% | 1,250% | 1,250% |
| Preço de Venda Final | **250.326** | **250.326** | **252.583** | **252.583** |
| Preço Raso (R$) | **229.835** | | **228.564** | |
| % de Raso | **91,81%** | | **90,49%** | |
| BP25 - Não Inflacionado | **213.777** | | **-** | |
| BP25 - Inflacionado | **219.856** | | **-** | |

# Simulação de Preço – Vaga Auto

## Informações Viabilidade

| Projeto: | Encanto Piatã | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | **Vaga Auto** | | **Vaga Auto** | |
| Método | **Ref - Encanto Piatã - F1** | | **Vision** | |
| Avaliação | 280.000 | | 280.000 | |
| Renda Inicial (VF) | 5.141 | | 5.033 | |
| Renda Final* | - | | - | |
| % RET1 | 0% | | 0% | |
| **Tipo:** | **VF** | **R$** | **VF** | **R$** |
| Ato | 1,30 | 6.946 | 1,02 | 5.173 |
| FGTS | 0,91 | 4.758 | 0,77 | 3.901 |
| Financiamento | 95,21% | 211.973 | 95,53% | 210.265 |
| Subsídio | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| Prazo de Pró-soluto | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Pró-Soluto | 68,73% | 33.380 | 80,15% | 38.108 |
| Preço Raso (RS) | 257.057 | 257.057 | 257.447 | 257.447 |
| TCD | 42,76% | 22.160 | 39,99% | 20.289 |
| VSO | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Preço de Venda | **275.771** | **275.771** | **274.308** | **274.308** |
| Elasticidade | 1,250% | 1,250% | 1,250% | 1,250% |
| Preço de Venda Final | **279.217** | **279.217** | **277.737** | **277.737** |
| Preço Raso (R$) | **257.057** | | **257.447** | |
| % de Raso | **92,06%** | | **92,69%** | |
| BP25 - Não Inflacionado | **230.677** | | **-** | |
| BP25 - Inflacionado | **237.240** | | **-** | |

# Percepção Comercial

## Concorrência

**Lançamentos na região (Raio de 5KM)**

1. Avaliação Media: 282.867
2. Preço Médio: 291.014

PORTAL DE
PIATÃ

**Ficha Técnica**

Área total do terreno: **18.877,10 m²**

Endereço: **Rua Pasquale Gatto, 2000, Piatã, Salvador/BA**

Itens de lazer: **piscinas adulto e infantil, playground, salão de festas, espaço gourmet, pet place, pomar, bicicletário, churrasqueira, quadra gramada e praça de convivência**

Unidades: **720 unidades**

Vagas de garagem: **486 vagas no total para automóveis. Sendo 50 para motos e 436 para carros, das quais 36 são para PCD. Além de 40 para bicicleta.**

Tipologia das unidades:

**1 quarto para PCD: 40,49m²**

**2 quartos: 40,49m²**

**2 quartos com suíte/varanda: 45,89m²**

**Área privativa*: de 16,80m² a 74,68m²**

*Área real privativa acessória com valores aproximados. Consulte unidades disponíveis.

**Parecer:** O Parecer do ciclo e favorável estamos com uma diferença segura de preço para o concorrente, e o mesmo já está em final de estoque também.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

# Informações Gerais – Cenário aprovação

## Encanto Piatã Real - BA - Salvador Capital

### Datas e Prazos

| | Compra | Lançamento | Início Obra | Término Obra | LÇTO até IO | IO até TO | Chaves | LÇTO até Chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Consolidado** | mai-22 | | | | | | | |
| **Encanto Piatã F2 sem vaga** | | mai-25 | nov-25 | ago-27 | 6 meses | 21 meses | mai-28 | 36 meses |
| **ncanto Piatã F2 com vaga moto** | | mai-25 | nov-25 | ago-27 | 6 meses | 21 meses | mai-28 | 36 meses |
| **Encanto Piatã F2 c vaga carro** | | mai-25 | nov-25 | ago-27 | 6 meses | 21 meses | mai-28 | 36 meses |
| **Encanto Piatã F3 sem vaga** | | nov-26 | mai-27 | out-28 | 6 meses | 17 meses | nov-29 | 36 meses |
| **ncanto Piatã F3 com vaga moto** | | nov-26 | mai-27 | out-28 | 6 meses | 17 meses | nov-29 | 36 meses |
| **Encanto Piatã F3 c vaga carro** | | nov-26 | mai-27 | out-28 | 6 meses | 17 meses | nov-29 | 36 meses |

### Terreno e Incorridos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL (R$ + Perm.):** | 17,74 MM | **Incorrido Terreno:** 4,26 MM | **Área do Terreno (100%):** | 15.578 m² | **Área Líquida do Terreno:** 15.578 m² |
| **Cash:** | 17,74 MM | | **Custo de terreno m²:** | 1.139,0 | **Custo de terreno m² Área Líquida:** 1.139,0 |
| **Permuta Financeira:** | 0,00 MM (0,00%) | | **VaR 25 (R$ mil):** | 2.637 | **Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 6,7% / 41,4% |
| **Permuta Física:** | 0,00 MM (0,00%) | | **VaR 26 (R$ mil):** | 0 | **CA Máx/Proj.** 3,0 / 2,4 |
| **Ato / %VGV:** | 0,00 MM / 0,0% | | **Incorrido de Construção:** | 0,11 MM | **Incorridos de Incorporação:** 1,66 MM |

### Vendas

| Fases | Nº Pavimentos | Preço Raso Unit. | Qtde | Preço Unit. | Aval. CEF | Cond. Parcela | % Pró-soluto | % TCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Encanto Piatã F2 sem vaga** | T+15 | 222.356 | 544 | 246.341 | 260.000 | 94,4% | 64,2% | 51,8% |
| **ncanto Piatã F2 com vaga moto** | T+15 | 229.891 | 18 | 250.325 | 270.000 | 96,5% | 63,1% | 43,5% |
| **Encanto Piatã F2 c vaga carro** | T+15 | 257.058 | 102 | 279.218 | 280.000 | 95,2% | 68,7% | 42,8% |
| **Encanto Piatã F3 sem vaga** | T+15 | 226.147 | 311 | 251.000 | 260.000 | 95,9% | 66,6% | 53,7% |
| **ncanto Piatã F3 com vaga moto** | T+15 | 233.961 | 12 | 255.157 | 270.000 | 98,0% | 65,4% | 45,2% |
| **Encanto Piatã F3 c vaga carro** | T+15 | 261.253 | 56 | 284.234 | 280.000 | 96,7% | 71,3% | 44,3% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidades Totais:** | 1.043 | **Preço Médio:** | 253.150 | **Renda Média:** | 4.693 | **ITBI+Emol. Unit. Médio:** | 8.064 |
| **Unidades Tenda:** | 1.043 | **Avaliação Média:** | 263.317 | **Ato:** | 5.741 (1,22 Salários) | **Custo do Ciclo Unit.:** | 14.971 |
| **VSO:** | 37 Unidades | **VGV Total:** | 264.035.795 | **FGTS:** | 3.277 (0,7 Salários) | **Preço Raso Médio:** | 229.232 |
| **RET Médio:** | 4,0% | **VGV Tenda:** | 264.035.795 | **% em RET 1%:** | 0% | **Adc. Tx. de Aceleração Médio:** | 750 |

### Construção

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Custo Total Unit.:** | 87.818 | **Eventuais:** | 4,00% | **Área priv (m²):** | 38,70 | **Gape / Mês Unit.:** | 11,08 |

### Resultado

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LI (R$):** | **54.952.098** | **LI:** | **30,39%** | **Exposição de Caixa (R$):** | **18.808.111** | **Margem Bruta Econômica:** | **51,55%** |
| **TIR:** | **118,03%** | **LI Aprovação:** | **20,00%** | **Ger. Caixa 12 meses (R$):** | **(12.785.438)** | **Margem Bruta REF:** | **54,48%** |
| **Exposição de Caixa:** | **6,97%** | **Δ LI:** | **10,39%** | **Ger. Caixa 24 meses (R$):** | **32.899.151** | **Margem Rasa Econômica:** | **45,87%** |
| **Payback Contingente (21 m):** | **18 m/ (-3 m)** | **LI Marginal:** | **34,14%** | **Ger. Caixa Marginal (R$):** | **104.620.409** | **Margem Rasa REF:** | **49,74%** |
| **Payback Consolidado:** | **18 meses** | | | | | **Margem de Contribuição Econômica:** | **39,17%** |

# DRE – Cenário aprovação

| R$ Mil - Valores Nominais - Compra | Encanto Piatã Real | | Encanto Piatã F2 sem vaga | | Encanto Piatã F2 com vaga moto | | Encanto Piatã F2 c vaga carro | | Encanto Piatã F3 sem vaga | | Encanto Piatã F3 com vaga moto | | Encanto Piatã F3 c vaga carro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % |
| Receita | 270.003 | 100,0% | 133.169 | 100,0% | 4.481 | 100,0% | 28.248 | 100,0% | 83.777 | 100,0% | 3.318 | 100,0% | 17.009 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (5.919) | 2,2% | (2.919) | 2,2% | (98) | 2,2% | (619) | 2,2% | (1.836) | 2,2% | (73) | 2,2% | (373) | 2,2% |
| Custo Total | (127.957) | 48,5% | (64.280) | 49,4% | (2.155) | 49,2% | (12.073) | 43,7% | (40.532) | 49,5% | (1.582) | 48,7% | (7.335) | 44,1% |
| Custo Terreno | (17.744) | 6,7% | (9.255) | 7,1% | (306) | 7,0% | (1.735) | 6,3% | (5.291) | 6,5% | (204) | 6,3% | (953) | 5,7% |
| Custo Relacionados a Terreno | (269) | 0,1% | (140) | 0,1% | (5) | 0,1% | (26) | 0,1% | (80) | 0,1% | (3) | 0,1% | (14) | 0,1% |
| Custos de Incorporação | (3.634) | 1,4% | (1.729) | 1,3% | (86) | 2,0% | (345) | 1,2% | (1.166) | 1,4% | (63) | 1,9% | (246) | 1,5% |
| Custo de Construção | (106.311) | 40,3% | (53.157) | 40,8% | (1.759) | 40,1% | (9.967) | 36,1% | (33.995) | 41,5% | (1.312) | 40,4% | (6.121) | 36,8% |
| Lucro Bruto Econômico | 136.127 | 51,5% | 65.970 | 50,6% | 2.227 | 50,8% | 15.556 | 56,3% | 41.409 | 50,5% | 1.663 | 51,3% | 9.301 | 55,9% |
| Custo para Rateio | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Lucro Bruto Contábil | 136.127 | 51,5% | 65.970 | 50,6% | 2.227 | 50,8% | 15.556 | 56,3% | 41.409 | 50,5% | 1.663 | 51,3% | 9.301 | 55,9% |
| Despesas de Selling | (26.477) | 10,0% | (13.166) | 10,1% | (440) | 10,0% | (2.676) | 9,7% | (8.261) | 10,1% | (321) | 9,9% | (1.614) | 9,7% |
| Contingência | (6.210) | 2,4% | (3.063) | 2,4% | (103) | 2,4% | (650) | 2,4% | (1.927) | 2,4% | (76) | 2,4% | (391) | 2,4% |
| Margem de Contribuição | 103.440 | 39,2% | 49.742 | 38,2% | 1.684 | 38,4% | 12.230 | 44,3% | 31.221 | 38,1% | 1.266 | 39,0% | 7.296 | 43,9% |
| IR e CSLL | (4.842) | 1,8% | (2.388) | 1,8% | (80) | 1,8% | (507) | 1,8% | (1.503) | 1,8% | (60) | 1,8% | (305) | 1,8% |
| Margem Líquida | 98.598 | 37,3% | 47.353 | 36,4% | 1.604 | 36,6% | 11.724 | 42,4% | 29.719 | 36,3% | 1.207 | 37,2% | 6.991 | 42,0% |
| Lucro Bruto REF Unit. | 145.091 | 54,5% | 134.908 | 53,5% | 138.687 | 54,2% | 168.229 | 59,0% | 149.094 | 53,6% | 151.627 | 54,0% | 186.214 | 59,1% |
| Lucro Raso REF Unit. | 119.889 | 49,7% | 110.388 | 48,5% | 117.858 | 50,2% | 145.613 | 55,4% | 121.572 | 48,5% | 128.406 | 49,9% | 160.745 | 55,5% |

| R$ Mil - VPL - Compra | Encanto Piatã Real | | Encanto Piatã F2 sem vaga | | Encanto Piatã F2 com vaga moto | | Encanto Piatã F2 c vaga carro | | Encanto Piatã F3 sem vaga | | Encanto Piatã F3 com vaga moto | | Encanto Piatã F3 c vaga carro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VP | % | VP | % | VP | % | VP | % | VP | % | VP | % | VP | % |
| Receitas | 180.843 | 100,0% | 97.010 | 100,0% | 3.242 | 100,0% | 20.803 | 100,0% | 48.093 | 100,0% | 1.939 | 100,0% | 9.757 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (3.904) | 2,2% | (2.094) | 2,2% | (70) | 2,2% | (449) | 2,2% | (1.038) | 2,2% | (42) | 2,2% | (211) | 2,2% |
| Custos e Despesas Totais | (121.986) | 67,5% | (65.770) | 67,8% | (2.203) | 68,0% | (12.619) | 60,7% | (33.833) | 70,4% | (1.332) | 68,7% | (6.228) | 63,8% |
| Custo Terreno | (15.243) | 8,4% | (7.950) | 8,2% | (263) | 8,1% | (1.491) | 7,2% | (4.545) | 9,5% | (175) | 9,0% | (818) | 8,4% |
| Custo Relacionados a Terreno | (365) | 0,2% | (191) | 0,2% | (6) | 0,2% | (36) | 0,2% | (109) | 0,2% | (4) | 0,2% | (20) | 0,2% |
| Custos de Incorporação | (3.417) | 1,9% | (1.711) | 1,8% | (79) | 2,4% | (336) | 1,6% | (1.027) | 2,1% | (54) | 2,8% | (210) | 2,2% |
| Custo de Construção | (76.656) | 42,4% | (41.634) | 42,9% | (1.378) | 42,5% | (7.806) | 37,5% | (21.202) | 44,1% | (818) | 42,2% | (3.818) | 39,1% |
| Despesas de Selling | (20.913) | 11,6% | (11.405) | 11,8% | (381) | 11,7% | (2.336) | 11,2% | (5.502) | 11,4% | (223) | 11,5% | (1.068) | 10,9% |
| Contingência | (2.196) | 1,2% | (1.166) | 1,2% | (39) | 1,2% | (247) | 1,2% | (598) | 1,2% | (24) | 1,2% | (121) | 1,2% |
| IR e CSLL | (3.195) | 1,8% | (1.714) | 1,8% | (57) | 1,8% | (367) | 1,8% | (850) | 1,8% | (34) | 1,8% | (172) | 1,8% |
| Lucro Imobiliário | 54.952 | 30,4% | 29.145 | 30,0% | 969 | 29,9% | 7.734 | 37,2% | 13.221 | 27,5% | 565 | 29,1% | 3.319 | 34,0% |

# Comparativo

| Comparativo dos Estudos - Consolidado | BP - 2025 | Atual | Atual vs BP - 2025 | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Data Estudo: | setembro-24 | maio-25 | 8 Meses | N/A |
| Lançamento: | julho-25 | maio-25 | -2 Meses | N/A |
| Uhs: | 1.043 | 1.043 | - | 0,0% |
| Preço Nominal: | 239.692 | 253.150 | 13.458 | 5,6% |
| Preço Raso: | 214.120 | 229.232 | 15.112 | 7,1% |
| Preço Nominal Inflacionado: | 266.009 | 266.893 | 884 | 0,3% |
| Preço Raso Inflacionado: | 237.681 | 241.692 | 4.010 | 1,7% |
| Renda Média: | 4.039 | 4.693 | 654 | 16,2% |
| RET Médio: | 3,5% | 4,0% | 0,5 p.p. | 13,6% |
| % em RET 1%: | 15,9% | 0,0% | -15,9 p.p. | -100,0% |
| VSO: | 29 | 29 | - | 0,0% |
| ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]: | 10.536 | 9.095 | (1.441) | -13,7% |
| Avaliação: | 263.784 | 263.317 | (466) | -0,2% |
| Cond. Financiamento: | 98,7% | 95,1% | -3,6 p.p. | -3,6% |
| Subsídio Utilizado: | 0,0% | 0,0% | 0,0 p.p. | |
| Percentual Pró-Soluto: | 65,5% | 65,8% | 0,3 p.p. | 0,4% |
| Percentual utilização TCD: | 64,9% | 50,9% | -14,0 p.p. | -21,6% |
| Prazo construção F1: | 20 | 21 | 1 | 5,0% |
| Prazo de Pró-Soluto F1: | 25 | 26 | 1 | 4,0% |
| Custo Total Inf (Unit): | 127.591 | 122.682 | (4.909) | -3,8% |
| Custo Construção (Unit): | 88.939 | 87.818 | (1.121) | -1,3% |
| Custo Construção Corrigido: | 86.284 | 87.818 | 1.534 | 1,8% |
| Fração de construção: | 36,0% | 34,7% | -1,3 p.p. | -3,6% |
| INCC Folha Rosto: | 1.161,58 | 1.178,39 | 17 | 1,4% |
| Custo Terreno Inf: | 18.758.527 | 17.743.827 | (1.014.700) | -5,4% |
| Custo Relacionados a Terreno (Unit): | 233 | 258 | 25 | 10,5% |
| Fração do Terreno[1]: | 7,5% / 44,6% | 6,7% / 41,4% | -0,8 p.p. | -10,7% |
| Custo de Incorp. por uh: | -6.484 | 3.484 | 9.968 | -153,7% |
| Custo do Ciclo (Unit): | 14.174 | 14.971 | 797 | 5,6% |
| Lucro Imobiliário: | 27,2% | 30,4% | 3,2 p.p. | 11,6% |
| LI Marginal: | 29,1% | 34,1% | 5,1 p.p. | 17,5% |
| Exposição de caixa: | 8,3% | 7,0% | -1,4 p.p. | -16,5% |
| TIR: | 95,9% | 118,0% | 22,2 p.p. | 23,1% |
| Margem Bruta REF: | 52,5% | 54,5% | 1,9 p.p. | 3,7% |
| Margem Bruta Econômica: | 49,8% | 51,5% | 1,7 p.p. | 3,5% |
| Margem Rasa REF: | 46,9% | 49,7% | 2,8 p.p. | 6,1% |
| Margem Rasa Econômica: | 43,1% | 45,9% | 2,8 p.p. | 6,4% |
| Margem Contribuição Econômica: | 36,6% | 39,2% | 2,6 p.p. | 7,1% |
| Payback Contingente (Régua 21 m): | 19 m/ (-2 m) | 18 m/ (-3 m) | -1 | -5,3% |
| Payback Consolidado: | 19 Meses | 18 Meses | -1 Meses | -5,3% |

# Comparativo

| Comparativo dos Estudos - Primeira Fase | Anterior | Atual | Atual vs Anterior | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Data Estudo: | junho-24 | maio-25 | 11 Meses | N/A |
| Lançamento: | junho-24 | maio-25 | 11 Meses | N/A |
| Uhs: | 568 | 664 | 96 | 16,9% |
| Preço Nominal: | 242.327 | 251.500 | 9.172 | 3,8% |
| Preço Raso: | 213.616 | 227.891 | 14.275 | 6,7% |
| Preço Nominal Inflacionado: | 246.906 | 257.231 | 10.325 | 4,2% |
| Preço Raso Inflacionado: | 217.653 | 233.103 | 15.450 | 7,1% |
| Renda Média: | 3.584 | 4.694 | 1.110 | 31,0% |
| RET Médio: | N/A | 4,0% | 0,5 p.p. | |
| % em RET 1%: | N/A | 0,0% | -15,9 p.p. | |
| VSO: | 32 | 37 | 5 | 15,6% |
| ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]: | 8.278 | 8.814 | 535 | 6,5% |
| Avaliação: | 264.683 | 263.343 | (1.340) | -0,5% |
| Cond. Financiamento: | 92,8% | 94,6% | 1,8 p.p. | 1,9% |
| Subsídio Utilizado: | 135,5% | 0,0% | -135,5 p.p. | -100,0% |
| Percentual Pró-Soluto: | 88,9% | 64,9% | -24,0 p.p. | -27,0% |
| Percentual utilização TCD: | 80,4% | 50,2% | -30,3 p.p. | -37,6% |
| Prazo construção F1: | N/A | 21 | N/A | |
| Prazo de Pró-Soluto F1: | N/A | 26 | N/A | |
| Custo Total Inf (Unit): | 148.323 | 118.236 | -30.087 | -20,3% |
| Custo Construção (Unit): | 99.994 | 86.236 | -13.758 | -13,8% |
| Custo Construção Corrigido: | N/A | 86.236 | N/A | |
| Fração de construção: | 41,3% | 34,3% | -698% | -16,9% |
| INCC Folha Rosto: | 1.101,39 | 1.178,39 | 77,00 | 7,0% |
| Custo Terreno Inf: | N/A | 11.296.166 | N/A | |
| Custo Relacionados a Terreno (Unit): | 310 | 258 | -52 | -16,9% |
| Fração do Terreno[1]: | 6,70% | 6,91% | 20,31% | 3,0% |
| Custo de Incorp. por uh: | N/A | 3.252 | N/A | |
| Custo do Ciclo (Unit): | 13.719 | 14.971 | 1.252 | 9,1% |
| Lucro Imobiliário: | 29,6% | 31,3% | 1,6 p.p. | 5,5% |
| LI Marginal: | 30,5% | 34,8% | 4,3 p.p. | 14,1% |
| Exposição de caixa: | 19,0% | 8,9% | -10,0 p.p. | -52,9% |
| TIR: | 101,0% | 143,6% | 42,5 p.p. | 42,1% |
| Margem Bruta REF: | N/A | 54,5% | N/A | 2,4% |
| Margem Bruta Econômica: | 46,9% | 48,0% | 1,1 p.p. | |
| Margem Rasa REF: | N/A | 49,8% | N/A | |
| Margem Rasa Econômica: | 39,0% | 45,9% | 6,9 p.p. | 17,8% |
| Margem Contribuição Econômica: | 38,5% | 39,2% | 0,7 p.p. | 1,8% |
| Payback Contingente (Régua 20 m): | N/A | 18 m/ (-3 m) | N/A | |
| Payback Consolidado: | N/A | 17 Meses | N/A | |

# Informações Gerais – Cenário Real

## Encanto Piatã Real - BA - Salvador Capital

### Datas e Prazos

| | Compra | Lançamento | Início Obra | Término Obra | LÇTO até IO | IO até TO | Chaves | LÇTO até Chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Consolidado** | mai-22 | | | | | | | |
| **Encanto Piatã F2 sem vaga** | | mai-25 | mar-26 | dez-27 | 10 meses | 21 meses | mai-28 | 36 meses |
| **ncanto Piatã F2 com vaga moto** | | mai-25 | mar-26 | dez-27 | 10 meses | 21 meses | mai-28 | 36 meses |
| **Encanto Piatã F2 c vaga carro** | | mai-25 | mar-26 | dez-27 | 10 meses | 21 meses | mai-28 | 36 meses |
| **Encanto Piatã F3 sem vaga** | | nov-26 | mai-27 | out-28 | 6 meses | 17 meses | nov-29 | 36 meses |
| **ncanto Piatã F3 com vaga moto** | | nov-26 | mai-27 | out-28 | 6 meses | 17 meses | nov-29 | 36 meses |
| **Encanto Piatã F3 c vaga carro** | | nov-26 | mai-27 | out-28 | 6 meses | 17 meses | nov-29 | 36 meses |

### Terreno e Incorridos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL (R$ + Perm.):** | 17,74 MM | **Incorrido Terreno:** 4,26 MM | **Área do Terreno (100%):** | 15.578 m² | **Área Líquida do Terreno:** 15.578 m² |
| **Cash:** | 17,74 MM | | **Custo de terreno m²:** | 1.139,0 | **Custo de terreno m² Área Líquida:** 1.139,0 |
| **Permuta Financeira:** | 0,00 MM (0,00%) | | **VaR 25 (R$ mil):** | 2.637 | **Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 6,6% / 41,0% |
| **Permuta Física:** | 0,00 MM (0,00%) | | **VaR 26 (R$ mil):** | 0 | **CA Máx/Proj.** 3,0 / 2,4 |
| **Ato / %VGV:** | 0,00 MM / 0,0% | | **Incorrido de Construção:** | 0,11 MM | **Incorridos de Incorporação:** 1,66 MM |

### Vendas

| Fases | Nº Pavimentos | Preço Raso Unit. | Qtde | Preço Unit. | Aval. CEF | Cond. Parcela | % Pró-soluto | % TCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Encanto Piatã F2 sem vaga** | T+15 | 226.605 | 544 | 250.646 | 260.000 | 96,7% | 73,9% | 59,6% |
| **ncanto Piatã F2 com vaga moto** | T+15 | 234.142 | 18 | 254.606 | 270.000 | 95,7% | 66,3% | 45,8% |
| **Encanto Piatã F2 c vaga carro** | T+15 | 262.193 | 102 | 284.353 | 280.000 | 94,3% | 68,7% | 42,8% |
| **Encanto Piatã F3 sem vaga** | T+15 | 226.068 | 311 | 251.000 | 260.000 | 97,5% | 76,6% | 61,8% |
| **ncanto Piatã F3 com vaga moto** | T+15 | 233.933 | 12 | 255.157 | 270.000 | 98,0% | 68,8% | 47,5% |
| **Encanto Piatã F3 c vaga carro** | T+15 | 261.228 | 56 | 284.234 | 280.000 | 96,7% | 71,3% | 4440,0% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidades Totais:** | 1.043 | **Preço Médio:** | 255.972 | **Renda Média:** | 4.194 | **ITBI+Emol. Unit. Médio:** | 8.147 |
| **Unidades Tenda:** | 1.043 | **Avaliação Média:** | 263.317 | **Ato:** | 5.684 (1,36 Salários) | **Custo do Ciclo Unit.:** | 15.140 |
| **VSO:** | 37 Unidades | **VGV Total:** | 266.978.662 | **FGTS:** | 3.275 (0,78 Salários) | **Preço Raso Médio:** | 231.996 |
| **RET Médio:** | 4,0% | **VGV Tenda:** | 266.978.662 | **% em RET 1%:** | 0% | **Adc. Tx. de Aceleração Médio:** | 750 |

### Construção

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Custo Total Unit.:** | 87.818 | **Eventuais:** | 4,00% | **Área priv (m²):** | 38,70 | **Gape / Mês Unit.:** | 11,08 |

### Resultado

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LI (R$):** | **54.436.968** | **LI:** | **30,51%** | **Exposição de Caixa (R$):** | **16.645.673** | **Margem Bruta Econômica:** | **51,67%** |
| **TIR:** | **112,44%** | **LI Aprovação:** | **20,00%** | **Ger. Caixa 12 meses (R$):** | **(9.473.384)** | **Margem Bruta REF:** | **54,57%** |
| **Exposição de Caixa:** | **6,09%** | **Δ LI:** | **10,51%** | **Ger. Caixa 24 meses (R$):** | **20.729.001** | **Margem Rasa Econômica:** | **46,01%** |
| **Payback Contingente (21 m):** | **20 m/ (-1 m)** | **LI Marginal:** | **34,31%** | **Ger. Caixa Marginal (R$):** | **106.249.440** | **Margem Rasa REF:** | **49,88%** |
| **Payback Consolidado:** | **20 meses** | | | | | **Margem de Contribuição Econômica:** | **39,32%** |

# DRE – Cenário Real

| R$ Mil - Valores Nominais - Compra | Encanto Piatã Real | | Encanto Piatã F2 sem vaga | | Encanto Piatã F2 com vaga moto | | Encanto Piatã F2 c vaga carro | | Encanto Piatã F3 sem vaga | | Encanto Piatã F3 com vaga moto | | Encanto Piatã F3 c vaga carro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % |
| Receita | 273.376 | 100,0% | 135.862 | 100,0% | 4.569 | 100,0% | 28.839 | 100,0% | 83.779 | 100,0% | 3.318 | 100,0% | 17.009 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (5.993) | 2,2% | (2.978) | 2,2% | (100) | 2,2% | (632) | 2,2% | (1.836) | 2,2% | (73) | 2,2% | (373) | 2,2% |
| Custo Total | (129.216) | 48,3% | (65.194) | 49,1% | (2.186) | 48,9% | (12.245) | 43,4% | (40.535) | 49,5% | (1.721) | 53,0% | (7.335) | 44,1% |
| Custo Terreno | (17.744) | 6,6% | (9.255) | 7,0% | (306) | 6,9% | (1.735) | 6,2% | (5.291) | 6,5% | (204) | 6,3% | (953) | 5,7% |
| Custo Relacionados a Terreno | (269) | 0,1% | (140) | 0,1% | (5) | 0,1% | (26) | 0,1% | (80) | 0,1% | (3) | 0,1% | (14) | 0,1% |
| Custos de Incorporação | (3.827) | 1,4% | (1.773) | 1,3% | (87) | 2,0% | (353) | 1,3% | (1.166) | 1,4% | (201) | 6,2% | (246) | 1,5% |
| Custo de Construção | (107.377) | 40,2% | (54.026) | 40,7% | (1.788) | 40,0% | (10.130) | 35,9% | (33.999) | 41,5% | (1.312) | 40,4% | (6.122) | 36,8% |
| Lucro Bruto Econômico | 138.167 | 51,7% | 67.689 | 50,9% | 2.283 | 51,1% | 15.962 | 56,6% | 41.408 | 50,5% | 1.525 | 47,0% | 9.301 | 55,9% |
| Custo para Rateio | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Lucro Bruto Contábil | 138.167 | 51,7% | 67.689 | 50,9% | 2.283 | 51,1% | 15.962 | 56,6% | 41.408 | 50,5% | 1.525 | 47,0% | 9.301 | 55,9% |
| Despesas de Selling | (26.750) | 10,0% | (13.357) | 10,1% | (446) | 10,0% | (2.717) | 9,6% | (8.289) | 10,1% | (322) | 9,9% | (1.619) | 9,7% |
| Contingência | (6.288) | 2,4% | (3.125) | 2,4% | (105) | 2,4% | (663) | 2,4% | (1.927) | 2,4% | (76) | 2,4% | (391) | 2,4% |
| Margem de Contribuição | 105.130 | 39,3% | 51.207 | 38,5% | 1.732 | 38,8% | 12.582 | 44,6% | 31.192 | 38,1% | 1.127 | 34,7% | 7.291 | 43,8% |
| IR e CSLL | (4.903) | 1,8% | (2.437) | 1,8% | (82) | 1,8% | (517) | 1,8% | (1.503) | 1,8% | (60) | 1,8% | (305) | 1,8% |
| Margem Líquida | 100.227 | 37,5% | 48.771 | 36,7% | 1.650 | 36,9% | 12.064 | 42,8% | 29.689 | 36,2% | 1.067 | 32,9% | 6.986 | 42,0% |
| Lucro Bruto REF Unit. | 146.903 | 54,6% | 137.632 | 53,7% | 141.380 | 54,3% | 171.795 | 59,1% | 149.083 | 53,6% | 151.616 | 54,0% | 186.203 | 59,1% |
| Lucro Raso REF Unit. | 121.640 | 49,9% | 113.053 | 48,8% | 120.521 | 50,4% | 149.155 | 55,7% | 121.473 | 48,5% | 128.364 | 49,9% | 160.707 | 55,4% |

| R$ Mil - VPL - Compra | Encanto Piatã Real | | Encanto Piatã F2 sem vaga | | Encanto Piatã F2 com vaga moto | | Encanto Piatã F2 c vaga carro | | Encanto Piatã F3 sem vaga | | Encanto Piatã F3 com vaga moto | | Encanto Piatã F3 c vaga carro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VP | % | VP | % | VP | % | VP | % | VP | % | VP | % | VP | % |
| Receitas | 178.414 | 100,0% | 95.047 | 100,0% | 3.194 | 100,0% | 20.393 | 100,0% | 48.084 | 100,0% | 1.939 | 100,0% | 9.756 | 100,0% |
| PIS/COFINS | (3.852) | 2,2% | (2.052) | 2,2% | (69) | 2,2% | (440) | 2,2% | (1.038) | 2,2% | (42) | 2,2% | (211) | 2,2% |
| Custos e Despesas Totais | (120.125) | 67,3% | (64.164) | 67,5% | (2.149) | 67,3% | (12.320) | 60,4% | (33.845) | 70,4% | (1.417) | 73,1% | (6.230) | 63,9% |
| Custo Terreno | (15.243) | 8,5% | (7.950) | 8,4% | (263) | 8,2% | (1.491) | 7,3% | (4.545) | 9,5% | (175) | 9,0% | (818) | 8,4% |
| Custo Relacionados a Terreno | (365) | 0,2% | (191) | 0,2% | (6) | 0,2% | (36) | 0,2% | (109) | 0,2% | (4) | 0,2% | (20) | 0,2% |
| Custos de Incorporação | (3.521) | 2,0% | (1.729) | 1,8% | (78) | 2,4% | (339) | 1,7% | (1.027) | 2,1% | (138) | 7,1% | (210) | 2,2% |
| Custo de Construção | (74.565) | 41,8% | (39.927) | 42,0% | (1.321) | 41,4% | (7.486) | 36,7% | (21.196) | 44,1% | (818) | 42,2% | (3.817) | 39,1% |
| Despesas de Selling | (21.137) | 11,8% | (11.566) | 12,2% | (386) | 12,1% | (2.371) | 11,6% | (5.520) | 11,5% | (223) | 11,5% | (1.071) | 11,0% |
| Contingência | (2.142) | 1,2% | (1.123) | 1,2% | (38) | 1,2% | (238) | 1,2% | (598) | 1,2% | (24) | 1,2% | (121) | 1,2% |
| IR e CSLL | (3.151) | 1,8% | (1.679) | 1,8% | (56) | 1,8% | (360) | 1,8% | (849) | 1,8% | (34) | 1,8% | (172) | 1,8% |
| Lucro Imobiliário | 54.437 | 30,5% | 28.831 | 30,3% | 977 | 30,6% | 7.632 | 37,4% | 13.201 | 27,5% | 480 | 24,8% | 3.316 | 34,0% |

# Obrigada!
