Tenda

sua próxima conquista

Book de Escritura - Respostas comitê 19/05/2025

Regional: RJ

Projeto: Bosque Jacarepaguá – RZO7

Data Comitê Presencial: 23/05/2025

Questionamentos Comitê de Escritura 19/05/2025

Nome	Bosque Jacarepaguá - Escritura	Observação - Bosque Jacarepaguá
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	Ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	Custo não contempla melhorias de projetos tais como inclusão de miniquadra e ducha..., desta forma o mesmo deverá ser acrescido para lançamento.
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Manter voto anterior (Caso esteja votando pela a 2° vez)	Ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	ok
Rodrigo Osmo	Discutir em Comitê	(1) Com relação aos Gardens, queria entender se a "diretriz inicial de DPP, [de aloca-los somente] em áreas mais reservadas do condomínio (evitando corredores entre torres, fachadas voltadas para áreas de lazer e vagas)," é por uma questão da qualidade percebida pelo cliente, ou por limitação de implantação. Se for qualidade percebida, valeria desafiarmos a premissa, pois o cliente pode querer pagar pelo Garden mesmo com menos privacidade.

Rodrigo Osmo

(1) Com relação aos Gardens, queria entender se a "diretriz inicial de DPP, [de aloca-los somente] em áreas mais reservadas do condomínio (evitando corredores entre torres, fachadas voltadas para áreas de lazer e vagas)," é por uma questão da qualidade percebida pelo cliente, ou por limitação de implantação. Se for qualidade percebida, valeria desafiarmos a premissa, pois o cliente pode querer pagar pelo Garden mesmo com menos privacidade.

Em relação à diretriz de alocação dos gardens, seguimos atualmente a premissa de posicioná-los em faces voltadas para espaços sem frente para áreas de lazer ou fluxo intenso de pedestres, com o objetivo de preservar a privacidade e reduzir a exposição dessas unidades. No caso específico deste empreendimento, que passou por um processo de melhoria de produto e implementação de atributos de lazer em linha, a posição dos gardens também disputa espaço com soluções técnicas já estipuladas previamente pelos projetistas. Por isso, sua localização foi estrategicamente planejada para evitar complexidades na disposição das instalações, como interferências com redes enterradas e a necessidade de reposicionamento de caixas de inspeção. Além disso, evitou-se áreas com solução estrutural em talude, prevenindo a necessidade de contenções adicionais.

Em relação às percepções dos clientes, não há dados disponíveis, pois o Bosque Jacarepaguá é um dos primeiros empreendimentos da Tenda a ter gardens.

Questionamentos Comitê de Escritura 12/05/2025

Nome	Bosque Jacarepaguá - Escritura	Observação - Bosque Jacarepaguá
Renan Barbosa Sanches	Discutir em Comitê	Pfv avaliar se há oportunidades no pré orçamento. Indiretos e torre estão mais caros que peônia e possivelmente mais caros que as últimas obras em execução e especialmente as entregues. Terraplanagem está muito alto tb.
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	Ok
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	Ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	Projeto de implantação em revisão para inclusão de novos atributos de produto.
Rodrigo Osmo	Discutir em Comitê	(1) Temos algum risco de surpresa negativa na aprovação dos projetos pelas concessionárias?; (2) Quantas unidades tem garden no projeto? Parecem ser menos do que todas as do térreo; caso sim, por que não fizemos mais?
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok, projeto foi revisado para inserção de uma mini quadra esportiva
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	o projeto parece ter renda suficiente para varanda e piscina, não temos como incluir?

Atualização de material

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Anterior	Atual	Atual vs Anterior	Δ%
Data Estudo:	maio-25	maio-25	0 Meses	N/A
Lançamento:	junho-25	junho-25	0 Meses	N/A
Preço Nominal:	209.161	207.517	(1.644)	-0,8%
Preço Raso:	186.955	185.311	(1.644)	-0,9%
Prazo construção F1:	14	12	(2)	-14,3%
Prazo de Pró-Soluto F1:	19	17	(2)	-10,5%
Custo Total Inf (Unit):	127.492	125.831	(1.660)	-1,3%
Custo Construção (Unit):	89.966	89.023	(943)	-1,0%
Custo Terreno Inf:	8.273.659	8.263.401	(10.258)	-0,1%
Custo do Ciclo (Unit):	14.420	14.307	(113)	-0,8%
Lucro Imobiliário:	20,1%	20,4%	0,3 p.p.	1,6%
Exposição de caixa:	15,1%	17,0%	1,9 p.p.	12,7%
TIR:	114,0%	119,9%	5,9 p.p.	5,2%
Margem Bruta Econômica:	38,5%	38,8%	0,3 p.p.	0,7%
Margem Rasa Econômica:	30,5%	30,8%	0,3 p.p.	0,9%
Margem Contribuição Econômica:	26,7%	27,0%	0,2 p.p.	0,9%
Payback Contingente (Régua 21 m):	16 m/ (-5 m)	15 m/ (-6 m)	-1	-6,3%
Payback Consolidado:	16 Meses	15 Meses	-1 Meses	-6,3%

Custo foi revisado.
Ajuste no pró-soluto impactou preço raso e nominal.

Questionamentos Comitê de Escritura 12/05/2025

Renan Barbosa

(1) Pfv avaliar se há oportunidades no pré orçamento. Indiretos e torre estão mais caros que peônia e possivelmente mais caros que as últimas obras em execução e especialmente as entregues. Terraplanagem está muito alto tb.

Entre a liberação do material para o comitê e o retorno dos questionamentos da diretoria, GETEC emitiu uma nova FR com uma redução de 1k no custo (redução de 2 meses do prazo de obra, ajuste fck concreto). Acreditamos que até o comitê de lançamento vamos conseguir mais reduções.

Sobre a terraplenagem, tivemos um aumento na altura da troca de solo do custo BP para o atual. Temos uma torre que chega até 4,5m de altura de troca de solo, sendo que no BP essa altura era de 2m. Mas estamos provocando sobre essa ser a melhor solução, dado o alto custo, e acreditamos que possa ser revisitada.

Segue abaixo simulação considerando a redução inicial emitida em nova FR por GETEC:

Resultados Viabilidade Financeira		
	Comitê de escritura 12/05	Nova emissão de FR
Preço Nominal	209.161	207.517
Preço Raso	186.955	185.311
Custo	89.966	89.023
Prazo de obra	14 meses	12 meses
LI	20,1%	20,4%
PB	16 meses	15 meses

One Page - Nova emissão FR

Cidade	Rio de Janeiro	**Mancha de demanda**	RJ - - Jacarepaguá
Regional	RJ	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura	**Versão da VF**	Versão 1.0: Mai

Unidades (% Vagas)	414 (13%)	**CA Máx | Proj**	1,3 | 0,4
Tipologia	F2 - Concreto	**Escritura**	mai-25
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	jun/25 | 18

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	5.000 (5,8%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	2.500 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	2,9% (50,0%)
Valor R$/m²	487	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	36.856 (42,9%)	**Indireto Unit.**	17.203
Prazo da Obra (meses)	12	**Torre Unit.**	42.005
Custo Total Unit. (LPU):	89.023 (89)	**Infra Unit.**	17.612
Início de Obra	dez-25	**Fundação Unit.**	5.464

Preço Nominal Unit.	207.517	**VSO**	32
Preço Raso Unit.	185.311	**Referência**	VISION
Avaliação Unit.	211.860	**Renda (% em RET 1%)**	3.265 (47,2%)



LI (Régua):	**20,4% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	38,8%
LI Marginal:	21,9%	**Margem Rasa Econômica:**	30,8%
Margem Bruta REF:	41,3%	**Margem Contribuição Econômica:**	27,0%
Margem Rasa REF:	**34,3%**	**Exposição (% VGV):**	14.652 (17,0%)
TIR:	119,9%	**VGV Total:**	85.912
Payback Contingente (21 m) :	**15 m/ (-6 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(13.767)
Payback Consolidado:	15	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	19.287

Questionamentos Comitê de Escritura 12/05/2025

Rodrigo Osmo

(1) Temos algum risco de surpresa negativa na aprovação dos projetos pelas concessionárias?; (2) Quantas unidades tem garden no projeto? Parecem ser menos do que todas as do térreo; caso sim, por que não fizemos mais?

A drenagem foi aprovada em 13/05, estamos apenas aguardando as vias assinadas, e os demais projetos estão em andamento, sem riscos associados pelo GETEC.

Com relação ao garden, por diretriz inicial de DPP, foram alocados em áreas mais reservadas do condomínio (evitando corredores entre torres, fachadas voltadas para áreas de lazer e vagas), e por isso, no Bosque, temos apenas 12 unidades com garden. Vale ressaltar que o Bosque foi a primeira implantação desenvolvida com garden pela equipe de AP e estamos aumentando os testes a medida que desenvolvemos os demais projetos.

Questionamentos Comitê de Escritura 12/05/2025

Alexandre Regis

Projeto de implantação em revisão para inclusão de novos atributos de produto.

Amanda da Silva Bezerra

Ok, projeto foi revisado para inserção de uma mini quadra esportiva.

Luiz Mauricio de Garcia Paula

O projeto parece ter renda suficiente para varanda e piscina, não temos como incluir?

Já estamos revisando a implantação para inclusão de uma meia quadra com espaço ducha, pois acreditamos que esses atributos trarão valor para o produto.

Quanto a varanda, esse produto tem o direcionamento de ser o combate da ZO7, com foco maior no VSO do que no preço, gerando um projeto T+4 robusto em fase única. Nesse sentido, buscamos os atributos que valorizassem o produto com menor impacto em preço possível, preservando a renda inicial projetada para o cliente desejado.

Em relação a piscina, o trade off para considerarmos provavelmente envolveria a perda de vagas, porém, a rua de acesso é estreita, o que valoriza a projeção de algumas vagas. Como ainda não temos total sensibilidade do ganho de preço e avaliação da piscina, optamos por manter a quantidade de vagas nesse projeto combate.

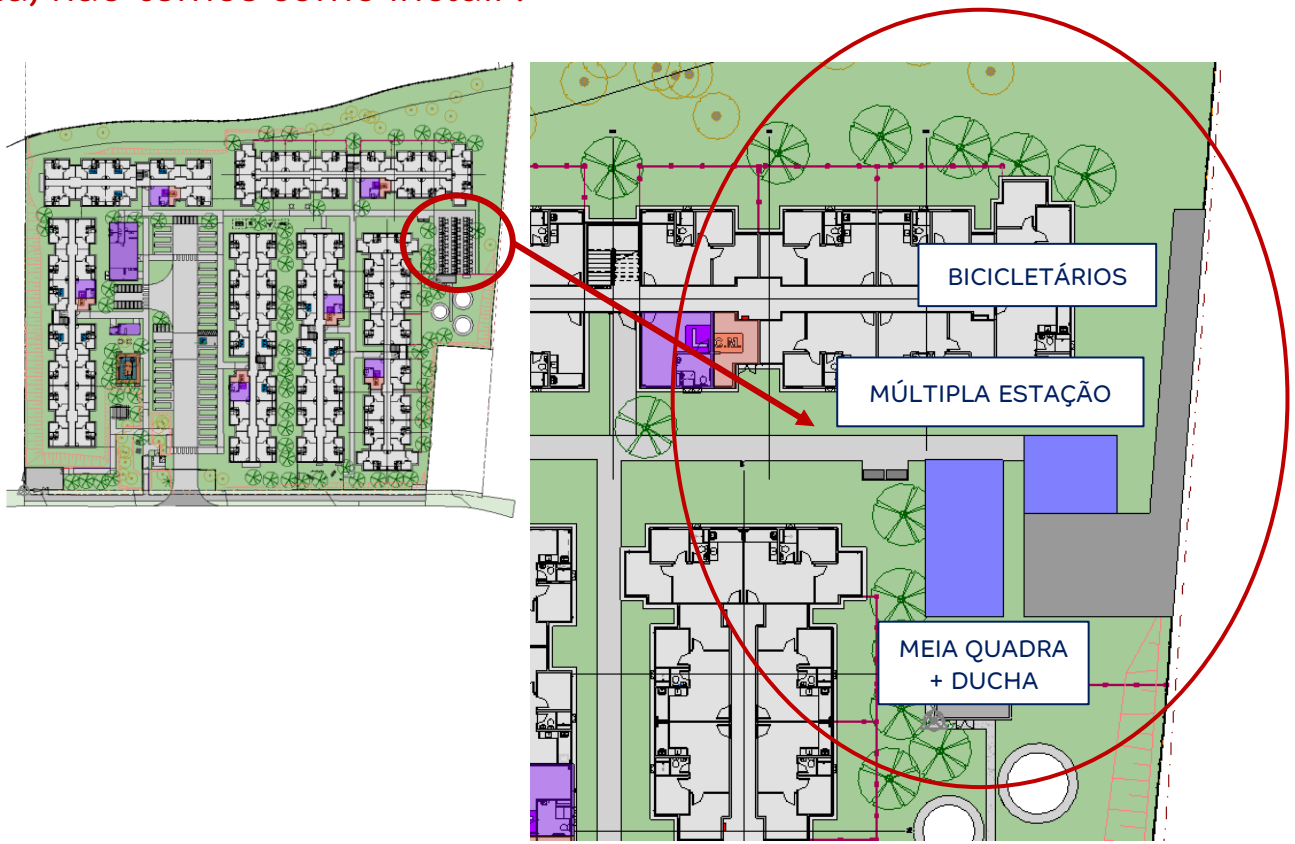

One Page – Bosque Jacarepaguá

[1]

Cidade	Rio de Janeiro	**Mancha de demanda**	RJ - - Jacarepaguá
Regional	RJ	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura	**Versão da VF**	Versão 1.0: Mai

[2]

Unidades (% Vagas)	414 (13%)	**CA Máx | Proj**	1,3 | 0,4
Tipologia	F2 - Concreto	**Escritura**	mai-25
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	jun/25 | 18

[3]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	5.000 (5,8%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	2.500 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	2,9% (50,0%)
Valor R$/m²	487	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[4]

Custo Construção (%VGV)	36.856 (42,9%)	**Indireto Unit.**	17.203
Prazo da Obra (meses)	12	**Torre Unit.**	42.005
Custo Total Unit. (LPU):	89.023 (89)	**Infra Unit.**	17.612
Início de Obra	dez-25	**Fundação Unit.**	5.464

[5]

Preço Nominal Unit.	207.517	**VSO**	32
Preço Raso Unit.	185.311	**Referência**	VISION
Avaliação Unit.	211.860	**Renda (% em RET 1%)**	3.265 (47,2%)

[6]

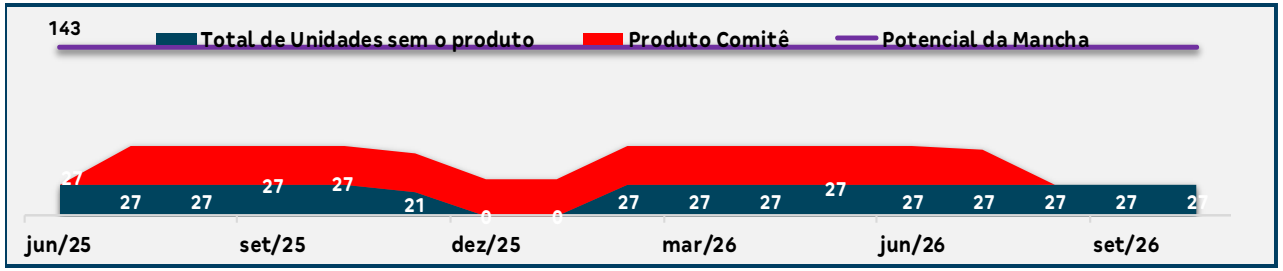

LI (Régua):	**20,4% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	38,8%
LI Marginal:	21,9%	**Margem Rasa Econômica:**	30,8%
Margem Bruta REF:	41,3%	**Margem Contribuição Econômica:**	27,0%
Margem Rasa REF:	**34,3%**	**Exposição (% VGV):**	14.652 (17,0%)
TIR:	119,9%	**VGV Total:**	85.912
Payback Contingente (21 m) :	**15 m/ (-6 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(13.767)
Payback Consolidado:	15	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	19.287

Destaques

[1] Imóvel fica localizado na mancha RZO7, no bairro do Tanque, em Jacarepaguá, a 300m da esquina com a Est. Do Cafundá, onde se encontra supermercado, grande oferta de comércio e transporte.

[2] Conseguimos um ganho de 9 unidades em relação ao comitê de investimento e inserimos unidades com garden no produto.

[3] R$ 5.000.000,00, sendo R$ 2.500.000,00 em permuta financeira, representados por 3% do VGV e R$ 2.500.000,00 em cash. A parte em cash ficou distribuída em um sinal de R$ 500k (0,59% do VGV), pago em ago/24 na PCV e o saldo de R$ 2 MM serão pagos com R$ 1 MM na assinatura da ECV (descontados débitos de IPTU) e R$ 1 MM em 15 parcelas mensais e sucessivas após assinatura da ECV.

[4] Custo de parametrização utilizando quantitativo do anteprojeto. Para o comitê de lançamento, teremos o pré orçamento considerando o EP finalizado.

[5] Avaliação em andamento na Caixa, consideramos o valor solicitado. Ideia é que seja o produto combate da ZO7

[6] Projeto apresenta resultados financeiros dentro das réguas da companhia.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Farol Pareceres – Bosque Jacarepaguá

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Due Diligencie concluída em 06/2024 e renovada em 05/2025, com os seguintes pontos de atenção e pendências: - Os imóveis possuem débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2007 a 2009, 2020 e 2024, totalizando R$ 149.041,72 que serão quitados pela Tenda, com o correspondente abatimento no preço, conforme previsto e Contrato e Escritura. Além da quitação dos débitos de IPTU referentes ao exercício de 2025, até o mês de maio, no valor total de R$ 19.141,00, que também será abatido do preço. - Os vendedores são sócios de 9 empresas ativas, que acumulam um passivo judicial total de aproximadamente R$ 21MM x um ativo de R$ 22MM. Caso surja algum passivo maior que possa afetar a compra, existe previsão expressa na Escritura sobre a possibilidade de retenção do pagamento do preço por parte da Tenda, para sua utilização no pagamento de tais débitos. Ademais, será realizado o monitoramento das ações judiciais com valores mais relevantes envolvendo as empresas das quais os vendedores são sócios, até a emissão do habite-se dos empreendimentos. - Pendente recebimento dos extratos de débitos fiscais dos vendedores para análise de contingência administrativa (dívidas inscritas, mas não judicializadas), o que pode alterar a análise risco acima indicada. A escritura será lavrada apenas com recebimento de tais documentos. - O imóvel está ocupado por contrato de comodato. A Tenda firmará um aditivo ao contrato de comodato com os ocupantes na data de assinatura da ECV, estabelecendo que a desocupação do imóvel ocorrerá em até 30 dias contados do envio da notificação que será encaminhada pela Tenda, assim que a Adriana nos confirmar que está segura para prosseguirmos com a assinatura da escritura. Além disso, a escritura preverá a retenção das parcelas pós-escritura e da participação até que o imóvel esteja totalmente desocupado. - O objeto do contrato firmado é um lote, o qual será originado de um processo de parcelamento que resultará em dois lotes, sendo um deles objeto do contrato e o outro trata-se de uma área invadida que ficará na propriedade dos vendedores. Para fins de agilizar o lançamento, a escritura será lavrada antes do registro do parcelamento, dessa forma, constará em novação que o lote invadido será dado em pagamento aos vendedores, ficando o pagamento das parcelas pós escrituras e da participação, retidos até a conclusão do processo de dação do referido lote invadido. Os custos de ITBI e registro da referida escritura serão suportados pela Tenda.	Ok com ressalvas	
Legalização	O remembramento / desmembramento está tecnicamente aprovado, com o termo de processamento de recuo assinado, aguardando aprovação da Rede de Drenagem para finalização do processo e emissão da Certidão. Há FNAs de drenagem e linha de transmissão que deverão ser representadas no PAL e gravadas na matrícula. A Licença de Obras está em análise final junto ao urbanismo para posterior emissão. O Licenciamento Ambiental está finalizado com toda documentação expedida. Há dívidas de IPTU que devem ser quitadas para a aprovação do remembramento/ desmembramento.	Ok com ressalvas	
Produto	Sem riscos associados.	Ok	
GETEC	Quantitativo de torre do anteprojeto. Aguardando elaboração e aprovação de laudo para Geo Rio.	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos associados.	Ok	
Contratação	N/A	Ok	
Inteligência de mercado	IM avalia o preço como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Ok	Ok	
Estudos Econômicos	Sem riscos associados.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- RZO 7 – Rio de Janeiro Oeste]

Lançamento

1. Soul Taquá

LandBank

2. Bosque Jacarepaguá

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 3 - Verde

Região

Capital

Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Bosque Jacarepaguá
Descritivo - Escritura

Informações Gerais		
Terreno	**Área terreno**	42.545,75m²
	Menor poligonal	42.046,84m²
	Acordo Usocapião	498,91m²
	Aclive Rochoso	31.780,21m²
	Área liquida	10.266,63m²
	Zoneamento	ZRM2-Q
	Ca máximo	1,25
	Ca projetado	0,43
	Ca projetado Sem Aclive Rochoso	1,70
	Gabarito máximo	T+4
Geral	**Total uh**	414
	Total de vagas	54 vagas de carro (Sendo 1 PCD, 29 Comum e 24 Moto) - (13%)
Tipologia	**Tipologia**	Modular sem elevador Flex e Não Flex
	Gabarito	T+04
	Lâmina	01 16pp, 03 14pp e 01 10pp
	Área privativa	33,97, 34,12m² e 34,22m²
	Garden	12uh (2,90%)
Condomínio	**Unidade pcd**	13
	Unidade lazer|técnica	06 | 06
	Torre	06
	Fase	Única
Lazer	**Lazer Interno**	01-Espaço delivery/Minimarket, 02-Espaço Office,03-Espaço oficina, 04-Brinquedoteca, 05- Fitness e 06-Sport Bar
	Lazer Externo	07-Praça de chegada, 08-Play Baby, 09-Play kids, 10-Churrasqueira Gourmet com banheiro e previsão de geladeira, 11-Salão de festas, 12-Fitness externo e 13-Play Pet



Planta Chave

PRODUTO

Empreendimento Bosque Jacarepaguá
Atributos de produto - Escritura

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Prime**	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	07 unidades de lazer externo: Praça de chegada, Play Kids, Play Baby, Churrasqueira Gourmet com banheiro e previsão de geladeira, Salão de festas externo, Fitness externo e Play Pet
	Atributos Torre	Sim	Garden e 06 unidades de lazer interno (sugestões de uso): Espaço delivery/Minimarket, Espaço Office, Espaço oficina, Brinquedoteca, Fitness e Sport Bar
	Edifício Garagem	Não	

	Riscos associados	Parecer	Criticidade
Produto	Não há riscos associados	ok	

Churrasqueira Gourmet com banheiro e previsão de geladeira

Salão de festas externo

Empreendimento Bosque Jacarepaguá
Modulação - Escritura

Fase única: 414uh (sendo 13PCD e 12 Gardens) - 54 vagas (Sendo 1 PCD, 29 Comum e 24 de moto)				
módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	02 Blocos (T+4)	148Uh (Sendo 03PCD e 06 Gardens)	54 vagas de carro (Sendo 1 PCD, 29 Comum e 24 Moto)	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 01 a Praça de chegada, Play Baby, Play Kids, Churrasqueira Gourmet com banheiro e previsão de geladeira, Salão de festas, Fitness externo, demais lazeres, não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas
Módulo 02	02 Blocos (T+4)	138Uh (Sendo 06PCD)	-	Dos Lazeres, esta contemplado no módulo 02 o Play Pet
Módulo 03	02 Blocos (T+4)	128Uh (Sendo 04PCD e 06 Gardens)	-	-

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Condições do Negócio

- **VALOR DO NEGÓCIO – R$ 5.000.000,00**

- R$ 2.500.000,00 (50% em permuta financeira – mínimo garantido) representados pela fração de 2,96% do VGV líquido, corrigido pelo IPCA divulgado em março/24.
- R$ 500.000,00, 0,59% do VGV, pago após a assinatura da PCV (ago24), sem correção.
- R$ 1.000.000,00, a ser pago em até 5 dias úteis após a assinatura da ECV, corrigido pelo IPCA divulgado em março/24 (2 meses antes da assinatura).
- R$ 1.000.000,00, a ser pago em 15 parcelas iguais mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no mês subsequente a assinatura da ECV, corrigido pelo IPCA divulgado em março/24.
- Previsão de devolução do sinal caso não consigamos aprovar o projeto ou efetivar a ECV, sendo o próprio terreno como garantia da devolução.
- OBS* Escritura de 100% do terreno, com devolução de pequena fração invadida após o parcelamento. Decisão tomada em conjunto com Leg e Jur para acelerarmos a esteira de lançamento do projeto.
- OBS**O imóvel encontra-se atualmente ocupado a título de comodato, com previsão de encerramento em 27/09/2025. Contudo, como a escritura será celebrada antes dessa data, os ocupantes serão notificados para desocupação no prazo de até 30 (trinta) dias, conforme previsto no contrato de comodato (no qual a Tenda é anuente). Será, ainda, celebrado aditivo contratual ao comodato para formalizar o novo prazo de desocupação. Na escritura, constará cláusula de retenção do preço, a ser aplicada caso o imóvel não seja desocupado dentro do prazo estabelecido

- **PRAZOS CONTRATUAIS**

- PCV válida até set/25.

- **GARANTIAS**

- Para Vendedores: aval CONSTRUTORA TENDA;
- Para Tenda: n/a.

- **CORRETAGEM**

- 5% do valor da ECV em favor da MR3 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, a ser pago em até 30 dias após a assinatura da ECV.

CONDIÇÕES RESOLUTIVAS:

a. Due Diligence – Ok.
b. Aprovação Urbanismo e Meio Ambiente – Urbanismo tecnicamente aprovado, aguardando drenagem; Meio ambiente ok;
c. Aprovação Concessionárias – Aguardando LO.
d. Risco Ambiental – OK.
e. Retificação de Metragens – N/A
f. Contratação junto a instituição financeira – Protocolo LAE em andamento (prevista para final de junho);
g. Aquisição de outorga – N/A
h. Aprovação de Projeto de drenagem – OK;
i. Viabilidade Técnica e Financeira do Empreendimento – OK;
j. Transição do imóvel de caráter rural para urbano – OK;
k. Aprovação de projeto imobiliário nos exatos moldes pretendidos pela Tenda – Tecnicamente aprovado, aguardando drenagem e LO.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Posse – definitiva na ECV do imóvel.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Custo de Construção

	BOSQUE JACAREPAGUÁ | REV01	BOSQUE JACAREPAGUÁ | REV00	LVS JARDIM PEÔNIA	BOSQUE JACAREPAGUÁ BP25
Torres	6	6	25	6
Unidades Construídas	420	420	500	420
Unidades Vendidas	414	414	500	414
Total Unidades Vendidas	414	414	500	414
Condomínios (qta.)	1	1	1	1
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	RJ C-5.0	F2 MODULAR
Tipologia	1 Torre | T+04 | 10PP	1 Torre | T+04 | 10PP	T+4 | 4 PP	1 Torre | T+04 | 10PP
Tipologia	3 Torre | T+04 | 14PP	3 Torre | T+04 | 14PP	-	3 Torre | T+04 | 14PP
Tipologia	2 Torre | T+04 | 16PP	2 Torre | T+04 | 16PP	-	2 Torre | T+04 | 16PP
Projeto Infra	AP	AP	-	AP
Projeto Torre	AP	AP	-	AP
Mês Base	abril-25	abril-25	-	agosto-24
Incc	1.178,386	1.178,386	-	1.134,775
LVS	março-25	março-25	-	-
Indiretos	março-25	março-25	-	-
Base de Preço	LPU 89	LPU 89	-	-
Takt	2+2	2+2	2+2	2+2
Prazo (mês)	12	14	14	14
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 87.674	R$ / UND R$ 88.617	R$ / UND R$ 84.040	R$ / UND R$ 88.209
Indireto	R$ 16.599	R$ 17.203	R$ 16.194	R$ 17.826
Torre	R$ 41.665	R$ 42.005	R$ 41.556	R$ 42.203
Infra	R$ 17.612	R$ 17.612	R$ 18.673	R$ 19.950
Fundação	R$ 5.464	R$ 5.464	R$ 5.295	R$ 6.039
EEE			R$ 265	
ETE			R$ 1.086	
Contenção	R$ 1.774	R$ 1.774	R$ 200	R$ 559
Terraplenagem	R$ 4.560	R$ 4.560	R$ 771	R$ 1.632
CUSTO TOTAL II	R$ 1.349	R$ 1.349	R$ 5.439	R$ 1.688
Urbanização			R$ 4.542	
Drenagem	R$ 1.035	R$ 1.035		R$ 1.688
Extensão de Rede Elétrica	R$ 121	R$ 121		
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 193	R$ 193	R$ 897	
CUSTO TOTAL III				
Incorridos				
CUSTO TOTAL IV				
Aprendizado				
CUSTO TOTAL V				R$ 3.455
Atualização por INCC				R$ 3.455
CUSTO TOTAL I+II	R$ 89.023	R$ 89.966	R$ 89.479	R$ 89.897
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 89.023	R$ 89.966	R$ 89.479	R$ 93.352

Custo de Construção

	BOSQUE JACAREPAGUÁ | REV01	BOSQUE JACAREPAGUÁ BP25	
Torres	6	6	
Unidades Construídas	420	420	
Unidades Vendidas	414	414	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	
Tipologia	1 Torre | T+04 | 10PP	1 Torre | T+04 | 10PP	
Tipologia	3 Torre | T+04 | 14PP	3 Torre | T+04 | 14PP	
Tipologia	2 Torre | T+04 | 16PP	2 Torre | T+04 | 16PP	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	abril-25	agosto-24	
Incc	1178,386	1134,775	
LVS	março-25	-	
Indiretos	março-25	-	
Base de Preço	LPU 89	-	
Takt	2+2	2+2	
Prazo (mês)	12	14	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 87.674	R$ / UND R$ 88.209	DIF -R$ 535
Indireto	R$ 16.599	R$ 17.826	-R$ 1.227
Torre	R$ 41.665	R$ 42.203	-R$ 538
Infra	R$ 17.612	R$ 19.950	-R$ 2.338
Fundação	R$ 5.464	R$ 6.039	-R$ 576
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 1.774	R$ 559	R$ 1.215
Terrapplenagem	R$ 4.560	R$ 1.632	R$ 2.928
CUSTO TOTAL II	R$ 1.349	R$ 1.688	-R$ 339
Urbanização	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Drenagem	R$ 1.035	R$ 1.688	-R$ 653
Extensão de Rede Eletrica	R$ 121	R$ 0	R$ 121
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 193	R$ 0	R$ 193
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 3.455	-R$ 3.455
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 3.455	-R$ 3.455
CUSTO TOTAL	R$ 89.023	R$ 93.352	-R$ 4.329

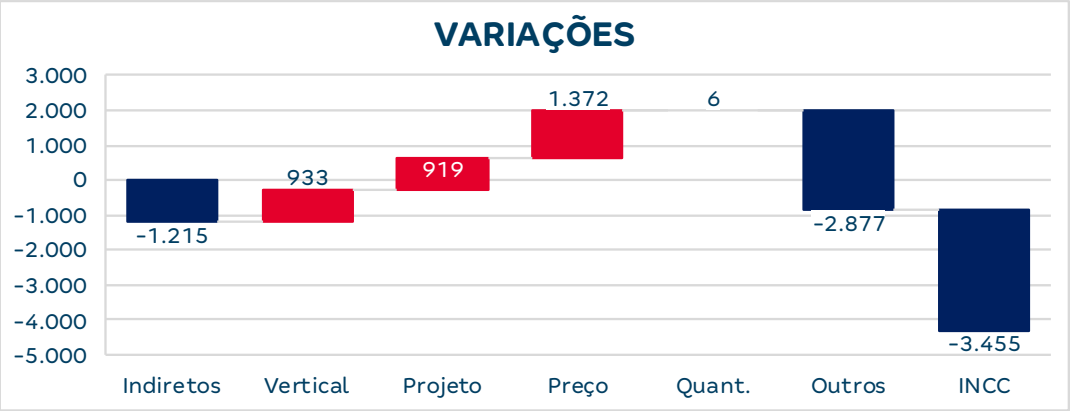

INDIRETOS
-1215 | Redução de prazo de 2 meses.

VERTICAL
+933 | Plano de carreira vertical e Dissidio.

PROJETO
+158 | Vaga em U
+492 | G77 – Anexos (Rebaixamento de Lençol freático | Acréscimo de anexos)
+1214 | G27 – Contenção (Muro de impacto)
+2316| G25 – Preparo do Terreno (Acréscimo de troca de solo da fundação)
-136 | G36 – Estrutura de Concreto (Mudança para 20mpa)
-209 | G65 – Esquadrias de ferro
-219 | G41 – Alvenaria de Vedação (Fechamento dos Fundos em Esquadria de ferro)
-1156 | G27 – Fundação (Troca de solo no grupo de terraplenagem)
-1665 | G74 – Reservatório Metálico (Anterior: 33.404,6Kg / Atual: 19.099,28Kg)

PREÇO
+612 | G25 – Preparo do Terreno
+580 | G27 - Fundação
+197 | G61 – Esquadria de Madeira
+520 | Infra Externa
-115 | G33 – Concreto
-132 | G32 – Armação
-203 | G39 – Gesso Acartonado

OUTROS
-271 | G45 – Cobertura (MO verticalizada)
-2664| Instalações
+859 | G73 – Instalações (Drenagem interna considerada no custo I)

INCC
-3455 | Incc

Custo de Construção

	BOSQUE JACAREPAGUÁ | REV01	BOSQUE JACAREPAGUÁ | REV00
Torres	6	6
Unidades Construídas	420	420
Unidades Vendidas	414	414
Total Unidades Vendidas	414	414
Condomínios (qta.)	1	1
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR
Tipologia	1 Torre | T+04 | 10PP	1 Torre | T+04 | 10PP
Tipologia	3 Torre | T+04 | 14PP	3 Torre | T+04 | 14PP
Tipologia	2 Torre | T+04 | 16PP	2 Torre | T+04 | 16PP
Projeto Infra	AP	AP
Projeto Torre	AP	AP
Mês Base	abril-25	abril-25
Incc	1178,386	1178,386
LVS	março-25	março-25
Indiretos	março-25	março-25
Base de Preço	LPU 89	LPU 89
Takt	2+2	2+2
Prazo (mês)	12	14
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 87.674	R$ / UND R$ 88.617	DIF -R$ 943
INDIRETO	R$ 16.599	R$ 17.203	-R$ 604
TORRE	R$ 41.665	R$ 42.005	-R$ 339
INFRA	R$ 17.612	R$ 17.612	R$ 0
FUNDAÇÃO	R$ 5.464	R$ 5.464	R$ 0
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CONTENÇÃO	R$ 1.774	R$ 1.774	R$ 0
TERRAPLENAGEM	R$ 4.560	R$ 4.560	R$ 0
CUSTO TOTAL II	R$ 1.349	R$ 1.349	R$ 0
VIÁRIO	R$ 0	R$ 0	R$ 0
DRENAGEM	R$ 1.035	R$ 1.035	R$ 0
EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	R$ 121	R$ 121	R$ 0
EXTENSÃO DE REDE HIDRÁULICA	R$ 193	R$ 193	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
INCORRIDOS	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
APRENDIZADO	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ATUALIZAÇÃO POR INCC	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL	R$ 89.023	R$ 89.966	-R$ 943

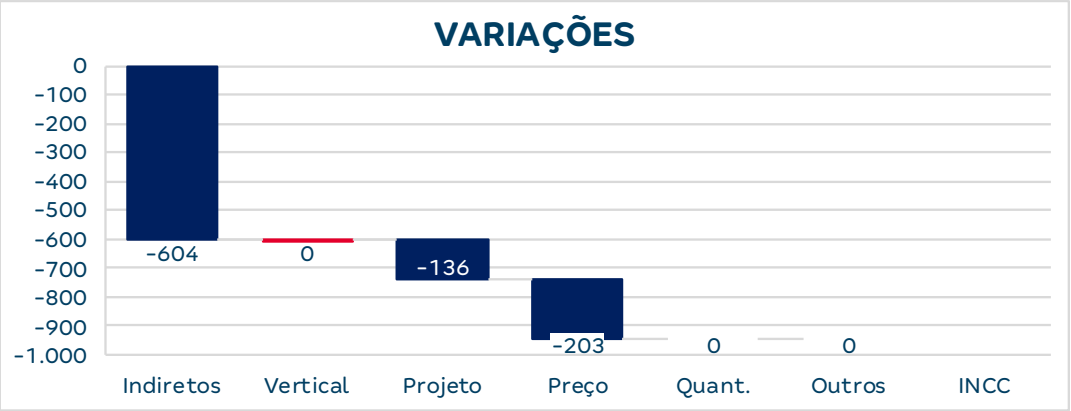

INDIRETOS
-604 | Redução de prazo de 2 meses.

PROJETO
-136 | G36 – Estrutura de Concreto
(Mudança para 20mpa)

PREÇO
-203 | G39 – Gesso Acartonado

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Viabilidade existente. Ligação na Rua Jordão.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Viabilidade existente. Ligação na Rua Jordão.

SISTEMA DE DRENAGEM
Considerado extensão de drenagem interna e FNA com 386m.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Viabilidade existente.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado calçada na frente do condomínio e Meio fio, conforme projeto.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	Nível 3
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida 06/24 com validade até 06/26.

Esgoto:
- Viabilidade emitida 06/24 com validade até 06/26.

Drenagem:
- Viabilidade emitida 06/24 com projeto disponibilizado.

Elétrica:
- Viabilidade emitida 04/25 e com validade de 60 dias.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado calçada na frente do condomínio.

Logística

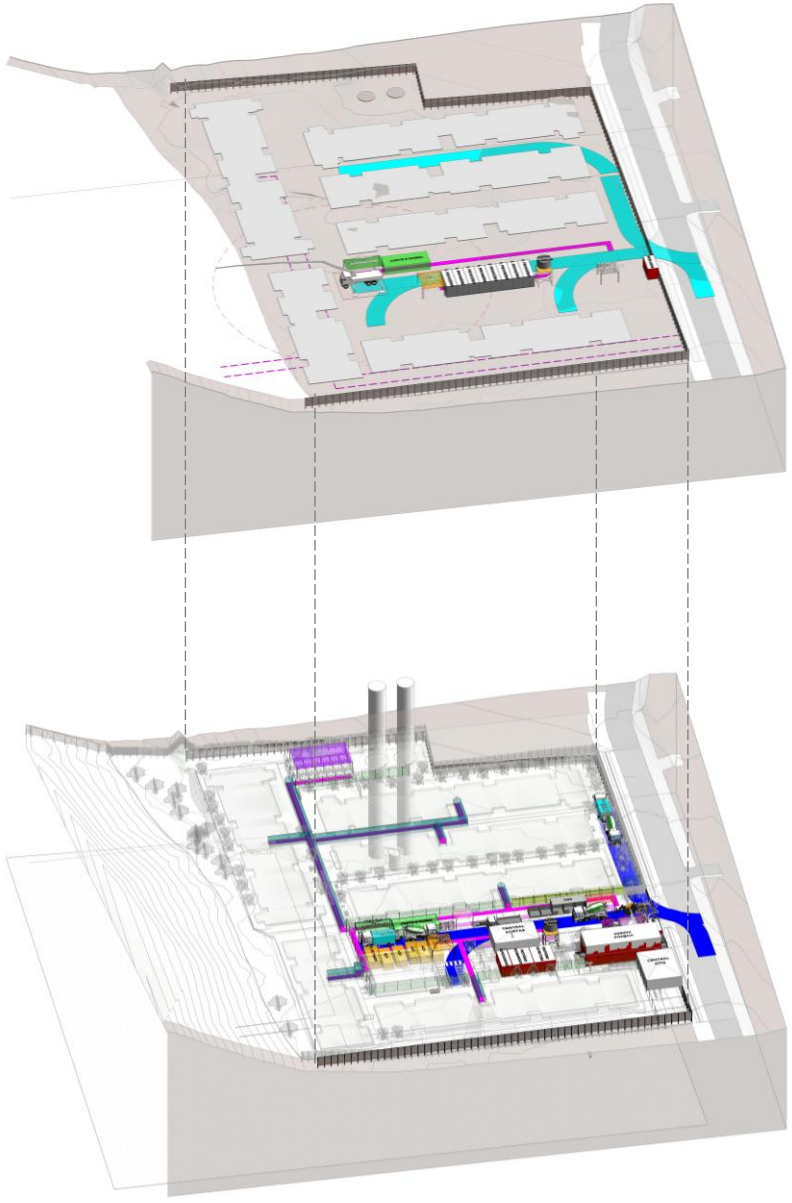

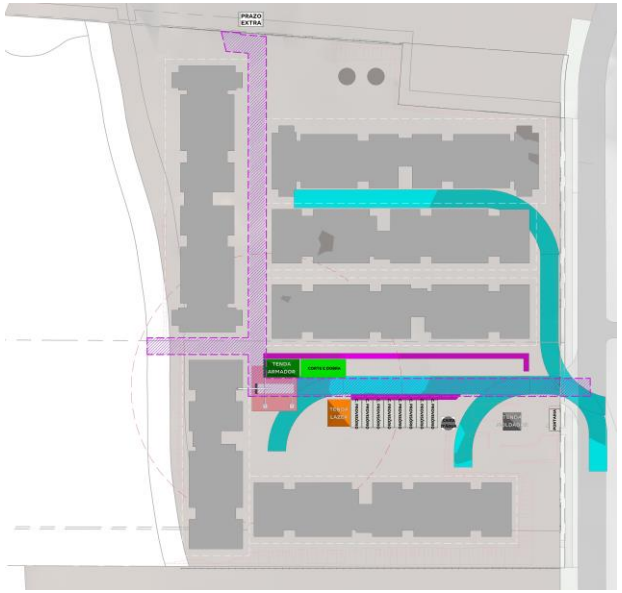

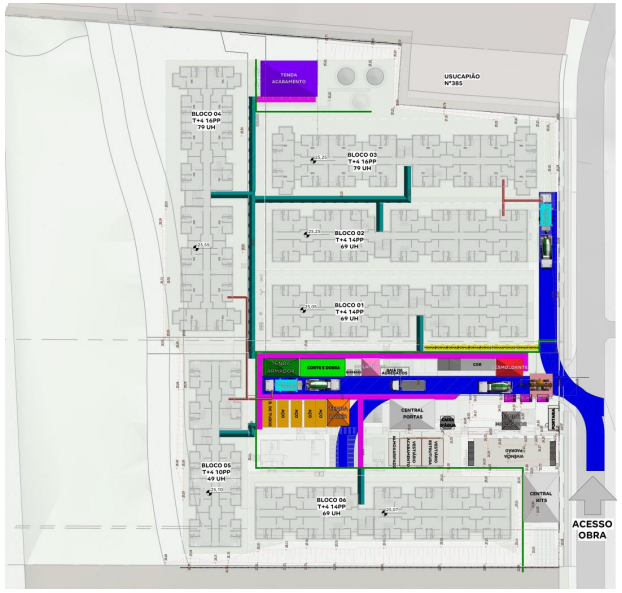

TENDAS_PERÍODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_DESMOLDANTE (LOG)	1	4,00	6,00	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_INFLAMÁVEIS (LOG)	1	4,00	4,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	8,00	12,66	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	8,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_TENDA CENTRAL DE RITS (LOG)	1	11,02	8,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	6,73	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA LAZER (LOG)	1	6,00	5,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA MOLDADOR (LOG)	1	4,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA

VIVÊNCIA - CONTAINERS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_CONTAINER ALMOXARIFADO (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_CONTAINER PORTARIA (LOG)	1 MÓDULO COM SANITÁRIO	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	CONSIDERAR A DEFINITIVA	CONSIDERAR A DEFINITIVA	UNICA
_TENDA_CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	8 MÓDULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	UNICA
_TENDA_CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG)	2 MÓDULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	-	-	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG)	2 MÓDULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	7 MÓDULOS DE CONTAINER EMBAIXO, 7 MÓDULOS EM CIMA	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_R01	VARIÁVEL	-	-	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_CAMINHÃO MUNK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR 1/2 PERÍODO DE ESTRUTURA	-	UNICA
_TENDA_SKYTRAK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	UNICA

Logística

BOSQUE JACAREPAGUÁ – RJ

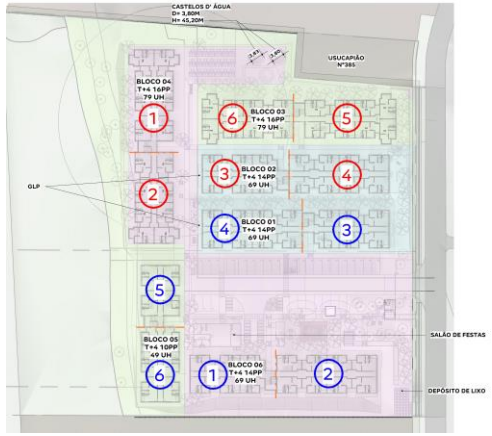

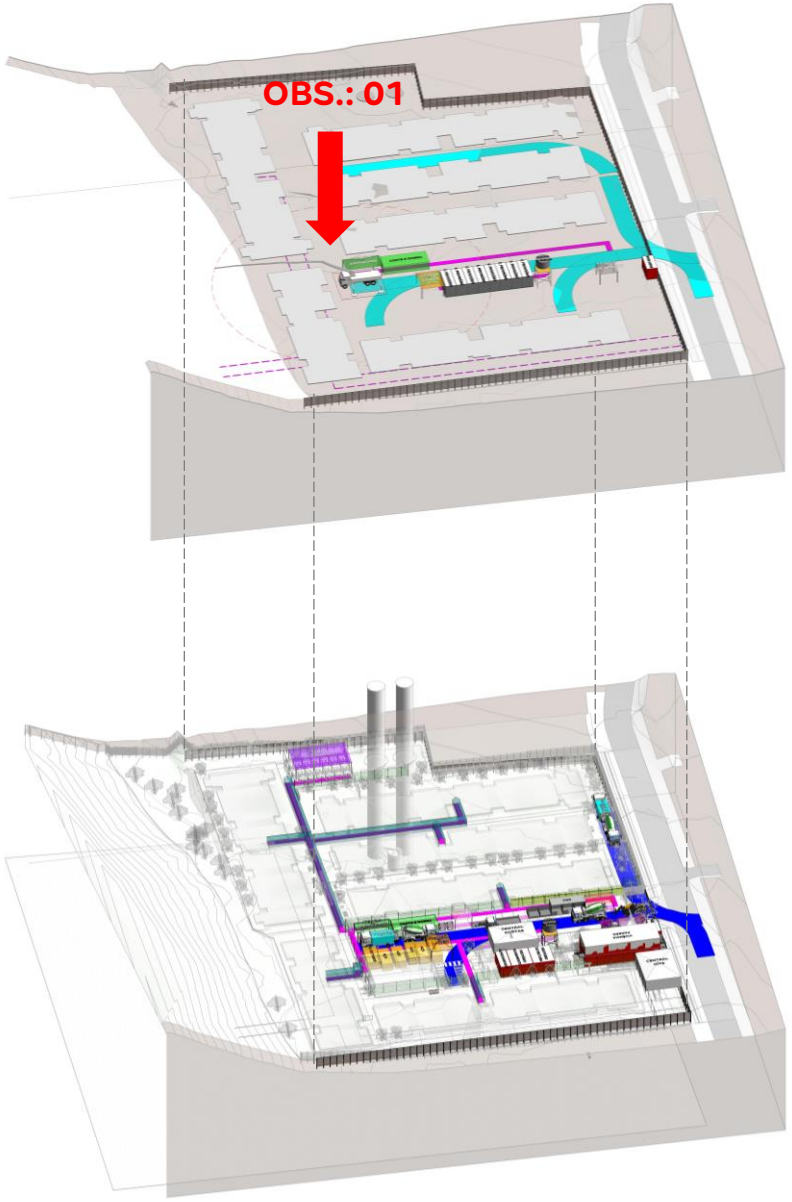

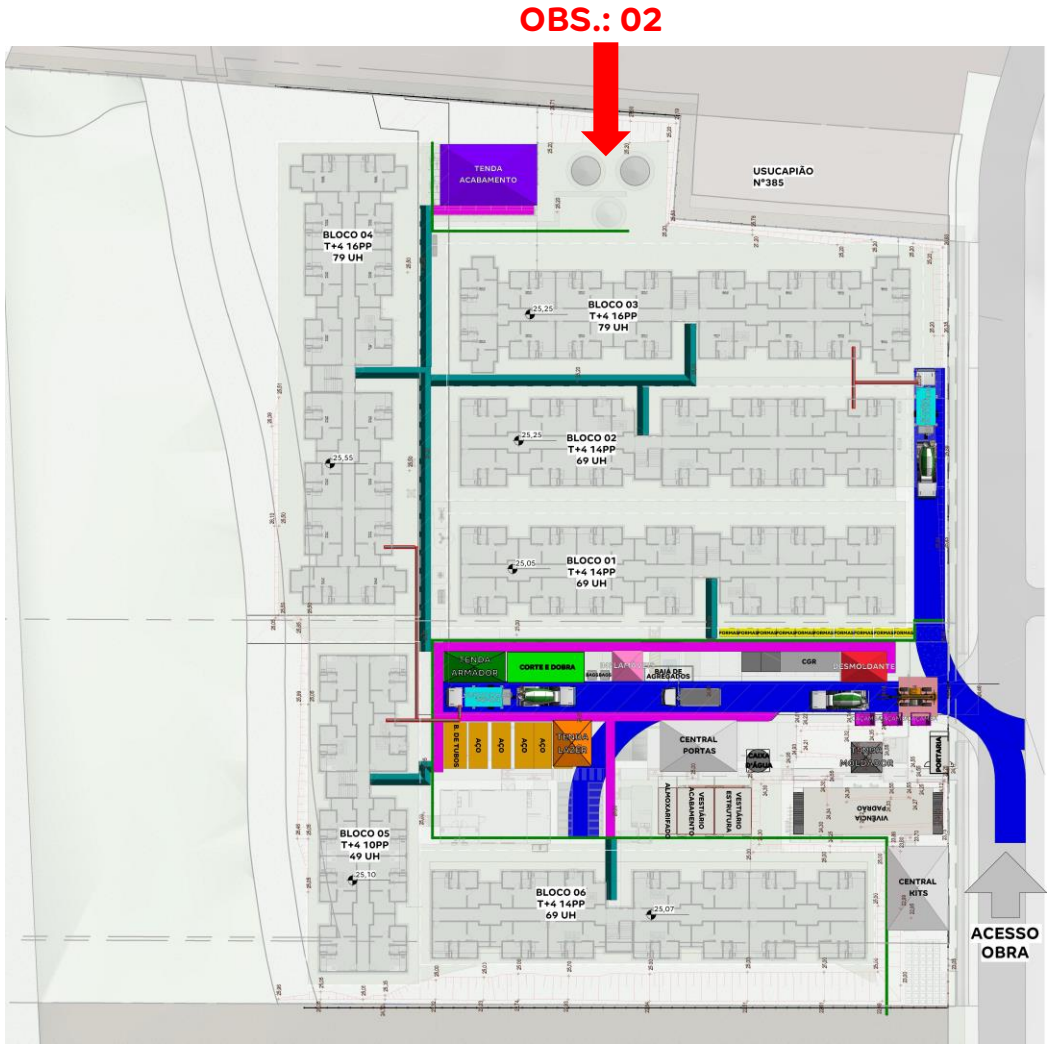

➢ **OBS. 01**	FNA DEVERÁ SER EXECUTADA NO INÍCIO DO PERÍODO DE PRÉ-FORMA, ANTES DE QUALQUER FUNDAÇÃO. PREVER PRAZO.
➢ **OBS. 02**	CASTELOS DEVERÃO SER IÇADOS NO INÍCIO DO PERÍODO DE PRÉ-FORMA, POIS FICARÃO ENCLAUSURADOS APÓS EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DAS TORRES.

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CUSTO PARA EQUIPE DE MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE MATERIAIS "FORMIGUINHAS" (2 FUNCIONÁRIOS ESTRUTURA E 2 FUNCIONÁRIOS ACABAMENTO), DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DE MAQUINÁRIOS AO LONGO DA IMPLANTAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO/DESCARGA DE MATERIAIS.
	PREVER CUSTO PARA PERDA DE CONCRETO DURANTE O PERÍODO DE ESTRUTURA COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA ESTACIONÁRIA PARA A CONCRETAGEM CONFORME INDICADO EM PROJETO, NECESSÁRIO DEVIDO À DISTÂNCIA ENTRE PONTO DE PATOLA E BLOCOS 2, 3,4 E 5.
	PREVER EM CUSTO O REAPROVEITAMENTO DO MURO EXISTENTE COMO TAPUME EXTERNO, PARA GANHO ECONÔMICO. PROSPECÇÃO NÃO DEVERÁ DEMOLI-LO.
	É OBRIGATÓRIA A INSTALAÇÃO DOS CASTELOS D'ÁGUA NA ETAPA DE PRÉ-FORMA PARA EVITAR SEU ENCLAUSURAMENTO.
➢ **PRAZO DE OBRA**	DEVIDO À COMPLEXIDADE DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO (FNA), O PERÍODO DE PRÉ-FORMA POSSÍVELMENTE TERÁ UM PRAZO MAIS LONGO QUE O PADRÃO.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Rio de Janeiro Oeste	RZO	50%	1.714	143	2.057	171

Empreendimento	Renda	Lançamento	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27
Soul Taquá I F1 - F2	4.094	mai-24	27	27	27	27	27	21																
Bosque Jacarepaguá	**3.117**	**jun-25**		**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**30**								
Soul Taquá II F1	4.094	jan-26									27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	16	
Soul Taquá II F2	4.094	fev-27																						27
Total de Vendas Lançados			**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**27**	**59**	**59**	**59**	**59**	**53**	**32**	**32**	**59**	**59**	**59**	**59**	**59**	**57**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**16**	**27**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Bosque Jacarepaguá | Mapa Concorrência

		Bosque Jacarepaguá	Conquista Florianópolis	Conquista Itanhaguá Green	My Jacarepaguá Life | Mood
		TENDA	Direcional	Direcional	Cury
	Distância Tenda (km)		2,13Km	4,93Km	3,54Km
Região 1 Km	População	24.999	37.351	36.083	43.203
	Dens. Demográfica	7.996	11.966	11.560	13.841
	Renda (R$)	6.906	8.259	16.044	7.238
	Classe Social	B1 (8.1k a 16k)	B1 (8.1k a 16k)	A++ (Maior que 28k)	B1 (8.1k a 16k)
	PEA Dia	15.580	20.353	41.184	28.433
Quantitativo	Lançamento	jun/25	dez/23	12/2023	10/2023
	Unidades	414	280	280	940
	Estoque	414	74	143	69
	VSO	32	12	8	46
	Stockout	13	6	18	2
Qualitativo	Condomínios	1	1	1	1
	Torres	6	5	2	6
	Gabarito	T+4	T+4	T+4	T+4
	Plantas (m²)	34,5m²	56,4m² e 56,4m² e 36m² e 43,9m² e 56,4m² e 54,92m² e 37,07m²	43,92m² e 43,92m² e 41,19m² e 52,05m² e 41,2m² e 50,18m² e 41,19m²	84m² e 53,25m² e 92m² e 92m² e 67m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Garden	Garden	Garden	Garden
	Dif. Entrega	Não	Equipado e Decorado	Equipado e Decorado	Equipado e Decorado
	Vagas	7% de Vagas	24% Com vaga	31% Com vaga	Com vaga
	Lazer	Praça de chegada, Praça das Palmeiras, Salão de festas com churrasqueira, Espaço Cultivo, Churrasqueira Gourmet, Play Kids, Play Baby, Play Pet, Fitness Externo.	Tem Garden, Bosque, Espaço Gourmet, Piscina, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Quadra, Quadra de Tênis, Salão de Jogos, Sauna Seca,	Tem Garden, Agua Aquecida a Gas, Bosque, Cinema, Fireplace, Piscina, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Quadra, Salão de Jogos,	Tem Garden, Agua Aquecida a Gas, Bosque, Cinema, Piscina, Praça, Quadra de Tênis, Salão de Jogos,

Diagnóstico Concorrência

- Os concorrentes mapeados possuem target de preço e renda acima do previsto para o Bosque Jacarepaguá.

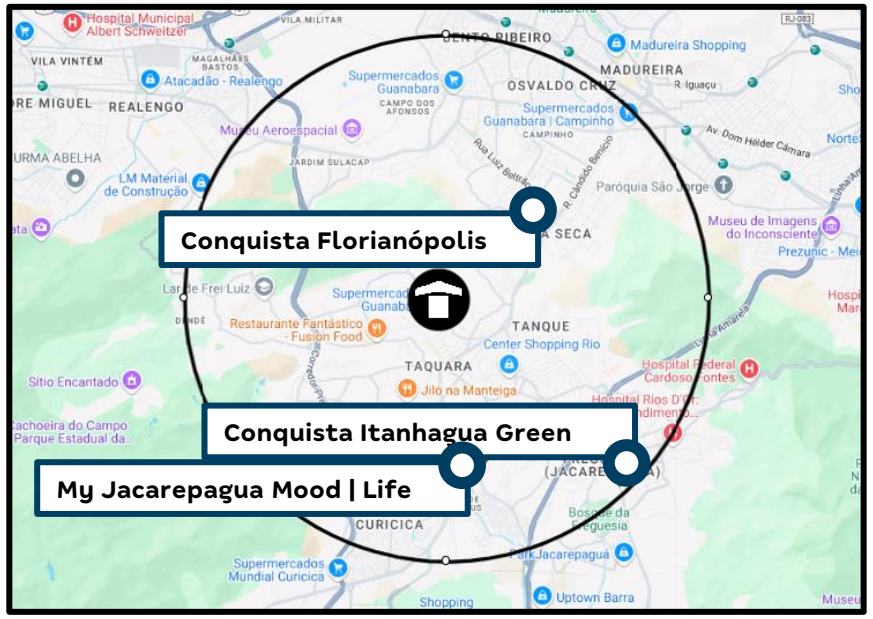

Tipologias	Empreendimento	Bosque Jacarepaguá			Conquista Florianópolis			Conquista Itanhanguá Green			My Jacarepaguá Life | Mood		
	Tipologia	Sem vaga	Com vaga	Garden c/vaga	Sem vaga	Com vaga	Garden c/vaga	Sem vaga	Com vaga	Garden c/vaga	Sem vaga	Com vaga	Garden c/vaga
	Preço Nominal	205.663	219.090	253.349	224.320	268.844	304.790	259.777	278.163	313.277	218.018	264.429	342.734
	CEF	167.061	177.752	207.223	179.456	215.075	243.832	207.822	222.530	250.622	174.414	211.543	274.187
	Renda	3.049	3.498	4.748	3.395	4.839	5.479	4.325	5.009	5.629	3.441	5.025	6.488
	Valor m²	-	-	**4.409**	-	-	**5.792**	-	-	**6.237**	-	-	**5.788**
	Dif Renda				346	1.341	731	1.276	1.511	881	392	1.527	1.740
	Farol de Factibilidade				●	●	●	●	●	●	●	●	●

Farol Renda

- Acima de 300
- Entre 0 e 300
- Abaixo de 0

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Bosque Jacarepaguá			
Tipo:	**Sem vaga**		**Sem vaga**	
Método	**Ref - Soul Taquá**		**Vision**	
Avaliação	210.000		210.000	
Renda Inicial (VF)	3.946		3.199	
Renda Final*	-		3.049	
% RET1	0%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,79	3.034	0,84	2.607
FGTS	0,52	1.980	0,67	2.076
Financiamento	99,44%	161.838	97,93%	159.111
Subsídio	166,36%	3.398	111,76%	5.875
Prazo de Pró-soluto	17	17	17	17
Pró-Soluto	56,17%	13.691	69,79%	13.790
Preço Raso (RS)	183.941	183.941	183.457	183.457
TCD	48,99%	19.486	68,87%	22.206
VSO	28	28	28	28
Preço de Venda	**209.906**	**209.906**	**212.213**	**212.213**
Elasticidade	-3,086%	-3,086%	-3,086%	-3,086%
Preço de Venda Final	**203.427**	**203.427**	**205.663**	**205.663**
Preço Raso (R$)	**183.941**		**183.457**	
% de Raso	**90,42%**		**89,20%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**181.915**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**187.167**	

O preço de referência foi simulado com base na avaliação do Bosque, e o valor praticado pelo projeto está detalhado na tabela do slide Análise de Preço

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Bosque Jacarepaguá			
Tipo:	**Com vaga**		**Com vaga**	
Método	**Ref - Soul Taquá**		**Vision**	
Avaliação	220.000		220.000	
Renda Inicial (VF)	6.053		3.598	
Renda Final*	-		3.498	
% RET1	0%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,09	6.368	1,05	3.661
FGTS	1,30	7.636	1,24	4.320
Financiamento	99,40%	169.544	99,63%	169.945
Subsídio	0,00%	0	147,00%	3.487
Prazo de Pró-soluto	17	17	17	17
Pró-Soluto	39,62%	14.811	69,61%	15.470
Preço Raso (RS)	198.360	198.360	196.884	196.884
TCD	32,41%	19.775	61,23%	22.206
VSO	2	2	2	2
Preço de Venda	**225.083**	**225.083**	**226.068**	**226.068**
Elasticidade	-3,086%	-3,086%	-3,086%	-3,086%
Preço de Venda Final	**218.136**	**218.136**	**219.090**	**219.090**
Preço Raso (R$)	**198.360**		**196.884**	
% de Raso	**90,93%**		**89,86%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

O preço de referência foi simulado com base na avaliação do Bosque, e o valor praticado pelo projeto está detalhado na tabela do slide Análise de Preço

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Bosque Jacarepaguá			
Tipo:	**Com Garden**		**Com Garden e vaga**	
Método	**Vision**		**Vision**	
Avaliação	250.000		260.000	
Renda Inicial (VF)	4.398		5.058	
Renda Final*	-		4.748	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,02	4.340	1,17	5.714
FGTS	1,11	4.715	1,24	6.072
Financiamento	98,91%	185.459	99,79%	201.152
Subsídio	140,40%	1.853	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	17	17	17	17
Pró-Soluto	58,22%	15.816	58,27%	18.205
Preço Raso (RS)	212.183	212.183	231.143	231.143
TCD	50,09%	22.206	43,55%	22.206
VSO	1	1	1	1
Preço de Venda	**241.854**	**241.854**	**261.417**	**261.417**
Elasticidade	-3,086%	-3,086%	-3,086%	-3,086%
Preço de Venda Final	**234.389**	**234.389**	**253.349**	**253.349**
Preço Raso (R$)	**212.183**		**231.143**	
% de Raso	**90,53%**		**91,23%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Bosque Jacarepaguá
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	211.860
Renda Inicial (VF)	3.265
Renda Final*	3.117

Tipo:	VF	R$
Ato	0,86	2.735
FGTS	0,72	2.297
Financiamento	98,06%	160.704
Subsídio	112,52%	5.599
Prazo de Pró-soluto	17	17
Pró-Soluto	69,45%	13.977
Preço Raso (RS)	185.311	185.311
TCD	67,80%	22.206
VSO	32	32
Preço de Venda	**213.922**	**213.922**
Elasticidade	-3,086%	-3,086%
Preço de Venda Final	**207.517**	**207.517**
Preço Raso (R$)	**185.311**	
% de Raso	**89,30%**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o Preço Vision, visto que, projetos da regional capturam rendas equivalentes à estimada pelo Vision. A diferença de valor do Garden, foi determinada com base no benchmark de mercado, utilizando como referência os empreendimentos das concorrências.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes da região vendem em um target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda.

	Preço Real					Preço Normalizado (17m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Soul Taquá	**251.479**	**203.687**	**4.094**	**27**	**8**	**9.196**	**212.883**
Bosque Jacarepaguá	**211.860**	**185.311**	**3.117**	**32**	**17**	**-**	**185.311**

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Informações Gerais – Consolidado

Bosque JPA – RJ – Rio de Janeiro Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	jun-24							
Bosque JPA s/ vaga		jun-25	dez-25	dez-26	6 meses	12 meses	jun-28	36 meses
Bosque JPA c/ vaga		jun-25	dez-25	dez-26	6 meses	12 meses	jun-28	36 meses
Bosque JPA c/ garden		jun-25	dez-25	dez-26	6 meses	12 meses	jun-28	36 meses
Bosque JPA c/ garden c/ vaga		jun-25	dez-25	dez-26	6 meses	12 meses	jun-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	5,00 MM	**Incorrido Terreno:** 0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	42.546 m²	**Área Líquida do Terreno:** 10.267 m²
Cash:	2,50 MM		**Custo de terreno m²:**	117,5	**Custo de terreno m² Área Líquida:** 487,0
Permuta Financeira:	2,50 MM (2,91%)		**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 5,8% / 48,7%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.** 1,3 / 0,4
Ato / %VGV:	0,50 MM / 0,6%		**Incorrido de Construção:**	0,50 MM	**Incorridos de Incorporação:** 0,39 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Bosque JPA s/ vaga	T+4	183.457	379	205.663	210.000	97,9%	69,8%	68,9%
Bosque JPA c/ vaga	T+4	196.884	23	219.090	220.000	99,6%	69,6%	61,2%
Bosque JPA c/ garden	T+4	212.183	6	234.389	250.000	98,9%	58,2%	50,1%
Bosque JPA c/ garden c/ vaga	T+4	231.143	6	253.349	260.000	99,8%	58,3%	43,6%

Unidades Totais:	414	**Preço Médio:**	207.517	**Renda Média:**	3.265	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.023
Unidades Tenda:	414	**Avaliação Média:**	211.860	**Ato:**	2.807 (0,86 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.307
VSO:	32 Unidades	**VGV Total:**	85.911.946	**FGTS:**	2.337 (0,72 Salários)	**Preço Raso Médio:**	185.311
RET Médio:	2,6%	**VGV Tenda:**	85.911.946	**% em RET 1%:**	47%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	1.391

Construção

Custo Total Unit.:	89.023	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	34,50	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**13.526.814**	**LI:**	**20,42%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**14.651.692**	**Margem Bruta Econômica:**	**38,78%**
TIR:	**119,93%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(13.767.112)**	**Margem Bruta REF:**	**41,32%**
Exposição de Caixa:	**16,97%**	**Δ LI:**	**0,42%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**19.286.713**	**Margem Rasa Econômica:**	**30,82%**
Payback Contingente (21 m):	**15 m/ (-6 m)**	**LI Marginal:**	**21,85%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**22.820.897**	**Margem Rasa REF:**	**34,29%**
Payback Consolidado:	**15 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**26,96%**

Informações Gerais – DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Bosque JPA		Bosque JPA s/ vaga		Bosque JPA c/ vaga		Bosque JPA c/ garden		Bosque JPA c/ garden c/ vaga	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	86.319	100,0%	78.293	100,0%	5.065	100,0%	1.423	100,0%	1.537	100,0%
PIS/COFINS	(1.227)	1,4%	(1.072)	1,4%	(90)	1,8%	(31)	2,2%	(34)	2,2%
Custo Total	(52.094)	61,2%	(47.548)	61,6%	(2.945)	59,2%	(806)	57,9%	(795)	52,9%
Custo Terreno	(8.263)	9,7%	(7.516)	9,7%	(477)	9,6%	(131)	9,4%	(139)	9,2%
Custo Relacionados a Terreno	(1.056)	1,2%	(964)	1,2%	(60)	1,2%	(16)	1,1%	(16)	1,1%
Custos de Incorporação	(2.482)	2,9%	(2.181)	2,8%	(170)	3,4%	(75)	5,4%	(56)	3,7%
Custo de Construção	(40.293)	47,4%	(36.887)	47,8%	(2.239)	45,0%	(584)	41,9%	(584)	38,8%
Lucro Bruto Econômico	32.998	38,8%	29.674	38,4%	2.030	40,8%	586	42,1%	708	47,1%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	32.998	38,8%	29.674	38,4%	2.030	40,8%	586	42,1%	708	47,1%
Despesas de Selling	(8.073)	9,5%	(7.341)	9,5%	(467)	9,4%	(128)	9,2%	(137)	9,1%
Contingência	(1.985)	2,3%	(1.801)	2,3%	(117)	2,3%	(33)	2,4%	(35)	2,4%
Margem de Contribuição	22.940	27,0%	20.532	26,6%	1.446	29,1%	425	30,5%	536	35,7%
IR e CSLL	(1.004)	1,2%	(877)	1,1%	(74)	1,5%	(26)	1,8%	(28)	1,8%
Margem Líquida	21.936	25,8%	19.655	25,5%	1.373	27,6%	400	28,7%	509	33,8%
Lucro Bruto REF Unit.	87.631	41,3%	86.021	40,9%	98.345	44,0%	110.958	46,7%	128.809	50,2%
Lucro Raso REF Unit.	64.944	34,3%	63.320	33,7%	75.706	37,7%	88.621	41,2%	106.496	45,5%

R$ Mil - VPL - Compra	Bosque JPA		Bosque JPA s/ vaga		Bosque JPA c/ vaga		Bosque JPA c/ garden		Bosque JPA c/ garden c/ vaga	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	66.228	100,0%	60.038	100,0%	3.871	100,0%	1.113	100,0%	1.207	100,0%
PIS/COFINS	(927)	1,4%	(809)	1,3%	(68)	1,8%	(24)	2,2%	(26)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(51.774)	78,2%	(47.177)	78,6%	(2.955)	76,3%	(821)	73,8%	(822)	68,1%
Custo Terreno	(6.198)	9,4%	(5.641)	9,4%	(356)	9,2%	(98)	8,8%	(103)	8,5%
Custo Relacionados a Terreno	(1.049)	1,6%	(958)	1,6%	(59)	1,5%	(16)	1,4%	(16)	1,3%
Custos de Incorporação	(2.333)	3,5%	(2.050)	3,4%	(159)	4,1%	(70)	6,3%	(54)	4,5%
Custo de Construção	(33.417)	50,5%	(30.592)	51,0%	(1.857)	48,0%	(484)	43,5%	(484)	40,1%
Despesas de Selling	(7.170)	10,8%	(6.503)	10,8%	(419)	10,8%	(120)	10,8%	(128)	10,6%
Contingência	(849)	1,3%	(770)	1,3%	(50)	1,3%	(14)	1,3%	(15)	1,3%
IR e CSLL	(759)	1,1%	(662)	1,1%	(55)	1,4%	(20)	1,8%	(21)	1,8%
Lucro Imobiliário	13.527	20,4%	12.052	20,1%	848	21,9%	267	24,0%	359	29,8%

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Compra	Anterior	Atual	Atual vs Anterior	Δ%
Data Estudo:	junho-24	maio-25	maio-25	0 Meses	N/A
Lançamento:	novembro-25	junho-25	junho-25	0 Meses	N/A
Uhs:	405	414	414	-	0,0%
Preço Nominal:	207.084	209.161	207.517	(1.644)	-0,8%
Preço Raso:	183.136	186.955	185.311	(1.644)	-0,9%
Preço Nominal Inflacionado:	225.107	213.902	212.221	(1.682)	-0,8%
Preço Raso Inflacionado:	199.074	191.215	189.534	(1.682)	-0,9%
Renda Média:	3.289	3.265	3.265	-	0,0%
VSO:	31	32	32	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	3.612	4.439	4.439	-	0,0%
Avaliação:	215.000	211.860	211.860	-	0,0%
Prazo construção F1:	14	14	12	(2)	-14,3%
Prazo de Pró-Soluto F1:	19	19	17	(2)	-10,5%
Custo Total Inf (Unit):	N/A	127.492	125.831	(1.660)	-1,3%
Custo Construção (Unit):	86.505	89.966	89.023	(943)	-1,0%
Custo Construção Corrigido:	N/A	89.966	89.023	(943)	-1,0%
Fração de construção:	41,8%	43,0%	42,9%	-0,1 p.p.	-0,3%
INCC Folha Rosto:	1.126,92	1.178,39	1.178,39	-	0,0%
Custo Terreno Inf:	5.392.315	8.273.659	8.263.401	(10.258)	-0,1%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	3.388	2.551	2.551	-	0,0%
Fração do Terreno[1]:	6,0% / 47,7%	5,8% / 48,8%	5,8% / 48,7%	0,0 p.p.	0,0%
Custo de Incorp. por uh:	N/A	6.034	5.994	(40)	-0,7%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	1.462.738	1.837.672	1.837.672	-	0,0%
Custo do Ciclo (Unit):	14.240	14.420	14.307	(113)	-0,8%
Lucro Imobiliário:	23,3%	20,1%	20,4%	0,3 p.p.	1,6%
LI Marginal:	N/A	21,5%	21,9%	0,3 p.p.	1,5%
Exposição de caixa:	14,3%	15,1%	17,0%	1,9 p.p.	12,7%
TIR:	110,7%	114,0%	119,9%	5,9 p.p.	5,2%
Margem Bruta Econômica:	40,8%	38,5%	38,8%	0,3 p.p.	0,7%
Margem Rasa Econômica:	32,7%	30,5%	30,8%	0,3 p.p.	0,9%
Margem Contribuição Econômica:	31,4%	26,7%	27,0%	0,2 p.p.	0,9%
Payback Contingente (Régua 21 m):	15 m/ (-5 m)	16 m/ (-5 m)	15 m/ (-6 m)	-1	-6,3%
Payback Consolidado:	15 Meses	16 Meses	15 Meses	-1 Meses	-6,3%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Anexo

One Page – Bosque Jacarepaguá

[1]

Cidade	Rio de Janeiro	**Mancha de demanda**	RJ - - Jacarepaguá
Regional	RJ	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura	**Versão da VF**	Versão 1.0: Mai

[2]

Unidades (% Vagas)	414 (13%)	**CA Máx | Proj**	1,3 | 0,4
Tipologia	F2 - Concreto	**Escritura**	mai-25
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	jun/25 | 20

[3]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	5.000 (5,8%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	2.500 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	2,9% (50,0%)
Valor R$/m²	487	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[4]

Custo Construção (%VGV)	37.246 (43,0%)	**Indireto Unit.**	17.203
Prazo da Obra (meses)	14	**Torre Unit.**	42.005
Custo Total Unit. (LPU):	89.966 (89)	**Infra Unit.**	17.612
Início de Obra	dez-25	**Fundação Unit.**	5.464

[5]

Preço Nominal Unit.	209.161	**VSO**	32
Preço Raso Unit.	186.955	**Referência**	VISION
Avaliação Unit.	211.860	**Renda (% em RET 1%)**	3.265 (47,2%)



[6]

LI (Régua):	**20,1% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	38,5%
LI Marginal:	21,5%	**Margem Rasa Econômica:**	30,5%
Margem Bruta REF:	41,0%	**Margem Contribuição Econômica:**	26,7%
Margem Rasa REF:	**34,0%**	**Exposição (% VGV):**	13.122 (15,1%)
TIR:	114,0%	**VGV Total:**	86.593
Payback Contingente (21 m) :	**16 m/ (-5 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(11.004)
Payback Consolidado:	16	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	19.162

Destaques

[1] Imóvel fica localizado na mancha RZO7, no bairro do Tanque, em Jacarepaguá, a 300m da esquina com a Est. Do Cafundá, onde se encontra supermercado, grande oferta de comércio e transporte.

[2] Conseguimos um ganho de 9 unidades em relação ao comitê de investimento e inserimos unidades com garden no produto.

[3] R$ 5.000.000,00, sendo R$ 2.500.000,00 em permuta financeira, representados por 3% do VGV e R$ 2.500.000,00 em cash. A parte em cash ficou distribuída em um sinal de R$ 500k (0,59% do VGV), pago em ago/24 na PCV e o saldo de R$ 2 MM serão pagos com R$ 1 MM na assinatura da ECV (descontados débitos de IPTU) e R$ 1 MM em 15 parcelas mensais e sucessivas após assinatura da ECV.

[4] Custo de parametrização utilizando quantitativo do anteprojeto. Para o comitê de lançamento, teremos o pré orçamento considerando o EP finalizado.

[5] Avaliação em andamento na Caixa, consideramos o valor solicitado. Ideia é que seja o produto combate da ZO7

[6] Projeto apresenta resultados financeiros dentro das réguas da companhia.

Custo de Construção

	BOSQUE JACAREPAGUÁ | REV00	LVS JARDIM PEÔNIA	BOSQUE JACAREPAGUÁ BP25
Torres	6	25	6
Unidades Construídas	420	500	420
Unidades Vendidas	414	500	414
Total Unidades Vendidas	414	500	414
Condomínios (qta.)	1	1	1
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ
Produto / Selo	F2 MODULAR	RJ C-5.0	F2 MODULAR
Tipologia	1 Torre | T+04 | 10PP	T+4 | 4 PP	1 Torre | T+04 | 10PP
Tipologia	3 Torre | T+04 | 14PP	-	3 Torre | T+04 | 14PP
Tipologia	2 Torre | T+04 | 16PP	-	2 Torre | T+04 | 16PP
Projeto Infra	AP	-	AP
Projeto Torre	AP	-	AP
Mês Base	abril-25	-	agosto-24
Incc	1.178,386	-	1.134,775
LVS	março-25	-	-
Indiretos	março-25	-	-
Base de Preço	LPU 89	-	-
Takt	2+2	2+2	2+2
Prazo (mês)	14	14	14
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 88.617	R$ / UND R$ 84.040	R$ / UND R$ 88.209
Indireto	R$ 17.203	R$ 16.194	R$ 17.826
Torre	R$ 42.005	R$ 41.556	R$ 42.203
Infra	R$ 17.612	R$ 18.673	R$ 19.950
Fundação	R$ 5.464	R$ 5.295	R$ 6.039
EEE		R$ 265	
ETE		R$ 1.086	
Contenção	R$ 1.774	R$ 200	R$ 559
Terraplenagem	R$ 4.560	R$ 771	R$ 1.632
CUSTO TOTAL II	R$ 1.349	R$ 5.439	R$ 1.688
Urbanização		R$ 4.542	
Drenagem	R$ 1.035		R$ 1.688
Extensão de Rede Elétrica	R$ 121		
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 193	R$ 897	
CUSTO TOTAL III			
Incorridos			
CUSTO TOTAL IV			
Aprendizado			
CUSTO TOTAL V			R$ 3.455
Atualização por INCC			R$ 3.455
CUSTO TOTAL I+II	R$ 89.966	R$ 89.479	R$ 89.897
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 89.966	R$ 89.479	R$ 93.352

Custo de Construção

	BOSQUE JACAREPAGUÁ | REV00	BOSQUE JACAREPAGUÁ BP25	
Torres	6	6	
Unidades Construídas	420	420	
Unidades Vendidas	414	414	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	
Tipologia	1 Torre | T+04 | 10PP	1 Torre | T+04 | 10PP	
Tipologia	3 Torre | T+04 | 14PP	3 Torre | T+04 | 14PP	
Tipologia	2 Torre | T+04 | 16PP	2 Torre | T+04 | 16PP	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	abril-25	agosto-24	
Incc	1178,386	1134,775	
LVS	março-25	-	
Indiretos	março-25	-	
Base de Preço	LPU 89	-	
Takt	2+2	2+2	
Prazo (mês)	14	14	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 88.617	R$ / UND R$ 88.209	DIF R$ 408
Indireto	R$ 17.203	R$ 17.826	-R$ 623
Torre	R$ 42.005	R$ 42.203	-R$ 199
Infra	R$ 17.612	R$ 19.950	-R$ 2.338
Fundação	R$ 5.464	R$ 6.039	-R$ 576
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 1.774	R$ 559	R$ 1.215
Terrapplenagem	R$ 4.560	R$ 1.632	R$ 2.928
CUSTO TOTAL II	R$ 1.349	R$ 1.688	-R$ 339
Urbanização	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Drenagem	R$ 1.035	R$ 1.688	-R$ 653
Extensão de Rede Eletrica	R$ 121	R$ 0	R$ 121
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 193	R$ 0	R$ 193
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 3.455	-R$ 3.455
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 3.455	-R$ 3.455
CUSTO TOTAL	R$ 89.966	R$ 93.352	-R$ 3.386

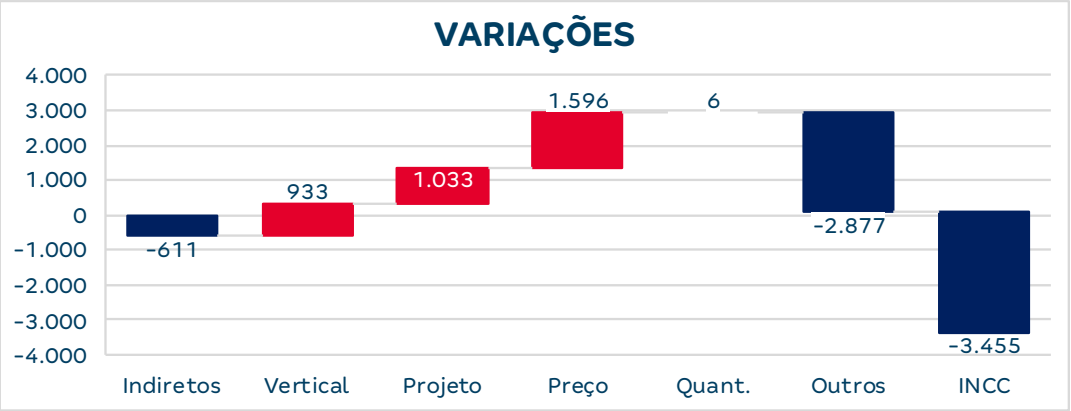

INDIRETOS
-611 | Retroalimentação

VERTICAL
+933 | Retroalimentação

PROJETO
+158 | Vaga em U
+492 | G77 – Anexos (Rebaixamento de Lençol freático | Acréscimo de anexos)
+1214 | G27 – Contenção (Muro de impacto)
+2316| G25 – Preparo do Terreno (Acréscimo de troca de solo da fundação)
-209 | G65 – Esquadrias de ferro
-219 | G41 – Alvenaria de Vedação (Fechamento dos Fundos em Esquadria de ferro)
-1156 | G27 – Fundação (Troca de solo no grupo de terraplenagem)
-1665 | G74 – Reservatório Metálico (Anterior: 33.404,6Kg / Atual: 19.099,28Kg)

PREÇO
+612 | G25 – Preparo do Terreno
+580 | G27 - Fundação
+197 | G61 – Esquadria de Madeira
+520 | Infra Externa
-115 | G33 – Concreto
-132 | G32 – Armação

OUTROS
-271 | G45 – Cobertura (MO verticalizada)
-2664| Instalações
+859 | G73 – Instalações (Drenagem interna considerada no custo I)

INCC
-3455 | Incc

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Viabilidade existente. Ligação na Rua Jordão.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Viabilidade existente. Ligação na Rua Jordão.

SISTEMA DE DRENAGEM
Considerado extensão de drenagem interna e FNA com 386m.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Viabilidade existente.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado calçada na frente do condomínio e Meio fio, conforme projeto.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	Nível 3
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida 06/24 com validade até 06/26.

Esgoto:
- Viabilidade emitida 06/24 com validade até 06/26.

Drenagem:
- Viabilidade emitida 06/24 com projeto disponibilizado.

Elétrica:
- Viabilidade emitida 04/25 e com validade de 60 dias.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado calçada na frente do condomínio.

Logística

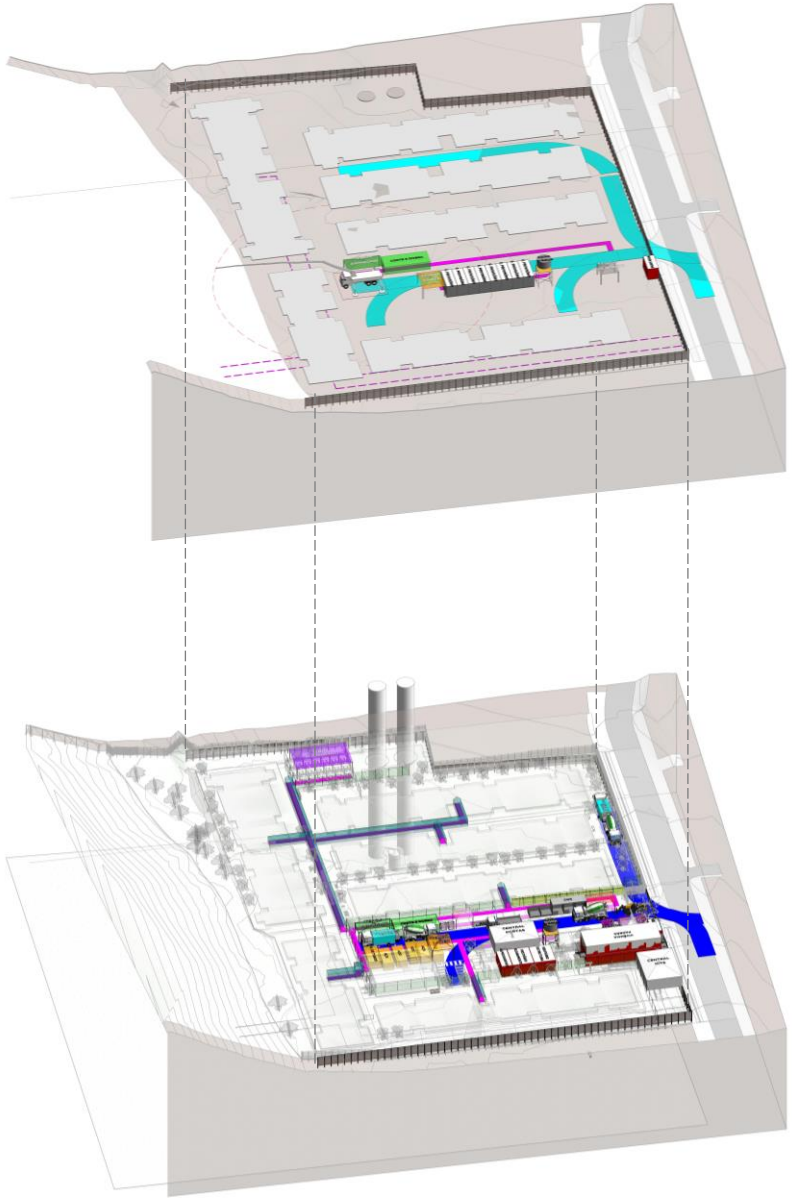

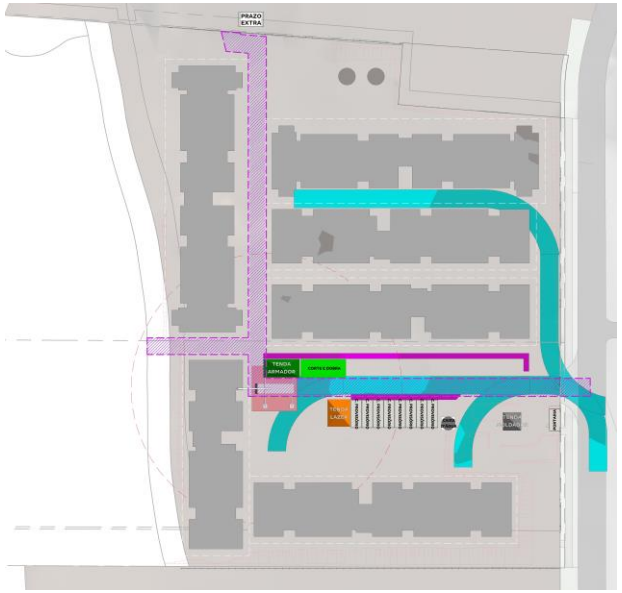

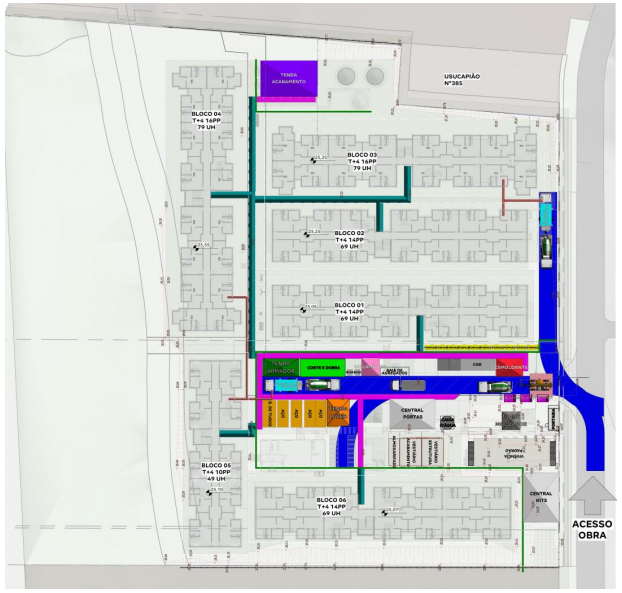

TENDAS_PERÍODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_DESMOLDANTE (LOG)	1	4,00	6,00	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_INFLAMÁVEIS (LOG)	1	4,00	4,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	8,00	12,66	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	8,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_TENDA CENTRAL DE RITS (LOG)	1	11,02	8,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	6,73	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA LAZER (LOG)	1	6,00	5,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA MOLDADOR (LOG)	1	4,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA

VIVÊNCIA - CONTAINERS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_CONTAINER ALMOXARIFADO (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_CONTAINER PORTARIA (LOG)	1 MÓDULO COM SANITÁRIO	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	CONSIDERAR A DEFINITIVA	CONSIDERAR A DEFINITIVA	UNICA
_TENDA_CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	8 MÓDULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	UNICA
_TENDA_CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG)	2 MÓDULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	-	-	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG)	2 MÓDULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	7 MÓDULOS DE CONTAINER EMBAIXO, 7 MÓDULOS EM CIMA	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_R01	VARIÁVEL	-	-	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_CAMINHÃO MUNK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR 1/2 PERÍODO DE ESTRUTURA	-	UNICA
_TENDA_SKYTRAK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	UNICA

Logística

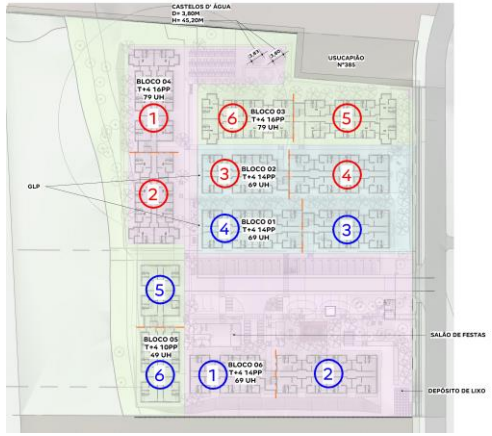

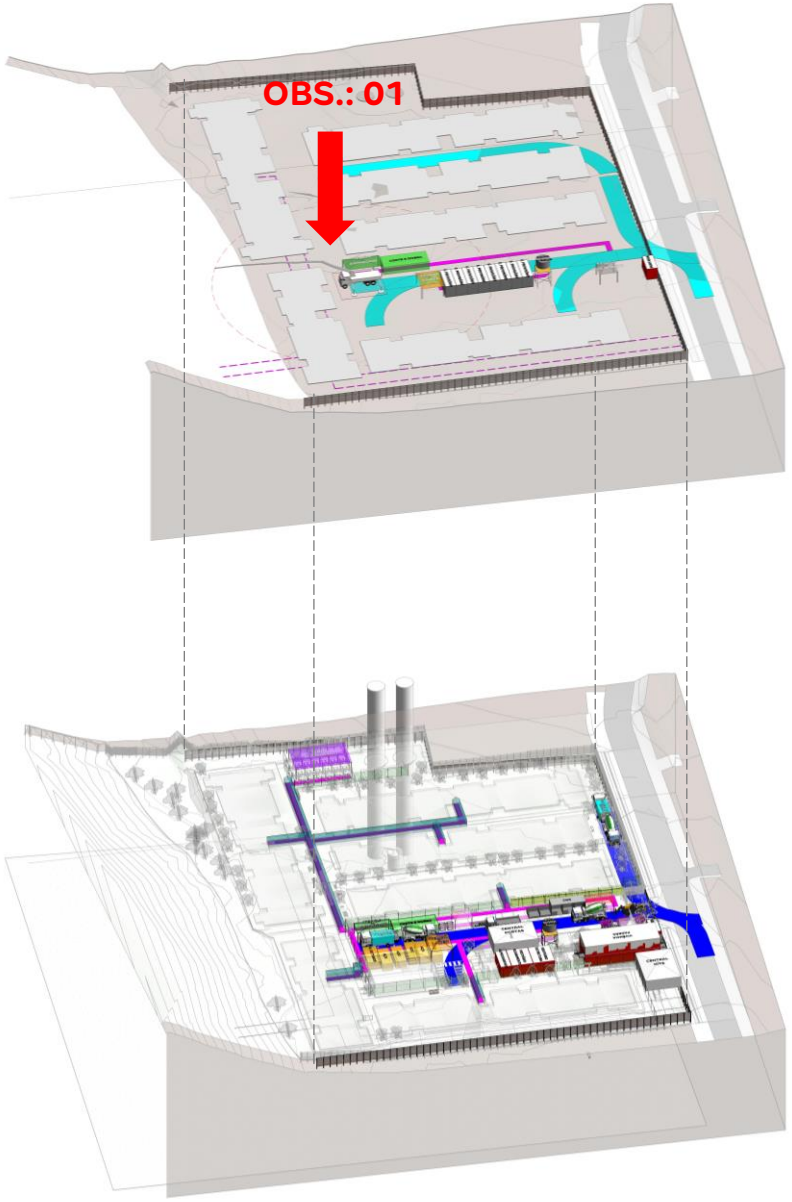

OBS.: 02

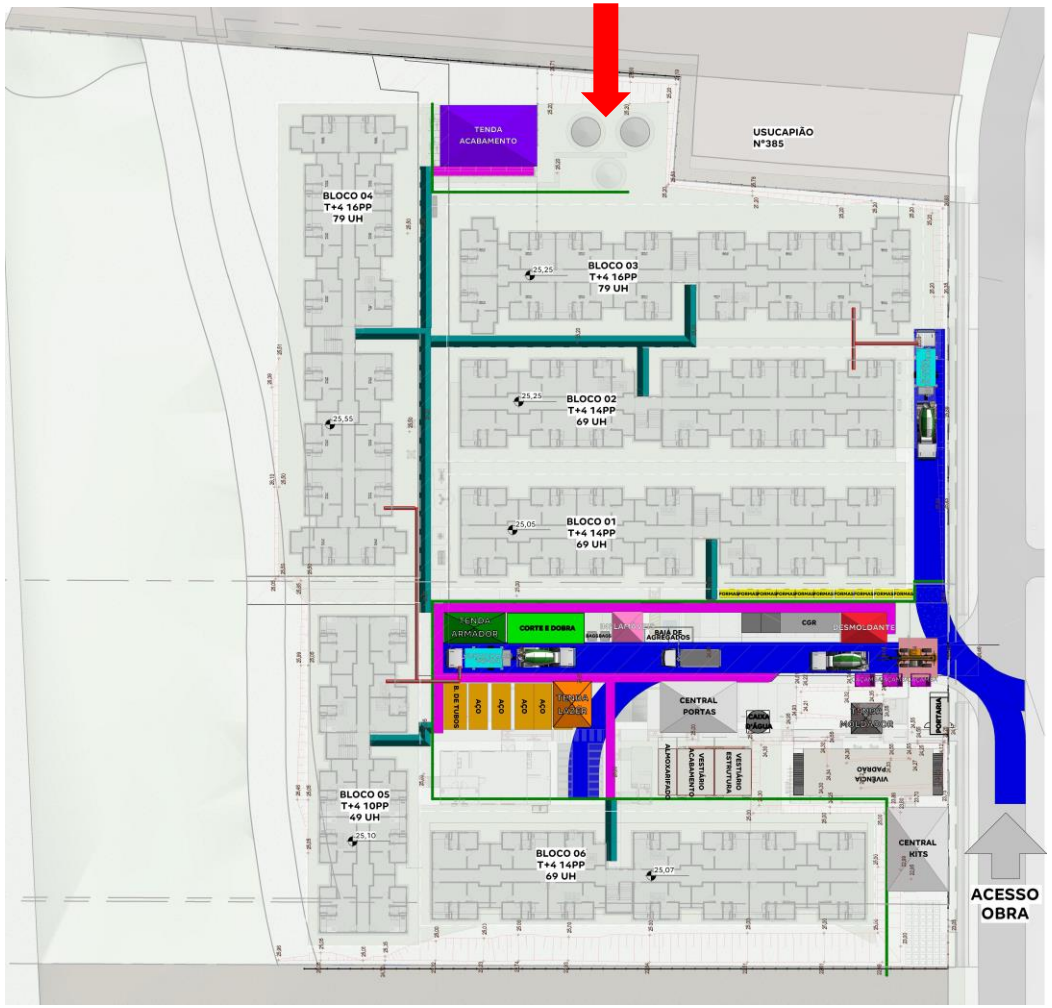

➢ **OBS. 01**	FNA DEVERÁ SER EXECUTADA NO INÍCIO DO PERÍODO DE PRÉ-FORMA, ANTES DE QUALQUER FUNDAÇÃO. PREVER PRAZO.
➢ **OBS. 02**	CASTELOS DEVERÃO SER IÇADOS NO INÍCIO DO PERÍODO DE PRÉ-FORMA, POIS FICARÃO ENCLAUSURADOS APÓS EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DAS TORRES.

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CUSTO PARA EQUIPE DE MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE MATERIAIS "FORMIGUINHAS" (2 FUNCIONÁRIOS ESTRUTURA E 2 FUNCIONÁRIOS ACABAMENTO), DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DE MAQUINÁRIOS AO LONGO DA IMPLANTAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO/DESCARGA DE MATERIAIS.
	PREVER CUSTO PARA PERDA DE CONCRETO DURANTE O PERÍODO DE ESTRUTURA COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA ESTACIONÁRIA PARA A CONCRETAGEM CONFORME INDICADO EM PROJETO, NECESSÁRIO DEVIDO À DISTÂNCIA ENTRE PONTO DE PATOLA E BLOCOS 2, 3,4 E 5.
	PREVER EM CUSTO O REAPROVEITAMENTO DO MURO EXISTENTE COMO TAPUME EXTERNO, PARA GANHO ECONÔMICO. PROSPECÇÃO NÃO DEVERÁ DEMOLI-LO.
	É OBRIGATÓRIA A INSTALAÇÃO DOS CASTELOS D'ÁGUA NA ETAPA DE PRÉ-FORMA PARA EVITAR SEU ENCLAUSURAMENTO.
➢ **PRAZO DE OBRA**	DEVIDO À COMPLEXIDADE DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO (FNA), O PERÍODO DE PRÉ-FORMA POSSÍVELMENTE TERÁ UM PRAZO MAIS LONGO QUE O PADRÃO.

PCP 164

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI
Solar Trindade - F1	mai/24	180	1	C	07/09/24	14/01/25			03/05/25			out/25
Soul Taquá I - F1	mai/24	340	2	A	15/09/24	08/01/25	19/01/25		30/04/25	29/04/25		set/25
Soul Taquá I - F2	mar/25	160	2	A	31/03/25	30/04/25	01/05/25		18/06/25	19/06/25		nov/25
Jardim Peônia (ex Jd Lirios VI)	out/24	460	2	A	18/12/24	19/06/25	20/06/25		09/11/25	10/11/25		abr/26
Porto Valência - F1	jul/24	340	2	C	07/01/25	04/05/25	04/06/25		17/08/25	02/10/25		mar/26
Reserva Carioca - F1	jul/24	340	2	C	11/05/25	18/08/25	03/10/25		02/12/25	17/01/26		jun/26
Reserva Carioca - F2	mar/25	160	2	C	04/10/25	03/12/25	18/01/26		21/01/26	08/03/26		ago/26
Parque Orquídea (ex R. Parque VI)	nov/24	400	2	A	13/07/25	10/11/25	11/11/25		14/03/26	15/03/26		ago/26
Elevato Bonsucesso	nov/24	504	2	C	09/09/25	22/01/26	09/03/26		28/06/26	13/08/26		mai/27
Bosque Jacarepaguá	jun/25	414	2	A	22/10/25	15/03/26	16/03/26		22/07/26	23/07/26		dez/26

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Rio de Janeiro Oeste	RZO	50%	1.714	143	2.057	171

Empreendimento	Renda	Lançamento	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27
Soul Taquá I F1 - F2	4.094	mai-24	27	27	27	27	27	21																
Bosque Jacarepaguá	**3.117**	**jun-25**		**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**30**								
Soul Taquá II F1	4.094	jan-26									27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	16	
Soul Taquá II F2	4.094	fev-27																						27
Total de Vendas Lançados			**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**27**	**59**	**59**	**59**	**59**	**53**	**32**	**32**	**59**	**59**	**59**	**59**	**59**	**57**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**16**	**27**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Bosque Jacarepaguá | Mapa Concorrência

		Bosque Jacarepaguá	Conquista Florianópolis	Conquista Itanhaguá Green	My Jacarepaguá Life | Mood
		TENDA	Direcional	Direcional	Cury
	Distância Tenda (km)		2,13Km	4,93Km	3,54Km
Região 1 Km	População	24.999	37.351	36.083	43.203
	Dens. Demográfica	7.996	11.966	11.560	13.841
	Renda (R$)	6.906	8.259	16.044	7.238
	Classe Social	B1 (8.1k a 16k)	B1 (8.1k a 16k)	A++ (Maior que 28k)	B1 (8.1k a 16k)
	PEA Dia	15.580	20.353	41.184	28.433
Quantitativo	Lançamento	jun/25	dez/23	12/2023	10/2023
	Unidades	414	280	280	940
	Estoque	414	74	143	69
	VSO	32	12	8	46
	Stockout	13	6	18	2
Qualitativo	Condomínios	1	1	1	1
	Torres	6	5	2	6
	Gabarito	T+4	T+4	T+4	T+4
	Plantas (m²)	34,5m²	56,4m² e 56,4m² e 36m² e 43,9m² e 56,4m² e 54,92m² e 37,07m²	43,92m² e 43,92m² e 41,19m² e 52,05m² e 41,2m² e 50,18m² e 41,19m²	84m² e 53,25m² e 92m² e 92m² e 67m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Garden	Garden	Garden	Garden
	Dif. Entrega	Não	Equipado e Decorado	Equipado e Decorado	Equipado e Decorado
	Vagas	7% de Vagas	24% Com vaga	31% Com vaga	Com vaga
	Lazer	Praça de chegada, Praça das Palmeiras, Salão de festas com churrasqueira, Espaço Cultivo, Churrasqueira Gourmet, Play Kids, Play Baby, Play Pet, Fitness Externo.	Tem Garden, Bosque, Espaço Gourmet, Piscina, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Quadra, Quadra de Tênis, Salão de Jogos, Sauna Seca,	Tem Garden, Agua Aquecida a Gas, Bosque, Cinema, Fireplace, Piscina, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Quadra, Salão de Jogos,	Tem Garden, Agua Aquecida a Gas, Bosque, Cinema, Piscina, Praça, Quadra de Tênis, Salão de Jogos,

Diagnóstico Concorrência

- Os concorrentes mapeados possuem target de preço e renda acima do previsto para o Bosque Jacarepaguá.

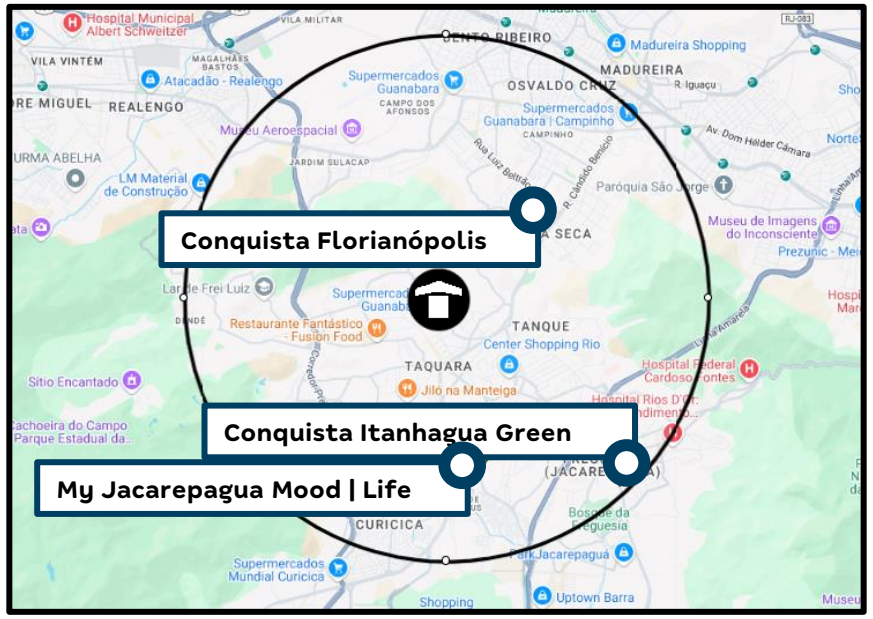

	Empreendimento	Bosque Jacarepaguá			Conquista Florianópolis			Conquista Itanhanguá Green			My Jacarepaguá Life | Mood		
Tipologias	Tipologia	Sem vaga	Com vaga	Garden c/vaga	Sem vaga	Com vaga	Garden c/vaga	Sem vaga	Com vaga	Garden c/vaga	Sem vaga	Com vaga	Garden c/vaga
	Preço Nominal	207.286	220.910	255.491	224.320	268.844	304.790	259.777	278.163	313.277	218.018	264.429	342.734
	CEF	167.061	177.752	207.223	179.456	215.075	243.832	207.822	222.530	250.622	174.414	211.543	274.187
	Renda	3.049	3.498	4.748	3.395	4.839	5.479	4.325	5.009	5.629	3.441	5.025	6.488
	Valor m²	-	-	**4.409**	-	-	**5.792**	-	-	**6.237**	-	-	**5.788**
	Dif Renda				346	1.341	731	1.276	1.511	881	392	1.527	1.740
	Farol de Factibilidade				●	●	●	●	●	●	●	●	●

Farol Renda

- ● Acima de 300
- ● Entre 0 e 300
- ● Abaixo de 0

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Bosque Jacarepaguá			
Tipo:	**Sem vaga**		**Sem vaga**	
Método	**Ref - Soul Taquá**		**Vision**	
Avaliação	210.000		210.000	
Renda Inicial (VF)	3.946		3.199	
Renda Final*	-		3.049	
% RET1	0%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,79	3.034	0,84	2.607
FGTS	0,52	1.980	0,67	2.076
Financiamento	99,40%	161.838	97,93%	159.111
Subsídio	166,36%	3.398	111,76%	5.875
Prazo de Pró-soluto	19	19	19	19
Pró-Soluto	56,17%	15.302	69,79%	15.412
Preço Raso (RS)	185.552	185.552	185.080	185.080
TCD	48,99%	19.486	68,87%	22.206
VSO	28	28	28	28
Preço de Venda	**211.568**	**211.568**	**213.887**	**213.887**
Elasticidade	-3,086%	-3,086%	-3,086%	-3,086%
Preço de Venda Final	**205.038**	**205.038**	**207.286**	**207.286**
Preço Raso (R$)	**185.552**		**185.080**	
% de Raso	**90,50%**		**89,29%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**183.695**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**188.947**	

O preço de referência foi simulado com base na avaliação do Bosque, e o valor praticado pelo projeto está detalhado na tabela do slide Análise de Preço

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Bosque Jacarepaguá			
Tipo:	**Com vaga**		**Com vaga**	
Método	**Ref - Soul Taquá**		**Vision**	
Avaliação	220.000		220.000	
Renda Inicial (VF)	6.053		3.598	
Renda Final*	-		3.498	
% RET1	0%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,09	6.368	1,05	3.661
FGTS	1,30	7.636	1,24	4.320
Financiamento	99,40%	169.544	99,63%	169.945
Subsídio	0,00%	0	147,00%	3.487
Prazo de Pró-soluto	19	19	19	19
Pró-Soluto	39,62%	16.554	69,61%	17.290
Preço Raso (RS)	200.103	200.103	198.704	198.704
TCD	32,41%	19.775	61,23%	22.206
VSO	2	2	2	2
Preço de Venda	**226.881**	**226.881**	**227.946**	**227.946**
Elasticidade	-3,086%	-3,086%	-3,086%	-3,086%
Preço de Venda Final	**219.878**	**219.878**	**220.910**	**220.910**
Preço Raso (R$)	**200.103**		**198.704**	
% de Raso	**91,01%**		**89,95%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

O preço de referência foi simulado com base na avaliação do Bosque, e o valor praticado pelo projeto está detalhado na tabela do slide Análise de Preço

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Bosque Jacarepaguá			
Tipo:	**Com Garden**		**Com Garden e vaga**	
Método	**Vision**		**Vision**	
Avaliação	250.000		260.000	
Renda Inicial (VF)	4.398		5.058	
Renda Final*	4.298		4.748	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,02	4.340	1,17	5.714
FGTS	1,11	4.715	1,24	6.072
Financiamento	98,13%	185.459	99,79%	201.152
Subsídio	140,40%	1.853	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	19	19	19	19
Pró-Soluto	58,22%	17.677	58,27%	20.347
Preço Raso (RS)	214.044	214.044	233.284	233.284
TCD	50,09%	22.206	43,55%	22.206
VSO	1	1	1	1
Preço de Venda	**243.774**	**243.774**	**263.627**	**263.627**
Elasticidade	-3,086%	-3,086%	-3,086%	-3,086%
Preço de Venda Final	**236.250**	**236.250**	**255.491**	**255.491**
Preço Raso (R$)	**214.044**		**233.284**	
% de Raso	**90,60%**		**91,31%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Bosque Jacarepaguá
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	211.860
Renda Inicial (VF)	3.265
Renda Final*	3.117

Tipo:	VF	R$
Ato	0,86	2.735
FGTS	0,72	2.297
Financiamento	98,05%	160.704
Subsídio	112,52%	5.599
Prazo de Pró-soluto	19	19
Pró-Soluto	69,45%	15.621
Preço Raso (RS)	186.955	186.955
TCD	67,80%	22.206
VSO	32	32
Preço de Venda	**215.617**	**215.617**
Elasticidade	-3,086%	-3,086%
Preço de Venda Final	**209.161**	**209.161**
Preço Raso (R$)	**186.955**	
% de Raso	**89,38%**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o Preço Vision, visto que, projetos da regional capturam rendas equivalentes à estimada pelo Vision. A diferença de valor do Garden, foi determinada com base no benchmark de mercado, utilizando como referência os empreendimentos das concorrências.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes da região vendem em um target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda.

	Preço Real					Preço Normalizado (19m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Soul Taquá	251.479	203.687	4.094	27	8	9.064	212.751
Bosque Jacarepaguá	211.860	186.955	3.117	32	19	-	186.955

Obrigado
