Tenda

sua próxima conquista

Book de Lançamento

Regional: SP

Projeto: Oásis Penha

Data Comitê: 09/06/2025

One Page – Oásis Penha – Aprovação

Cidade	São Paulo	**Mancha de demanda**	SP - SZL1 - São Paulo Leste 1
Regional	SP	**Cluster MPR**	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Jun

[1]

Unidades (% Vagas)	672 (6%)	**CA Máx | Proj**	4,5 | 3,2
Tipologia	F2E - Concreto	**Escritura**	jun-25
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	jun/25 | 28

[2]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	21.907 (11,8%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	21.907 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	3.515	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[3]

Custo Construção (%VGV)	68.283 (36,7%)	**Indireto Unit.**	17.567
Prazo da Obra (meses)	22	**Torre Unit.**	59.957
Custo Total Unit. (LPU):	101.611 (91)	**Infra Unit.**	13.994
Início de Obra	dez-25	**Fundação Unit.**	7.165

[4]

Preço Nominal Unit.	277.165	**VSO**	37
Preço Raso Unit.	257.284	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	284.567	**Renda (% em RET 1%)**	5.356 (1,0%)



LI (Régua):	**20,0% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	40,6%
LI Marginal:	24,7%	**Margem Rasa Econômica:**	35,4%
Margem Bruta REF:	44,2%	**Margem Contribuição Econômica:**	28,1%
Margem Rasa REF:	**39,8%**	**Exposição (% VGV):**	18.584 (10,1%)
TIR:	59,1%	**VGV Total:**	186.255
Payback Contingente (21 m) :	**18 m/ (-3 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(14.725)
Payback Consolidado:	18	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	34.566

Destaques

[1] Projeto: Composto por 2 torres (T+17-18PP/20PP) que totalizam 672uhs, sendo 646uhs com varanda e 37 vagas de automóvel (1 C/D; 1 pcd; 2 idoso).
Empreendimento projetado considerando todos os itens de lazer e atributos de produto disponíveis, incluindo portaria com pórtico de veículos, piscina, quadra e unidades com varanda.

[2] Condição Comercial: 100% Cash;

- Terreno escriturado em 05.06.25. O Valor do negócio estimado em contrato: R$ 21.240 MM, sendo:
- Sinal no valor de R$ 1.850 MM, pago em uma única em Out/2021;
- R$ 835 M, pago em uma única na outorga da escritura;
- R$18.587 MM a ser pago em 36 X, sendo a primeira em Jan/26 (carência de 7 meses da escritura). As parcelas de 1 a 18 serão no valor de R$413.058,00 e as parcelas de 19 a 36 no valor de R$619.585,00. Todas elas reajustadas pelo IPCA a partir de nov/24.
- Garantia: Seguro Fiança
- Reembolso aos proprietários dos valores de IPTU de ago/23 a jun/25 previsto na VF

[3] Custo
Foi considerado início de obra conforme regra de ouro, 6 meses após o lançamento, a um custo total de R$101.611 de construção, descontando os custo incorridos não aproveitados de R$1.757/uh.

[4] Preço de venda
Adotando regra ouro, 18 meses de venda e VSO de 37 unidades, PSO de 27 meses, aplicado a elasticidade sobre o preço real. Preço leva em consideração performance de vendas da tipologia com Varanda do Melodia Jaçanã e levantamento da concorrência do projeto.

[5]Resultado:
Recomendamos lançar este empreendimento.

One Page – Oásis Penha – Real

Cidade	São Paulo	**Mancha de demanda**	SP - SZL1 - São Paulo Leste 1
Regional	SP	**Cluster MPR**	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Jun

[1]	**Unidades (% Vagas)**	672 (6%)	**CA Máx | Proj**	4,5 | 3,2
	Tipologia	F2E - Concreto	**Escritura**	jun-25
	Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	jun/25 | 31
[2]	**Valor Líquido do Terreno (% VGV)**	21.907 (11,6%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
	Cash (Correção)	21.907 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
	Valor R$/m²	3.515	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)
[3]	**Custo Construção (%VGV)**	69.463 (36,8%)	**Indireto Unit.**	17.567
	Prazo da Obra (meses)	22	**Torre Unit.**	59.957
	Custo Total Unit. (LPU):	103.368 (91)	**Infra Unit.**	13.994
	Início de Obra	mar-26	**Fundação Unit.**	7.165
	Preço Nominal Unit.	280.938	**VSO**	37
	Preço Raso Unit.	261.057	**Referência**	Vision
[4]	**Avaliação Unit.**	284.567	**Renda (% em RET 1%)**	5.365 (1,0%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	266.989
Preço Inf. Médio Unit.	287.294	**Margem Bruta REF (%)**	43,7%
Custo Inf. Médio Unit.	161.850	**Margem Rasa REF (%)**	39,4%



LI (Régua):	**19,4% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	40,2%
LI Marginal:	24,2%	**Margem Rasa Econômica:**	35,0%
Margem Bruta REF:	43,7%	**Margem Contribuição Econômica:**	27,7%
Margem Rasa REF:	**39,4%**	**Exposição (% VGV):**	16.544 (8,8%)
TIR:	57,3%	**VGV Total:**	188.790
Payback Contingente (21 m) :	**19 m/ (-2 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(11.622)
Payback Consolidado:	19	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	25.111

Destaques

[1] Projeto: Composto por 2 torres (T+17-18PP/20PP) que totalizam 672uhs, sendo 646uhs com varanda e 37 vagas de automóvel (1 C/D; 1 pcd; 2 idoso).
Empreendimento projetado considerando todos os itens de lazer e atributos de produto disponíveis, incluindo portaria com pórtico de veículos, piscina, quadra e unidades com varanda.

[2] Condição Comercial: 100% Cash;

- Terreno escriturado em 05.06.25. O Valor do negócio estimado em contrato: R$ 21.240 MM, sendo:
- Sinal no valor de R$ 1.850 MM, pago em uma única em Out/2021;
- R$ 835 M, pago em uma única na outorga da escritura;
- R$18.587 MM a ser pago em 36 X, sendo a primeira em Jan/26 (carência de 7 meses da escritura). As parcelas de 1 a 18 serão no valor de R$413.058,00 e as parcelas de 19 a 36 no valor de R$619.585,00. Todas elas reajustadas pelo IPCA a partir de nov/24.
- Garantia: Seguro Fiança
- Reembolso aos proprietários dos valores de IPTU de ago/23 a jun/25 previsto na VF

[3] Custo
Foi considerado folga início de obra conforme PCP 165, 9 meses após o lançamento, a um custo total de construção de R$103.368.

[4] Preço de venda
Adotando regra ouro, 18 meses de venda e VSO de 37 unidades, PSOL de 30 meses, preço leva em consideração performance de vendas da tipologia com Varanda do Melodia Jaçanã e levantamento da concorrência do projeto.

[5] Resultado:
Recomendamos lançar este empreendimento.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Faróis Pareceres – Oásis Penha

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Terreno escriturado em 05.06.25. Não se verificam apontamentos relevantes que tragam impacto no registro da incorporação. Aguarda projeto aprovado para protocolo do RI. Previsão de RI: 30.06.25	Ok	
Legalização	Protoco de comunique-se atendido em 30.05. Previsão para emissão do alvará 13.06	Ok	
Produto	Sem Riscos Associados	Ok	
GETEC	Concreto e aço, utilizado de ante projeto, igual ao do projeto / Considerado trincheira drenante - Cotação enviada por GETEC.	Ok	
Logística	Sem Riscos Associados	Ok	
Contratação	Laudo de Engenharia com Pendencia de RI previsto para o dia 20.06. Risco previsto para o dia 30.06 e Analise Juridica para o dia 08.07	Ok, Com Resalvas	
Inteligência de mercado	I.M. avalia preço Vision como Factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Ciclo avaliou Preço e VSO como factíveis, projeto competitivo em atributos preço e condição de pagamento.	Ok	
Estudos Econômicos	Sem Riscos Associados	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- SZL – São Paulo Leste

Lançamento

1. Viva São Miguel
2. Viver Bem | Mais USP Leste
3. Viva Parque do Carmo
4. Reserva das Andorinhas
5. Palermo

LandBank

6. Residencial Tóquio e Quioto
7. Lar de Itaquera | Sol de Itaquera
8. Viva Azul
9. Tucumã
10. Oásis Penha
11. Jerivás
12. Sobral
13. Amarilis

Cluster MPR – (Comitê)

- Cluster 4 - Azul

Região

Capital

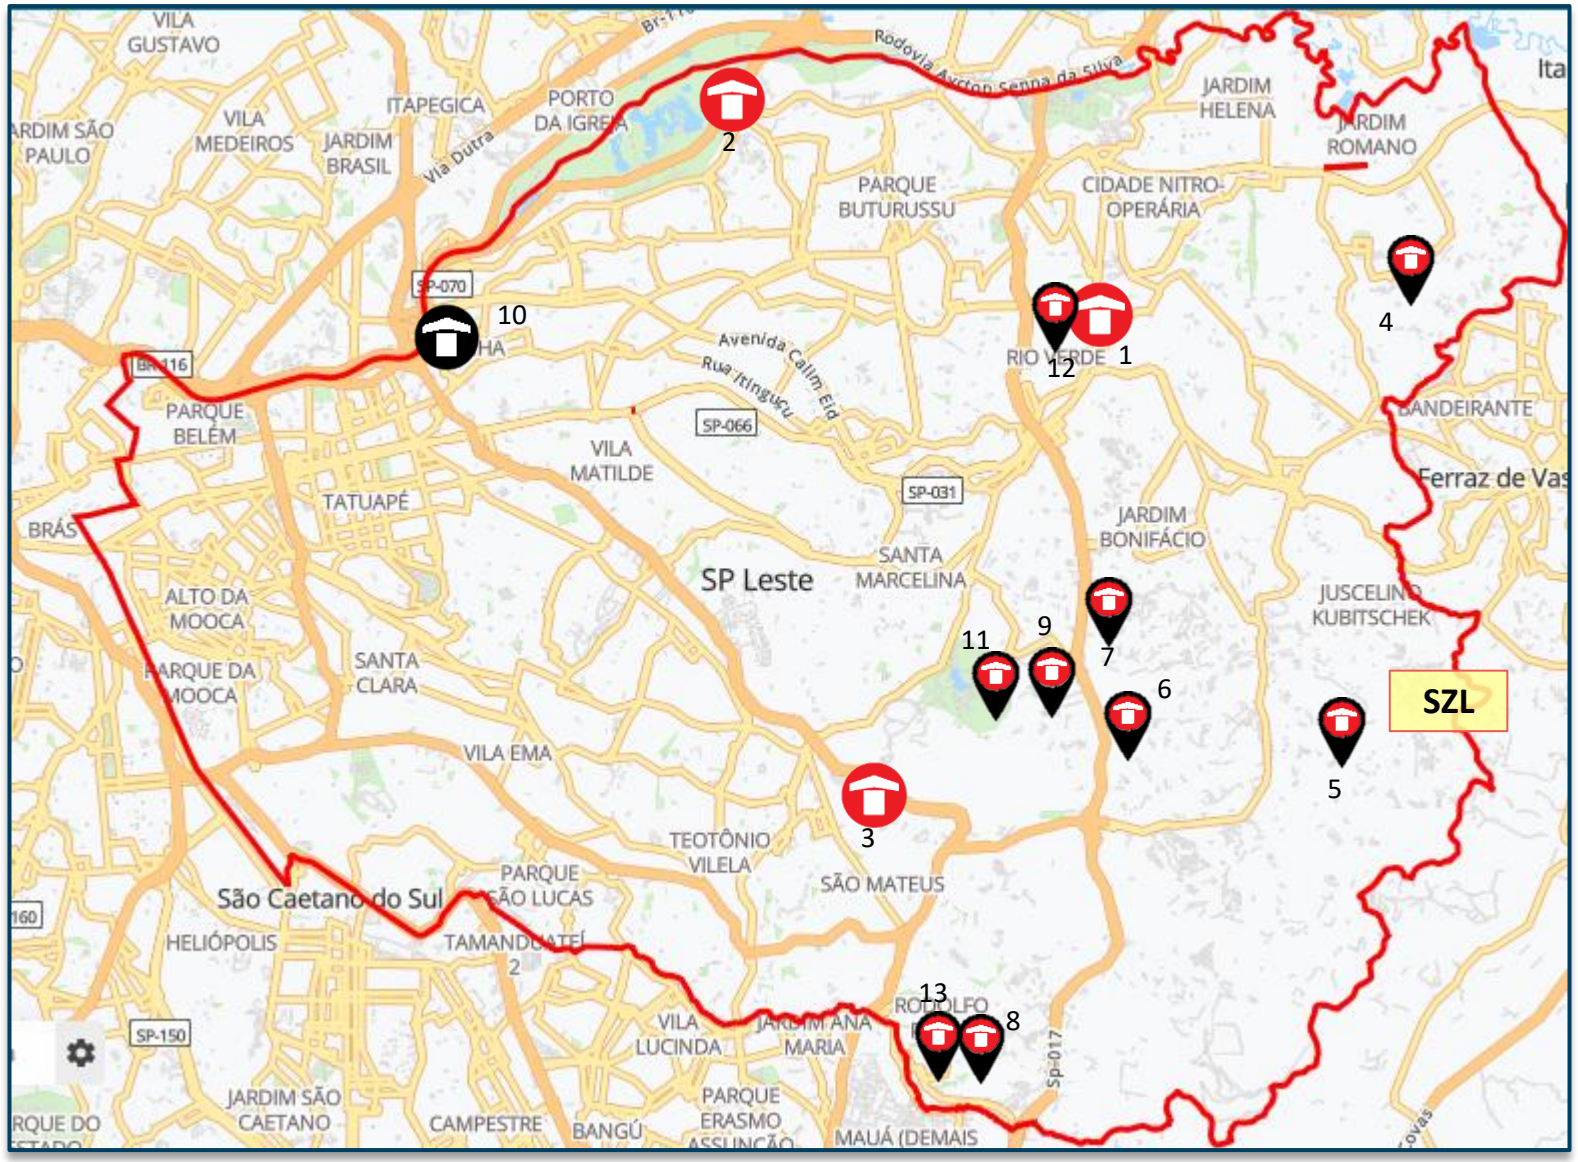

Lançados LandBank Comitê

Oásis Penha

PRODUTO

Empreendimento Oásis Penha
Descritivo - Lançamento

Informações Gerais		
Terreno	Área terreno	6.779,00m²
	Menor poligonal	6.231,72m²
	Faixa de domínio = App+fna	Não| Sim: 515,72m²
	Reserva de calçada/ melhoramento viário	Sim: 30,64m² | Não
	Área liquida	6.231,72m²
	Zoneamento	ZC
	Ca máximo + Incentivo HIS	3,00 + 1,5
	Ca máximo Total	4,5
	Ca projetado	3,17
	Gabarito máximo	48m
Geral	Total uh	672
	Total de vagas	37 (5,05%)
Tipologia	Tipologia	PCT com elevador (Nova tipologia)
	Gabarito	T+17
	Lâmina	18pp | 20pp
	Área privativa	31,86m²
	Varanda	646uh (96%)
Condomínio	Unidade pcd	21
	Unidade lazer | técnica	10 | 02
	Torre	02
	Fase	Única
Lazer	Lazer Interno	01-Espaço delivery/minimarket, 02-Espaço office , 03-Salão de Festas, 04-Espaço Saúde , 05-Fitness, 06-Sport Bar, 07-Espaço Teen, 08-Brinquedoteca
	Lazer Externo	09-Churrasqueira Gourmet com banheiro, 10-Espaço Cultivo, 11-Piscina Adulto, 12-Piscina Infantil, 13-Play Kids, 14-Espaço Relax 15-Play Baby, 16-Multipla Estação, 17-Espaço Ducha, 18-Quadra Gramada 19-Play Pet

PRODUTO

Empreendimento Oásis Penha
Atributos de produto - Lançamento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Prime**	Sim	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	Piscina adulto e infantil, quadra gramada, churrasqueira com banheiro, play baby e play kids com piso emborrachado, portaria com pórtico de veículos, múltipla estação (fitness), espaço relax e play pet.
	Atributos Torre	Sim	Varanda nos apartamentos; Lazeres internos: Salão de Festas, Brinquedoteca, Espaço Saúde, Espaço Teen, Espaço office, Sport Bar, Fitness e Espaço delivery/minimarket.
	Edifício Garagem	Não	

	Riscos associados	Parecer	Criticidade
Produto	Não há riscos associados	ok	

Obs.: Empreendimento Prime projetado considerando todos os itens de lazer e atributos de produto disponíveis, incluindo portaria com pórtico de veículos e unidades com varanda. O acesso ao empreendimento e o caminho do pedestre até as torres sem complexidade.

Quadra Gramada

Múltipla Estação

Portaria com pórtico de veículos

Churrasqueira Gourmet

Piscina

Empreendimento Oásis Penha
Modulação - Lançamento

Fase única: 672uh (sendo 21 PCD) - 37 vagas (Sendo 1 PCD, 2 idoso E 01 para food truck/carga e descarga)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	01 Bloco (T+17)	354 Uh (Sendo 20 PCD)	37 vagas (Sendo 1 PCD, 2 idoso E 01 para food truck/carga e descarga)	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 01 a Churrasqueira Gourmet com banheiro, 01 Espaço Cultivo, 01 Piscina Adulto, 01 Piscina Infantil, 01 Multipla Estação, 01 Espaço Ducha e 01 Quadra Gramada, demais lazeres, não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas
Módulo 02	01 Bloco (T+17)	318 UH (Sendo 1 PCD)	-	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 02, 01 Play Kids, 01 Play baby, 01 Espaço Relax e 01 Play pet.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Implantação

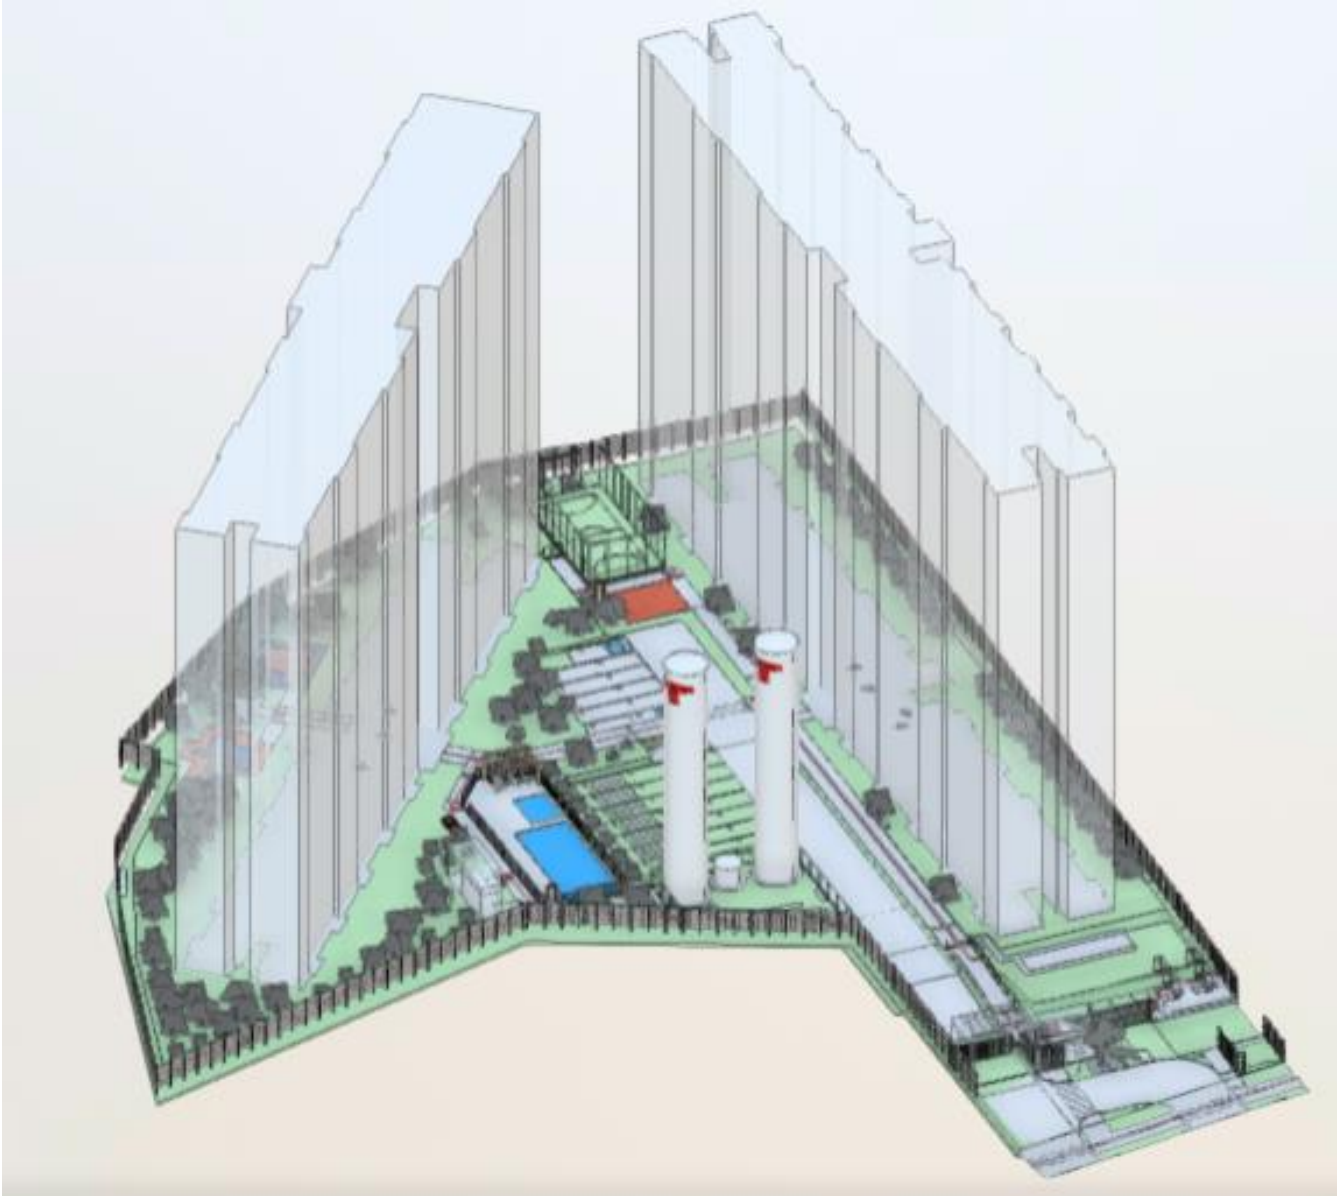

OÁSIS PENHA

01 Torre 18PP | T+17
01 Torre 20PP | T+17

684 Unid. A Construir
672 Unid. A Vender

Custo de Construção

	OASIS PENHA R04	VIVA PENHA R10 (ESCRITURA)	MIRANTE PIRITUBA LVS
Torres	2	2	2
Unidades Construídas	684	684	578
Unidades Vendidas	672	672	566
Cidade	São Paulo - SP	São Paulo - SP	São Paulo - SP
Produto / Selo	F2E - V0200 CDW	F2E - V0200 CDW	Modular F2E | CDW
Tipologia	1 Torre | T+17 | 18PP	1 Torre | T+17 | 18PP	1 Torre | T+16 | 16PP
Tipologia	1 Torre | T+17 | 20PP	1 Torre | T+17 | 20PP	1 Torre | T+16 | 18PP
Atributos	Piscina | 646 Varandas	Piscina | 646 Varandas	
Projeto Infra	EP	EP	
Projeto Torre	EP	EP	
Mês Base	maio-25	abril-25	abril-25
Incc	1.184,462	1.173,775	
LVS	abril-25	fevereiro-25	
Indiretos	abril-25	fevereiro-25	
Base de Preço	LPU 91	LPU 88	
Takt	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	22	22	25
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 99.749	R$ / UND R$ 98.229	R$ / UND R$ 97.492
Indireto	R$ 17.567	R$ 18.386	R$ 17.156
Torre	R$ 59.957	R$ 59.435	R$ 55.367
Infra	R$ 13.994	R$ 13.622	R$ 14.156
Fundação	R$ 7.063	R$ 5.305	R$ 6.210
EEE			
ETE			
Contenção	R$ 608	R$ 567	R$ 3.561
Terraplenagem	R$ 559	R$ 914	R$ 1.043
CUSTO TOTAL II	R$ 1.862	R$ 1.720	R$ 744
Urbanização			R$ 12
Drenagem	R$ 717	R$ 511	
Extensão de Rede Elétrica	R$ 223	R$ 223	
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 922	R$ 986	R$ 732
CUSTO TOTAL III	R$ 1.757	R$ 1.724	
Incorridos	R$ 1.757	R$ 1.724	
CUSTO TOTAL IV			
Aprendizado			
CUSTO TOTAL IV		R$ 910	
Atualização por INCC		R$ 910	
CUSTO TOTAL I+II	R$ 101.612	R$ 99.949	R$ 98.236
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 103.368	R$ 102.583	R$ 98.236

Custo de Construção

	OASIS PENHA R04	VIVA PENHA R10 (ESCRITURA)	
Torres	2	2	
Unidades Construídas	684	684	
Unidades Vendidas	672	672	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	São Paulo - SP	São Paulo - SP	
Produto / Selo	F2E - V0200 CDW	F2E - V0200 CDW	
Tipologia	1 Torre | T+17 | 18PP	1 Torre | T+17 | 18PP	
Tipologia	1 Torre | T+17 | 20PP	1 Torre | T+17 | 20PP	
Atributos	Piscina | 646 Varandas	Piscina | 646 Varandas	
Projeto Infra	EP	EP	
Projeto Torre	EP	EP	
Mês Base	maio-25	abril-25	
Incc	1184,462	1173,775	
LVS	abril-25	fevereiro-25	
Indiretos	abril-25	fevereiro-25	
Base de Preço	LPU 91	LPU 88	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	22	22	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 99.749	R$ / UND R$ 98.229	DIF R$ 1.521
Indireto	R$ 17.567	R$ 18.386	-R$ 818
Torre	R$ 59.957	R$ 59.435	R$ 522
Infra	R$ 13.994	R$ 13.622	R$ 372
Fundação	R$ 7.063	R$ 5.305	R$ 1.759
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 608	R$ 567	R$ 41
Terraplenagem	R$ 559	R$ 914	-R$ 354
CUSTO TOTAL II	R$ 1.862	R$ 1.720	R$ 142
Urbanização	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Drenagem	R$ 717	R$ 511	R$ 206
Extensão de Rede Elétrica	R$ 223	R$ 223	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 922	R$ 986	-R$ 64
CUSTO TOTAL III	R$ 1.757	R$ 1.724	
Incorridos	R$ 1.757	R$ 1.724	R$ 32
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	
Aterro Pré Carga	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 910	
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 910	-R$ 910
CUSTO TOTAL	R$ 103.368	R$ 102.583	R$ 785

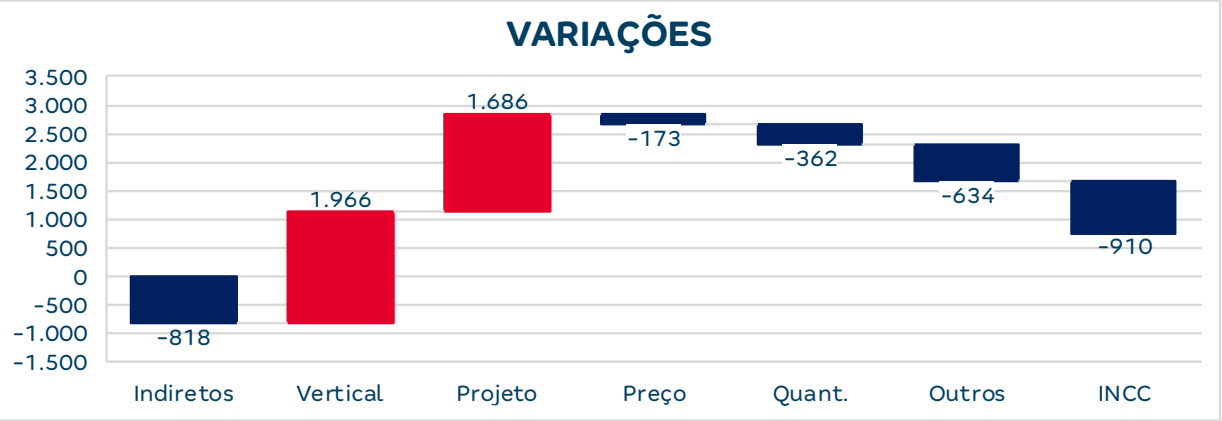

INDIRETOS
-406 | Refeição
-387 | SLQA + Tela Fachadeira

VERTICAL
+1.966 | Retroalimentação (Dissidio + QLP)

PROJETO
+1.151 | Fundação Rasa
Param.: Baldrame – Inovação e Produto
Pré: Lajão – Projetista Oasis Penha (Puga)
+889 | Fundação Profunda
Param.: 18PP – 136 Estacas | 20PP – 129 Estacas (ZF Solos)
Pré: 18PP – 244 Estacas | 20PP – 282 Estacas (Solotechnique)
-354 | Terraplenagem (otimização de raspagem e aterro)

PREÇO
-132 | Esquadrias Classe III
-462 | Elevador (Planilha especifica V0200)
+206 | Extensão de Drenagem (cotação + alinhamento infra externa)
+102 | Reservatório em Fibra (cotação)

QUANTIDADE
-547 | Sanca/Shaft
+105 | Muro de divisa
+172 | Enterrados (fundação)

OUTROS
-281 | Equipamentos Fundação
-350 | Consumo Vertical Formas

INCC
-910 | Atualização INCC

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Extensão de rede de aproximadamente 110m com tubulação PEAD D250mm MND.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ligação na porta.

SISTEMA DE DRENAGEM
Considerado execução de rede com aproximadamente 49m de extensão, com lançamento no PV existente.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Considerada verba de 150K para ligação na porta.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
N/A.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 03/2025, com validade em 03/2027.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 03/2025, com validade em 03/2027

Drenagem:
- Considerado rede de aproximadamente 49m de extensão, com lançamento em PV existente.

Elétrica:
- Viabilidade positiva para ligação, foi considerada verba de 150k. No pedido de ligação definitiva a concessionária pode vir a cobrar reformas necessárias, caso a infraestrutura existente não seja suficiente.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- N/A.

Logística

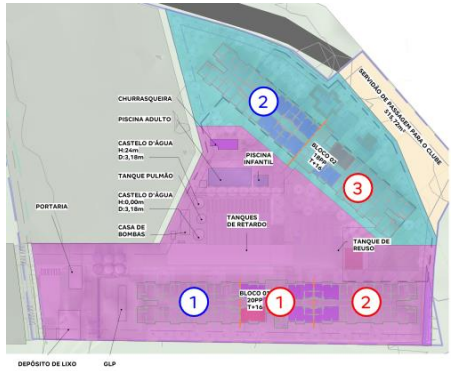

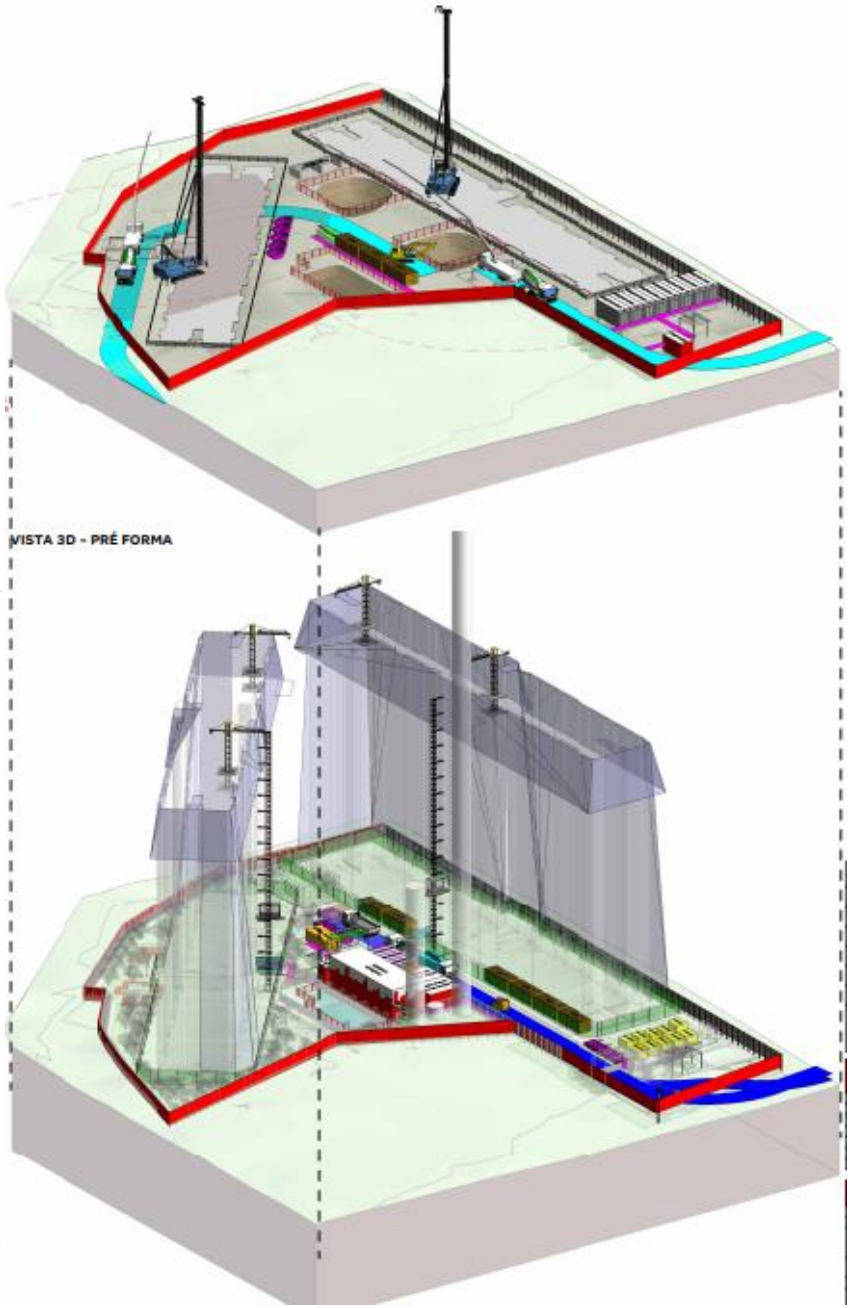

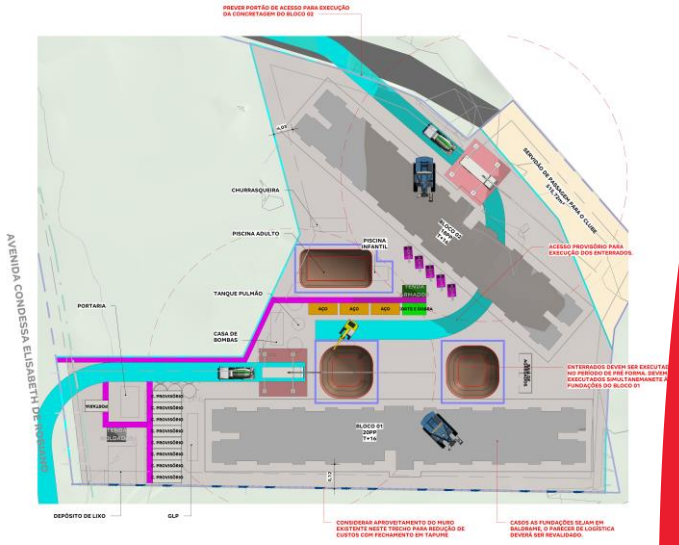

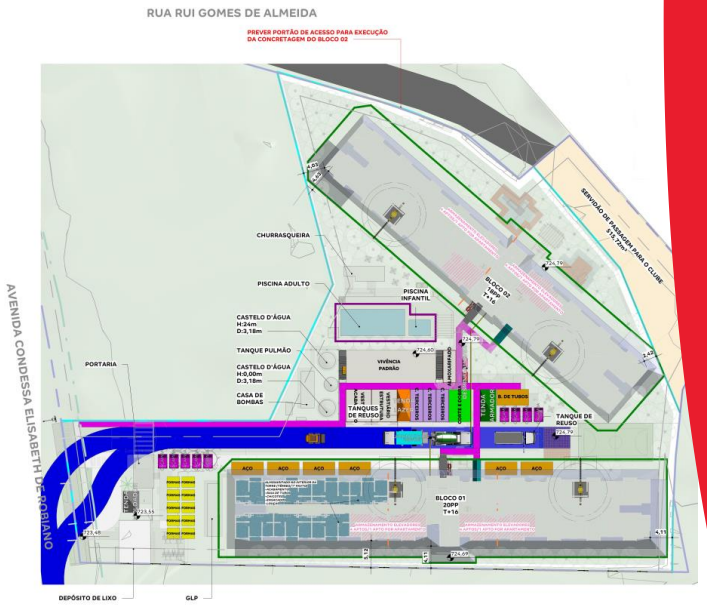

VIVÊNCIA - CONTAINERS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.
CONTAINER ALMOXARIFADO (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO COM SANITÁRIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-
CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	-	TODO PERÍODO
CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	-	TODO PERÍODO
CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	CONSIDERAR 14 MÓDULOS COM 2 ESCADAS (7 MÓDULOS NO PAV. T E 7 MÓDULOS NO PAV SUPERIOR)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO

TENDAS_PERÍODOS						
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	1,00	2,00	-	TODO PERÍODO	-
GAIOLA DE INFLAMÁVEIS (LOG)	1	1,00	2,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
TENDA ARMADOR (LOG)	1	2,50	5,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-
TENDA ARMADOR (LOG)	1	3,00	6,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-
TENDA LAZER (LOG)	1	6,00	2,50	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
TENDA MOLDADOR (LOG)	2	3,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS						
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-
BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_R01	1 EQUIP PARA OS BLOCOS 01 E 02	-	-	-	TODO PERÍODO	-
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-
CREMALHEIRA CDW (LOG)	2 EQUIP	1 MOB POR EQUIPAMENTO	1 DESMOB POR EQUIPAMENTO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
MINIGRUA (LOG)	AJUSTAR	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-

Logística

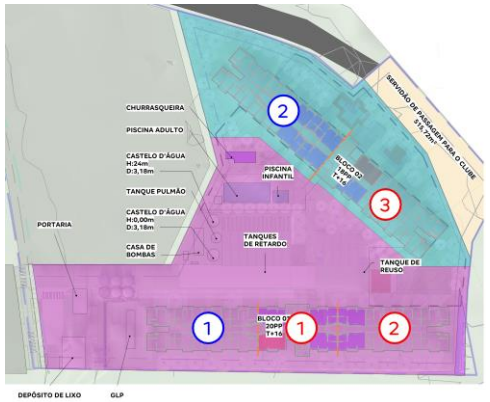

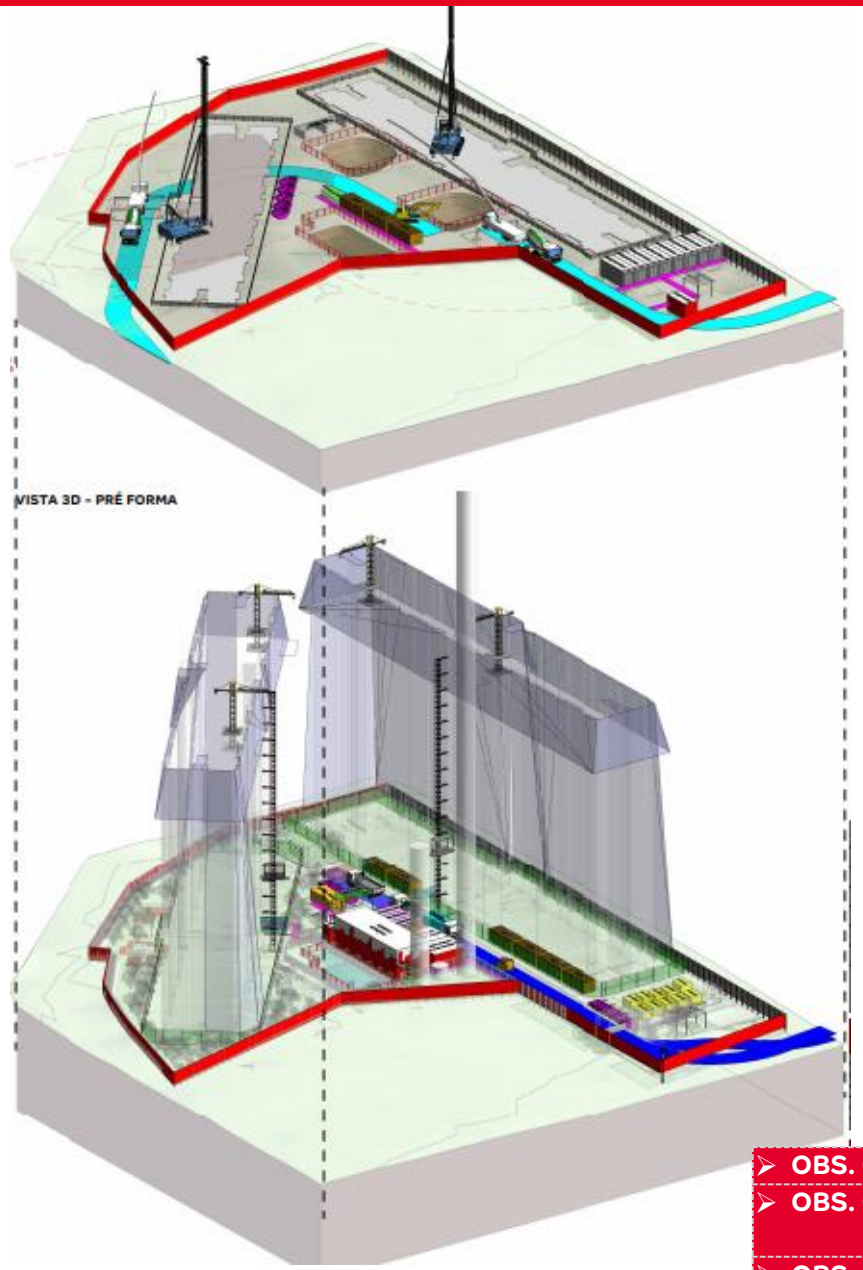

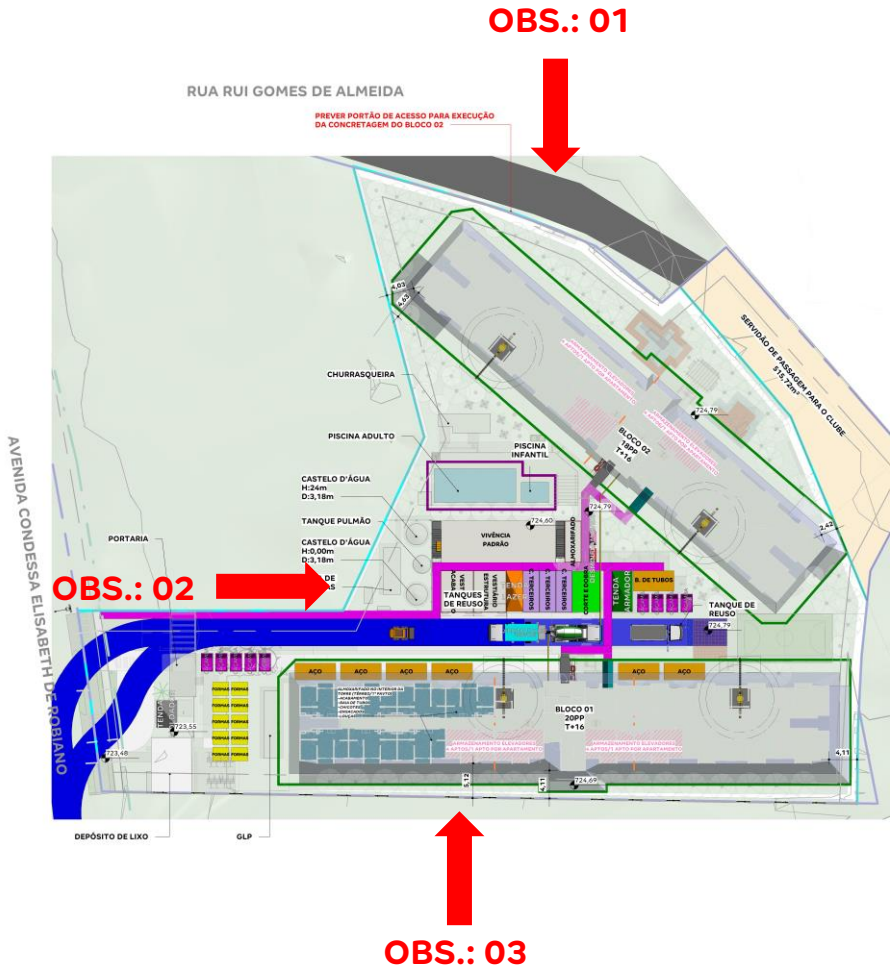

➢ OBS. 01	PREVER DOIS PORTÕES DE ACESSO, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
➢ OBS. 02	PRIORIZAR A EXECUÇÃO DOS ENTERRADOS NO PERÍODO DE PRÉ FORMA. DEVEM SER EXECUTADOS JUNTO À FUNDAÇÃO DO BLOCO 01.
➢ OBS. 03	CONSIDERAR APROVEITAMENTO PARCIAL DO MURO EXISTENTE PARA REDUÇÃO DE CUSTOS COM FECHAMENTO EM TAPUME.

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **LEGALIZAÇÃO**	PREVER LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DO VIÁRIO PÚBLICO DURANTE AS CONCRETAGENS . DEVIDO À QUANTIDADE DE ÁRVORES DE COMPENSAÇÃO PREVISTAS NESTA IMPLANTAÇÃO, DEVERÁ SER PREVISTO PRAZO ADICIONAL CONFORME AVALIAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO E PÓS-LEG PARA NÍVEL DE CRITICIDADE 1 (ITENS DE LOGÍSTICA SOBREPONDO ÁRVORES E ÁREA PERMEÁVEL).
➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CUSTO PARA EQUIPE DE MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE MATERIAIS "FORMIGUINHAS" (2 FUNCIONÁRIOS ESTRUTURA, 2 FUNCIONÁRIOS ACABAMENTO E 2 FUNCIONÁRIOS PARA TRANSPORTE DE AÇO), DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DE MAQUINÁRIOS AO LONGO DA IMPLANTAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO/DESCARGA DE MATERIAIS. PREVER EM CUSTO O REAPROVEITAMENTO PARCIAL DO MURO EXISTENTE COMO TAPUME EXTERNO, PARA GANHO ECONÔMICO. PROSPECÇÃO NÃO DEVERÁ DEMOLI-LO. PREVER CUSTO PARA SECCIONAMENTO DOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS (CASTELOS) EM DUAS PARTES, NÃO MAIORES QUE 20,00m CADA (GABARITO MÁXIMO DA CARRETA DE TRANSPORTE), PARA ACESSO DA CARRETA AO EMPREENDIMENTO. (VERIFICAR MEDIDAS EM NO PROJETO DE LOGISTICA)

PCP 165

SP - Modular 3.0

1 JOGO = 47 Aptos/mês

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI	Folga Inicio	Folga Aptidão	Folga Cliente	Carência CEF
CDW 10 | Viva Penha	jul/25	672	2	B	11/03/26	09/06/26	24/06/26		12/01/27	27/01/27		out/27	7,97	7,97	9,13	NC
CDW 15 | Jd dos Prados	jul/25	796	2	G	30/01/26	17/07/26	06/08/26		01/04/27	21/04/27		jan/28	6,65	6,65	6,07	NC
CDW 15 | Sobral	set/25	577	2	F	15/02/26	20/07/26	14/08/26		23/01/27	17/02/27		nov/27	5,12	5,12	10,17	NC
CDW 15 | Dália	out/25	667	2	B	08/07/26	13/01/27	28/01/27		17/08/27	01/09/27		jun/28	9,35	9,35	4,10	NC
CDW 10 | Adriático	out/25	642	3	F	04/07/26	24/01/27	18/02/27	05/03/27	12/06/27	07/07/27	06/08/27	mai/28	9,23	9,23	5,10	NC
CDW 15 | Horizonte Jaraguá	dez/25	514	3	G	18/06/26	02/04/27	22/04/27	07/05/27	22/07/27	11/08/27	09/09/27	jun/28	6,17	6,17	6,13	NC
CDW 10 | Cunha	jun/26	357	3	F	27/11/26	13/06/27	08/07/27	07/08/27	29/08/27	23/09/27	23/10/27	jun/28	5,51	5,51	12,17	NC
CDW 15 | Vila Butantã	jun/26	707	3	G	23/02/27	23/07/27	12/08/27	10/09/27	23/12/27	12/01/28	09/02/28	out/28	8,45	8,45	8,07	NC
CDW 10 | Essência do Campo F1	ago/26	550	2	B	19/02/27	18/08/27	02/09/27		12/02/28	27/02/28		out/28	6,29	6,29	10,13	NC
CDW 15 | Amarilis	ago/26	512	3	F	03/03/27	30/08/27	24/09/27	24/10/27	18/12/27	12/01/28	11/02/28	out/28	6,68	6,68	10,13	NC
CDW 15 | Essence Butantã (Eiras Garcia)	out/26	357	3	F	22/07/27	19/12/27	13/01/28	12/02/28	05/03/28	30/03/28	29/04/28	dez/28	9,36	9,36	10,13	NC
CDW 10 | Essência do Campo F2	jan/28	354	3	G	27/06/27	24/12/27	13/01/28	10/02/28	09/03/28	29/03/28	26/04/28	dez/28	-6,73	-6,73	25,37	NC

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
São Paulo Leste	SZL	35%	3.143	262	3.771	314

Empreendimento	Renda	Lançamento	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27
Viva São Miguel	3.800	jun-24	25	25	25	25	21																	
Viver Mais	3.800	ago-24	74	69																				
Reserva Das Andorinhas	3.900	set-24	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	13				
Viva Parque Do Carmo	4.343	set-24	38	38	38	38	38	38	38	38	25													
Palermo	3.667	dez-24	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Oásis Penha	**5.365**	**jun-25**		**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**6**		
Tucuma	3.089	set-25					26	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Sobral	3.326	set-25					32	32	32	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	13	
Residencial Quioto	2.938	fev-26										38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Amarilis	3.034	ago-26																54	54	54	54	54	54	54
Total de Vendas Lançados			**168**	**163**	**94**	**94**	**90**	**69**	**69**	**69**	**56**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**28**	**15**	**15**	**15**	**15**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**168**	**200**	**131**	**131**	**185**	**167**	**167**	**171**	**158**	**171**	**171**	**171**	**171**	**171**	**171**	**225**	**225**	**222**	**209**	**178**	**149**	**136**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Viva Penha | Mapa Concorrência

		Oásis Penha	Plano & Mais Belém	Dez Belenzinho	Mérito Belenzinho	Vivaz Belenzinho
		TENDA	Plano & Plano	Cury	Cury	Vivaz
	Distância Tenda (km)		5,37km	5,37km	5,22km	5,37km
Região 1 Km	População	24.303	21.018	21.018	27.486	21.018
	Dens. Demográfica	7.786	6.733	6.733	8.805	6.733
	Renda (R$)	8.829	8.746	8.746	9.648	8.746
	Classe Social	B1 (8.1k a 16k)	B1 (8.1k a 16k)	B1 (8.1k a 16k)	B1 (8.1k a 16k)	B1 (8.1k a 16k)
	PEA Dia	29.851	54.456	54.456	58.066	54.456
Quantitativo	Lançamento	jun/25	out/24	jun/24	set/24	out/24
	Unidades	672	930	796	1.152	799
	Estoque	672	609	162	169	167
	VSO	37	46	63	123	90
	Stockout	18	13	3	1	2
	Preço Nominal (R$)	280.938	295.266	300.471	312.167	313.900
	Preço CEF (R$)	221.030	236.213	240.377	249.734	251.120
	Renda Comprador (R$)	5.365	5.700	5.800	6.100	6.150
	Dif Tenda (R$)		-335	-435	-735	-785
	Factibilidade		●	●	●	●
Qualitativo	Condomínios	1	1	1	1	1
	Torres	2	4	3	4	3
	Gabarito	T+17	T+19	T+23 e T+24	T+24	T+20 e T+21
	Plantas (m²)	32m² e 33,75m²	26,9m² e 35,1m²	36,8m² e 40,85m²	34,24m² e 37,11m²	24,5m² e 36,71m²
	Tipologia	2 Dorms	1 e 2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms	1 e 2 Dorms
	Opções	Não	Não	Não	Não	Não
	Varanda	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
	Suite	Não	Não	Sim	Sim	Não
	Dif. Entrega	Não	Piso Laminado	Piso Laminado e Decorado	Piso Laminado e Decorado	Piso Laminado e Decorado
	Vagas	5% de Vagas	7% de Vagas	13% de Vagas	9% de Vagas	Sem Vagas
	Lazer	Piscina Adulto e Infantil, Quadra, Salão de Festas, Play Kids, Play Baby, Play Pet, Espaço Relax, Espaço Cultivo, Multipla Estação, Quadra, Espaço para Food Truck, Brinquedoteca, Espaço Saúde, Espaço Teen, Espaço office, Sport Bar, Fitness, Espaço delivery e Mini Market.	Churrasqueiras, Piscina, Mini quadra, Playground, Salão de Festas, Pet Care, Coworking, Brinquedoteca, Mini Mercado (sugestão de uso), Delivery, Sala de Jogos, Sala Multiuso, Lavanderia, Espaço Bem-Estar, Sala de Ginástica - Yoga.	Academia ao ar livre, Bicicletário, Brinquedoteca, Churrasqueria, Coworking, Fitness Center, Lavanderia, Mercado, Pet Place, Piscina, Piscina infantil, Quadra, Redário, Salão de Festas, Salão de Jogos, Sauna Úmida, Pista caminhada.	Academia ao ar livre, Bar, Bicicletário, Brinquedoteca, Churrasqueria, Coworking, Espaço delivery, Fitness Center, Lavanderia, Lounge, Pet Place, Piscina, Piscina infantil, Pista caminhada, Playground, Quadra de Tênis, Redário, Salão de Festas, Salão de Jogos, Sauna Seca.	Bicicletário, Brinquedoteca, Coworking, Fitness Center, Lavanderia, Pet Place, Piscina, Playground, Quadra Poliesportiva, Redário, Salão de Festas.

Diagnóstico Concorrência

- Os preços apresentados na tabela ao lado correspondem às tipologias com varanda e sem vaga dos empreendimentos concorrentes;
- O Oásis Penha está localizado em uma região comparável à dos concorrentes mapeados;
- O projeto Oásis Penha conta com atributos como Varanda, quadra e Piscina, esses atributos deixam o projeto em um patamar de atratividade mais semelhante ao da concorrência;

- **No próximo slide traremos um detalhamento da performance da concorrência por tipologia.**

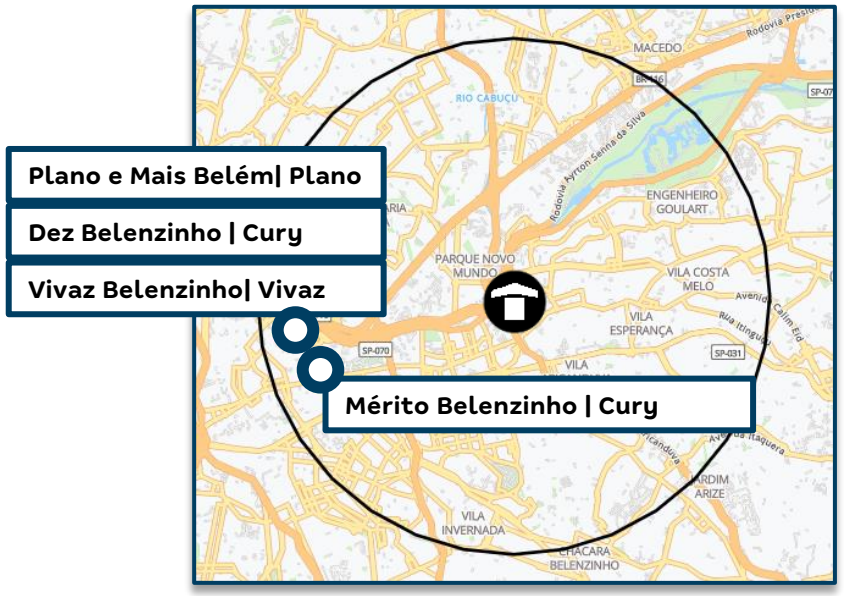

Detalhamento de Preços da Concorrência

Com o objetivo de trazer mais clareza sobre a performance da concorrência, organizamos na tabela abaixo os dados de preço e volume de cada projeto da concorrência por tipologia. Com essa análise, demonstramos nosso conforto quando ao preço, considerando que:

- A Tenda apresenta o menor preço na tipologia 2 Dormitórios com Varanda, com uma diferença de aproximadamente R$ 16 mil em relação ao concorrente mais próximo (Plano & Mais Belém);
- Os empreendimentos da Cury apresentam uma VSO superior à da Tenda na tipologia com varanda, mesmo praticando preços acima do estimado para o Oásis Penha;
- O Plano & Mais Belém e o Vivaz Belezinho registram uma VSO inferior à meta estipulada para o Oásis Penha. No entanto, essa performance está diretamente relacionada à baixa representatividade da tipologia com varanda nesses projetos (14% no Plano e 10% no Vivaz).

Enpreendimento	Plano & Mais Belém					Vivaz Belezinho					Mérito Belezinho					Dez Belezinho					Oásis Penha				
Tipologia	% Und.	m²	Avaliação	Preço	VSO	% Und.	m²	Avaliação	Preço	VSO	% Und.	m²	Avaliação	Preço	VSO	% Und.	m²	Avaliação	Preço	VSO	% Und.	m²	Avaliação	Preço	VSO
1 Dorm	-	-	-	-	-	42%	24,3m²	224.600	226.900	24	3%	34m²	355.000	249.016	2	3%	34,5m²	342.000	246.816	2	-	-	-	-	-
1 Dorm C/ Varanda	80%	27,3m²	S/I	237.576	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Dorms	-	-	-	-	-	48%	32,3m²	300.000	260.900	55	34%	34m²	355.000	250.216	39	32%	34,2m²	342.000	247.687	19	4%	32m²	265.000	234.008	1
2 Dorms C/ Varanda	14%	35,2m²	S/I	295.266	14	10%	36,7m²	345.000	313.900	11	54%	37m²	390.075	312.167	76	52%	37,1m²	366.000	300.471	38	91%	33,8m²	284.000	279.374	34
2 Dorms C/ Vaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Dorms C/ Varanda E Vaga	7%	35,2m²	S/I	348.655	5	-	-	-	-	-	9%	41m²	440.000	430.053	6	13%	44,8m²	436.000	440.105	5	5%	33,8m²	309.000	343.100	2
Total Ponderado	**100%**	**-**	**S/I**	**253.036**	**46**	**100%**	**-**	**272.704**	**251.866**	**90**	**100%**	**-**	**381.385**	**299.439**	**123**	**100%**	**-**	**366.409**	**299.530**	**64**	**100%**	**-**	**284.567**	**280.938**	**37**

*Os dados da tabela acima refletem os dados de performance da concorrência até maio/25

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Oásis Penha			
Tipo:	HIS		HIS	
Método	Ref - Melodia Jaçanã		Vision	
Avaliação	265.000		265.000	
Renda Inicial (VF)	3.627		3.697	
Renda Final*	-		-	
% RET1	25%		25%	
Tipo:	VF	R$	VF	R$
Ato	0,42	1.559	0,79	2.907
FGTS	1,13	4.153	0,72	2.659
Financiamento	95,73%	180.665	97,85%	183.174
Subsídio	142,85%	3.544	154,89%	3.551
Prazo de Pró-soluto	30	30	30	30
Pró-Soluto	83,63%	33.061	80,03%	32.250
Preço Raso (RS)	222.982	222.982	224.541	224.541
TCD	36,97%	13.514	25,40%	9.467
VSO	1	1	1	1
Preço de Venda	**233.576**	**233.576**	**234.008**	**234.008**
Elasticidade	1,250%	1,250%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**236.496**	**236.496**	**234.008**	**234.008**
Preço Raso (R$)	**222.982**		**224.541**	
% de Raso	**94,29%**		**95,95%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**0**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**0**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Oásis Penha	
Tipo:	**HIS - Varanda**	**HIS - Varanda**
Método	**Ref - Melodia Jaçanã**	**Vision**
Avaliação	284.000	284.000
Renda Inicial (VF)	0	4.312
Renda Final*	-	-
% RET1	100%	0%

Tipo:		VF	R$
Ato	O projeto **Melodia Jaçanã** não teve vendas de unidades HIS com Varanda.	0,53	2.282
FGTS		0,64	2.771
Financiamento		96,15%	189.663
Subsídio		140,34%	1.818
Prazo de Pró-soluto		30	30
Pró-Soluto		70,98%	33.360
Preço Raso (RS)		229.893	229.893
TCD		42,49%	18.467
VSO		1	1
Preço de Venda		**248.360**	**248.360**
Elasticidade		0,000%	0,000%
Preço de Venda Final		**248.360**	**248.360**
Preço Raso (R$)		**229.893**	
% de Raso		**92,56%**	
BP25 - Não Inflacionado		**0**	
BP25 - Inflacionado		**0**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Oásis Penha			
Tipo:	HMP - Varanda		HMP - Varanda	
Método	Ref - Melodia Jaçanã		Vision	
Avaliação	284.000		284.000	
Renda Inicial (VF)	5.686		5.391	
Renda Final*	-		-	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	VF	R$	VF	R$
Ato	0,36	2.048	0,39	2.082
FGTS	1,22	7.034	0,93	5.012
Financiamento	94,61%	203.589	97,54%	216.374
Subsídio	0,00%	453	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	30	30	30	30
Pró-Soluto	71,03%	44.025	62,18%	36.540
Preço Raso (RS)	257.150	257.150	260.008	260.008
TCD	20,66%	11.844	36,59%	19.882
VSO	33	33	33	33
Preço de Venda	**265.673**	**265.673**	**279.890**	**279.890**
Elasticidade	1,250%	1,250%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**268.994**	**268.994**	**279.890**	**279.890**
Preço Raso (R$)	**257.150**		**260.008**	
% de Raso	**95,60%**		**92,90%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**0**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**0**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Oásis Penha			
Tipo:	HMP - Varanda + Vaga		HMP - Varanda + Vaga	
Método	Ref - Melodia Jaçanã		Vision	
Avaliação	309.000		309.000	
Renda Inicial (VF)	6.146		6.465	
Renda Final*	-		-	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	VF	R$	VF	R$
Ato	2,84	17.697	0,85	5.513
FGTS	0,17	1.058	0,74	4.778
Financiamento	90,74%	224.377	97,61%	241.300
Subsídio	0,00%	0	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	30	30	30	30
Pró-Soluto	90,21%	60.431	90,13%	63.510
Preço Raso (RS)	303.564	303.564	315.101	315.101
TCD	8,93%	5.529	42,97%	27.999
VSO	2	2	2	2
Preço de Venda	**305.277**	**305.277**	**343.100**	**343.100**
Elasticidade	1,250%	1,250%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**309.093**	**309.093**	**343.100**	**343.100**
Preço Raso (R$)	**303.564**		**315.101**	
% de Raso	**98,21%**		**91,84%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**0**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**0**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Oásis Penha
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	284.567
Renda Inicial (VF)	5.365
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,43	2.296
FGTS	0,91	4.875
Financiamento	97,53%	215.990
Subsídio	8,08%	164
Prazo de Pró-soluto	30	30
Pró-Soluto	64,46%	37.731
Preço Raso (RS)	261.057	261.057
TCD	36,57%	19.881
VSO	37	37
Preço de Venda	**280.938**	**280.938**
Elasticidade	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**280.938**	**280.938**
Preço Raso (R$)	**261.057**	
% de Raso	**92,92%**	
Raso Todas as Fases	**261.057**	
Nominal Todas as Fases	**280.938**	

1

Análise de Riscos

Farol IM

IM avalia o Preço Vision como **factível**.

1) O I.M está em linha com o preço do Vision, considerando que o projeto está localizado em uma região estratégica, com excelentes indicadores sociodemográficos, como alta renda média e PEA/Dia. Além disso, o empreendimento conta com atributos relevantes, como varanda, quadra e piscina, que aumentam sua atratividade e justificam um posicionamento de preço mais elevado.

Outro fator que contribui para a viabilidade do preço é que o recém-lançado Melodia Jaçanã já vem praticando valores semelhantes aos estimados para o Oásis Penha, mesmo estando localizado em uma região com indicadores sociodemográficos inferiores.

Conforme apresentado no slide "Panorama de Concorrência", os projetos da região são comercializados para um perfil de renda semelhante ao estimado para o Viva Penha. No entanto, esses empreendimentos praticam preços nominais mais altos e exigem um fluxo de pagamento no PSOL com parcelas superiores. Por esses diferenciais, acreditamos que o Viva Penha se posiciona de forma competitiva no mercado.

Escalonamento de preços ZL	Preço Real					Preço Normalizado (30m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Palermo	235.902	211.462	3.667	7	28	1.907	213.368
Reserva das Andorinhas	231.396	212.284	3.900	21	25	5.112	217.397
Viver Mais	237.880	217.568	3.800	52	29	970	218.538
Viva São Miguel	234.192	204.988	3.800	25	14	18.874	223.863
Viva Parque do Carmo	242.823	228.474	4.343	38	27	3.725	232.199
Viva Penha	284.567	261.057	5.365	37	30	0	261.057

Ciclo Financeiro – Análise Concorrência

Incorporadora: Plano&Plano

Inf. Produto	Plano&Reserva da Mooca
Data Lanç	01/05/2024
Qtde de unidade	250
Estoque	108
Renda	3.500
Tipologias	HIS2 : 105 unidades
Tipologias	R2V: : 3 unidades

Preço	
HIS2 - 35m²	291.465
R2V -35m²	344.167

Fluxo	
Ato	200
Prazo Pró-Soluto	25 meses
% Pró-Soluto	40%
Prazo TCD	não cobra
% Parcela TCD	não cobra
ITBI	Imovel acima de 240k paga
Correção	INCC

Incorporadora: Plano&Plano

Inf. Produto	Plano&Mais Belém
Data Lanç	15/10/2024
Qtde de unidade	930
Estoque	663
Renda	3.800
Tipologias	HIS1- 526 unidades
Tipologias	HIS2 - 89 unidades
Tipologias	R2V - 48 unidades

Preço	
HIS2 - 35m²	291.465
R2V -35m²	344.167

Fluxo	
Ato	200
Prazo Pró-Soluto	21 meses
%Pró-Soluto	40%
Prazo TCD	não cobra
% Parcela TCD	não cobra
ITBI	Imovel acima de 240k paga
Correção	INCC

Incorporadora: VIVAZ

Inf. Produto	Vivaz Belenzinho
Data Lanç	01/10/2024
Qtde de unidade	799
Estoque	350
Renda	-
Tipologias	HIS1 / HMP/ R2V

Preço	
HMP: 32m²	265.500
R2V(c/varanda):	310.000

Fluxo	
Ato	500
Prazo Pró-Soluto	31 Meses
%Pró-Soluto	18% Máximo
Prazo TCD	Não Cobra
% Parcela TCD	Não Cobra
ITBI	Gratuito
Correção	INCC

Parecer Ciclo

O Ciclo avaliou Preço e VSO como factíveis. O projeto está em uma região estratégica e de grande potencial, mesmo com o panorama de concorrência na área bastante acirrado, além de termos as vantagens:

- projeto competitivo em atributos;
- preço e condição de pagamento.

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Oásis Penha			
Tipo:	**HIS**		**HIS**	
Método	**Ref - Melodia Jaçanã**		**Vision**	
Avaliação	265.000		265.000	
Renda Inicial (VF)	3.627		3.447	
Renda Final*	-		-	
% RET1	25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,42	1.559	0,84	2.907
FGTS	1,13	4.153	0,77	2.659
Financiamento	96,84%	180.665	99,73%	183.174
Subsídio	142,85%	3.544	109,89%	3.551
Prazo de Pró-soluto	27	27	27	27
Pró-Soluto	83,63%	29.755	85,84%	29.025
Preço Raso (RS)	219.676	219.676	221.316	221.316
TCD	36,97%	13.514	27,25%	9.467
VSO	1	1	1	1
Preço de Venda	**230.311**	**230.311**	**230.783**	**230.783**
Elasticidade	1,250%	1,250%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**233.190**	**233.190**	**230.783**	**230.783**
Preço Raso (R$)	**219.676**		**221.316**	
% de Raso	**94,20%**		**95,90%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**0**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**0**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Oásis Penha	
Tipo:	**HIS - Varanda**	**HIS - Varanda**
Método	**Ref - Melodia Jaçanã**	**Vision**
Avaliação	284.000	284.000
Renda Inicial (VF)	0	4.312
Renda Final*	-	-
% RET1	100%	0%

Tipo:		VF	R$
Ato	O projeto **Melodia Jaçanã** não teve vendas de unidades HIS com Varanda.	0,53	2.282
FGTS		0,64	2.771
Financiamento		97,09%	189.663
Subsídio		140,34%	1.818
Prazo de Pró-soluto		27	27
Pró-Soluto		70,98%	30.024
Preço Raso (RS)		226.557	226.557
TCD		42,49%	18.467
VSO		1	1
Preço de Venda		**245.024**	**245.024**
Elasticidade		0,000%	0,000%
Preço de Venda Final		**245.024**	**245.024**
Preço Raso (R$)		**226.557**	
% de Raso		**92,46%**	
BP25 - Não Inflacionado		**0**	
BP25 - Inflacionado		**0**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Oásis Penha			
Tipo:	**HMP - Varanda**		**HMP - Varanda**	
Método	**Ref - Melodia Jaçanã**		**Vision**	
Avaliação	284.000		284.000	
Renda Inicial (VF)	5.686		5.391	
Renda Final*	-		-	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,36	2.048	0,39	2.082
FGTS	1,22	7.034	0,93	5.012
Financiamento	96,18%	203.589	98,32%	216.374
Subsídio	0,00%	453	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	27	27	27	27
Pró-Soluto	71,03%	39.623	62,18%	32.886
Preço Raso (RS)	252.748	252.748	256.354	256.354
TCD	20,66%	11.844	36,59%	19.882
VSO	33	33	33	33
Preço de Venda	**261.325**	**261.325**	**276.236**	**276.236**
Elasticidade	1,250%	1,250%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**264.591**	**264.591**	**276.236**	**276.236**
Preço Raso (R$)	**252.748**		**256.354**	
% de Raso	**95,52%**		**92,80%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**0**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**0**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Oásis Penha			
Tipo:	HMP - Varanda + Vaga		HMP - Varanda + Vaga	
Método	Ref - Melodia Jaçanã		Vision	
Avaliação	309.000		309.000	
Renda Inicial (VF)	6.146		6.465	
Renda Final*	-		-	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	VF	R$	VF	R$
Ato	2,84	17.697	0,85	5.513
FGTS	0,17	1.058	0,74	4.778
Financiamento	92,55%	224.377	97,61%	241.300
Subsídio	0,00%	0	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	27	27	27	27
Pró-Soluto	90,21%	54.388	90,13%	57.159
Preço Raso (RS)	297.520	297.520	308.750	308.750
TCD	8,93%	5.529	42,97%	27.999
VSO	2	2	2	2
Preço de Venda	**299.308**	**299.308**	**336.749**	**336.749**
Elasticidade	1,250%	1,250%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**303.050**	**303.050**	**336.749**	**336.749**
Preço Raso (R$)	**297.520**		**308.750**	
% de Raso	**98,18%**		**91,69%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**0**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**0**	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Resumo

Oasis Penha - SP - São Paulo Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	jun-21							
L SEM VARANDA SEM VAGA		jun-25	dez-25	out-27	6 meses	22 meses	jun-28	36 meses
COM VARANDA SEM VAGA		jun-25	dez-25	out-27	6 meses	22 meses	jun-28	36 meses
PCOM VARANDASEM VAGA		jun-25	dez-25	out-27	6 meses	22 meses	jun-28	36 meses
COM VARANDACOM VAGA		jun-25	dez-25	out-27	6 meses	22 meses	jun-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	21,91 MM	**Incorrido Terreno:** 1,85 MM	**Área do Terreno (100%):**	6.779 m²	**Área Líquida do Terreno:** 6.232 m²
Cash:	21,91 MM		**Custo de terreno m²:**	3.231,6	**Custo de terreno m² Área Líquida:** 3.515,4
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 11,8% / 48,4%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.** 4,5 / 3,2
Ato / %VGV:	0,84 MM / 0,4%		**Incorrido de Construção:**	1,31 MM	**Incorridos de Incorporação:** 0,70 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
L SEM VARANDA SEM VAGA	T+17	221.316	26	230.783	265.000	99,7%	85,8%	27,2%
COM VARANDA SEM VAGA	T+17	226.557	10	245.024	284.000	97,1%	71,0%	42,5%
PCOM VARANDASEM VAGA	T+17	256.354	601	276.236	284.000	98,3%	62,2%	36,6%
COM VARANDACOM VAGA	T+17	308.750	35	336.749	309.000	97,6%	90,1%	43,0%

Unidades Totais:	672	**Preço Médio:**	277.165	**Renda Média:**	5.356	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	8.118
Unidades Tenda:	672	**Avaliação Média:**	284.567	**Ato:**	2.305 (0,43 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	17.447
VSO:	37 Unidades	**VGV Total:**	186.254.660	**FGTS:**	4.870 (0,91 Salários)	**Preço Raso Médio:**	257.284
RET Médio:	4,0%	**VGV Tenda:**	186.254.660	**% em RET 1%:**	1%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit.:	101.611	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	33,24	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**27.057.416**	**LI:**	**20,03%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**18.584.372**	**Margem Bruta Econômica:**	**40,60%**
TIR:	**59,06%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(14.724.697)**	**Margem Bruta REF:**	**44,15%**
Exposição de Caixa:	**10,08%**	**Δ LI:**	**0,03%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**34.566.229**	**Margem Rasa Econômica:**	**35,39%**
Payback Contingente (21 m):	**18 m/ (-3 m)**	**LI Marginal:**	**24,75%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**51.215.173**	**Margem Rasa REF:**	**39,84%**
Payback Consolidado:	**18 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**28,09%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Oasis Penha		HIS1 SEM VARANDA		HIS1 COM VARANDA		HIS2/ HMP COM VARANDA		HIS2/ HMP COM VARANDA	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	184.315	100,0%	5.854	100,0%	2.458	100,0%	164.485	100,0%	11.518	100,0%
PIS/COFINS	(4.019)	2,2%	(104)	1,8%	(54)	2,2%	(3.608)	2,2%	(253)	2,2%
Custo Total	(107.092)	59,4%	(4.132)	71,9%	(1.589)	66,1%	(95.808)	59,6%	(5.563)	49,4%
Custo Terreno	(24.298)	13,5%	(940)	16,3%	(362)	15,0%	(21.731)	13,5%	(1.266)	11,2%
Custo Relacionados a Terreno	(2.127)	1,2%	(82)	1,4%	(32)	1,3%	(1.902)	1,2%	(111)	1,0%
Custos de Incorporação	(3.486)	1,9%	(123)	2,1%	(48)	2,0%	(3.148)	2,0%	(167)	1,5%
Custo de Construção	(77.182)	42,8%	(2.986)	51,9%	(1.149)	47,8%	(69.027)	42,9%	(4.020)	35,7%
Lucro Bruto Econômico	73.204	40,6%	1.618	28,1%	815	33,9%	65.069	40,4%	5.703	50,6%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	73.204	40,6%	1.618	28,1%	815	33,9%	65.069	40,4%	5.703	50,6%
Despesas de Selling	(18.321)	10,2%	(487)	8,5%	(241)	10,0%	(16.423)	10,2%	(1.171)	10,4%
Contingência	(4.239)	2,4%	(135)	2,3%	(57)	2,4%	(3.783)	2,4%	(265)	2,4%
Margem de Contribuição	50.644	28,1%	997	17,3%	518	21,5%	44.862	27,9%	4.267	37,9%
IR e CSLL	(3.288)	1,8%	(85)	1,5%	(44)	1,8%	(2.952)	1,8%	(207)	1,8%
Margem Líquida	47.355	26,3%	911	15,8%	473	19,7%	41.910	26,1%	4.061	36,0%
Lucro Bruto REF Unit.	124.505	44,2%	79.427	33,4%	89.749	36,2%	124.178	44,0%	185.813	54,0%
Lucro Raso REF Unit.	104.201	39,8%	69.712	30,6%	71.162	31,0%	103.868	39,6%	157.249	49,8%

R$ Mil - VPL - Compra	Oasis Penha		HIS1 SEM VARANDA		HIS1 COM VARANDA		HIS2/ HMP COM VARANDA		HIS2/ HMP COM VARANDA	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	135.093	100,0%	4.149	100,0%	1.827	100,0%	120.803	100,0%	8.313	100,0%
PIS/COFINS	(2.902)	2,1%	(73)	1,8%	(39)	2,2%	(2.610)	2,2%	(180)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(105.134)	77,8%	(3.803)	91,7%	(1.539)	84,2%	(94.100)	77,9%	(5.691)	68,5%
Custo Terreno	(19.157)	14,2%	(741)	17,9%	(285)	15,6%	(17.133)	14,2%	(998)	12,0%
Custo Relacionados a Terreno	(2.463)	1,8%	(95)	2,3%	(37)	2,0%	(2.202)	1,8%	(128)	1,5%
Custos de Incorporação	(3.024)	2,2%	(106)	2,6%	(41)	2,2%	(2.734)	2,3%	(143)	1,7%
Custo de Construção	(60.652)	44,9%	(2.347)	56,6%	(903)	49,4%	(54.243)	44,9%	(3.159)	38,0%
Despesas de Selling	(15.873)	11,7%	(403)	9,7%	(220)	12,1%	(14.233)	11,8%	(1.017)	12,2%
Contingência	(1.591)	1,2%	(51)	1,2%	(21)	1,2%	(1.420)	1,2%	(99)	1,2%
IR e CSLL	(2.375)	1,8%	(60)	1,4%	(32)	1,8%	(2.136)	1,8%	(147)	1,8%
Lucro Imobiliário	27.057	20,0%	273	6,6%	249	13,6%	24.093	19,9%	2.442	29,4%

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Escritura	Atual	Atual vs Escritura	Δ%
Data Estudo:	abril-25	junho-25	2 Meses	N/A
Lançamento:	julho-25	junho-25	-1 Meses	N/A
Uhs:	672	672	-	0,0%
Preço Nominal:	274.930	277.165	2.235	0,8%
Preço Raso:	254.753	257.284	2.531	1,0%
Preço Nominal Inflacionado:	285.772	283.435	(2.336)	-0,8%
Preço Raso Inflacionado:	264.818	263.131	(1.687)	-0,6%
Renda Média:	5.177	5.356	179	3,5%
RET Médio:	3,97%	3,97%	0,0 p.p.	0,0%
% em RET 1%:	0,97%	0,97%	0,0 p.p.	0,0%
VSO:	37	37	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	8.957	8.868	(90)	-1,0%
Avaliação:	306.310	284.567	(21.743)	-7,1%
Prazo construção F1:	22	22	-	0,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	27	27	-	0,0%
Custo Total Inf (Unit):	159.000	159.363	362	0,2%
Custo Construção (Unit):	99.949	101.611	1.662	1,7%
Fração de construção:	36%	36,7%	0,3 p.p.	0,8%
INCC Folha Rosto:	1.173,78	1.184,46	11	0,9%
Custo Terreno Inf:	23.942.829	24.297.932	355.103	1,5%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	3.306	3.165	(142)	-4,3%
Fração do Terreno[1]:	11,6% / 48,0%	11,8% / 48,4%	0,2 p.p.	1,7%
Custo de Incorp. por uh:	5.362	5.187	(175)	-3,3%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	6.019.309	5.959.107	(60.202)	-1,0%
Custo do Ciclo (Unit):	17.306	17.447	141	0,8%
Lucro Imobiliário:	20,3%	20,0%	-0,3 p.p.	-1,5%
LI Marginal:	25,0%	24,7%	-0,3 p.p.	-1,2%
Exposição de caixa:	10,6%	10,1%	-0,5 p.p.	-5,1%
TIR:	57,9%	59,1%	1,2 p.p.	2,0%
Margem Bruta REF:	44,8%	44,2%	-0,6 p.p.	-1,4%
Margem Bruta Econômica:	41,4%	40,6%	-0,8 p.p.	-2,0%
Margem Rasa REF:	40,4%	39,8%	-0,6 p.p.	-1,4%
Margem Rasa Econômica:	36,2%	35,4%	-0,8 p.p.	-2,3%
Margem Contribuição Econômica:	29,0%	28,1%	-0,9 p.p.	-3,0%
Payback Contingente (Régua 21 m):	18 m/ (-3 m)	18 m/ (-3 m)	0	0,0%
Payback Consolidado:	18 Meses	18 Meses	0 Meses	0,0%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Resumo

Oasis Penha - SP - São Paulo Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	jun-21							
L SEM VARANDA SEM VAGA		jun-25	mar-26	jan-28	9 meses	22 meses	jun-28	36 meses
COM VARANDA SEM VAGA		jun-25	mar-26	jan-28	9 meses	22 meses	jun-28	36 meses
PCOM VARANDASEM VAGA		jun-25	mar-26	jan-28	9 meses	22 meses	jun-28	36 meses
COM VARANDACOM VAGA		jun-25	mar-26	jan-28	9 meses	22 meses	jun-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	21,91 MM	**Incorrido Terreno:** 1,85 MM	**Área do Terreno (100%):**	6.779 m²	**Área Líquida do Terreno:** 6.232 m²
Cash:	21,91 MM		**Custo de terreno m²:**	3.231,6	**Custo de terreno m² Área Líquida:** 3.515,4
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 11,6% / 48,4%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.** 4,5 / 3,2
Ato / %VGV:	0,84 MM / 0,4%		**Incorrido de Construção:**	1,31 MM	**Incorridos de Incorporação:** 0,70 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
L SEM VARANDA SEM VAGA	T+17	224.541	26	234.008	265.000	97,8%	80,0%	25,4%
COM VARANDA SEM VAGA	T+17	229.893	10	248.360	284.000	96,1%	71,0%	42,5%
PCOM VARANDASEM VAGA	T+17	260.008	601	279.890	284.000	97,5%	62,2%	36,6%
COM VARANDACOM VAGA	T+17	315.101	35	343.100	309.000	97,6%	90,1%	43,0%

Unidades Totais:	672	**Preço Médio:**	280.938	**Renda Média:**	5.365	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	8.323
Unidades Tenda:	672	**Avaliação Média:**	284.567	**Ato:**	2.297 (0,43 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	17.685
VSO:	#REF!	**VGV Total:**	188.790.209	**FGTS:**	4.868 (0,91 Salários)	**Preço Raso Médio:**	261.057
RET Médio:	4,0%	**VGV Tenda:**	188.790.209	**% em RET 1%:**	1%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit.:	103.368	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	33,24	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**25.931.805**	**LI:**	**19,45%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**16.543.673**	**Margem Bruta Econômica:**	**40,20%**
TIR:	**57,34%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(11.621.817)**	**Margem Bruta REF:**	**43,66%**
Exposição de Caixa:	**8,84%**	**Δ LI:**	**-0,55%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**25.111.416**	**Margem Rasa Econômica:**	**34,97%**
Payback Contingente (21 m):	**19 m/ (-2 m)**	**LI Marginal:**	**24,23%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**51.178.700**	**Margem Rasa REF:**	**39,38%**
Payback Consolidado:	**19 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**27,67%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Oasis Penha		HIS1 SEM VARANDA		HIS1 COM VARANDA		HIS2/HMP COM VARANDA		HIS2/HMP COM VARANDA	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	187.154	100,0%	5.945	100,0%	2.496	100,0%	166.949	100,0%	11.765	100,0%
PIS/COFINS	(4.081)	2,2%	(106)	1,8%	(55)	2,2%	(3.662)	2,2%	(258)	2,2%
Custo Total	(109.483)	59,8%	(4.224)	72,3%	(1.625)	66,6%	(97.947)	60,0%	(5.687)	49,4%
Custo Terreno	(24.298)	13,3%	(940)	16,1%	(362)	14,8%	(21.731)	13,3%	(1.266)	11,0%
Custo Relacionados a Terreno	(2.216)	1,2%	(86)	1,5%	(33)	1,4%	(1.982)	1,2%	(115)	1,0%
Custos de Incorporação	(3.512)	1,9%	(124)	2,1%	(48)	2,0%	(3.172)	1,9%	(168)	1,5%
Custo de Construção	(79.457)	43,4%	(3.074)	52,6%	(1.182)	48,4%	(71.062)	43,5%	(4.138)	36,0%
Lucro Bruto Econômico	73.590	40,2%	1.615	27,7%	816	33,4%	65.340	40,0%	5.819	50,6%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	73.590	40,2%	1.615	27,7%	816	33,4%	65.340	40,0%	5.819	50,6%
Despesas de Selling	(18.628)	10,2%	(498)	8,5%	(244)	10,0%	(16.694)	10,2%	(1.192)	10,4%
Contingência	(4.305)	2,4%	(137)	2,3%	(57)	2,4%	(3.840)	2,4%	(271)	2,4%
Margem de Contribuição	50.658	27,7%	980	16,8%	515	21,1%	44.806	27,4%	4.357	37,9%
IR e CSLL	(3.339)	1,8%	(87)	1,5%	(45)	1,8%	(2.996)	1,8%	(211)	1,8%
Margem Líquida	47.319	25,8%	893	15,3%	470	19,3%	41.810	25,6%	4.146	36,0%
Lucro Bruto REF Unit.	124.805	43,7%	79.189	32,9%	89.567	35,6%	124.356	43,4%	188.743	53,8%
Lucro Raso REF Unit.	104.501	39,4%	69.475	30,0%	70.980	30,5%	104.046	39,1%	160.179	49,7%

R$ Mil - VPL - Compra	Oasis Penha		HIS1 SEM VARANDA		HIS1 COM VARANDA		HIS2/HMP COM VARANDA		HIS2/HMP COM VARANDA	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	133.346	100,0%	4.137	100,0%	1.801	100,0%	119.131	100,0%	8.277	100,0%
PIS/COFINS	(2.864)	2,1%	(73)	1,8%	(39)	2,2%	(2.574)	2,2%	(179)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(104.550)	78,4%	(3.781)	91,4%	(1.530)	84,9%	(93.573)	78,5%	(5.667)	68,5%
Custo Terreno	(19.157)	14,4%	(741)	17,9%	(285)	15,8%	(17.133)	14,4%	(998)	12,1%
Custo Relacionados a Terreno	(2.534)	1,9%	(98)	2,4%	(38)	2,1%	(2.266)	1,9%	(132)	1,6%
Custos de Incorporação	(3.009)	2,3%	(106)	2,6%	(41)	2,3%	(2.719)	2,3%	(143)	1,7%
Custo de Construção	(59.830)	44,9%	(2.315)	55,9%	(890)	49,4%	(53.508)	44,9%	(3.116)	37,6%
Despesas de Selling	(16.132)	12,1%	(412)	10,0%	(223)	12,4%	(14.462)	12,1%	(1.035)	12,5%
Contingência	(1.546)	1,2%	(49)	1,2%	(21)	1,1%	(1.379)	1,2%	(97)	1,2%
IR e CSLL	(2.343)	1,8%	(59)	1,4%	(32)	1,8%	(2.106)	1,8%	(146)	1,8%
Lucro Imobiliário	25.932	19,4%	284	6,9%	233	12,9%	22.984	19,3%	2.431	29,4%

Sensibilidade de Custo e Preço – Cenário Real

GANHO DE ATRIBUTO

Lucro Imobiliário VP (%)

Custo Construção por Unidade	Preço - R$/unidade				
	280.938	**286.557**	**292.175**	**297.794**	**303.413**
99.554	19,4%	20,6%	21,7%	22,8%	23,8%
101.546	18,6%	19,7%	20,9%	21,9%	23,0%
103.537	17,7%	18,9%	20,1%	21,1%	22,2%
105.528	16,9%	18,1%	19,2%	20,3%	21,4%
107.519	16,0%	17,2%	18,4%	19,5%	20,6%

Margem Rasa Econômica (%)

Custo Construção por Unidade	Preço - R$/unidade				
	280.938	**286.557**	**292.175**	**297.794**	**303.413**
99.554	35,0%	36,1%	37,2%	38,2%	39,2%
101.546	34,1%	35,2%	36,3%	37,4%	38,3%
103.537	33,2%	34,3%	35,4%	36,5%	37,5%
105.528	32,3%	33,4%	34,6%	35,6%	36,6%
107.519	31,3%	32,5%	33,7%	34,8%	35,8%

PAYBACK (Meses)

Custo Construção por Unidade	Preço - R$/unidade				
	280.938	**286.557**	**292.175**	**297.794**	**303.413**
99.554	19 meses	19 meses	19 meses	19 meses	19 meses
101.546	20 meses	19 meses	19 meses	19 meses	19 meses
103.537	20 meses	20 meses	19 meses	19 meses	19 meses
105.528	20 meses	20 meses	20 meses	19 meses	19 meses
107.519	20 meses	20 meses	20 meses	20 meses	19 meses

Variação Custo Raso (R$):	1.991
Variação Preço (R$):	5.619
Calibragem	
Variação Preço (%):	**2,00%**
Variação Custo (%):	**2,00%**

PERDA DE ATRIBUTO

Lucro Imobiliário VP (%)

Custo Construção por Unidade					
	258.463	**264.082**	**269.700**	**275.319**	**280.938**
91.590	17,7%	19,1%	20,4%	21,7%	22,9%
93.581	16,8%	18,2%	19,5%	20,8%	22,0%
95.572	15,8%	17,3%	18,6%	20,0%	21,2%
97.563	14,9%	16,4%	17,8%	19,1%	20,3%
99.554	14,0%	15,5%	16,9%	18,2%	19,4%

Margem Rasa Econômica (%)

Custo Construção por Unidade	Preço - R$/unidade				
	258.463	**264.082**	**269.700**	**275.319**	**280.938**
91.590	33,6%	35,0%	36,3%	37,5%	38,6%
93.581	32,6%	34,0%	35,3%	36,5%	37,7%
95.572	31,6%	33,1%	34,4%	35,6%	36,8%
97.563	30,7%	32,1%	33,4%	34,7%	35,9%
99.554	29,7%	31,1%	32,5%	33,8%	35,0%

PAYBACK (Meses)

Custo Construção por Unidade					
	258.463	**264.082**	**269.700**	**275.319**	**280.938**
91.590	19 meses	19 meses	19 meses	19 meses	19 meses
93.581	20 meses	19 meses	19 meses	19 meses	19 meses
95.572	20 meses	20 meses	19 meses	19 meses	19 meses
97.563	20 meses	20 meses	20 meses	19 meses	19 meses
99.554	20 meses	20 meses	20 meses	20 meses	19 meses

Obrigado
