Tenda

sua próxima conquista

Book de Lançamento – Respostas Comitê

Regional: RJ

Projeto: Bosque Jacarepaguá – RZO7

Data Comitê Digital: 13/06/2025

Questionamentos comitê 09/06/2025

Nome	Bosque Jacarepaguá - Lançamento	Observação - Bosque Jacarepaguá
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	De acordo com VSO e Preço. Ponto de preocupação é a dificuldade para trabalhar o produto em função da baixa segurança.
Rodrigo Osmo	Discutir em Comitê	(1) Qual é o risco de termos uma surpresa aqui? “Apesar de já termos o EP finalizado, ainda não recebemos o quantitativo da torre pelo projetista, e por isso, foi considerado o quantitativo de Produto para o pré orçamento. Por se tratar de um T+4 a complexidade e risco são menores.”
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Discutir em Comitê	mesmo tendo só 13% de unidades com vaga, pq estimam que só conseguiremos R$10 mil pela vaga? peers indicados (slide 23) precificando entre 20 e 40 mil a vaga.
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	Ok

Questionamentos – Rodrigo Osmo

“Qual o risco de termos uma surpresa aqui? *“Apesar de já termos o EP finalizado, ainda não recebemos o quantitativo da torre pelo projetista, e por isso, foi considerado o quantitativo de Produto para o pré orçamento. Por se tratar de um T+4 a complexidade e risco são menores.”*

É um risco pequeno, tendo em vista que é uma tipologia T+4, que já estamos habituados em executar, e que o quantitativo utilizado foi levantado pelo projetista que apoia a equipe de Produto, que já conhece o modelo da empresa.

Questionamentos – Luiz Maurício

"Mesmo tendo só 13% de unidades com vagas, pq estimam que só conseguiremos R$10 mil pela vaga? Peers indicados (slide 23) precificando entre 20 e 40 mil a vaga."

Mesmo com concorrentes aplicando valores entre R$20 mil e R$40 mil por vaga, o Bosque apresentou uma avaliação inferior, o que limitou o potencial ganho de preço nas unidades com vaga. Na seguinte tabela, apresentamos o comparativo entre as avaliações do Bosque e dos concorrentes.

Empreendimento	Bosque Jacarepaguá				Conquista Florianópolis			Conquista Itanhanguá Green		
Tipologia	Sem vaga	Com vaga	Garden	Garden c/vaga	Sem vaga	Com vaga	Garden c/vaga	Sem vaga	Com vaga	Garden c/vaga
Avaliação	210.000	220.000	250.000	260.000	233.205	280.000	290.200	255.000	269.280	280.500
Preço Nominal	210.013	220.910	241.693	255.491	224.320	268.844	304.790	259.777	278.163	313.277
CEF	169.788	177.752	197.470	207.223	179.456	215.075	243.832	207.822	222.530	250.622
Renda	2.999	3.248	4.098	5.098	3.395	4.839	5.479	4.325	5.009	5.629

Abaixo, apresentamos também a tabela com a performance dos últimos 3 meses do Soul Taquá (Tenda). Com avaliação superior, o empreendimento conseguiu capturar um ganho aproximado de R$18 mil por vaga. No caso do Bosque, diferente do que acontece no Taquá, esse incremento de preço não foi possível por conta de a avaliação estar limitando o preço de venda das unidades com vaga.

Soul Taquá				
Tipologia	Avaliação	Nominal	Raso	VSO
Com vaga	262.000	235.358	220.587	9
Sem vaga	249.485	217.442	202.738	19
Dif	12.515	17.917	17.849	27

Bosque Jacarepaguá				
Tipologia	Avaliação	Nominal	Raso	VSO
Com vaga	220.000	220.910	198.704	2
Sem vaga	210.000	210.013	187.807	28
Dif	10.000	10.897	10.897	30

One Page – Bosque Jacarepaguá - Aprovação

[1]

Cidade	Rio de Janeiro	**Mancha de demanda**	RJ - - Jacarepaguá
Regional	RJ	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Jun

Unidades (% Vagas)	414 (13%)	**CA Máx | Proj**	1,3 | 0,4
Tipologia	F2 - Concreto	**Escritura**	jun-25
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	jul/25 | 18

[2]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	5.000 (5,7%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	2.500 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	2,9% (50,0%)
Valor R$/m²	487	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[3]

Custo Construção (%VGV)	36.788 (42,3%)	**Indireto Unit.**	16.659
Prazo da Obra (meses)	12	**Torre Unit.**	41.067
Custo Total Unit. (LPU):	88.860 (91)	**Infra Unit.**	17.415
Início de Obra	jan-26	**Fundação Unit.**	5.638

[4]

Preço Nominal Unit.	210.092	**VSO**	32
Preço Raso Unit.	187.886	**Referência**	VISION
Avaliação Unit.	211.860	**Renda (% em RET 1%)**	3.270 (47,2%)



[5]

LI (Régua):	**20,1% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	38,7%
LI Marginal:	23,2%	**Margem Rasa Econômica:**	30,8%
Margem Bruta REF:	41,2%	**Margem Contribuição Econômica:**	26,9%
Margem Rasa REF:	**34,3%**	**Exposição (% VGV):**	15.243 (17,5%)
TIR:	104,8%	**VGV Total:**	86.978
Payback Contingente (21 m) :	**15 m/ (-6 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(13.287)
Payback Consolidado:	15	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	20.523

Destaques

[1] Imóvel fica localizado na mancha RZO7, no bairro do Tanque, em Jacarepaguá, a 300m da esquina com a Est. Do Cafundá, onde se encontra supermercado, grande oferta de comércio e transporte.

[2] R$ 5.000.000,00, sendo R$ 2.500.000,00 em permuta financeira, representados por 3% do VGV e R$ 2.500.000,00 em cash. A parte em cash ficou distribuída em um sinal de R$ 500k (0,59% do VGV), pago em set/24 na PCV e o saldo de R$ 2 MM serão pagos com R$ 1 MM na assinatura da ECV (descontados débitos de IPTU) e R$ 1 MM em 15 parcelas mensais e sucessivas após assinatura da ECV.

[3] Apesar de já termos o EP finalizado, ainda não recebemos o quantitativo da torre pelo projetista, e por isso, foi considerado o quantitativo de Produto para o pré orçamento. Por se tratar de um T+4 a complexidade e risco são menores.

[4] Precificação já adaptada para VF de junho e com as alterações do programa MCMV. Já considerando a avaliação da CEF inclusive para os Gardens
Tipo sem vaga 210k
Tipo com vaga 220k
Garden sem vaga 250k
Garden com vaga 260k
*Os Gardens desse projeto ficaram grandes, 23 m² na média, o que resulta em uma avaliação de R$ 1.700/m² aprox. (como referência parece mais consistente do que o valor absoluto).

[5] Projeto apresenta resultados financeiros dentro das réguas da companhia.

One Page – Bosque Jacarepaguá - Real

Cidade	Rio de Janeiro	**Mancha de demanda**	RJ - - Jacarepaguá
Regional	RJ	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Jun

Unidades (% Vagas)	414 (13%)	**CA Máx | Proj**	1,3 | 0,4
Tipologia	F2 - Concreto	**Escritura**	jun-25
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	jul/25 | 20

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	5.000 (5,7%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	2.500 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	2,9% (50,0%)
Valor R$/m²	487	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	36.788 (42,0%)	**Indireto Unit.**	16.659
Prazo da Obra (meses)	12	**Torre Unit.**	41.067
Custo Total Unit. (LPU):	88.860 (91)	**Infra Unit.**	17.415
Início de Obra	mar-26	**Fundação Unit.**	5.638

[1]	**Preço Nominal Unit.**	211.737	**VSO**	32
	Preço Raso Unit.	189.531	**Referência**	VISION
	Avaliação Unit.	211.860	**Renda (% em RET 1%)**	3.270 (47,2%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	192.657
Preço Inf. Médio Unit.	215.206	**Margem Bruta REF (%)**	41,2%
Custo Inf. Médio Unit.	126.545	**Margem Rasa REF (%)**	34,3%



[2]	**LI (Régua):**	**20,2% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	38,8%
	LI Marginal:	23,4%	**Margem Rasa Econômica:**	30,9%
	Margem Bruta REF:	41,2%	**Margem Contribuição Econômica:**	27,0%
	Margem Rasa REF:	**34,3%**	**Exposição (% VGV):**	13.526 (15,4%)
	TIR:	104,2%	**VGV Total:**	87.659
	Payback Contingente (21 m) :	**16 m/ (-5 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(10.004)
	Payback Consolidado:	16	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	20.673

Destaques

[1] Pró soluto maior (2 meses a mais que a regra de ouro) pois consideramos o início de obra do PCP165 nessa visão.

[2] Projeto apresenta resultados financeiros dentro das réguas da companhia.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Farol Pareceres – Bosque Jacarepaguá

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Pendente assinatura da Escritura de Compra e Venda e Novação, registro do Parcelamento (aguardando emissão da Certidão e do projeto chancelado), registro do memorial de incorporação e averbação das FNA's que atingem o imóvel. - O imóvel está ocupado a título de comodato, com desocupação prevista em até 30 dias após notificação da Tenda nesse sentido, o que ocorrerá com a assinatura da escritura. Será celebrado aditivo ao comodato para formalizar o prazo de desocupação, e a escritura prevê a retenção das parcelas pós-escritura e da participação até a desocupação total do imóvel. - O lote do empreendimento será originado do processo de parcelamento, que resultará em dois lotes: um deles objeto do contrato e o outro, uma área invadida que permanecerá em propriedade dos vendedores. Para fins de agilizar o lançamento, a escritura será lavrada antes do registro do parcelamento, dessa forma, constará em novação que o lote invadido será dado em pagamento aos vendedores, ficando o pagamento das parcelas pós escrituras e da participação, retidos até a conclusão do processo de dação do referido lote invadido.	Ok com ressalvas	
Legalização	O remembramento / desmembramento está aprovado com alvará expedido e com o termo de processamento de recuo assinado, aguardando finalização e emissão da Certidão e do Projeto de Parcelamento chancelado. Há FNAs de drenagem e linha de transmissão que deverão ser gravadas na matrícula. A Licença de Obras foi expedida e Projeto Legal Aprovado. O Licenciamento Ambiental está finalizado com toda documentação expedida.	Ok com ressalvas	
Produto	Não há riscos associados.	Ok	
GETEC	Quantitativo de torre do anteprojeto. Aguardando aprovação de laudo GeoRio.	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos associados.	Ok	
Contratação	Laudo de engenharia com pendência de contratação previsto para 30/06 e sem pendências previsto para 10/07. Laudo de risco previsto para 10/07/25. Retorno da análise jurídica em 14/07/25 (RI previsto para o dia 30/06).	Ok com ressalvas	
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Vision como factível.	Ok	
Comercial/Ciclo	Ok	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- RZO 7 – Rio de Janeiro Oeste]

Lançamento

1. Soul Taquá

LandBank

2. Bosque Jacarepaguá

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 3 - Verde

Região

Capital

Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Bosque Jacarepaguá
Descritivo - Lançamento

Informações Gerais		
Terreno	**Área terreno**	42.545,75m²
	Menor poligonal	42.046,84m²
	Acordo Usocapião	498,91m²
	Aclive Rochoso	31.780,21m²
	Área liquida	10.266,63m²
	Zoneamento	ZRM2-Q
	Ca máximo	1,25
	Ca projetado	0,43
	Ca projetado Sem Aclive Rochoso	1,70
	Gabarito máximo	T+4
Geral	**Total uh**	414
	Total de vagas	54 vagas de carro (Sendo 1 PCD, 29 Comum e 24 Moto) - (13%)
Tipologia	**Tipologia**	Modular sem elevador Flex e Não Flex
	Gabarito	T+04
	Lâmina	01 16pp, 03 14pp e 01 10pp
	Área privativa	33,97, 34,12m² e 34,22m²
	Garden	12uh (2,90%)
Condomínio	**Unidade pcd**	13
	Unidade lazer|técnica	06 | 06
	Torre	06
	Fase	Única
Lazer	**Lazer Interno**	01-Espaço delivery/Minimarket, 02-Espaço Office,03-Espaço oficina, 04-Brinquedoteca, 05-Fitness e 06-Sport Bar
	Lazer Externo	07-Praça de chegada, 08-Play Baby, 09-Play kids, 10-Churrasqueira Gourmet com banheiro e previsão de geladeira, 11-Salão de festas, 12-Fitness externo,13-Play Pet, 14-Mini quadra, 15-Espaço ducha, 16-Múltipla estação

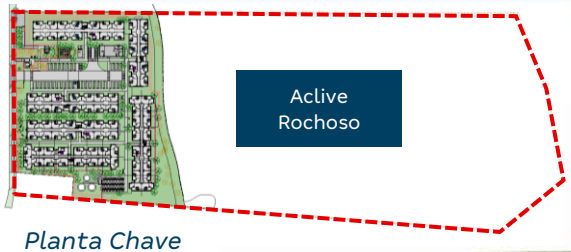

Planta Chave

PRODUTO

Empreendimento Bosque Jacarepaguá
Atributos de produto - Lançamento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Prime**	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	10 unidades de lazer externo: Praça de chegada, Play Kids, Play Baby, Churrasqueira Gourmet com banheiro e previsão de geladeira, Salão de festas externo, Fitness externo, Play Pet, Mini Quadra, Espaço Ducha, Múltipla Estação
	Atributos Torre	Sim	Garden e 06 unidades de lazer interno (sugestões de uso): Espaço delivery/Minimarket, Espaço Office, Espaço oficina, Brinquedoteca, Fitness e Sport Bar
	Edifício Garagem	Não	

	Riscos associados	Parecer	Criticidade
Produto	Não há riscos associados	ok	

Espaço Ducha e Múltipla Estação

Mini Quadra

Garden

Empreendimento Bosque Jacarepaguá
Modulação - Lançamento

Fase única: 414uh (sendo 13PCD e 12 Gardens) - 54 vagas (Sendo 1 PCD, 29 Comum e 24 de moto)				
módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	03 Blocos (T+4)	197Uh (Sendo 07PCD e 6 Gardens)	54 vagas de carro (Sendo 1 PCD, 29 Comum e 24 Moto)	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 01 a Praça de chegada, Play Baby, Play Kids, Churrasqueira Gourmet com banheiro e previsão de geladeira, Salão de festas, Fitness externo, Mini Quadra, Espaço Ducha e Múltipla Estação. Demais lazeres que não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas
Módulo 02	03 Blocos (T+4)	217Uh (Sendo 06PCD e 6 Gardens)	-	Dos Lazeres, esta contemplado no módulo 02 o Play Pet

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Custo de Construção

	BOSQUE JACAREPAGUÁ | REV02	BOSQUE JACAREPAGUÁ | REV01	LVS JARDIM PEÔNIA	BOSQUE JACAREPAGUÁ BP25
Torres	6	6	25	6
Unidades Construídas	420	420	500	420
Unidades Vendidas	414	414	500	414
Total Unidades Vendidas	414	414	500	414
Condomínios (qta.)	1	1	1	1
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	RJ C-5.0	F2 MODULAR
Tipologia	1 Torre | T+04 | 10PP	1 Torre | T+04 | 10PP	T+4 | 4 PP	1 Torre | T+04 | 10PP
Tipologia	3 Torre | T+04 | 14PP	3 Torre | T+04 | 14PP	-	3 Torre | T+04 | 14PP
Tipologia	2 Torre | T+04 | 16PP	2 Torre | T+04 | 16PP	-	2 Torre | T+04 | 16PP
Projeto Infra	EP	AP	-	AP
Projeto Torre	AP	AP	-	AP
Mês Base	abril-25	abril-25	-	agosto-24
Incc	1.184,462	1.178,386	-	1.134,775
LVS	abril-25	março-25	-	-
Indiretos	abril-25	março-25	-	-
Base de Preço	LPU 91	LPU 89	-	-
Takt	2+2	2+2	2+2	2+2
Prazo (mês)	12	12	14	14
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 87.125	R$ / UND R$ 87.674	R$ / UND R$ 84.040	R$ / UND R$ 88.209
Indireto	R$ 16.659	R$ 16.599	R$ 16.194	R$ 17.826
Torre	R$ 41.067	R$ 41.665	R$ 41.556	R$ 42.203
Infra	R$ 17.415	R$ 17.612	R$ 18.673	R$ 19.950
Fundação	R$ 5.638	R$ 5.464	R$ 5.295	R$ 6.039
EEE			R$ 265	
ETE			R$ 1.086	
Contenção	R$ 1.801	R$ 1.774	R$ 200	R$ 559
Terraplenagem	R$ 4.545	R$ 4.560	R$ 771	R$ 1.632
CUSTO TOTAL II	R$ 1.735	R$ 1.349	R$ 5.439	R$ 1.688
Urbanização	R$ 141		R$ 4.542	
Drenagem	R$ 1.280	R$ 1.035		R$ 1.688
Extensão de Rede Elétrica	R$ 121	R$ 121		
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 193	R$ 193	R$ 897	
CUSTO TOTAL III				
Incorridos				
CUSTO TOTAL IV				
Aprendizado				
CUSTO TOTAL V		R$ 459		R$ 3.936
Atualização por INCC		R$ 459		R$ 3.936
CUSTO TOTAL I+II	R$ 88.860	R$ 89.023	R$ 89.479	R$ 89.897
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 88.860	R$ 89.482	R$ 89.479	R$ 93.833

Custo de Construção

	BOSQUE JACAREPAGUÁ | REV02	BOSQUE JACAREPAGUÁ | REV01
Torres	6	6
Unidades Construídas	420	420
Unidades Vendidas	414	414
Total Unidades Vendidas	414	414
Condomínios (qta.)	1	1
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR
Tipologia	1 Torre | T+04 | 10PP	1 Torre | T+04 | 10PP
Tipologia	3 Torre | T+04 | 14PP	3 Torre | T+04 | 14PP
Tipologia	2 Torre | T+04 | 16PP	2 Torre | T+04 | 16PP
Projeto Infra	EP	AP
Projeto Torre	AP	AP
Mês Base	abril-25	abril-25
Incc	1184,462	1178,386
LVS	abril-25	março-25
Indiretos	abril-25	março-25
Base de Preço	LPU 91	LPU 89
Takt	2+2	2+2
Prazo (mês)	12	12

CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 87.125	R$ / UND R$ 87.674	DIF -R$ 549
INDIRETO	R$ 16.659	R$ 16.599	R$ 60
TORRE	R$ 41.067	R$ 41.665	-R$ 599
INFRA	R$ 17.415	R$ 17.612	-R$ 196
FUNDAÇÃO	R$ 5.638	R$ 5.464	R$ 174
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CONTENÇÃO	R$ 1.801	R$ 1.774	R$ 27
TERRAPLENAGEM	R$ 4.545	R$ 4.560	-R$ 15
CUSTO TOTAL II	R$ 1.735	R$ 1.349	R$ 386
VIÁRIO	R$ 141	R$ 0	R$ 141
DRENAGEM	R$ 1.280	R$ 1.035	R$ 245
EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	R$ 121	R$ 121	R$ 0
EXTENSÃO DE REDE HIDRÁULICA	R$ 193	R$ 193	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
INCORRIDOS	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
APRENDIZADO	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 459	-R$ 459
ATUALIZAÇÃO POR INCC	R$ 0	R$ 459	-R$ 459
CUSTO TOTAL	R$ 88.860	R$ 89.482	-R$ 622

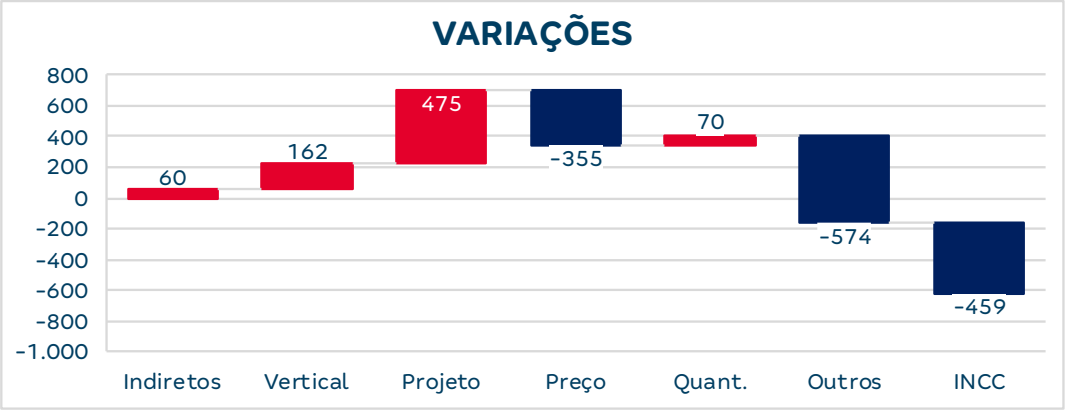

INDIRETOS
+60 | Retroalimentação

VERTICAL
+162 | Retroalimentação

PROJETO
+174 | Anexos (Acréscimo de quadra + quantitativo de estrutura)
+141 | Infra Externa (Sinalização)
+245 | Infra Externa (Aumento no metro linear da drenagem)

PREÇO
+174 | Fundação (MO)
+87 | Armação
-139 | Limpeza Torre
-194 | Gesso
-398 | Telhado

QUANTIDADE
+70 | Muro de Divisa

OUTROS
-458 | Instalações
-128 | Consumo vertical forma

INCC
-459 | Incc

Custo de Construção

	BOSQUE JACAREPAGUÁ | REV02	BOSQUE JACAREPAGUÁ BP25	
Torres	6	6	
Unidades Construídas	420	420	
Unidades Vendidas	414	414	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	
Tipologia	1 Torre | T+04 | 10PP	1 Torre | T+04 | 10PP	
Tipologia	3 Torre | T+04 | 14PP	3 Torre | T+04 | 14PP	
Tipologia	2 Torre | T+04 | 16PP	2 Torre | T+04 | 16PP	
Projeto Infra	EP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	abril-25	agosto-24	
Incc	1184,462	1134,775	
LVS	abril-25	-	
Indiretos	abril-25	-	
Base de Preço	LPU 91	-	
Takt	2+2	2+2	
Prazo (mês)	12	14	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 87.125	R$ / UND R$ 88.209	DIF -R$ 1.084
Indireto	R$ 16.659	R$ 17.826	-R$ 1.167
Torre	R$ 41.067	R$ 42.203	-R$ 1.137
Infra	R$ 17.415	R$ 19.950	-R$ 2.535
Fundação	R$ 5.638	R$ 6.039	-R$ 401
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 1.801	R$ 559	R$ 1.242
Terrapplenagem	R$ 4.545	R$ 1.632	R$ 2.913
CUSTO TOTAL II	R$ 1.735	R$ 1.688	R$ 47
Urbanização	R$ 141	R$ 0	R$ 141
Drenagem	R$ 1.280	R$ 1.688	-R$ 408
Extensão de Rede Eletrica	R$ 121	R$ 0	R$ 121
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 193	R$ 0	R$ 193
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 3.936	-R$ 3.936
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 3.936	-R$ 3.936
CUSTO TOTAL	R$ 88.860	R$ 93.833	-R$ 4.973

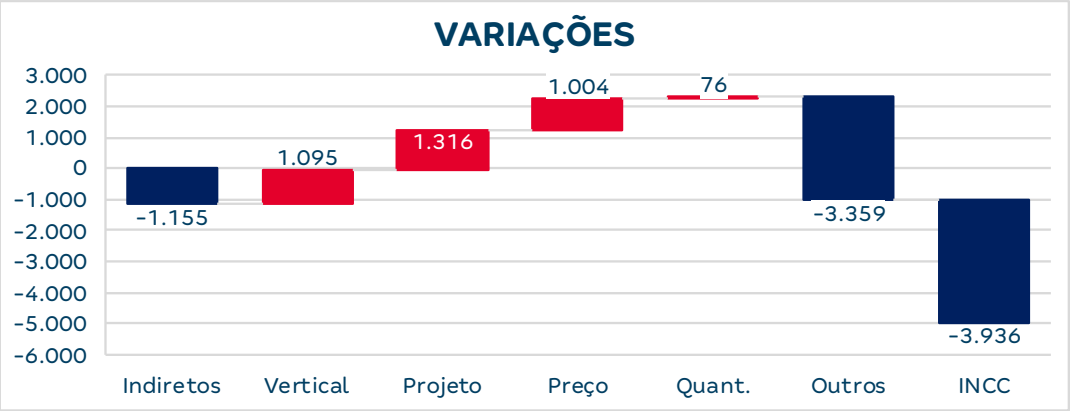

INDIRETOS
-1155 | Redução de prazo de 2 meses.

VERTICAL
+1095 | Plano de carreira vertical e Dissidio.

PROJETO
+2301| G25 – Preparo do Terreno (Acréscimo de troca de solo da fundação)
+1221 | G27 – Contenção (Muro de impacto)
+642 | G77 – Anexos (Rebaixamento de Lençol freático | Acréscimo de anexos)
+245 | Infra Externa (Aumento no metro linear da drenagem externa)

+141 | Infra Externa (Sinalização)
-136 | G36 – Estrutura de Concreto (Mudança para 20mpa)
-209 | G65 – Esquadrias de ferro
-219 | G41 – Alvenaria de Vedação (Fechamento dos Fundos em Esquadria de ferro)
-1156 | G27 – Fundação (Troca de solo no grupo de terraplenagem)
-1660 | G74 – Reservatório Metálico (Anterior: 33.404,6Kg / Atual: 19.099,28Kg)

PREÇO
+612 | G25 – Preparo do Terreno
+755 | G27 – Fundação
+520 | Infra Externa
+139 | G61 – Esquadria de Madeira
-115 | G33 – Concreto
-132 | G32 – Armação
-186 | G84 – Limpeza
-396 | G39 – Gesso Acartonado
-399 | G46 - Telhado

OUTROS
-271 | G45 – Cobertura (MO verticalizada)
-2263 | Instalações
+859 | G73 – Instalações (Drenagem interna considerada no custo I)

INCC
-3936 | Incc

Operações

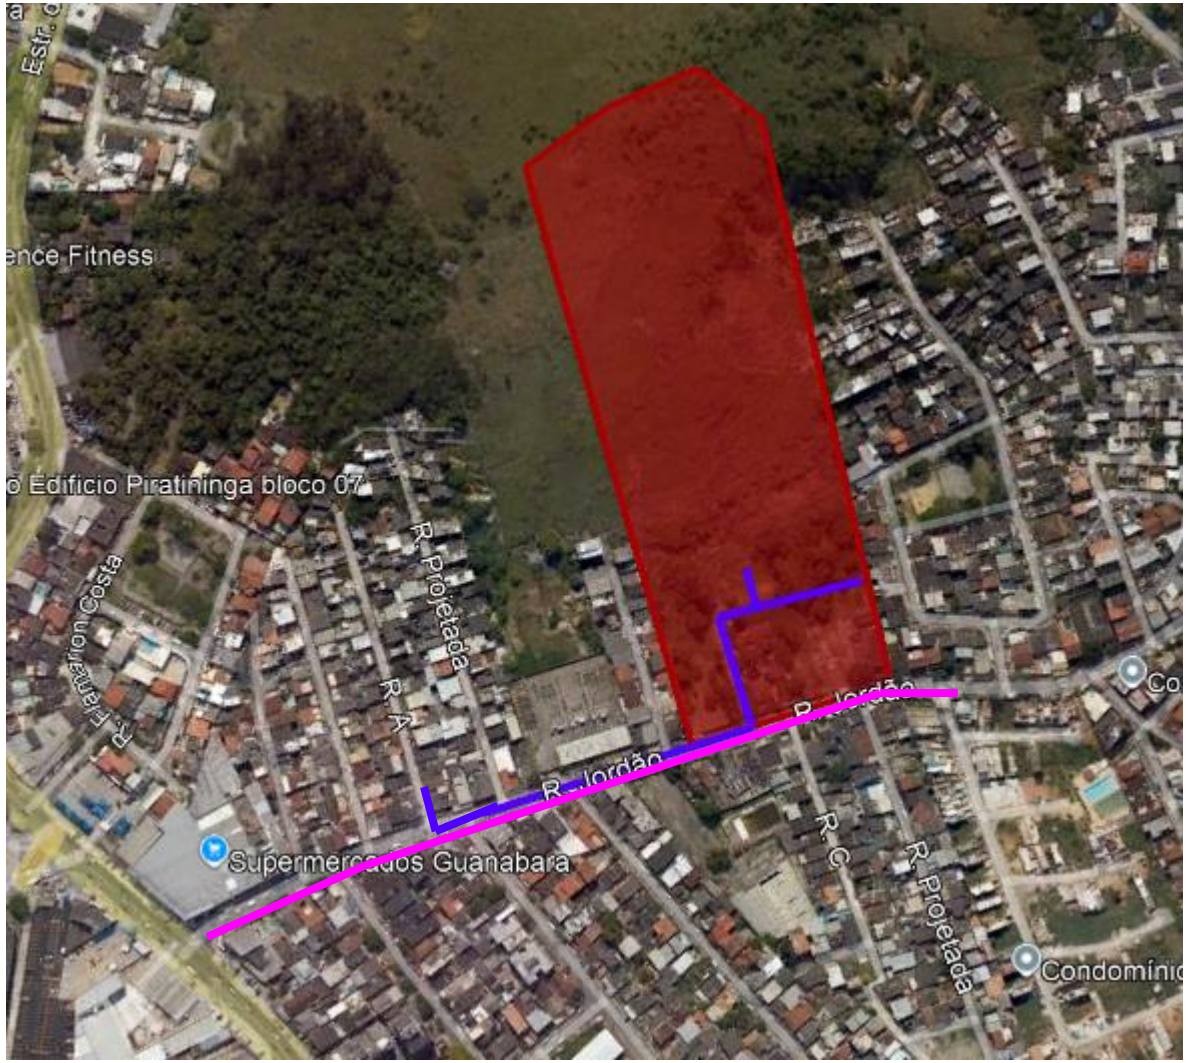

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Viabilidade existente. Ligação na Rua Jordão.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Viabilidade existente. Ligação na Rua Jordão.

SISTEMA DE DRENAGEM
Considerado extensão de drenagem interna e FNA com 425m. Drenagem aprovada com acesso pela light (menor), porém, em acordo com a Rio Águas, por não termos acesso ao terreno da light para confirmação do PV/cotas, desenvolvemos solução alternativa com maior extensão, solicitado para considerá-la no custos, em acordo com a regional.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Viabilidade existente.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado calçada na frente do condomínio, Meio fio e sinalização (placas) conforme projeto.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	Nível 2
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	Nível 3

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida 06/24 com validade até 06/26.

Esgoto:
- Viabilidade emitida 06/24 com validade até 06/26.

Drenagem:
- Projeto aprovado em 05/25.

Elétrica:
- Viabilidade emitida com validade até 08/25.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado calçada na frente do condomínio e sinalização (placas).

Logística

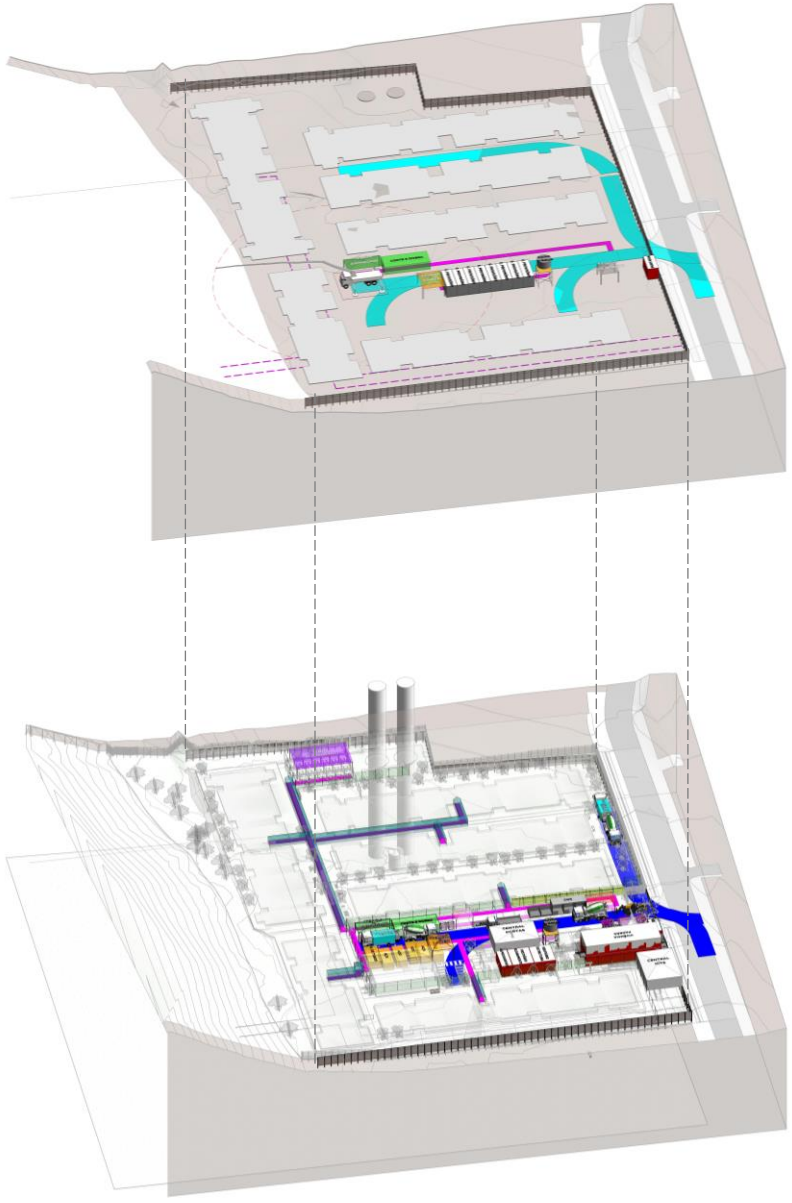

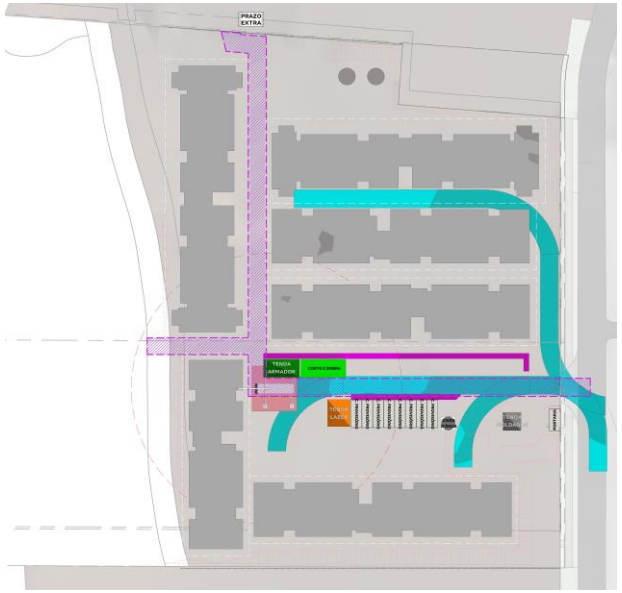

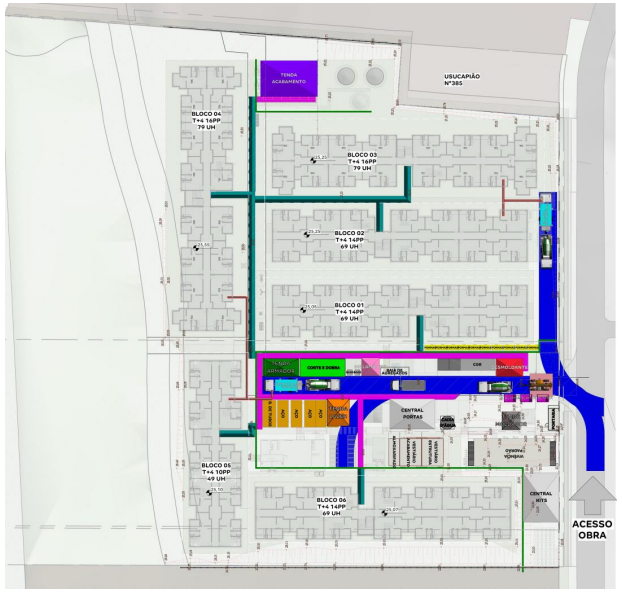

TENDAS_PERÍODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_DESMOLDANTE (LOG)	1	4,00	6,00	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_INFLAMÁVEIS (LOG)	1	4,00	4,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	8,00	12,66	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	8,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_TENDA CENTRAL DE RITS (LOG)	1	11,02	8,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	6,73	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA LAZER (LOG)	1	6,00	5,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_TENDA MOLDADOR (LOG)	1	4,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA

VIVÊNCIA - CONTAINERS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_CONTAINER ALMOXARIFADO (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_CONTAINER PORTARIA (LOG)	1 MÓDULO COM SANITÁRIO	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	CONSIDERAR A DEFINITIVA	CONSIDERAR A DEFINITIVA	UNICA
_TENDA_CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	8 MÓDULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	UNICA
_TENDA_CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG)	2 MÓDULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	-	-	TODO PERÍODO	UNICA
_TENDA_CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG)	2 MÓDULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	7 MÓDULOS DE CONTAINER EMBAIXO, 7 MÓDULOS EM CIMA	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_R01	VARIÁVEL	-	-	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
_TENDA_CAMINHÃO MUNK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR 1/2 PERÍODO DE ESTRUTURA	-	UNICA
_TENDA_SKYTRAK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	UNICA

Logística

BOSQUE JACAREPAGUÁ – RJ

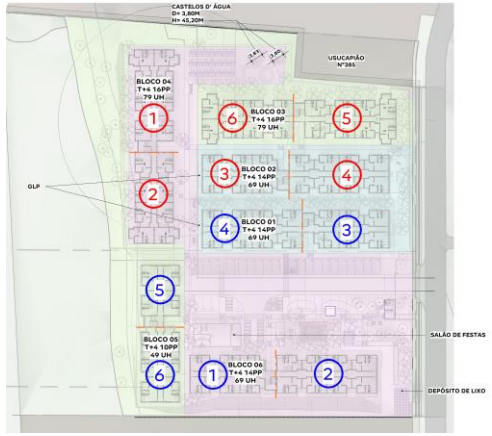

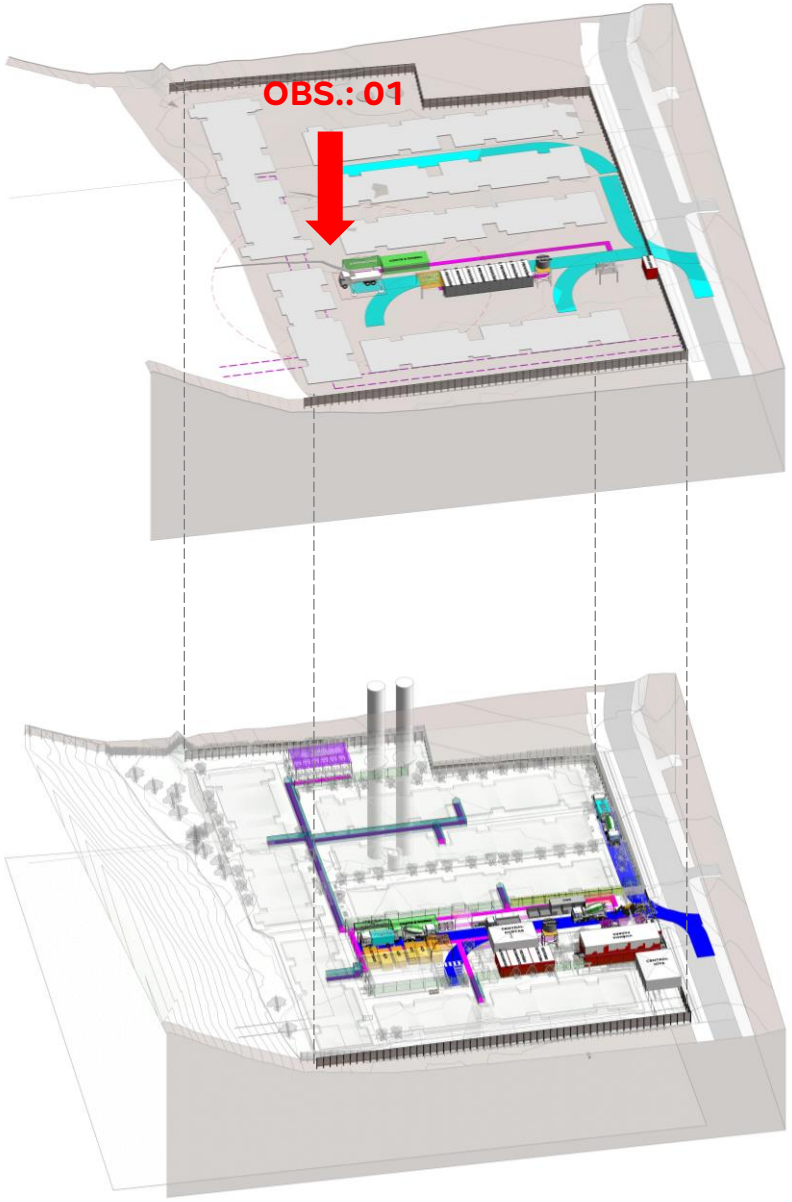

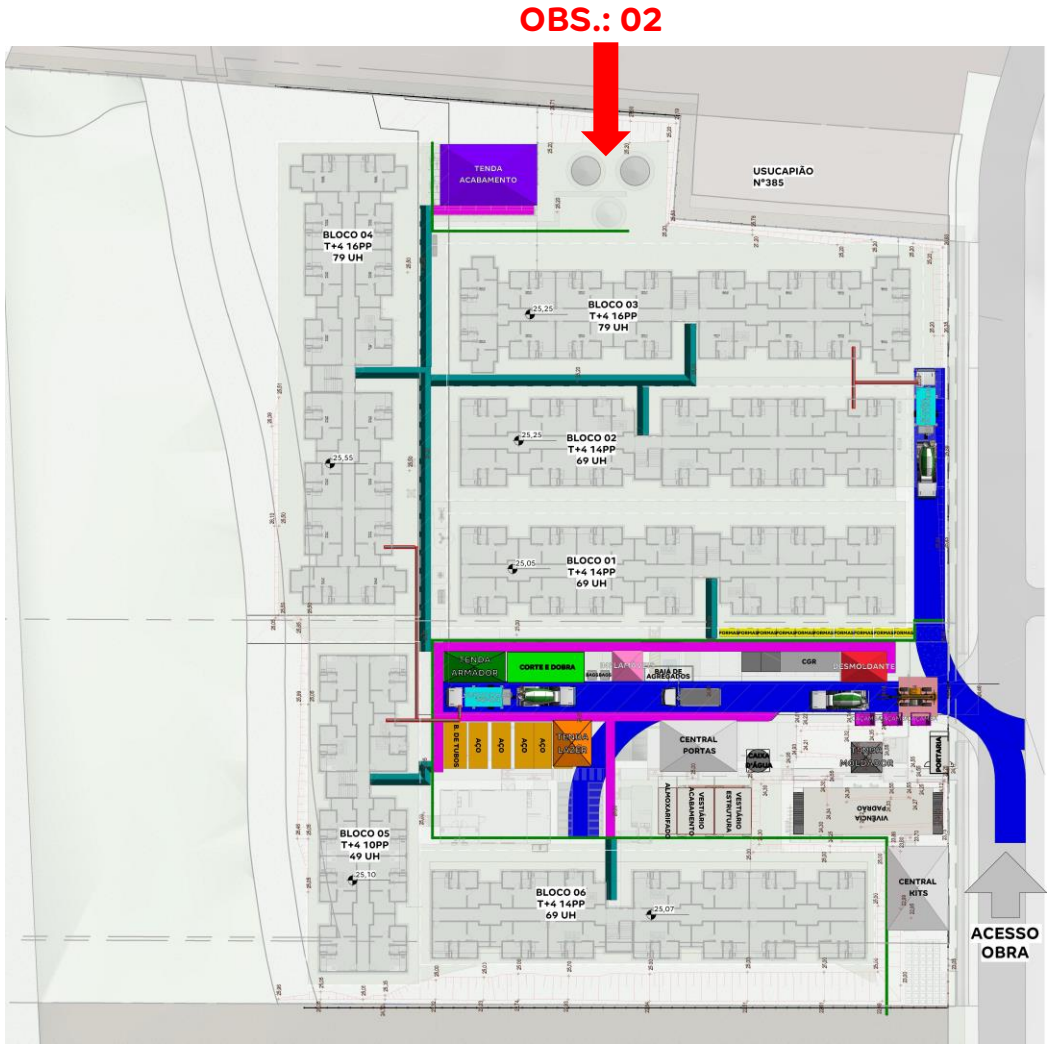

➢ **OBS. 01**	FNA DEVERÁ SER EXECUTADA NO INÍCIO DO PERÍODO DE PRÉ-FORMA, ANTES DE QUALQUER FUNDAÇÃO. PREVER PRAZO.
➢ **OBS. 02**	CASTELOS DEVERÃO SER IÇADOS NO INÍCIO DO PERÍODO DE PRÉ-FORMA, POIS FICARÃO ENCLAUSURADOS APÓS EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DAS TORRES.

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CUSTO PARA EQUIPE DE MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE MATERIAIS "FORMIGUINHAS" (2 FUNCIONÁRIOS ESTRUTURA E 2 FUNCIONÁRIOS ACABAMENTO), DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DE MAQUINÁRIOS AO LONGO DA IMPLANTAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO/DESCARGA DE MATERIAIS.
	PREVER CUSTO PARA PERDA DE CONCRETO DURANTE O PERÍODO DE ESTRUTURA COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA ESTACIONÁRIA PARA A CONCRETAGEM CONFORME INDICADO EM PROJETO, NECESSÁRIO DEVIDO À DISTÂNCIA ENTRE PONTO DE PATOLA E BLOCOS 2, 3,4 E 5.
	PREVER EM CUSTO O REAPROVEITAMENTO DO MURO EXISTENTE COMO TAPUME EXTERNO, PARA GANHO ECONÔMICO. PROSPECÇÃO NÃO DEVERÁ DEMOLI-LO.
	É OBRIGATÓRIA A INSTALAÇÃO DOS CASTELOS D'ÁGUA NA ETAPA DE PRÉ-FORMA PARA EVITAR SEU ENCLAUSURAMENTO.
➢ **PRAZO DE OBRA**	DEVIDO À COMPLEXIDADE DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO (FNA), O PERÍODO DE PRÉ-FORMA POSSÍVELMENTE TERÁ UM PRAZO MAIS LONGO QUE O PADRÃO.

PCP 165

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI
Solar Trindade - F1	mai/24	180	1	C	07/09/24	14/01/25			02/05/25			out/25
Soul Taquá I - F1	mai/24	340	2	A	15/09/24	08/01/25	19/01/25		29/04/25	28/04/25		set/25
Soul Taquá I - F2	mar/25	160	2	A	31/03/25	29/04/25	30/04/25		16/06/25	17/06/25		nov/25
Jardim Peônia (ex Jd Lirios VI)	out/24	460	2	A	18/12/24	17/06/25	18/06/25		06/11/25	07/11/25		abr/26
Porto Valência - F1	jul/24	340	2	C	07/01/25	03/05/25	06/06/25		14/08/25	19/09/25		fev/26
Reserva Carioca - F1	jul/24	340	2	C	10/05/25	15/08/25	20/09/25		28/11/25	04/01/26		jun/26
Reserva Carioca - F2	mar/25	160	2	C	30/09/25	29/11/25	05/01/26		18/01/26	23/02/26		jul/26
Parque Orquídea (ex R. Parque VI)	nov/24	400	2	A	10/07/25	07/11/25	08/11/25		11/03/26	12/03/26		ago/26
Elevato Bonsucesso	nov/24	504	2	C	06/09/25	19/01/26	24/02/26		24/06/26	31/07/26		abr/27
Estação Rio (Forja Rio) - F1	jul/25	365	2	A	12/11/25	12/03/26	13/03/26		04/07/26	05/07/26		dez/26
Bosque Jacarepaguá	jul/25	414	3	C	01/02/26	25/06/26	01/08/26	01/09/26	19/09/26	25/10/26	10/12/26	mai/27

**Lançamento desafio para junho/25, com volume de vendas em julho/25.*

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Rio de Janeiro Oeste	RZO	50%	1.714	143	2.057	171

Empreendimento	Renda	Lançamento	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27
Soul Taquá I F1 - F2	4.094	mai-24	26	26	26	26	26	5																
Bosque Jacarepaguá	**3.059**	**jul-25**		**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**30**								
Soul Taquá II F1	4.094	jan-26								27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	16	0	
Soul Taquá II F2	4.094	fev-27																					27	27
Total de Vendas Lançados			**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**26**	**58**	**58**	**58**	**58**	**37**	**32**	**59**	**59**	**59**	**59**	**59**	**59**	**57**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**16**	**27**	**27**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Bosque Jacarepaguá | Mapa Concorrência

		Bosque Jacarepaguá	Conquista Florianópolis	Conquista Itanhaguá Green	My Jacarepaguá Life | Mood
		TENDA	Direcional	Direcional	Cury
	Distância Tenda (km)		2,13Km	4,93Km	3,54Km
Região 1 Km	População	24.999	37.351	36.083	43.203
	Dens. Demográfica	7.996	11.966	11.560	13.841
	Renda (R$)	6.906	8.259	16.044	7.238
	Classe Social	B1 (8.1k a 16k)	B1 (8.1k a 16k)	A++ (Maior que 28k)	B1 (8.1k a 16k)
	PEA Dia	15.580	20.353	41.184	28.433
Quantitativo	Lançamento	jul/25	dez/23	12/2023	10/2023
	Unidades	414	280	280	940
	Estoque	414	74	143	69
	VSO	32	11	8	44
	Stockout	13	6	19	2
Qualitativo	Condomínios	1	1	1	1
	Torres	6	5	2	6
	Gabarito	T+4	T+4	T+4	T+4
	Plantas (m²)	34,5m²	56,4m² e 56,4m² e 36m² e 43,9m² e 56,4m² e 54,92m² e 37,07m²	43,92m² e 43,92m² e 41,19m² e 52,05m² e 41,2m² e 50,18m² e 41,19m²	84m² e 53,25m² e 92m² e 92m² e 67m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Garden	Garden	Garden	Garden
	Dif. Entrega	Não	Equipado e Decorado	Equipado e Decorado	Equipado e Decorado
	Vagas	7% de Vagas	24% Com vaga	31% Com vaga	Com vaga
	Lazer	Praça de chegada, Praça das Palmeiras, Salão de festas com churrasqueira, Espaço Cultivo, Churrasqueira Gourmet, Play Kids, Play Baby, Play Pet, Fitness Externo.	Tem Garden, Bosque, Espaço Gourmet, Piscina, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Quadra, Quadra de Tênis, Salão de Jogos, Sauna Seca,	Tem Garden, Agua Aquecida a Gas, Bosque, Cinema, Fireplace, Piscina, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Quadra, Salão de Jogos,	Tem Garden, Agua Aquecida a Gas, Bosque, Cinema, Piscina, Praça, Quadra de Tênis, Salão de Jogos,

Diagnóstico Concorrência

- Os concorrentes mapeados possuem target de preço e renda acima ao previsto para o Bosque Jacarepaguá.

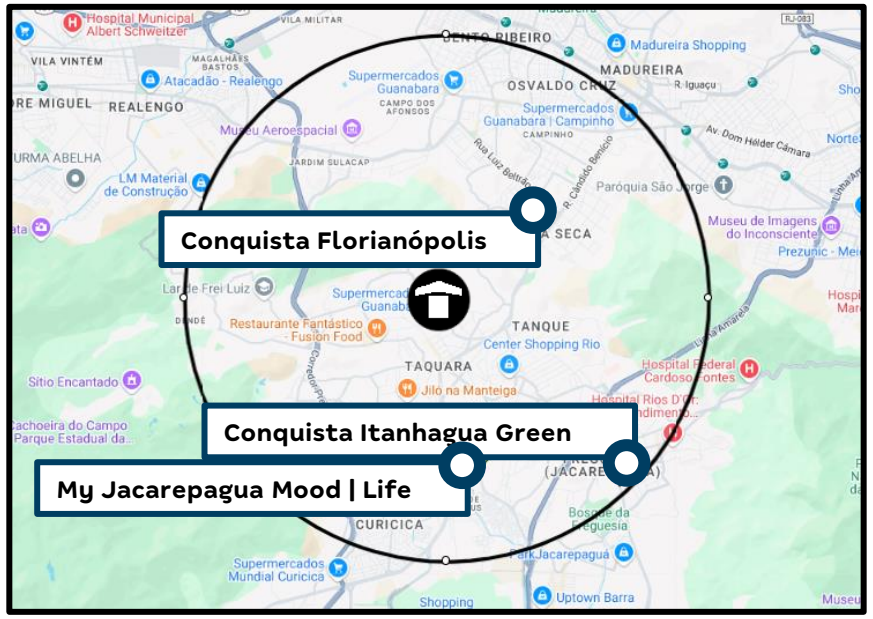

Tipologias	Empreendimento	Bosque Jacarepaguá				Conquista Florianópolis			Conquista Itanhanguá Green			My Jacarepaguá Life | Mood		
	Tipologia	Sem vaga	Com vaga	Garden	Garden c/vaga	Sem vaga	Com vaga	Garden c/vaga	Sem vaga	Com vaga	Garden c/vaga	Sem vaga	Com vaga	Garden c/vaga
	Preço Nominal	210.013	220.910	241.693	255.491	224.320	268.844	304.790	259.777	278.163	313.277	218.018	264.429	342.734
	CEF	169.788	177.752	197.470	207.223	179.456	215.075	243.832	207.822	222.530	250.622	174.414	211.543	274.187
	Renda	2.999	3.248	4.098	5.098	3.395	4.839	5.479	4.325	5.009	5.629	3.441	5.025	6.488
	Valor m²	-	-	**4.200**	**4.439**	-	-	**5.792**	-	-	**6.237**	-	-	**5.788**
	Dif Renda					396	1.591	381	1.326	1.761	531	442	1.777	1.390
	Farol de Factibilidade					●	●	●	●	●	●	●	●	●

Farol Renda
● Acima de 300
● Entre 0 e 300
● Abaixo de 0

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Bosque Jacarepaguá			
Tipo:	**Sem vaga**		**Sem vaga**	
Método	**Ref - Soul Taquá**		**Vision**	
Avaliação	210.000		210.000	
Renda Inicial (VF)	3.946		3.199	
Renda Final*	-		2.999	
% RET1	0%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,79	3.034	0,84	2.607
FGTS	0,52	1.980	0,67	2.076
Financiamento	99,40%	161.838	99,60%	161.838
Subsídio	246,55%	4.950	112,37%	5.875
Prazo de Pró-soluto	19	19	19	19
Pró-Soluto	56,17%	15.302	69,79%	15.412
Preço Raso (RS)	187.104	187.104	187.807	187.807
TCD	48,99%	19.486	68,87%	22.206
VSO	28	28	28	28
Preço de Venda	**213.170**	**213.170**	**216.701**	**216.701**
Elasticidade	-3,086%	-3,086%	-3,086%	-3,086%
Preço de Venda Final	**206.591**	**206.591**	**210.013**	**210.013**
Preço Raso (R$)	**187.104**		**187.807**	
% de Raso	**90,57%**		**89,43%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**183.695**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**190.015**	

O preço de referência foi simulado com base na avaliação do Bosque, e o valor praticado pelo projeto está detalhado na tabela do slide Análise de Preço

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Bosque Jacarepaguá			
Tipo:	**Com vaga**		**Com vaga**	
Método	**Ref - Soul Taquá**		**Vision**	
Avaliação	220.000		220.000	
Renda Inicial (VF)	6.053		3.598	
Renda Final*	-		3.248	
% RET1	0%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,09	6.368	1,05	3.661
FGTS	1,30	7.636	1,24	4.320
Financiamento	99,40%	169.544	99,63%	169.945
Subsídio	0,00%	0	148,48%	3.487
Prazo de Pró-soluto	19	19	19	19
Pró-Soluto	39,62%	16.554	69,61%	17.290
Preço Raso (RS)	200.103	200.103	198.704	198.704
TCD	32,41%	19.775	61,23%	22.206
VSO	2	2	2	2
Preço de Venda	**226.881**	**226.881**	**227.946**	**227.946**
Elasticidade	-3,086%	-3,086%	-3,086%	-3,086%
Preço de Venda Final	**219.878**	**219.878**	**220.910**	**220.910**
Preço Raso (R$)	**200.103**		**198.704**	
% de Raso	**91,01%**		**89,95%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

O preço de referência foi simulado com base na avaliação do Bosque, e o valor praticado pelo projeto está detalhado na tabela do slide Análise de Preço

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Bosque Jacarepaguá			
Tipo:	**Com Garden**		**Com Garden e vaga**	
Método	**Vision**		**Vision**	
Avaliação	250.000		260.000	
Renda Inicial (VF)	4.398		5.398	
Renda Final*	-		5.098	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,02	4.340	1,09	5.714
FGTS	1,11	4.715	1,16	6.072
Financiamento	98,95%	190.902	99,79%	201.152
Subsídio	140,69%	1.853	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	19	19	19	19
Pró-Soluto	58,22%	17.677	54,60%	20.347
Preço Raso (RS)	219.487	219.487	233.284	233.284
TCD	50,09%	22.206	40,81%	22.206
VSO	1	1	1	1
Preço de Venda	**249.390**	**249.390**	**263.627**	**263.627**
Elasticidade	-3,086%	-3,086%	-3,086%	-3,086%
Preço de Venda Final	**241.693**	**241.693**	**255.491**	**255.491**
Preço Raso (R$)	**219.487**		**233.284**	
% de Raso	**90,81%**		**91,31%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Bosque Jacarepaguá
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	211.860
Renda Inicial (VF)	3.270
Renda Final*	3.059

Tipo:	VF	R$
Ato	0,86	2.735
FGTS	0,71	2.297
Financiamento	99,60%	163.279
Subsídio	113,16%	5.599
Prazo de Pró-soluto	19	19
Pró-Soluto	69,39%	15.621
Preço Raso (RS)	189.531	189.531
TCD	67,76%	22.206
VSO	32	32
Preço de Venda	**218.272**	**218.272**
Elasticidade	-3,086%	-3,086%
Preço de Venda Final	**211.737**	**211.737**
Preço Raso (R$)	**189.531**	
% de Raso	**89,51%**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o Preço Vision, visto que, projetos da regional capturam rendas equivalentes à estimada pelo Vision. A diferença de valor do Garden, foi determinada com base no benchmark de mercado, utilizando como referência os empreendimentos das concorrências.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes da região vendem em um target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda.

	Preço Real					Preço Normalizado (19m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Soul Taquá	**253.182**	**205.993**	**4.200**	**26**	**7**	**9.780**	**215.773**
Bosque Jacarepaguá	**211.860**	**189.531**	**3.059**	**32**	**19**	**-**	**189.531**

Concorrência no Entorno:

Ciclo entende que o preço e VSO estão OK.

PARECER: Ciclo avalia como factível o preço apresentado.

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Bosque Jacarepaguá			
Tipo:	**Sem vaga**		**Sem vaga**	
Método	**Ref - Soul Taquá**		**Vision**	
Avaliação	210.000		210.000	
Renda Inicial (VF)	3.946		3.199	
Renda Final*	-		2.999	
% RET1	0%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,79	3.034	0,84	2.607
FGTS	0,52	1.980	0,67	2.076
Financiamento	99,40%	161.838	99,60%	161.838
Subsídio	246,55%	4.950	112,37%	5.875
Prazo de Pró-soluto	17	17	17	17
Pró-Soluto	56,17%	13.691	69,79%	13.790
Preço Raso (RS)	185.493	185.493	186.185	186.185
TCD	48,99%	19.486	68,87%	22.206
VSO	28	28	28	28
Preço de Venda	**211.508**	**211.508**	**215.027**	**215.027**
Elasticidade	-3,086%	-3,086%	-3,086%	-3,086%
Preço de Venda Final	**204.980**	**204.980**	**208.391**	**208.391**
Preço Raso (R$)	**185.493**		**186.185**	
% de Raso	**90,49%**		**89,34%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**181.915**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**188.235**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Bosque Jacarepaguá			
Tipo:	**Com vaga**		**Com vaga**	
Método	**Ref - Soul Taquá**		**Vision**	
Avaliação	220.000		220.000	
Renda Inicial (VF)	6.053		3.598	
Renda Final*	-		3.248	
% RET1	0%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,09	6.368	1,05	3.661
FGTS	1,30	7.636	1,24	4.320
Financiamento	99,40%	169.544	99,63%	169.945
Subsídio	0,00%	0	148,48%	3.487
Prazo de Pró-soluto	17	17	17	17
Pró-Soluto	39,62%	14.811	69,61%	15.470
Preço Raso (RS)	198.360	198.360	196.884	196.884
TCD	32,41%	19.775	61,23%	22.206
VSO	2	2	2	2
Preço de Venda	**225.083**	**225.083**	**226.068**	**226.068**
Elasticidade	-3,086%	-3,086%	-3,086%	-3,086%
Preço de Venda Final	**218.136**	**218.136**	**219.090**	**219.090**
Preço Raso (R$)	**198.360**		**196.884**	
% de Raso	**90,93%**		**89,86%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Informações Viabilidade

Projeto:	Bosque Jacarepaguá			
Tipo:	**Com Garden**		**Com Garden e vaga**	
Método	**Vision**		**Vision**	
Avaliação	250.000		260.000	
Renda Inicial (VF)	4.398		5.398	
Renda Final*	4.098		5.098	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	1,02	4.340	1,09	5.714
FGTS	1,11	4.715	1,16	6.072
Financiamento	99,56%	190.902	99,79%	201.152
Subsídio	140,69%	1.853	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	17	17	17	17
Pró-Soluto	58,22%	15.816	54,60%	18.205
Preço Raso (RS)	217.626	217.626	231.143	231.143
TCD	50,09%	22.206	40,81%	22.206
VSO	1	1	1	1
Preço de Venda	**247.470**	**247.470**	**261.417**	**261.417**
Elasticidade	-3,086%	-3,086%	-3,086%	-3,086%
Preço de Venda Final	**239.832**	**239.832**	**253.349**	**253.349**
Preço Raso (R$)	**217.626**		**231.143**	
% de Raso	**90,74%**		**91,23%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Informações Gerais – Consolidado - Aprovação

Bosque JPA - RJ - Rio de Janeiro Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	jun-24							
Bosque JPA s/ vaga		jul-25	jan-26	jan-27	6 meses	12 meses	jul-28	36 meses
Bosque JPA c/ vaga		jul-25	jan-26	jan-27	6 meses	12 meses	jul-28	36 meses
Bosque JPA c/ garden		jul-25	jan-26	jan-27	6 meses	12 meses	jul-28	36 meses
Bosque JPA c/ garden c/ vaga		jul-25	jan-26	jan-27	6 meses	12 meses	jul-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	5,00 MM	**Incorrido Terreno:** 0,50 MM	**Área do Terreno (100%):**	42.546 m²	**Área Líquida do Terreno:** 10.267 m²
Cash:	2,50 MM		**Custo de terreno m²:**	117,5	**Custo de terreno m² Área Líquida:** 487,0
Permuta Financeira:	2,50 MM (2,87%)		**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 5,7% / 48,0%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.** 1,3 / 0,4
Ato / %VGV:	0,50 MM / 0,6%		**Incorrido de Construção:**	0,55 MM	**Incorridos de Incorporação:** 0,90 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Bosque JPA s/ vaga	T+4	186.185	379	208.391	210.000	99,6%	69,8%	68,9%
Bosque JPA c/ vaga	T+4	196.884	23	219.090	220.000	99,6%	69,6%	61,2%
Bosque JPA c/ garden	T+4	217.626	6	239.832	250.000	99,6%	58,2%	50,1%
Bosque JPA c/ garden c/ vaga	T+4	231.143	6	253.349	260.000	99,8%	54,6%	40,8%

Unidades Totais:	414	**Preço Médio:**	210.092	**Renda Média:**	3.270	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.023
Unidades Tenda:	414	**Avaliação Média:**	211.860	**Ato:**	2.808 (0,86 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.484
VSO:	32 Unidades	**VGV Total:**	86.978.290	**FGTS:**	2.337 (0,71 Salários)	**Preço Raso Médio:**	187.886
RET Médio:	2,6%	**VGV Tenda:**	86.978.290	**% em RET 1%:**	47%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	1.391

Construção

Custo Total Unit.:	88.860	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	34,10	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**13.377.384**	**LI:**	**20,06%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**15.243.026**	**Margem Bruta Econômica:**	**38,70%**
TIR:	**104,81%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(13.286.965)**	**Margem Bruta REF:**	**41,20%**
Exposição de Caixa:	**17,55%**	**Δ LI:**	**0,06%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**20.522.663**	**Margem Rasa Econômica:**	**30,84%**
Payback Contingente (21 m):	**15 m/ (-6 m)**	**LI Marginal:**	**23,22%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**23.971.605**	**Margem Rasa REF:**	**34,26%**
Payback Consolidado:	**15 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**26,89%**

Informações Gerais – Consolidado – Real

Bosque JPA - RJ - Rio de Janeiro Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	jun-24							
Bosque JPA s/ vaga		jul-25	mar-26	mar-27	8 meses	12 meses	jul-28	36 meses
Bosque JPA c/ vaga		jul-25	mar-26	mar-27	8 meses	12 meses	jul-28	36 meses
Bosque JPA c/ garden		jul-25	mar-26	mar-27	8 meses	12 meses	jul-28	36 meses
Bosque JPA c/ garden c/ vaga		jul-25	mar-26	mar-27	8 meses	12 meses	jul-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	5,00 MM	**Incorrido Terreno:** 0,50 MM	**Área do Terreno (100%):**	42.546 m²	**Área Líquida do Terreno:** 10.267 m²
Cash:	2,50 MM		**Custo de terreno m²:**	117,5	**Custo de terreno m² Área Líquida:** 487,0
Permuta Financeira:	2,50 MM (2,85%)		**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 5,7% / 47,7%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.** 1,3 / 0,4
Ato / %VGV:	0,50 MM / 0,6%		**Incorrido de Construção:**	0,55 MM	**Incorridos de Incorporação:** 0,90 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Bosque JPA s/ vaga	T+4	187.807	379	210.013	210.000	99,6%	69,8%	68,9%
Bosque JPA c/ vaga	T+4	198.704	23	220.910	220.000	99,6%	69,6%	61,2%
Bosque JPA c/ garden	T+4	219.487	6	241.693	250.000	98,9%	58,2%	50,1%
Bosque JPA c/ garden c/ vaga	T+4	233.284	6	255.491	260.000	99,8%	54,6%	40,8%

Unidades Totais:	414	**Preço Médio:**	211.737	**Renda Média:**	3.270	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.023
Unidades Tenda:	414	**Avaliação Média:**	211.860	**Ato:**	2.808 (0,86 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.598
VSO:	32 Unidades	**VGV Total:**	87.659.031	**FGTS:**	2.337 (0,71 Salários)	**Preço Raso Médio:**	189.531
RET Médio:	2,6%	**VGV Tenda:**	87.659.031	**% em RET 1%:**	47%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	1.391

Construção

Custo Total Unit.:	88.860	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	34,10	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**13.334.275**	**LI:**	**20,21%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**13.526.184**	**Margem Bruta Econômica:**	**38,75%**
TIR:	**104,18%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(10.004.377)**	**Margem Bruta REF:**	**41,20%**
Exposição de Caixa:	**15,44%**	**Δ LI:**	**0,21%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**20.672.671**	**Margem Rasa Econômica:**	**30,92%**
Payback Contingente (21 m):	**16 m/ (-5 m)**	**LI Marginal:**	**23,40%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**24.240.071**	**Margem Rasa REF:**	**34,32%**
Payback Consolidado:	**16 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**26,97%**

Informações Gerais – DRE – Aprovação

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Bosque JPA		Bosque JPA s/ vaga		Bosque JPA c/ vaga		Bosque JPA c/ garden		Bosque JPA c/ garden c/ vaga	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	86.865	100,0%	78.855	100,0%	5.034	100,0%	1.448	100,0%	1.528	100,0%
PIS/COFINS	(1.234)	1,4%	(1.079)	1,4%	(90)	1,8%	(32)	2,2%	(33)	2,2%
Custo Total	(52.496)	61,3%	(47.938)	61,6%	(2.964)	60,0%	(794)	56,1%	(800)	53,5%
Custo Terreno	(8.286)	9,7%	(7.542)	9,7%	(474)	9,6%	(132)	9,4%	(138)	9,2%
Custo Relacionados a Terreno	(1.227)	1,4%	(1.121)	1,4%	(69)	1,4%	(18)	1,3%	(19)	1,2%
Custos de Incorporação	(2.827)	3,3%	(2.515)	3,2%	(190)	3,8%	(61)	4,3%	(61)	4,1%
Custo de Construção	(40.155)	46,9%	(36.760)	47,3%	(2.231)	45,1%	(582)	41,1%	(582)	38,9%
Lucro Bruto Econômico	33.135	38,7%	29.838	38,4%	1.980	40,0%	622	43,9%	695	46,5%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	33.135	38,7%	29.838	38,4%	1.980	40,0%	622	43,9%	695	46,5%
Despesas de Selling	(8.112)	9,5%	(7.381)	9,5%	(465)	9,4%	(130)	9,2%	(136)	9,1%
Contingência	(1.998)	2,3%	(1.814)	2,3%	(116)	2,3%	(33)	2,4%	(35)	2,4%
Margem de Contribuição	23.025	26,9%	20.643	26,5%	1.400	28,3%	459	32,4%	523	35,0%
IR e CSLL	(1.010)	1,2%	(883)	1,1%	(73)	1,5%	(26)	1,8%	(27)	1,8%
Margem Líquida	22.016	25,7%	19.760	25,4%	1.326	26,8%	433	30,6%	496	33,2%
Lucro Bruto REF Unit.	87.929	41,2%	86.469	40,8%	96.155	43,3%	113.878	47,1%	126.540	49,6%
Lucro Raso REF Unit.	65.380	34,3%	63.906	33,8%	73.653	36,9%	91.666	41,8%	104.352	44,8%

R$ Mil - VPL - Compra	Bosque JPA		Bosque JPA s/ vaga		Bosque JPA c/ vaga		Bosque JPA c/ garden		Bosque JPA c/ garden c/ vaga	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	66.689	100,0%	60.510	100,0%	3.847	100,0%	1.133	100,0%	1.200	100,0%
PIS/COFINS	(933)	1,4%	(816)	1,3%	(67)	1,8%	(24)	2,2%	(26)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(52.379)	78,5%	(47.753)	78,9%	(2.981)	77,5%	(817)	72,1%	(828)	69,0%
Custo Terreno	(6.315)	9,5%	(5.752)	9,5%	(359)	9,3%	(100)	8,8%	(104)	8,7%
Custo Relacionados a Terreno	(1.225)	1,8%	(1.120)	1,9%	(69)	1,8%	(18)	1,6%	(19)	1,6%
Custos de Incorporação	(2.695)	4,0%	(2.396)	4,0%	(180)	4,7%	(59)	5,2%	(59)	5,0%
Custo de Construção	(33.321)	50,0%	(30.504)	50,4%	(1.851)	48,1%	(483)	42,6%	(483)	40,3%
Despesas de Selling	(7.204)	10,8%	(6.538)	10,8%	(417)	10,8%	(122)	10,7%	(127)	10,6%
Contingência	(855)	1,3%	(776)	1,3%	(50)	1,3%	(14)	1,3%	(15)	1,3%
IR e CSLL	(764)	1,1%	(667)	1,1%	(55)	1,4%	(20)	1,8%	(21)	1,8%
Lucro Imobiliário	13.377	20,1%	11.942	19,7%	799	20,8%	292	25,8%	345	28,8%

Informações Gerais – DRE – Real

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Bosque JPA		Bosque JPA s/ vaga		Bosque JPA c/ vaga		Bosque JPA c/ garden		Bosque JPA c/ garden c/ vaga	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	87.632	100,0%	79.549	100,0%	5.081	100,0%	1.460	100,0%	1.542	100,0%
PIS/COFINS	(1.245)	1,4%	(1.089)	1,4%	(90)	1,8%	(32)	2,2%	(34)	2,2%
Custo Total	(52.908)	61,2%	(48.315)	61,6%	(2.987)	59,9%	(800)	56,0%	(806)	53,4%
Custo Terreno	(8.299)	9,6%	(7.553)	9,6%	(475)	9,5%	(133)	9,3%	(138)	9,2%
Custo Relacionados a Terreno	(1.296)	1,5%	(1.185)	1,5%	(73)	1,5%	(19)	1,4%	(20)	1,3%
Custos de Incorporação	(2.835)	3,3%	(2.522)	3,2%	(191)	3,8%	(61)	4,3%	(61)	4,1%
Custo de Construção	(40.477)	46,9%	(37.055)	47,2%	(2.249)	45,1%	(587)	41,1%	(587)	38,9%
Lucro Bruto Econômico	33.479	38,8%	30.145	38,4%	2.003	40,1%	628	44,0%	702	46,6%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	33.479	38,8%	30.145	38,4%	2.003	40,1%	628	44,0%	702	46,6%
Despesas de Selling	(8.161)	9,4%	(7.425)	9,5%	(468)	9,4%	(131)	9,2%	(137)	9,1%
Contingência	(2.016)	2,3%	(1.830)	2,3%	(117)	2,3%	(34)	2,4%	(35)	2,4%
Margem de Contribuição	23.303	27,0%	20.890	26,6%	1.418	28,4%	464	32,5%	530	35,1%
IR e CSLL	(1.019)	1,2%	(891)	1,1%	(74)	1,5%	(26)	1,8%	(28)	1,8%
Margem Líquida	22.284	25,8%	20.000	25,5%	1.344	26,9%	438	30,6%	502	33,3%
Lucro Bruto REF Unit.	88.605	41,2%	87.125	40,8%	96.997	43,3%	114.752	47,1%	127.682	49,6%
Lucro Raso REF Unit.	66.056	34,3%	64.562	33,8%	74.495	36,9%	92.540	41,8%	105.494	44,9%

R$ Mil - VPL - Compra	Bosque JPA		Bosque JPA s/ vaga		Bosque JPA c/ vaga		Bosque JPA c/ garden		Bosque JPA c/ garden c/ vaga	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	65.992	100,0%	59.870	100,0%	3.819	100,0%	1.118	100,0%	1.185	100,0%
PIS/COFINS	(924)	1,4%	(807)	1,3%	(67)	1,8%	(24)	2,2%	(26)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(51.734)	78,4%	(47.163)	78,8%	(2.946)	77,1%	(807)	72,2%	(819)	69,1%
Custo Terreno	(6.290)	9,5%	(5.729)	9,6%	(358)	9,4%	(100)	8,9%	(103)	8,7%
Custo Relacionados a Terreno	(1.281)	1,9%	(1.171)	2,0%	(72)	1,9%	(19)	1,7%	(19)	1,6%
Custos de Incorporação	(2.683)	4,1%	(2.386)	4,0%	(179)	4,7%	(59)	5,3%	(59)	5,0%
Custo de Construção	(32.641)	49,5%	(29.881)	49,9%	(1.813)	47,5%	(473)	42,3%	(473)	39,9%
Despesas de Selling	(7.246)	11,0%	(6.576)	11,0%	(420)	11,0%	(122)	11,0%	(128)	10,8%
Contingência	(837)	1,3%	(760)	1,3%	(49)	1,3%	(14)	1,2%	(15)	1,2%
IR e CSLL	(756)	1,1%	(660)	1,1%	(55)	1,4%	(20)	1,8%	(21)	1,8%
Lucro Imobiliário	13.334	20,2%	11.900	19,9%	807	21,1%	287	25,6%	340	28,7%

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Escritura	Atual	Atual vs Escritura	Δ%
Data Estudo:	maio-25	junho-25	1 Meses	N/A
Lançamento:	junho-25	julho-25	1 Meses	N/A
Uhs:	414	414	-	0,0%
Preço Nominal:	209.161	210.092	931	0,4%
Preço Raso:	186.955	187.886	931	0,5%
Preço Nominal Inflacionado:	213.902	213.535	(367)	-0,2%
Preço Raso Inflacionado:	191.215	190.986	(229)	-0,1%
Renda Média:	3.265	3.270	5	0,2%
RET Médio:	2,6%	2,6%	0,0 p.p.	
% em RET 1%:	47,2%	47,2%	0,0 p.p.	
VSO:	32	32	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	4.439	4.439	-	0,0%
Avaliação:	211.860	211.860	-	0,0%
Prazo construção F1:	14	12	(2)	-14,3%
Prazo de Pró-Soluto F1:	19	17	(2)	-10,5%
Custo Total Inf (Unit):	127.492	126.802	(690)	-0,5%
Custo Construção (Unit):	89.966	88.860	(1.106)	-1,2%
Fração de construção:	43,0%	42,3%	-0,7 p.p.	-1,7%
INCC Folha Rosto:	1.178,39	1.184,46	6	0,5%
Custo Terreno Inf:	8.273.659	8.286.417	12.758	0,2%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	2.551	2.964	413	16,2%
Fração do Terreno[1]:	5,8% / 48,8%	5,7% / 48,0%	-0,1 p.p.	-1,7%
Custo de Incorp. por uh:	6.034	6.829	795	13,2%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	1.837.672	1.837.672	-	0,0%
Custo do Ciclo (Unit):	14.420	14.484	64	0,4%
Lucro Imobiliário:	20,1%	20,1%	0,0 p.p.	-0,2%
LI Marginal:	21,5%	23,2%	1,7 p.p.	7,8%
Exposição de caixa:	15,1%	17,5%	2,5 p.p.	16,5%
TIR:	114,0%	104,8%	-9,2 p.p.	-8,0%
Margem Bruta REF:	41,0%	41,2%	0,2 p.p.	0,5%
Margem Bruta Econômica:	38,5%	38,7%	0,2 p.p.	0,5%
Margem Rasa REF:	34,0%	34,3%	0,2 p.p.	0,7%
Margem Rasa Econômica:	30,5%	30,8%	0,3 p.p.	1,0%
Margem Contribuição Econômica:	26,7%	26,9%	0,2 p.p.	0,6%
Payback Contingente (Régua 21 m):	16 m/ (-5 m)	15 m/ (-6 m)	-1	-6,3%
Payback Consolidado:	16 Meses	15 Meses	-1 Meses	-6,3%

Obrigado
