Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento

Regional: MG

Projeto: Aurora de Minas (Anel Sancruza)

Data Comitê: 30/06/2025

Questionamentos comitê 26/06/25

Nome	Aurora de Minas - Investimento	Observação - Aurora de Minas
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok! boas vitorias regulatorias
Alejandro Octavio Abiusi	Discutir em Comitê	Não entendi a redução expressiva no ITBI e gostaria de mais detalhes, pois essa variação foi fundamental pra atingimento da LI.
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	Ok
Rodrigo Osmo	Aprovado	N/A
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	ok

Questionamentos comitê 26/06/25

***Alejandro Octavio Abiusi*: Não entendi a redução expressiva no ITBI e gostaria de mais detalhes, pois essa variação foi fundamental para o atingimento da LI.**

Resposta: A redução foi gerada por dois fatores principais:

- Por conta dos novos limites de preço estabelecidos pela portaria, houve a alteração no enquadramento de 155 unidades, que antes eram de livre comercialização e passaram a ser HIS-2 : na legislação tributária de BH, unidades enquadradas como **HIS tem isenção na cobrança de ITBI**, gerando economia de 11k nessas 155 uhs

- Ajuste do valor cobrado de Emolumentos: nova tabela divulgada pelo **TJMG instituiu desconto de 80%** nas custas de aquisição de imóveis financiados através do SFI, SFH, Cooperativas de Crédito ou Administradora de Consórcios de imóveis.

Comparativo	Comitê 09/06		Comitê 26/06		Δ	
	UHs	ITBI +Emol.	UHs	ITBI +Emol.	UHs	ITBI +Emol.
HIS-1	58	3.800	58	1.619	0	-2.181
HIS-2	25	4.200	180	1.823	155	-2.377
Livre comerc. s/ vaga	155	11.317	0	0	-155	-11.317
Livre comerc. c/ vaga	119	12.078	119	10.759	0	-1.319
Total | Média	357	9.851	357	4.769	0	-5.083

Reaprovação 26/06/25 vs. comitê 09/06/2025

Em 09/06 aprovamos em comitê de investimento o projeto Aurora de Minas, considerando a baixa de 50% das unidades visto o atingimento de 17,2% de Lucro Imobiliário. No One Page indicamos que:

"Considerando o zoneamento do terreno e legislação aplicada, partes das UHS são enquadradas e vendidas como tipologias HIS-1 (58 uhs) e HIS-2 (25 uhs), que **hoje apresentam limite de renda e preço de venda de 161k e 247k**, respectivamente. O restante das unidades poderão ser vendidas livremente. **As regras de limitação tem sido rediscutidas com a expectativa de possíveis alterações no segundo semestre** desse ano visando manter somente a limitação de renda (2,5 SM para HIS-1 e 5,0 SM para HIS-2), o que deverá elevar consideravelmente os preços médios (244k e 350k, respectivamente)."

dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/463816

PORTARIA: PORTARIA CONJUNTA SMPU/SMOBI Nº 005/2025
Edição: 7283 | 1ª Edição | Ano XXXI | Publicada em: 25/06/2025
SMPU - Secretaria Municipal de Política Urbana

PORTARIA CONJUNTA SMPU/SMOBI Nº 005/2025

Estabelece critérios relativos à Habitação de Interesse Social 1 e 2 e ao Benefício Decorrente da Produção de Habitação de Interesse Social.

Os Secretários Municipais de Política Urbana e de Obras e Infraestrutura, no exercício da atribuição que lhes confere o inciso III do parágrafo único do art. 112 da Lei Orgânica do Município, e com fundamento nos arts. 58 e 162 da Lei nº 11.181, de 8 de agosto de 2019, RESOLVEM:

Art. 1º – Os graus de vulnerabilidade socioeconômica para caracterização e enquadramento das unidades habitacionais de interesse social, definidos pelo Conselho Municipal de Habitação em Reunião Extraordinária realizada no dia 30 de janeiro de 2020, são os seguintes:

I – HIS-1: habitação de interesse social voltada para beneficiários com renda familiar mensal de até 2,5 (dois e meio) salários mínimos;
II – HIS-2: habitação de interesse social voltada para beneficiários com renda familiar mensal acima de 2,5 (dois e meio) e de até 5 (cinco) salários mínimos.

Art. 2º – O valor máximo de comercialização de cada unidade habitacional, calculado pelo valor do metro quadrado de área privativa real, deverá obedecer aos seguintes limites:

I – para HIS-1, de R$ 4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais) por metro quadrado;
II – para HIS-1 localizada em centralidade regional ou local, conforme Lei 11.181/19, de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais) por metro quadrado;
III – para HIS-2, de R$ 6.860,00 (seis mil, oitocentos e sessenta reais) por metro quadrado;
IV – para empreendimento gerador de potencial construtivo por meio do Benefício de Produção Habitacional – BPH, de R$ 4.170,00 (quatro mil, cento e setenta reais) por metro quadrado.

§ 1º – Considera-se área privativa real a área da unidade autônoma de uso exclusivo, destinada à moradia, considerando as projeções das faces externas das paredes externas da edificação e dos eixos das paredes que separam as dependências privativas das unidades autônomas contíguas.

Ontem foi publicada no DOM nova portaria alterando os limites de preço das unidades HIS1 e HIS2 para **187k e 280k**, gerando incremento considerável de preço, bem como **redução na fração média de ITBI+Emolumentos**, visto que unidades antes de livre comercialização passaram a englobar a tipologia HIS2.

Com essas alterações, houve incremento de resultado, **viabilizando o atingimento da régua de 20% de LI:**

Comparativo	Comitê 09/06	Comitê 26/06	Δ
Preço HIS-1 (58 UHs) mil	161	187	26
Preço HIS-2 (25 UHs) mil	247	270	23
Preço Livre comerc. s/ vaga (155 UHs) mil	270	270	0
Preço Livre comerc. c/ vaga (119 UHs) mil	296	296	0
Preço médio projeto (357 UHs) mil	260	265	5
ITBI + Emolumentos médio	9.851	4.766	-5.085
LI %	17,2%	20,1%	2,9%
Payback (meses)	19	18	-1

Atualização Material

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Comitê 09/06	Comitê 26/06	Comitê 26/06 vs Comitê 09/06	Δ%
Data Estudo:	junho-25	junho-25	0 Meses	N/A
Lançamento:	janeiro-28	janeiro-28	0 Meses	N/A
Uhs:	357	357	-	0,0%
Preço Nominal:	259.646	265.493	5.847	2,3%
Preço Raso:	238.825	244.465	5.640	2,4%
Preço Nominal Inflacionado:	302.872	309.713	6.841	2,3%
Preço Raso Inflacionado:	278.625	285.223	6.599	2,4%
Renda Média:	4.737	4.904	168	3,5%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	12.139	6.317	(5.823)	-48,0%
Custo Total Inf (Unit):	179.446	180.973	1.527	0,9%
Custo Construção (Unit):	118.381	118.381	-	0,0%
Fração de construção:	45,6%	44,6%	-1,0 p.p.	-2,2%
Custo Terreno Inf:	8.022.382	8.179.901	157.519	2,0%
Custo de Incorp. por uh:	6.854	7.939	1.086	15,8%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	4.333.670	2.255.003	(2.078.667)	-48,0%
Custo do Ciclo (Unit):	16.178	16.542	364	2,3%
LI Resiliência:	12,3%	15,0%	2,8 p.p.	22,5%
Lucro Imobiliário:	17,2%	20,1%	2,8 p.p.	16,3%
Exposição de caixa:	12,4%	11,2%	-1,3 p.p.	-10,2%
TIR:	116,1%	136,9%	20,8 p.p.	17,9%
Margem Bruta REF:	41,3%	42,1%	0,8 p.p.	2,0%
Margem Bruta Econômica:	37,4%	38,1%	0,6 p.p.	1,7%
Margem Rasa REF:	36,1%	37,1%	0,9 p.p.	2,6%
Margem Rasa Econômica:	31,4%	32,1%	0,8 p.p.	2,4%
Margem Contribuição Econômica:	24,1%	26,7%	2,7 p.p.	11,1%
Payback Contingente (Régua 21 m):	19 m/ (-2 m)	18 m/ (-3 m)	-1	-5,3%
Payback Consolidado:	19 Meses	18 Meses	-1 Meses	-5,3%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Questionamentos comitê 09/06/25

Nome	Aurora de Minas - Investimento	Observação - Aurora de Minas
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	Aprovo o projeto, mas gostaria de entender melhor a questão do grau de aclividade entre a portaria e a última torre. Uma das imagens da implantação me deixou com a sensação de que, além do cliente percorrer uma distância considerável, ainda o fará numa baita subida.
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	Ok
Rodrigo Osmo	Discutir em Comitê	(1) Esse contrato foi assinado em 2023. Nunca fizemos um comite investimentos / baixamos para landbank esse projeto? Caso já tenhamos feito, por que estamos reaprovando?
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	pq a previsão de lançamento apenas em 2028? pq planta de 41 m2?
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	Ok

Questionamentos comitê 09/06/25

***Rodrigo Osmo**: Esse contrato foi assinado em 2023. Nunca fizemos um comitê investimentos / baixamos para landbank esse projeto? Caso já tenhamos feito, por que estamos reaprovando?*

Resposta: Não baixamos para landbank e nunca fizemos comitê deste projeto anteriormente. Em 2024 trabalhamos no aprimoramento da solução de parcelamento dele enquanto focamos na baixa para landbank dos projetos de menor complexidade técnica.

Questionamentos comitê 09/06/25

***Alejandro Octavio Abiusi**: Aprovo o projeto, mas gostaria de entender melhor a questão do grau de aclividade entre a portaria e a última torre. Uma das imagens da implantação me deixou com a sensação de que, além do cliente percorrer uma distância considerável, ainda o fará numa baita subida.*

Resposta: A portaria está na cota 1.009m enquanto o acesso desta torre está na cota 1.003m, logo um desnível de 6 metros, superada integralmente por passeios e rampas, sem necessidade de plataformas ou escadas. A porção de maior aclive deste caminho é um desnível de 8 metros em um trecho de 180m de comprimento, com rampas que variam de 2,92% a 8,33% e **inclinação média de 4,4%.**

***Luiz Mauricio de Garcia Paula**: pq a previsão de lançamento apenas em 2028? pq planta de 41 m2?*

Resposta: Será necessário parcelamento do terreno que se dará por loteamento, no qual o prazo de legalização é mais extenso visto que as etapas são longas e sequenciais. De toda forma, nosso cronograma de trabalho visa buscar oportunidades para antecipar esse lançamento para o final de 2027, mas entendemos que 2028 é a visão segura.

A planta atual tem 40,80m² e foi aprovada em 2022, neste momento o time de Produto está trabalhando na nova tipologia, que deve ser emitida no 2º semestre de 2025.

One Page – Aurora de Minas – comitê 26/06/2025

Cidade	Belo Horizonte	**Mancha de demanda**	MG - CNT - BH Sul + Contagem
Regional	MG	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Investimento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Jun

Unidades (% Vagas)	357 (33%)	**CA Máx | Proj**	1,0 | 0,9
Tipologia	F2E - Concreto	**Escritura**	nov-27
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	jan/28 | 23

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	7.276 (7,7%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	7,7% (100,0%)
Valor R$/m²	721	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	42.262 (44,6%)	**Indireto Unit.**	21.835
Prazo da Obra (meses)	17	**Torre Unit.**	58.186
Custo Total Unit. (LPU):	118.381 (90)	**Infra Unit.**	18.325
Início de Obra	jul-28	**Fundação Unit.**	6.151

Preço Nominal Unit.	265.493	**VSO**	20
Preço Raso Unit.	244.465	**Referência**	VISION
Avaliação Unit.	290.000	**Renda (% em RET 1%)**	4.904 (8,1%)

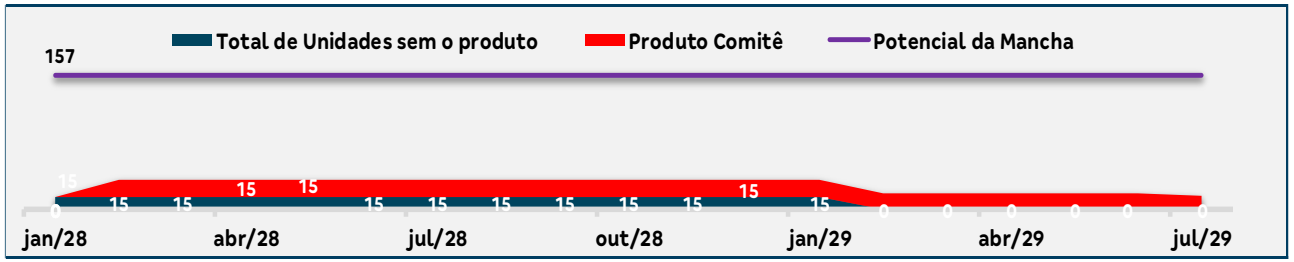

LI (Régua):	**20,1% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	38,1%
LI Resiliência:	7,8% (N/A)	**Margem Rasa Econômica:**	32,1%
Margem Bruta REF:	42,1%	**Margem Contribuição Econômica:**	26,7%
Margem Rasa REF:	**37,1%**	**Exposição (% VGV):**	11.902 (11,2%)
TIR:	136,9%	**VGV Total:**	94.781
Payback Contingente (21 m) :	**18 m/ (-3 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	-
Payback Consolidado:	18	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	-

Destaques

Projeto em Belo Horizonte, região sul, próximo ao bairro Buritis onde RIVA tem vendido projeto a +400k. CVC assinado em 26/08/2023.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

- 100% permuta financeira, fração 9,0% do VGV, descontos de 14,71% e sem preço mínimo garantido, representando uma fração líquida de 7,7% do VGV.
- AP com 357 uhs, sendo o máximo permitido pelo limite de quota de 45m²/UH
- *Way-out* por resolutivas master;
- Prazo para superação das resolutivas: Não há;
- Prazo máximo para lançamento: Não há;
- Prazo máximo para início de obra: Não há;
- Intermediação: Não há.

GARANTIA:

- Aval da Construtora Tenda S/A.

DEMAIS CONSIDERAÇÕES:

- Atualização tipologia: este projeto desenvolvido na tipologia modular aprovada em 2022 que não permite blocos com mais de 8PP ou mais de 15 andares;
- Ainda não foram absorvidas melhorias de produto como varanda (nova tipologia) e piscina (premissas de produto), relevantes na praça de MG;
- Considerando o zoneamento do terreno e legislação aplicada, partes das UHS são enquadradas e vendidas como tipologias HIS-1 (58 uhs) e HIS-2 (180 uhs), que hoje apresentam limite de renda e preço de venda de 187k e 280k, respectivamente. O restante das unidades poderão ser vendidas livremente. As regras de limitação tem sido rediscutidas, com atualização dos tetos para os atuais no dia 25/06. Seguiremos na briga institucional para que até o lançamento seja mantida somente a limitação de renda
- Unidades HIS-1 e HIS-2 apresentam isenção de ITBI. Para compra através de SFH, há desconto de 80% nos emolumentos cartorários.
- Terraplanagem e contenção seguem com custos controlados (1.170 e 999/uh, respectivamente).
- Estruturando reduções de custo: menor preço de concreto (já validado com suprimentos – menor custo BR) e INFRA (otimização no traçado das redes de água e drenagem);

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro
- Pareceres anexos

Farol Pareceres – Aurora de Minas

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Contrato compra e venda assinado em 26/08/2023. Due Diligence concluída em 10/23, em renovada em 05/2025, contendo os seguintes pontos de atenção: - Parte do imóvel (225m²) encontra-se locada para empresa de telecomunicações, com antena instalada. O direito de preferência e de renovação da locação já foram formalmente renunciados. Contudo, o contrato permanece vigente até 01/11/2027, sendo obrigação da locatária a desocupação da área ao término do referido prazo. - Certidões de desapropriação pendentes de emissão por órgãos públicos (DNIT, DEER, EPR Via Mineira e Secretaria Municipal). Como ponto de mitigação, não foram localizadas ações de desapropriação envolvendo o imóvel. - A Sancruza (sócia da vendedora) apresenta passivos judiciais (trabalhista e cível) que totalizam aproximadamente R$ 710 mil. A análise patrimonial está em andamento, mas há risco remoto de que tais ações atinjam o imóvel, pois isso dependeria da desconsideração da personalidade jurídica, hipótese que não se vislumbra no presente caso. - Contrato possui resolutiva master de saída.	Ok com ressalvas	
Legalização	- o empreedimento teve seu licenciamento ambiental e Parcelamento do solco iniciado; - "Antena" de telefonia deve ser retirada para viabilização do alargamento da Rua dos Esportes e execução do EUC (Equipamento Urbano Comunitário) - A Servidão da CEMIG exitente no terreno está respeitada no projeto - As Faixas de Domínio e Servidão da Rodovia que afetam o o terreno estão respeitadas	Ok com ressalvas	
Produto	Está andamento a negociação para a remoção da antena de telecomunicações posicionada no lote previsto para doação. Caso haja uma negativa deverá ser reestudado a poligonal do empreendimento, o que consequentemente poderá alterar o número total de unidades projetadas.	Ok com ressalvas	
GETEC	Sem riscos	Ok	
Logística	Sem riscos	Ok	
Contratação	N/A	Ok	
Inteligência de mercado	IM avalia o preço como Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	N/A	Ok	
Estudos Econômicos	Sem riscos	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA
• BH – Belo Horizonte

LandBank

1. Flor de Minas
2. Aurora de Minas

Cluster MPR – (Comitê)
Cluster 3 - Verde

Região
Capital

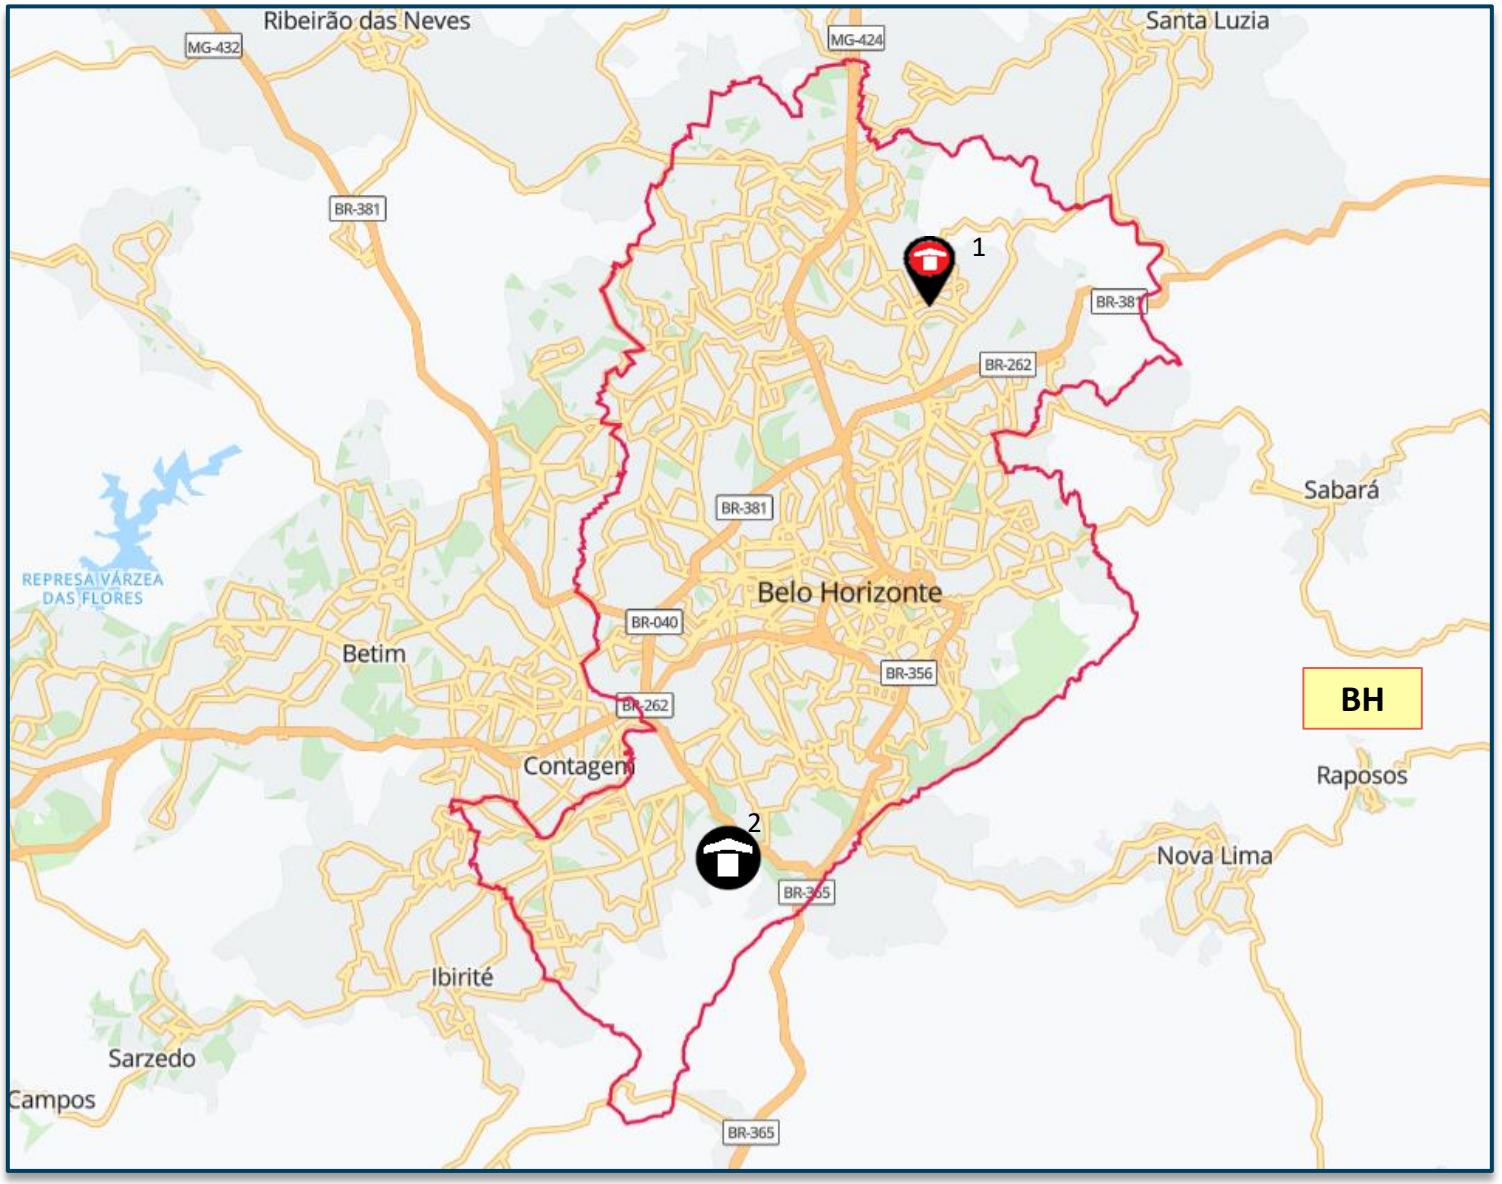

Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento AURORA DE MINAS
Investimento

Informações Gerais – Condomínio 01		
Terreno	**Área terreno**	16.463,28m²
	Menor poligonal	16.463,28m²
	App / FNA	APP Hídrica = 1.611,28m² | FNA= 3.026,01m²
	Reserva de calçada/ melhoramento viário	Não
	Área liquida	11.825,99m²
	Zoneamento	Zona de Adensamento Restrito 2
	Ca máximo	1,00
	Ca projetado	0,88
	Ca liquido	1,22
	Fração Exigida | Projetada	45 (367UH) | 46 (357UH)
	Gabarito máximo	COMAER T+14
Geral	**Total uh**	357
	Total de vagas	119Vagas (33,33%)
Tipologia	**Tipologia**	MG-GRA-F02E-PCT-C2A
	Gabarito	T+14
	Lâmina	03 – 08PP
	Área privativa	40,80m² | 32,12m²
Condomínio	**Unidade pcd**	11
	Unidade lazer|técnica	03 | 00
	Torre	03
	Fase	Única
Lazer	**Lazer coberto**	Salão de Festas
	Lazer descoberto	Play Kids, Play Baby, Play Pet, Fitness externo.

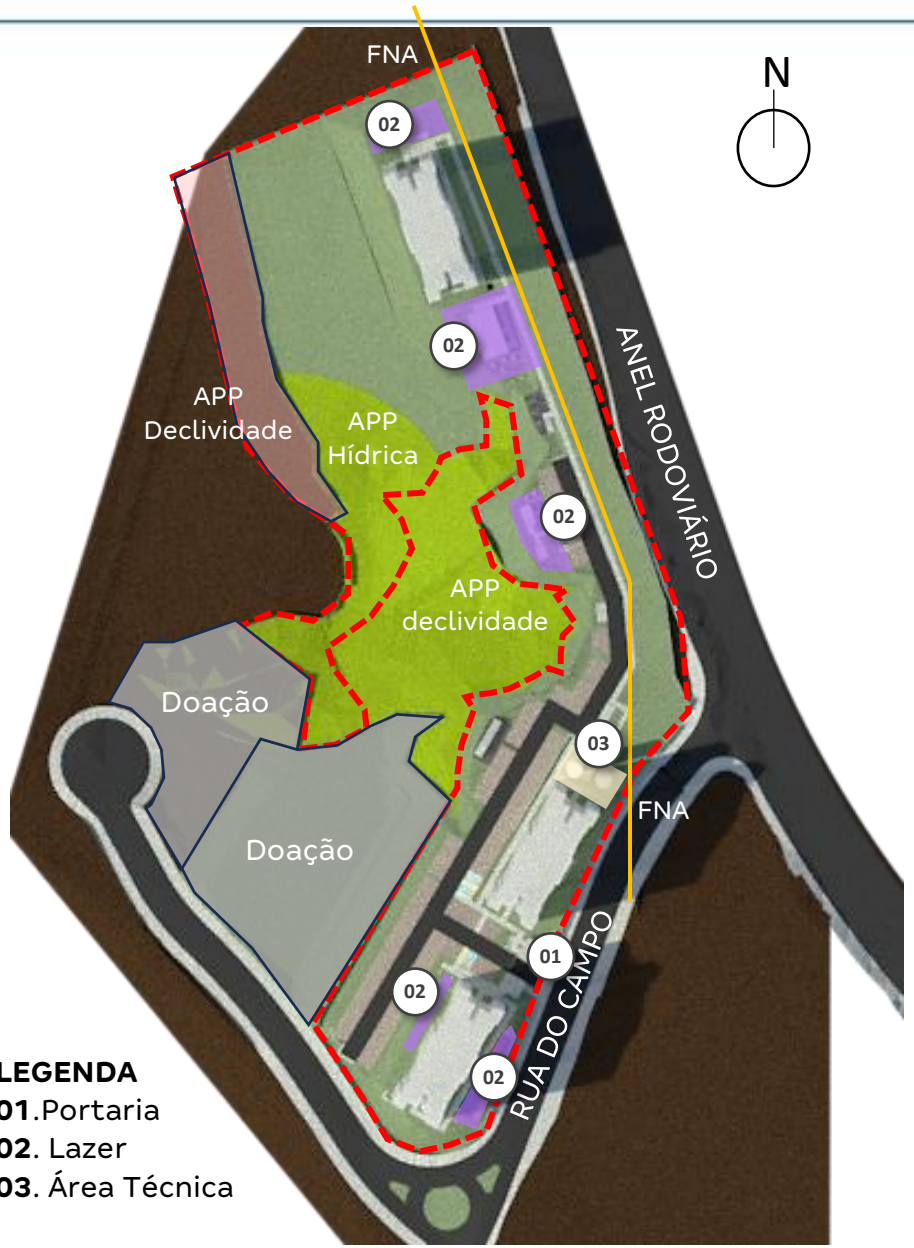

LEGENDA
01.Portaria
02. Lazer
03. Área Técnica

PRODUTO

Empreendimento AURORA DE MINAS
Investimento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	**Limite super condomínio**	🟢	-
	Acesso	🟢	-
	Percurso do pedestre até torre	🟡	230m da última torre até a portaria
Diferencial produto	**Atributos Infra**	Não	-
	Atributos Torre	Não	-
	Edifício Garagem	Não	-

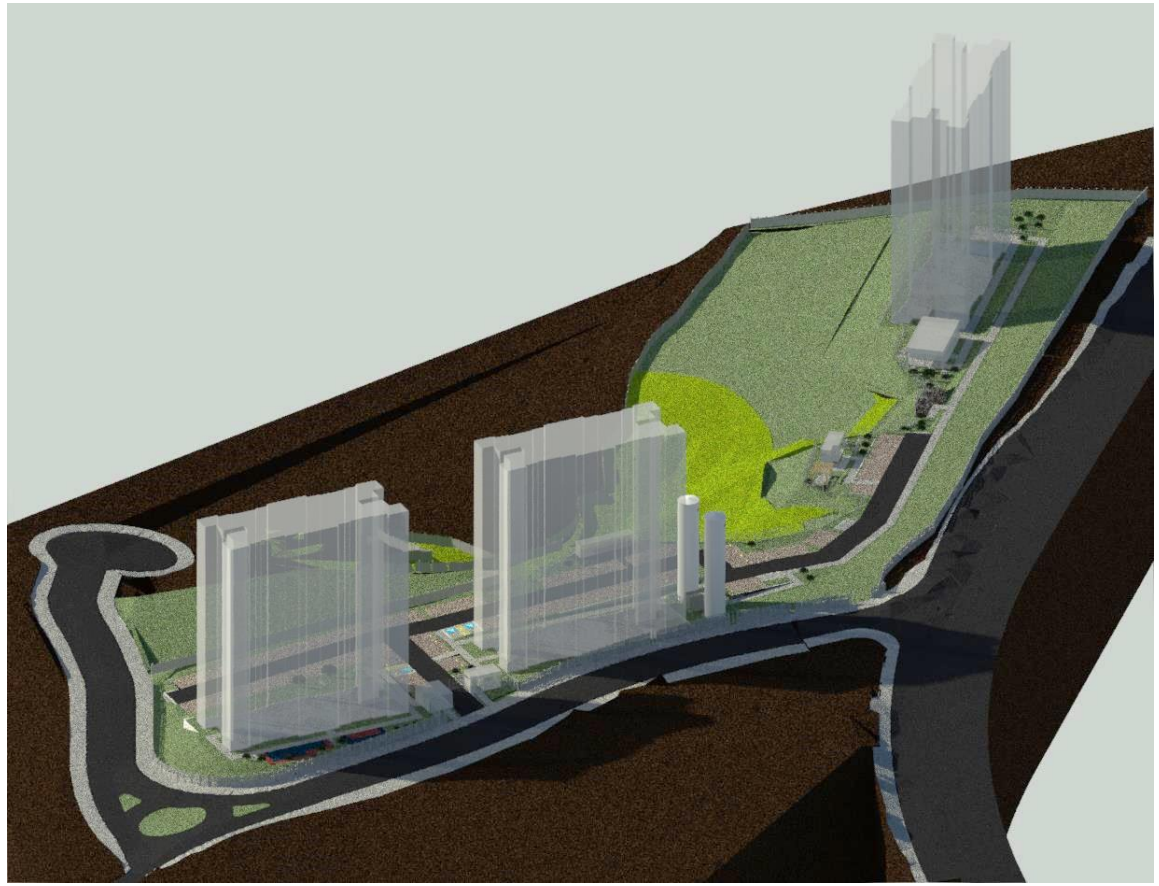

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Condições do Negócio

VALOR DO NEGÓCIO

- Valor Total CVC: R$ 5.685.120**.** Na VF: R$ 8.530.281 (diferença entre CVC e Book: preço CVC = 188k e parecer IM = 265k; volume de unidades CVC = 336 e projetado = 357);

FORMA DE PAGAMENTO

- Remuneração 100% em permuta financeira (“Participação”);
- Participação de 9,0% do VGV se o preço médio de venda das unidades for de até R$188.00,00;
- Participação de 9,5% do VGV se o preço médio de venda das unidades for de R$188.00,01 até R$ 197.000,00;
- Participação de 10,0% do VGV se o preço médio de venda das unidades for igual ou superior 197.000,01;
- O valor médio de venda das unidades para referência e definição do percentual da participação será atualizado a partir de 28/08/2022 até a conclusão dos pagamentos: pela variação do INCC ou pela variação do teto do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), o que for maior;
- A variação do INCC do período de ago/22 (1.044,679) a abr/25 (1.184,462) foi de 13,38%. A variação do teto do PMCMV no mesmo período foi de 42,86% (350k para 500k), devendo ser esta a referência de atualização a ser considerada. Como o preço médio de venda na data vigente é de R$259.646,00, foi considerada a Participação de 9,0% do VGV, uma vez que o preço médio de R$ 188.000,00 atualizado em 42,86% representa um valor de R$ 268.571,43.
- Aplicação de 14,71% de descontos sobre o valor da Participação, referente aos descontos de selling, marketing, impostos, custas de venda, contingência e comissão de corretagem, ITBI, registros, emol.

PRAZOS CONTRATUAIS

- Contrato assinado em 26/08/2023. Não há prazo limite para superação das condições resolutivas.

GARANTIAS

- Em favor dos Permutantes: Saldo devedor garantido com aval da Construtora Tenda S/A, conforme cláusula 5.4 do instrumento particular.

CORREÇÃO MONETÁRIA

- Para fins de antecipação, penalidade ou multa será aplicado IPCA/IBGE.

INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA

- Não houve intermediação neste negócio conforme cláusula 8.1 do instrumento particular.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Comitê

	ANEL VILLE ÉBANO CEN02 | REV03	ANEL VILLE ÉBANO CEN02 | REV02	ANEL VILLE ÉBANO CEN01 | REV01 LANÇAMENTO UNIFICADO	ELEVATO MIRANTE NOVO CEN03 | REV04
Torres	3	3	3	4
Unidades Construídas	360	360	240 | 104	336
Unidades Vendidas	357	357	240 | 103	336
Total Unidades Vendidas	357	357	343	336
Condomínios (qta.)	1	1	2	1
Cidade	Belo Horizonte - MG	Belo Horizonte - MG	Belo Horizonte - MG	Vespasiano - MG
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	3 Torres | T+14 | 08PP | C2A	3 Torres | T+14 | 08PP | C2A	2 Torres | T+14 | 08PP | C1A	4 Torres | T+13 | 06PP | C1A
Tipologia	-	-	1 Torre | T+12 | 08PP | C1A	-
Atributos de Projeto	-	-		-
Projeto Infra	AP	AP	AP	AP
Projeto Torre	AP	AP	AP	AP
Mês Base	abril-25	abril-25	novembro-24	fevereiro-25
Incc	1.184,462	1.178,386	1.149,170	1.169,116
LVS	abril-25	fevereiro-25	setembro-24	janeiro-25
Indiretos	abril-25	fevereiro-25	setembro-24	janeiro-25
Base de Preço	LPU 90	LPU 89	LPU 84	LPU 87
Takt	2x2	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	17	18	17	16
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 107.526	R$ / UND R$ 109.438	R$ / UND R$ 109.282	R$ / UND R$ 103.067
Indireto	R$ 21.835	R$ 23.220	R$ 23.026	R$ 21.074
Torre	R$ 58.186	R$ 58.417	R$ 55.765	R$ 57.651
Infra	R$ 18.325	R$ 18.601	R$ 20.884	R$ 17.182
Fundação	R$ 6.151	R$ 6.151	R$ 6.138	R$ 6.055
EEE	R$ 859	R$ 997	R$ 1.204	
ETE				
Contenção	R$ 999	R$ 999	R$ 1.290	R$ 487
Terraplenagem	R$ 1.170	R$ 1.052	R$ 975	R$ 619
CUSTO TOTAL II	R$ 10.855	R$ 10.855	R$ 9.063	R$ 4.888
Urbanização	R$ 5.010	R$ 5.010	R$ 3.743	R$ 3.648
Drenagem	R$ 2.155	R$ 2.155	R$ 1.695	R$ 282
Extensão de Rede Elétrica	R$ 280	R$ 280	R$ 292	R$ 298
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 3.410	R$ 3.410	R$ 3.333	R$ 661
CUSTO TOTAL III				
Incorridos				
CUSTO TOTAL IV				
Aprendizado				
CUSTO TOTAL V		R$ 620	R$ 3.634	R$ 1.417
Atualização por INCC		R$ 620	R$ 3.634	R$ 1.417
CUSTO TOTAL VI				
Edifício Garagem				
CUSTO TOTAL I+II	R$ 118.380	R$ 120.292	R$ 118.345	R$ 107.955
CUSTO TOTAL I AO VI	R$ 118.380	R$ 120.913	R$ 121.979	R$ 109.372

Custo de Construção

	ANEL VILLE ÉBANO CEN02 | REV03	ANEL VILLE ÉBANO CEN02 | REV02	
Torres	3	3	
Unidades Construídas	360	360	
Unidades Vendidas	357	357	
Total Unidades Vendidas	357	357	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Belo Horizonte - MG	Belo Horizonte - MG	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	3 Torres | T+14 | 08PP | C2A	3 Torres | T+14 | 08PP | C2A	
Tipologia	-	-	
Atributos de Projeto	-	-	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	abril-25	abril-25	
Incc	1184,462	1178,386	
LVS	abril-25	fevereiro-25	
Indiretos	abril-25	fevereiro-25	
Base de Preço	LPU 90	LPU 89	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	17	18	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 107.526	R$ / UND R$ 109.438	DIF -R$ 1.912
Indireto	R$ 21.835	R$ 23.220	-R$ 1.385
Torre	R$ 58.186	R$ 58.417	-R$ 231
Infra	R$ 18.325	R$ 18.601	-R$ 276
Fundação	R$ 6.151	R$ 6.151	R$ 0
EEE	R$ 859	R$ 997	-R$ 138
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 999	R$ 999	R$ 0
Terrapplenagem	R$ 1.170	R$ 1.052	R$ 118
CUSTO TOTAL II	R$ 10.855	R$ 10.855	R$ 0
Urbanização	R$ 5.010	R$ 5.010	R$ 0
Drenagem	R$ 2.155	R$ 2.155	R$ 0
Extensão de Rede Eletrica	R$ 280	R$ 280	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 3.410	R$ 3.410	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 620	-R$ 620
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 620	-R$ 620
CUSTO TOTAL	R$ 118.380	R$ 120.913	-R$ 2.532

INDIRETOS
-701 | G11 – Serviços Técnicos (Valor Alinhado com Renan)
-231 | G14 – Administração (Redução de 1 mês)
+477 | G17 – Operação do Canteiro (Retirada de Rampa Metálica – considerado em Terraplenagem)

TORRE
+349 | Instalações (LVS Fev/25 – LVS Abr/25 - Instalações F2E Brasil)
-248 | Esquadrias de Ferro (Troca de Portas de Ferro dos Shafts para Visores)
-332 | Elevador (Desconto de 85% para 80%)

INFRA
+94 | Instalações (Simulador NE de Fev/25 para Mar/25)
-370 | Reserv. Metálico (Atualização de KG's e preço das Bombas)

EEE
-138 | Projeto (Atualização de Referencia)

TERRAPLENAGEM
+118 | Projeto (Absorção de rampa provisória de LOG)

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Segundo diretriz, há viabilidade para abastecimento de água. Será necessária uma extensão de aproximadamente 865m até Rua Doze com Rua Doutor Cristiano Rezende.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Segundo a diretriz, há viabilidade para o abastecimento de esgoto, sendo necessária uma extensão de aproximadamente 50 m até a Rua Quinze .

SISTEMA DE DRENAGEM
Considerado uma FNA direcionando a rede próxima à rodovia para a Rua do Campo, e uma extensão de rede de aproximadamente 272 m na Rua do Campo até um córrego.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Não se aplica.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Há viabilidade.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Foi considerado urbanização de 3.214m² na Rua do Campo.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 5
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 10/2024, com validade em 10/2026.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 10/2024, com validade em 10/2026.

Drenagem:
- Não se aplica.

Elétrica:
- Viabilidade emitida em 04/2024. Apesar da viabilidade positiva para ligação, no pedido de ligação definitiva a concessionária pode vir a cobrar reformas necessárias, caso a infraestrutura existente não seja suficiente.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Foi considerado urbanização de 3.214m² na Rua do Campo.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 10 furos.
- Considerada Estaca Hélice Contínua, com diâmetros de 50, 60 e 70cm e profundidade de 14m.

Logística

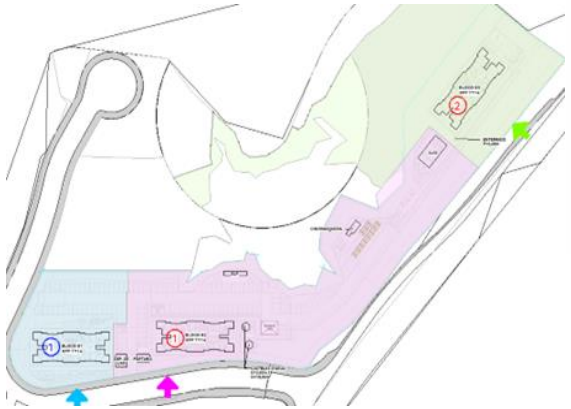

PLANEJAMENTO / CUSTO

PRODUTIVIDADE

DEVIDO À COMPLEXIDADE DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO (CONTENÇÕES), O PERÍODO DE PRÉ-FORMA POSSÍVELMENTE TERÁ UM PRAZ MAIS LONGO QUE O PADRÃO.

ENTERRADOS

PRIORIZAR A EXECUÇÃO NO PERÍODO DE PRÉ-FORMA DO ENTERRADO, DEVIDO À PROJEÇÃO DOS TALUDES PROVISÓRIOS ORIUNDOS DE SUAS ESCAVAÇÕES, QUE APRESENTAM INTERFERÊNCIA COM A FUNDAÇÃO DOS BLOCO 03. *********

LOG_VIVENCIA - CONTAINERS

DESCRIÇAO	QUANTIDADE	TAMANHO MODULOS	MOBILIZAÇAO	DESMOBILIZAÇAO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.
CONTAINER ALMOXARIFADO (LOG)	1 MODULO DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MODULO COM SANITARIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERIODO	ONSIDERAR DEFINITIVA	ONSIDERAR DEFINITIVA
CONTAINER PROVISORIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MODULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERIODO	-	-
CONTAINER VESTIARIO ACABAMENTO (LOG)	CONSIDERAR 2 MODULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	-	TODO PERIODO
CONTAINER VESTIARIO ESTRUTURA (LOG)	CONSIDERAR 2 MODULOS DE CONTAINER (EQUIPE VERTICAL)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERIODO	-
CONTAINER VIVENCIA PADRAO (LOG)	CONSIDERAR 14 MODULOS COM 2 ESCADAS (7 MODULOS NO PAV. T E 7 MODULOS NO PAV SUPERIOR)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO

LOG_TENDAS_PERIODOS

DESCRIÇAO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	4,00	6,00	-	TODO PERIODO	-
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	4,00	10,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO
TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	4,00	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-
TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	7,00	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-
TENDA BANHEIRO QUIMICO E BEBEDOURO (LOG)	1	3,00	3,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	6,00	8,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO
TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	6,00	10,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO
TENDA LAZER (LOG)	1	5,00	12,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	3,00	4,00	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇAO	DESMOBILIZAÇAO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO
BETONEIRA (LOG)	VARAVEL	-	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-
BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERIODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERIODO DE ACABAMENTO
BOMBA ESTACIONARIA PADRAO (LOG)_R01	1 EQUIP PARA O BLOCO X	-	-	-	TODO PERIODO	-
BOMBA LANÇA (LOG)	VARAVEL	-	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-
CAMINHAO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERIODO DE ESTRUTURA	-
CREMALHEIRA PCT (LOG)	3 EQUIPAMENTOS	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO
MINIGRUA (LOG)	4 EQUIPAMENTOS	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERIODO	-
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERIODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-

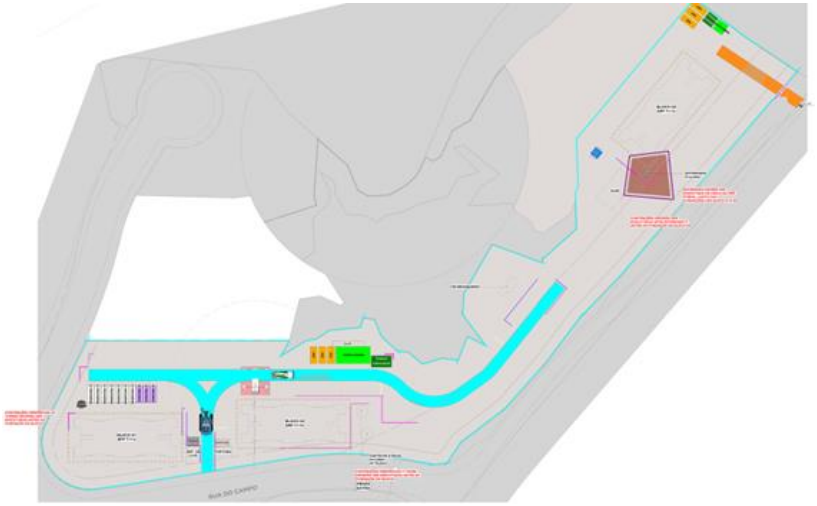

VISTA 3D - PRÉ FORMA

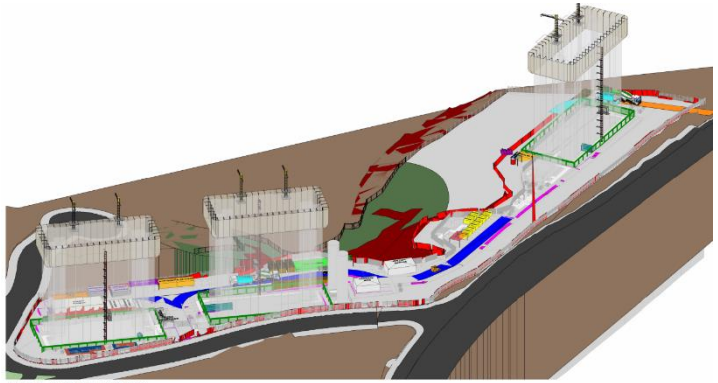

VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO

Logística

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS						
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-
BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_R01	1 EQUIP PARA O BLOCO X	-	-	-	TODO PERÍODO	-
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-
CREMALHEIRA PCT (LOG)	3 EQUIPAMENTOS	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
MINIGRUA (LOG)	4 EQUIPAMENTOS	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-

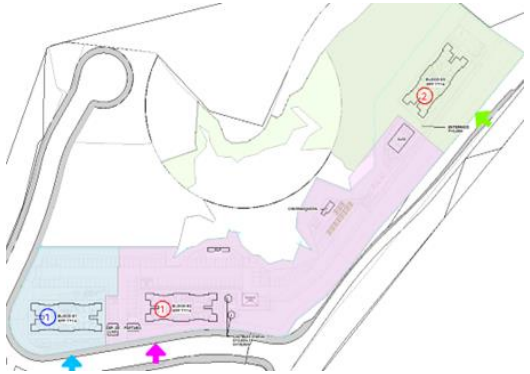

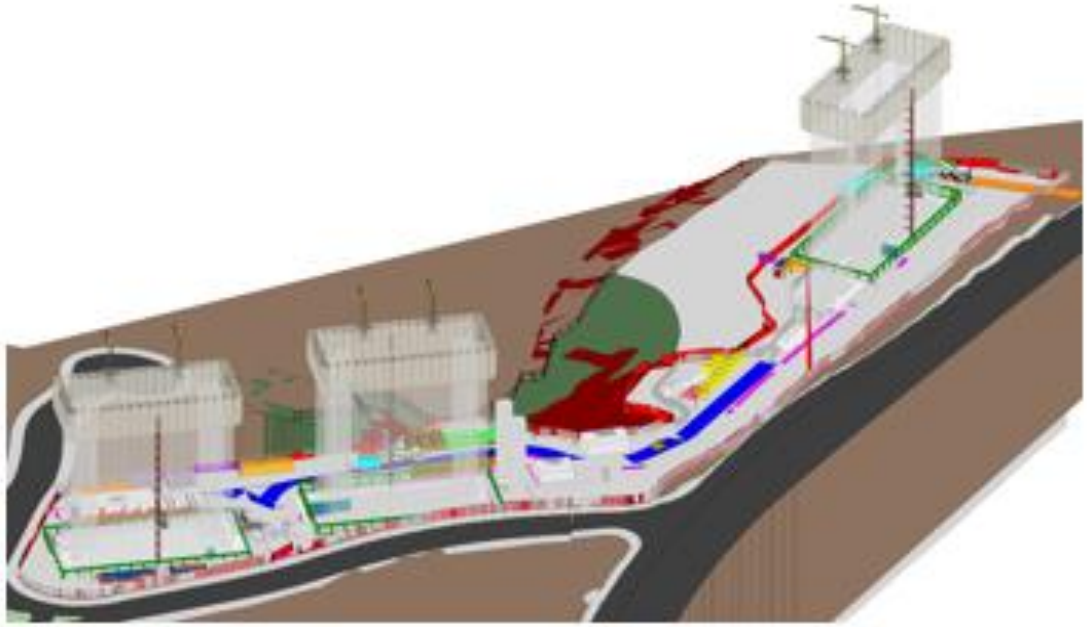

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CUSTO PARA EQUIPE DE MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE MATERIAIS "FORMIGUINHAS" (2 FUNCIONÁRIOS ESTRUTURA, 2 FUNCIONÁRIOS ACABAMENTO E 2 FUNCIONÁRIOS PARA TRANSPORTE DE AÇO), DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DE MAQUINÁRIOS AO LONGO DA IMPLANTAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO/DESCARGA DE MATERIAIS. NÃO HÁ ALCANCE DO RAIO DO MUNCK PARA MOBILIZAR E DESMOBILIZAR A CREMALHEIRA DO BLOCO 03. NECESSÁRIO PREVER CUSTOS COM CREMALHEIRA DE MONTAGEM MANUAL. PREVER CUSTO DE DOIS PORTÕES DE ACESSO, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
➢ **PRAZO DE OBRA**	PREVER PRAZO NO PERÍODO DE PRÉ FORMA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÕES CRÍTICAS (CONFORME INDICADO EM PROJETO).

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Belo Horizonte	BH	30%	1.575	131	1.890	157

Empreendimento	Renda	Lançamento	dez/28	jan/29	fev/29	mar/29	abr/29	mai/29	jun/29	jul/29	ago/29	set/29	out/29	nov/29	dez/29	jan/30	fev/30	mar/30	abr/30	mai/30	jun/30
Flor De Minas	3.358	set-28	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15						
Aurora de Minas	**4.904**	**dez-28**		**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**17**
Total de Vendas Lançados			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**15**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**17**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Aurora de Minas | Mapa Concorrência

		Aurora de Minas	Reserva Dos Buritis
		TENDA	Riva
Distância Tenda (km)			1,3km
Região 1 Km	População	11.324	18.317
	Dens. Demográfica	3.628	5.868
	Renda (R$)	5.246	6.306
	Classe Social	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)
	PEA Dia	10.200	15.121
Quantitativo	Lançamento	dez/28	dez/23
	Unidades	357	504
	Estoque	357	99
	VSO	20	23
	Stockout	18	4
	Preço Nominal (R$)	265.493	422.100
	Preço CEF (R$)	213.228	337.680
	Renda Comprador (R$)	4.904	7.500
	Dif Tenda (R$)		-2.596
	Factibilidade		●
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	3	5
	Gabarito	T+14	T+8
	Plantas (m²)	40,8m²	38,75m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Garden
	Dif. Entrega	Não	Equipado e Decorado
	Vagas	0% de Vagas	100% Com vaga
	Lazer	'Salão de festas, petplace, bicicletario (coberto), churrasqueira, mirante, fitness, brinquedoteca, playbaby, playkids.	Tem Suítes, Tem Garden, Bicicletário, Lounge, Pet Place, Piscina, Playground, Praça, Quadra, Salão de Festas, SPA,

Farol Renda
● Acima de 300
● Entre 0 e 300
● Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência possui target de preço e renda superior ao previsto para o produto Tenda.
- Na região de BH nos últimos 3 anos tivemos lançamento de apenas 2 projetos dentro do Faixa 2 do MCMV.

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Aurora de Minas					
Tipo:	**HIS***		**Faixa 2 - Sem Vaga**		**Faixa 2 - Com Vaga**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	280.000		280.000		310.000	
Renda Inicial (VF)	2.798		4.996		5.792	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	50%		0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,36	1.000	0,56	2.790	0,48	2.790
FGTS	0,36	1.000	0,81	4.030	0,70	4.030
Financiamento	103,28%	154.732	99,90%	207.943	98,52%	232.607
Subsídio	111,94%	13.366	0,00%	0	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	22	22	22	22	22	22
Pró-Soluto	76,79%	17.174	76,74%	30.646	67,71%	31.350
Preço Raso (RS)	187.272	187.272	245.409	245.409	270.777	270.777
TCD	0,00%	0	49,96%	25.161	43,10%	25.161
VSO	3	3	10	10	7	7
Preço de Venda	**187.272**	**187.272**	**270.570**	**270.570**	**295.938**	**295.938**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**187.272**	**187.272**	**270.570**	**270.570**	**295.938**	**295.938**
Preço Raso (R$)	**187.272**		**245.409**		**270.777**	
% de Raso	**100,00%**		**90,70%**		**91,50%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**		**-**	

*Unidades de HIS possuí limite de preço e renda devido a legislação vigente no munícipio de BH.

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Aurora de Minas
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	290.000
Renda Inicial (VF)	4.904
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,50	2.499
FGTS	0,70	3.538
Financiamento	99,99%	207.519
Subsídio	18,19%	2.172
Prazo de Pró-soluto	22	22
Pró-Soluto	73,74%	28.692
Preço Raso (RS)	244.419	244.419
TCD	39,56%	21.073
VSO	20	20
Preço de Venda	**265.493**	**265.493**
Elasticidade	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**265.493**	**265.493**
Preço Raso (R$)	**244.419**	
% de Raso	**92,06%**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região com bons indicadores sociodemográficos, como renda e PEA/Dia, o mesmo também se encontra próximo de pontos de interesses como hospital, escola, supermercado, shopping, via de acesso e etc.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes da região vendem em um target de preço e renda superior do previsto para o Produto Tenda.

	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Aurora de Minas	**290.000**	**244.419**	**4.904**	**20**	**22**	**-**	**244.419**

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Resumo

Aurora de Minas - MG - Belo Horizonte Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	ago-23							
C VAGA		jan-28	jul-28	dez-29	6 meses	17 meses	jan-31	36 meses
S VAGA HIS 2		jan-28	jul-28	dez-29	6 meses	17 meses	jan-31	36 meses
S VAGA HIS 2		jan-28	jul-28	dez-29	6 meses	17 meses	jan-31	36 meses
S VAGA HIS 1		jan-28	jul-28	dez-29	6 meses	17 meses	jan-31	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	8,53 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	16.463 m²
Cash:	0,00 MM			**Custo de terreno m²:**	518,1
Permuta Financeira:	8,53 MM (9,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,00 MM

Área Líquida do Terreno:	11.826 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	721,3
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	9,0% / 53,6%
CA Máx/Proj.	1,0 / 0,9
Incorridos de Incorporação:	0,03 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
C VAGA	T+14	270.777	119	295.938	310.000	98,5%	67,7%	43,1%
S VAGA HIS 2	T+14	245.499	155	270.570	280.000	99,9%	76,7%	50,0%
S VAGA HIS 2	T+14	245.499	25	270.570	280.000	99,9%	76,7%	50,0%
S VAGA HIS 1	T+14	187.272	58	187.272	280.000	103,3%	76,8%	0,0%

Unidades Totais:	357	**Preço Médio:**	265.493	**Renda Média:**	4.904	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	4.766
Unidades Tenda:	357	**Avaliação Média:**	290.000	**Ato:**	2.453 (0,5 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	16.542
VSO:	20 Unidades	**VGV Total:**	94.780.896	**FGTS:**	3.417 (0,7 Salários)	**Preço Raso Médio:**	244.465
RET Médio:	3,8%	**VGV Tenda:**	94.780.896	**% em RET 1%:**	8%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit.:	118.381	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	40,80	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**10.220.739**	**LI:**	**20,06%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**11.901.593**	**Margem Bruta Econômica:**	**38,07%**
TIR:	**136,95%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**0**	**Margem Bruta REF:**	**42,06%**
Exposição de Caixa:	**11,17%**	**Δ LI:**	**0,06%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**0**	**Margem Rasa Econômica:**	**32,13%**
Payback Contingente (21 m):	**18 m/ (-3 m)**	**LI Resiliência:**	**7,81%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**26.109.039**	**Margem Rasa REF:**	**37,08%**
Payback Consolidado:	**18 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**26,75%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Aurora de Minas		C VAGA		S VAGA HIS 2		S VAGA HIS 2		S VAGA HIS 1	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	106.559	100,0%	39.694	100,0%	47.149	100,0%	7.513	100,0%	12.203	100,0%
PIS/COFINS	(2.236)	2,1%	(870)	2,2%	(1.034)	2,2%	(165)	2,2%	(167)	1,4%
Custo Total	(64.607)	61,9%	(21.844)	56,3%	(28.121)	61,0%	(4.528)	61,6%	(10.114)	84,0%
Custo Terreno	(8.180)	7,8%	(3.047)	7,8%	(3.619)	7,8%	(577)	7,8%	(937)	7,8%
Custo Relacionados a Terreno	(60)	0,1%	(20)	0,1%	(26)	0,1%	(4)	0,1%	(10)	0,1%
Custos de Incorporação	(2.834)	2,7%	(933)	2,4%	(1.233)	2,7%	(199)	2,7%	(470)	3,9%
Custo de Construção	(53.533)	51,3%	(17.844)	46,0%	(23.243)	50,4%	(3.749)	51,0%	(8.697)	72,3%
Lucro Bruto Econômico	39.716	38,1%	16.980	43,7%	17.994	39,0%	2.820	38,4%	1.922	16,0%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	39.716	38,1%	16.980	43,7%	17.994	39,0%	2.820	38,4%	1.922	16,0%
Despesas de Selling	(9.361)	9,0%	(4.205)	10,8%	(3.599)	7,8%	(584)	7,9%	(973)	8,1%
Contingência	(2.451)	2,3%	(913)	2,4%	(1.084)	2,4%	(173)	2,4%	(281)	2,3%
Margem de Contribuição	27.904	26,7%	11.861	30,6%	13.311	28,9%	2.063	28,1%	668	5,6%
IR e CSLL	(1.829)	1,7%	(712)	1,8%	(846)	1,8%	(135)	1,8%	(137)	1,1%
Margem Líquida	26.074	25,0%	11.149	28,7%	12.465	27,0%	1.928	26,2%	531	4,4%
Lucro Bruto REF Unit.	129.811	42,1%	162.712	47,2%	135.501	43,0%	138.103	43,5%	46.252	21,1%
Lucro Raso REF Unit.	105.322	37,1%	133.428	42,3%	106.316	37,1%	108.738	37,7%	46.252	21,1%

R$ Mil - VPL - Compra	Aurora de Minas		C VAGA		S VAGA HIS 2		S VAGA HIS 2		S VAGA HIS 1	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	50.942	100,0%	19.043	100,0%	22.508	100,0%	3.385	100,0%	6.006	100,0%
PIS/COFINS	(1.051)	2,1%	(411)	2,2%	(486)	2,2%	(73)	2,2%	(81)	1,3%
Custos e Despesas Totais	(39.670)	77,9%	(14.042)	73,7%	(17.043)	75,7%	(2.714)	80,2%	(5.871)	97,8%
Custo Terreno	(3.743)	7,3%	(1.399)	7,3%	(1.654)	7,3%	(249)	7,3%	(441)	7,3%
Custo Relacionados a Terreno	(55)	0,1%	(18)	0,1%	(24)	0,1%	(4)	0,1%	(9)	0,1%
Custos de Incorporação	(1.600)	3,1%	(522)	2,7%	(698)	3,1%	(114)	3,4%	(266)	4,4%
Custo de Construção	(27.591)	54,2%	(9.197)	48,3%	(11.979)	53,2%	(1.932)	57,1%	(4.483)	74,6%
Despesas de Selling	(5.192)	10,2%	(2.334)	12,3%	(2.012)	8,9%	(311)	9,2%	(534)	8,9%
Contingência	(630)	1,2%	(235)	1,2%	(279)	1,2%	(44)	1,3%	(72)	1,2%
IR e CSLL	(860)	1,7%	(336)	1,8%	(398)	1,8%	(60)	1,8%	(66)	1,1%
Lucro Imobiliário	10.221	20,1%	4.590	24,1%	4.979	22,1%	598	17,7%	54	0,9%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres anexos

Implantação | Google Earth

ANEL VILLE ÉBANO
Belo Horizonte - MG
357 UH

Implantação

CONDOMÍNIO ÚNICO

03 Torres 08PP | T+14
360 Unid. A Construir
357 Unid. A Vender

Enterrado
Caixa de detenção
Volume = 98,24m³

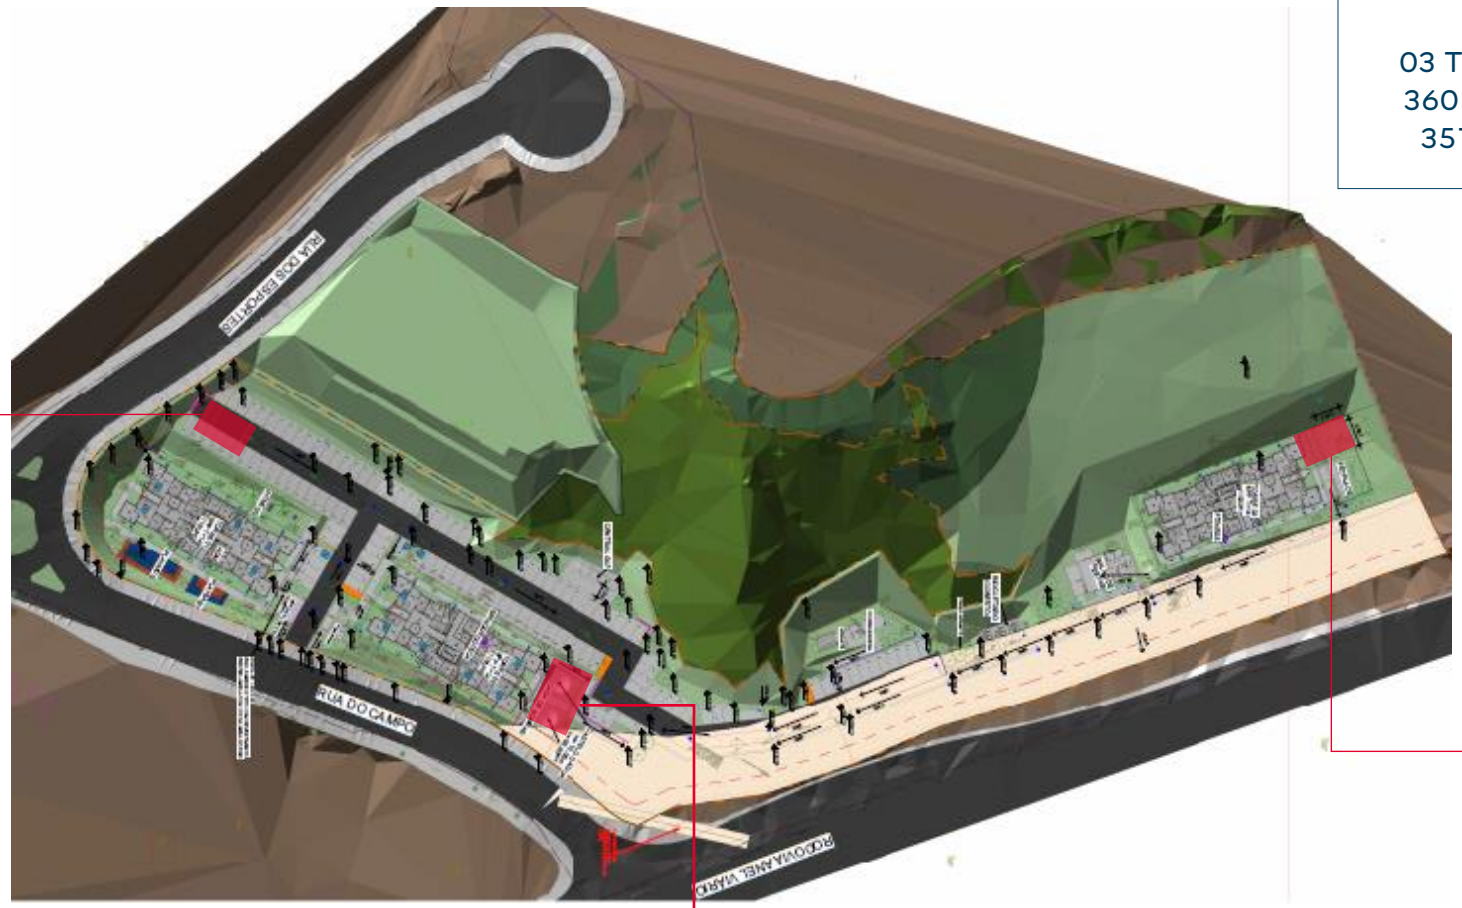

Pavimentação Externa
Área = 3.214m²

2 Reservatórios
Ø 3,80m – 10,05m

Enterrado
Caixas de detenção
Volume = 78,50m³

Implantação 3D

CONDOMÍNIO ÚNICO

03 Torres 08PP | T+14
360 Unid. A Construir
357 Unid. A Vender

Fundação | Contenção | Terraplenagem

FUNDAÇÃO – INPUT INTERNO

	Cond. Único
Hélice Contínua	8pp
Ø 50 cm	27 unid. – L = 13m
Ø 60 cm	36 unid. – L = 13m
Ø 70 cm	12 unid. – L = 13m
	Salão de festas, GLP e Churrasqueira
Ø 30 cm	L = 8m
	Castelos
Ø 50 cm	L = 10m

CONTENÇÕES

	Cond. Único
Até 1,2m	118m
Até 2,0m	36m
Até 3,0m	-
Mureta	101m

TERRAPLENAGEM – RAMBLA

	Volume	
	Cond. Único	**Externo**
Limpeza	2.355 m³	1.143m³
Corte	3.814 m³	4.286m³
Aterro	6.332 m³	1.136m³

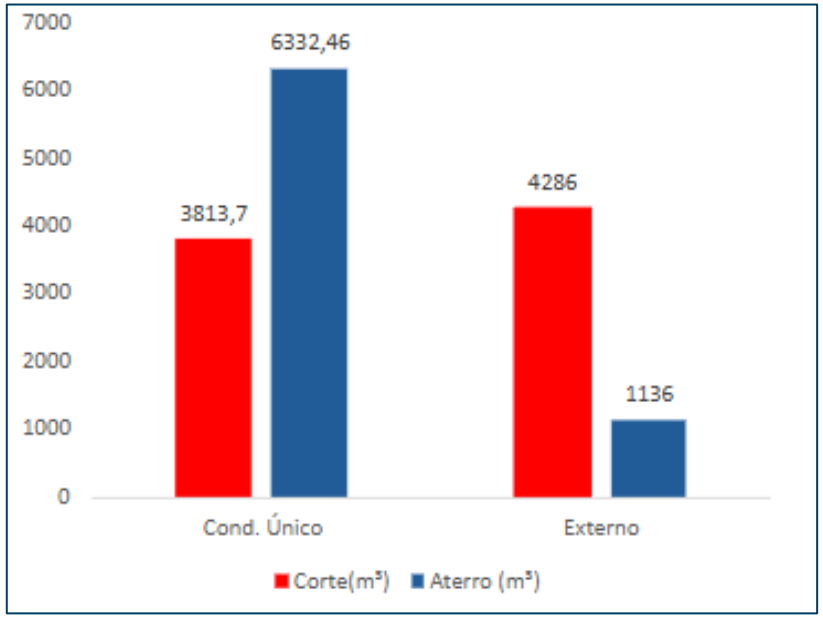

Prazo | Ref. Instalações

ANEL - COND. ÚNICO

ESTIMATIVA DE PRÉ FORMA	
Fase	1
Regional	MG F2E
Tipologia	F2E
Terraplenagem - volume limpeza	2.355
Terraplenagem - volume corte	3.814
Terraplenagem - volume aterro	6.332
Terraplanagem	4.874
Fundação das torres	Hélice
Profundidade	13
Estacas / torre	75
Castelo enclausurado	não
Enterrado crítico	sim
Contenção crítica até 2m	3
Contenção crítica de 2 a 3m	
Contenção crítica de 3 a 4m	
Contenção crítica > 4m	
Enterrado próximo a castelo crítico	não
Contenção próximo a castelo crítico	sim
Contenção próximo a enterrado crítico	sim
Jogos de forma	2
Mob. Equipamentos fundação	1

Acréscimo de prazo MODULAR	
Apto / pavimento	8,0
Dias para 2 apto/pav	5,0
Total de dias a ser acrescido	

Acréscimo de prazo	2,0
Terraplenagem	
Fundação	0,1
Castelo enclausurado	
Enterrado crítico	1,0
Contenção crítica	1,0
Complexidade críticos	1,0

PRÉ FORMA	6,0
PRÉ FORMA c/ MODULAR	6,0

PRAZO

Condomínio	Fase	Pré Forma	Forma	Pós Forma	TOTAL
1	Única	5,00	3,83	8,00	17

INSTALAÇÕES		R$/ Uh	R$	REF.
TORRE	Elétrica	R$ 4.889,57	R$ 8.340,53	Média F2E BR - 02/2025
	Hidráulica	R$ 3.450,96		
INFRA	Elétrica	R$ 3.287,97	R$ 6.447,00	Simulador BA F2EM LVS 02/2025
	Hidráulica	R$ 3.159,03		

Implantação

Caixilho Classe III
Bloco 3 – 48 U.H

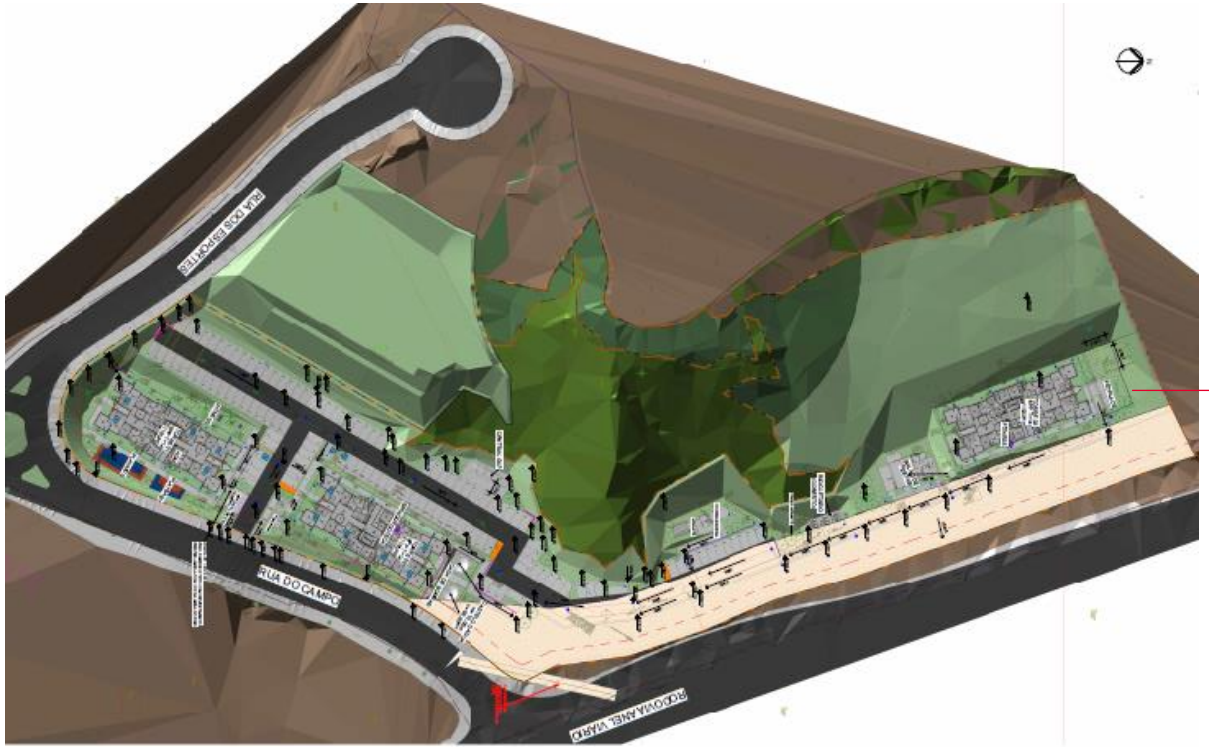

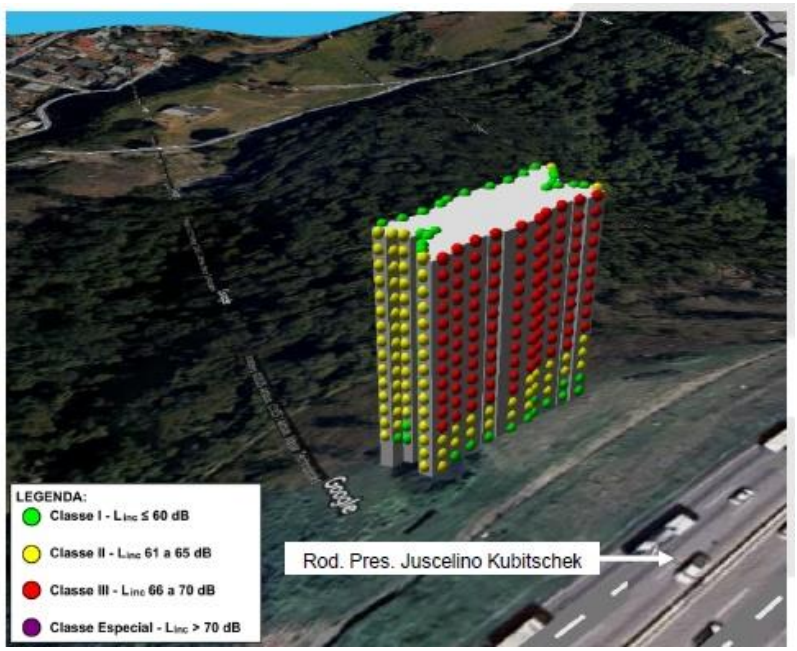

Obrigado
