Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento - Respostas

Regional: RJ

Projeto: Luiza Vale– RZN1

Data Comitê: 26/06/2025

Questionamentos Comitê 23/06/2025

Nome	Luiza Vale - Investimento - Respostas	Observação - Luiza Vale
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Manter voto anterior (Caso esteja votando pela a 2° vez)	ok
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Rodrigo Osmo	Aprovado	N/A
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok, porem reforcando que so baixaremos com as questoes do comodato assinadas
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Discutir em Comitê	Entendi as limitações de CA, mas não tem como chegarmos nas 500 uh, com mais verticalização?
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	Ok

Questionamentos

Renan Barbosa Sanches: *ok, porem reforçando que só baixaremos com as questões do comodato assinadas*

Resposta: Só efetivaremos a baixa com as assinaturas. Status atual : Os comodatos referentes ao lote 105 estão para serem assinados ainda esse mês. O aditivo referente ao lote 87 já esta assinado.

Luiz Mauricio de Garcia Paula: *Entendi as limitações de CA, mas não tem como chegarmos nas 500 uh, com mais verticalização?*

Resposta: Já estamos no gabarito máximo permitido para a região (16 pavimentos). A outra maneira de aumentar o número de unidades seria a retirada do salão de festas e trocar o bloco de 10PP para 12,14 ou 16PP, porém temos um limitador que é o afastamento mínimo exigido entre blocos, para as fachadas ventiladas. (Linha vermelha representa o afastamento, trocando 10PP pelo 12PP, conforme a imagem a direita). De toda forma o time de negócios e projetos já esta imbuído em tentar maximizar, se possível, o adensamento.

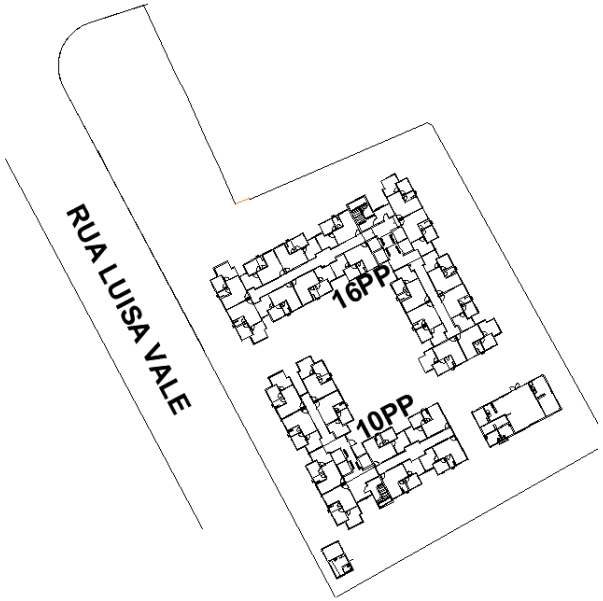

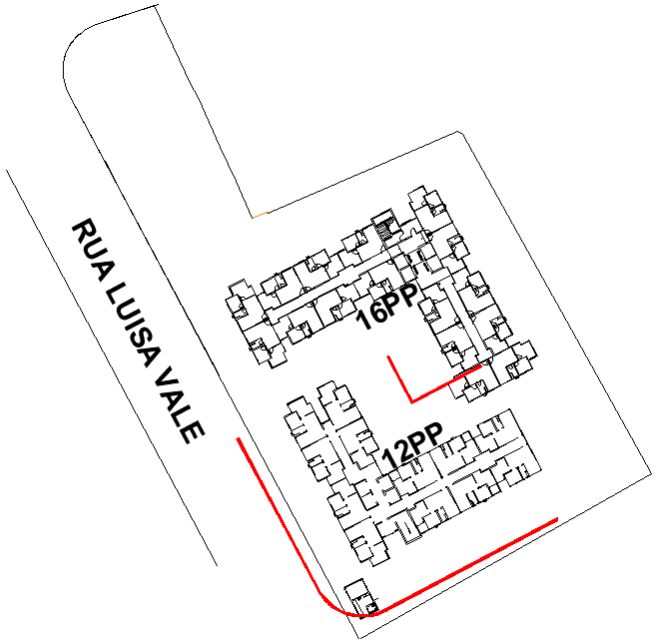

Questionamentos Comitê 16/06/2025

Nome	Luiza Vale - Investimento	Observação - Luiza Vale
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	Ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok. informar se projeto terá mix de varanda e senao, qual o motivo...
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Discutir em Comitê	Preocupação com a qtde de projetos (7 ao mesmo tempo) na zona norte do RJ, ultrapassando o potencial teórico da mancha. Por que não deslocar o lçto para final do 1o semestre de 2027, onde teremos apenas 4 projetos?
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	só conseguimos T+15?
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	Ok
Rodrigo Osmo	Discutir em Comitê	(1) O Slide 9 fala em um CA máximo de 10,5x. Está certa essa info? Caso sim, qual previsão da lei que viabiliza um CA tão alto?; (2) Esse é o 3o projeto desse comitê na mesma região da ZN. Segundo o cálculo de IM, a mancha de demanda não aguenta os VSOs dos 6 projetos que estamos estimando ter na prateleira concomitantemente a partir de Out-26. Por que acreditamos que mercado poderia absorver tamanha oferta, nos VSOs que estimamos?

Questionamentos

Renan Barbosa Sanches: *ok. informar se projeto terá mix de varanda e senao, qual o motivo...*

Resposta: Sim, só não utilizamos no comitê de investimento, mas será objetivo de negócios no desenvolvimento do projeto (upside).

Rodrigo Osmo: *(1) O Slide 9 fala em um CA máximo de 10,5x. Está certa essa info? Caso sim, qual previsão da lei que viabiliza um CA tão alto?; (2) Esse é o 3o projeto desse comitê na mesma região da ZN. Segundo o cálculo de IM, a mancha de demanda não aguenta os VSOs dos 6 projetos que estamos estimando ter na prateleira concomitantemente a partir de Out-26. Por que acreditamos que mercado poderia absorver tamanha oferta, nos VSOs que estimamos?*

Resposta:

(1) Esta correta a informação, o CA máx para esse terreno é 7, porém como beneficio para HIS poderíamos chegar a 10,5 (+50%) desde a aprovação do novo PD (LC 270/24). Na legislação atual não contamos com outros parâmetros necessário para esse atingimento. Cota de soleira que limita o gabarito, afastamento entre blocos limita adensamento e o limite de 500 uh por condomínio também dificulta para HIS – resumindo o CA do novo plano diretor foi melhorado mas sem compatibilizar com demais parâmetros.

(2) O slide de mancha de demanda conta concomitantemente com Elevato Ramos e Elevato Av. Brasil, sendo que um deles é coringa do outro. Além disso postergamos o lançamento do Luisa Vale para compor melhor a curva de vendas, respeitando a demanda potencial e flutuando entre 4 ou 5 projetos simultâneos na mancha. A estratégia da regional é respeitar o calculo teórico de demanda potencial de todas as manchas.

Questionamentos

Fabricio Quesiti Arrivabene: *Preocupação com a qtde de projetos (7 ao mesmo tempo) na zona norte do RJ, ultrapassando o potencial teórico da mancha. Por que não deslocar o lçto para final do 1o semestre de 2027, onde teremos apenas 4 projetos?*

Resposta: Postergamos o lançamento para o final do 1º tri de 2027, dessa forma a curva teórica fica mais aderente com a estratégia da regional em respeitar a demanda teórica flutuando entre 4 ou 5 projetos simultâneos na mancha.

Empreendimento	Renda	Lançamento	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
Lançados																																	
Elevato Bonsucesso	3.444		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	7														
Landbank																																	
Estação Rio	2.885	jun-25		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	28																	
Mirante Boa Vista	**5.322**	**ago-25**				**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**17**										
Carolina Machado (Elevato Madureira)	3.894	dez-25								25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	6							
Elevato Ramos	3.563	jun-26														28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	18
Elevato Brasil	**3.598**	**jul-26**															**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
Silva Vale I	**3.298**	**set-26**																	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
Luiza Vale	**3.499**	**fev-27**																						**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**
Silva Vale - II	**3.298**	**mar-28**																															
Silva Vale - Cond III	**3.298**	**set-29**																															
Silva Vale - Cond IV	**3.298**	**mar-31**																															
Total de Vendas Lançados			**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**7**														
Total de Vendas Lançados + Landbank			**21**	**52**	**52**	**77**	**77**	**77**	**77**	**102**	**102**	**102**	**102**	**102**	**102**	**127**	**99**	**99**	**112**	**105**	**105**	**105**	**97**	**103**	**103**	**84**	**78**	**78**	**78**	**78**	**78**	**78**	**68**
Vendas Produto Comitê						**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**52**	**52**	**52**	**52**	**44**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Total de Vendas Sem o Produto Comitê						**52**	**52**	**52**	**52**	**77**	**77**	**77**	**77**	**77**	**77**	**102**	**74**	**74**	**60**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**34**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**18**
Potencial Total da Mancha			**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**
Projetos Simultâneos na Mancha			**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Projetos Simultâneos na Mancha ex Coringas			**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Atualização de Material

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Comitê 16/06	Comitê 23/06	Comitê 23/06 vs Comitê 16/06	Δ%
Data Estudo:	junho-25	junho-25	0 Meses	N/A
Lançamento:	outubro-26	fevereiro-27	4 Meses	N/A
Preço Nominal:	234.993	234.993	-	0,0%
Preço Raso:	209.718	209.718	-	0,0%
Preço Nominal Inflacionado:	257.866	262.094	4.228	1,6%
Preço Raso Inflacionado:	230.159	233.933	3.774	1,6%
Custo Total Inf (Unit):	142.031	145.234	3.203	2,3%
Custo Construção (Unit):	101.959	101.959	-	0,0%
Fração de construção:	43,4%	43,4%	0,0 p.p.	0,0%
Custo Terreno Inf:	4.460.821	4.483.612	22.791	0,5%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	4.969	6.045	1.076	21,7%
Lucro Imobiliário:	22,1%	21,5%	-0,7 p.p.	-3,0%
Exposição de caixa:	15,0%	15,4%	0,4 p.p.	2,7%
TIR:	103,9%	92,6%	-11,3 p.p.	-10,9%
Margem Bruta REF:	45,4%	45,0%	-0,3 p.p.	-0,8%
Margem Bruta Econômica:	42,4%	42,0%	-0,3 p.p.	-0,8%
Margem Rasa REF:	38,8%	38,4%	-0,4 p.p.	-1,0%
Margem Rasa Econômica:	34,8%	34,4%	-0,4 p.p.	-1,1%
Margem Contribuição Econômica:	30,8%	30,4%	-0,3 p.p.	-1,1%
Payback Contingente (Régua 21 m):	19 m/ (-2 m)	19 m/ (-2 m)	0	0,0%
Payback Consolidado:	19 Meses	19 Meses	0 Meses	0,0%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

One Page – Luiza Vale

[1]

Cidade	Rio de Janeiro	**Mancha de demanda**	RJ - RZN1 - Méier + Cachambi + Lins
Regional	RJ	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Investimento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Jun

[2]

Unidades (% Vagas)	414 (0%)	**CA Máx | Proj**	10,5 | 4,2
Tipologia	F2E - Concreto	**Escritura**	jul-26
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	fev/27 | 23

[3]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	4.200 (4,3%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	5 (28,0%)
Cash (Correção)	725 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	2,4% (54,8%)
Valor R$/m²	955	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	42.211 (43,4%)	**Indireto Unit.**	19.266
Prazo da Obra (meses)	17	**Torre Unit.**	58.007
Custo Total Unit. (LPU):	101.959 (91)	**Infra Unit.**	15.561
Início de Obra	ago-27	**Fundação Unit.**	5.781

[4]

Preço Nominal Unit.	234.993	**VSO**	23
Preço Raso Unit.	209.718	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	240.000	**Renda (% em RET 1%)**	3.499 (25,0%)



LI (Régua):	**21,5% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	42,0%
LI Resiliência:	14,7% (N/A)	**Margem Rasa Econômica:**	34,4%
Margem Bruta REF:	45,0%	**Margem Contribuição Econômica:**	30,4%
Margem Rasa REF:	**38,4%**	**Exposição (% VGV):**	16.238 (15,4%)
TIR:	92,6%	**VGV Total:**	97.287
Payback Contingente (21 m) :	**19 m/ (-2 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(83)
Payback Consolidado:	19	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	(4.451)

Destaques

[1] Imóvel localizado na Zona Norte, no bairro de Del Castilho, divisa com os bairros de Cachambi, Iháuma e Higienópolis, com frentes para a Av. Dom Hélder Câmara e R. Luisa Vale. Entorno com farto transporte público, próximo a estação de trem Del Castilho da Supervia e a estação Del Castilho, da Linha 2 do metrô. Terreno a 1,8km do Norte Shopping e a 1,3km do Shopping Nova América, os maiores da região, com presença de serviços em gerais, supermercados, serviços públicos, comercio e entretenimento.

[2] Implantação de Tipologia Vertical com 414 unidades sendo um torre em L 16PP com T+15 e uma torre em L com T+15 10PP.

[3] Valor do terreno: R$ 4,199 MM, sendo R$ 725.000,00 em cash, com R$10 mil (0,076% do VGV) a título de adiantamento para a resolução do inventário em momento ideal, R$ 715.000,00 na ECV desde que superadas resolutivas, e do saldo devedor no valor de R$ 3,475MM divido em R$ 1,174MM em permuta física (Correspondente a 5 unidades) e R$ 2,300MM em permuta financeira que representada 2,48% do VGV total com valor mínimo garantido de R$ 2,300 MM (apuração 6 meses pós habite-se).

[4] Projeto inserido na faixa 2, com preço de venda e renda extremamente compatíveis, principalmente se comparados com a concorrência na região (slide 24)

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Farol Pareceres – Luiza Vale

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico Imobiliário	Due diligence concluída em 05/2025, com os seguintes pontos de atenção e pendências: (i) Necessidade de regularização da cadeia dominial dos imóveis nº 87 e nº 95. A escritura pública de inventário em favor dos vendedores já se encontra em registro junto ao RGI, previsão de conclusão em 15/07. (ii) Existência de cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e insubrogabilidade nas matrículas dos imóveis nº 87 e nº 95, cujo processamento de cancelamento encontra-se em curso junto ao cartório, previsão de conclusão em 15/07. (iii) Ocupações: Imóvel nº 87: encontra-se locado para uso residencial, com aditivo já assinado prevendo a desocupação mediante notificação e renúncia ao direito de preferência; Imóvel nº 105: Primeira locação (oficina): imóvel ocupado para fins comercias sem contrato formal. Já foi elaborada minuta contratual que resguarda os interesses da Tenda, prevendo a desocupação mediante notificação e renúncia ao direito de preferência (pendente de assinatura e ponto para baixa); Segunda locação (quadra/bar): há contrato de locação firmado para fins comerciais e residencias em julho de 2024, com prazo de 5 anos. O locatário sublocou parte do imóvel a terceiros para instalação de um outdoor, sem, contudo, fornecer o contrato de sublocação. Para mitigar riscos à Tenda, foi elaborado aditivo contratual (pendente de assinatura e ponto para baixa) que: (1) determina a retirada imediata do outdoor; e (2) inclui cláusulas que resguardam os interesses da Tenda, prevendo a desocupação mediante notificação, tornando o contrato para prazo indeterminado e renúncia ao direito de preferência; (iv) IPTU: O imóvel de nº 105 possui um débito ≈31k, contudo, há previsão contratual para pagamento e abatimento do valor no preço, caso necessário. (v) Extratos fiscais: as certidões de débitos municipais em nome de Paulo e Luiz (proprietários do imóvel nº 105) estão positivas. Será necessária a apresentação dos respectivos extratos de débitos para análise da contingência (para fins de ECV).	Ok com ressalvas	
Legalização	Constam dívidas ativas referentes ao IPTU do lote de nº 105. Será necessário apresentar CND para aprovação da demolição e do parcelamento. Há divergências entre o PAL e a topografia que excedem 5% da área, o que demandará retificação de metragem. Será necessário corrigir uma das dimensões descritas na matrícula referente ao nº 105 para compatibilizar com PAL. Para fins de projeto, foi considerada uma largura de 15,00m para a rua Luisa Vale, conforme PAL 29.994. Como o PAA do local não indica a largura da rua, será necessário confirmar junto à Prefeitura. O laudo confirmatório indica contaminação em água e será necessário realizar investigação detalhada e análise de risco. Segundo o consultor, as análises iniciais indicam que a contaminação encontrada não apresentará riscos à saúde humana, o que será confirmado após conclusão da detalhada e etapas de monitoramento (custos previstos no orçamento). Não foram previstos custos para remediação. Não consta aceitação das obras de urbanização dos logradouros. Prefeitura poderá exigir recomposição da pavimentação e da calçada, que se encontram em estado precário. Os custos foram previstos por GETEC. Há necessidade de abertura de processo junto ao COMAR, considerando T+15 e a maior cota de soleira, para as torres habitacionais. O projeto respeita as diretrizes do consultor. Pendente emissão do laudo do IPHAN que indica o nível de enquadramento do terreno. O processo passará pelos setores que analisam os bens materiais, imateriais e arqueológicos. Foi emitida a exigência de um Relatório de Impacto ao Patrimônio Imaterial (RAIPI), estando pendentes os pareceres dos setores que avaliam os bens materiais e arqueológicos. De acordo com o consultor, o IPHAN deverá manter apenas a apresentação do RAIPI como exigência (previsto no orçamento).	Ok com ressalvas	
Implantação	Nenhum risco associado.	Ok	
GETEC	De acordo com o laudo ambiental, há suspeita de contaminação do solo. No entanto, não foram considerados no orçamento quaisquer custos relacionados à remediação ou à execução de obras civis, ficando tais responsabilidades à prospecção.	Com ressalvas	
Logística	Sem riscos.	Ok	
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Ciclo avalia o Preço Vision como factível	Ok	
Estudos Econômicos	Nenhum risco associado.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- RZN – Rio de Janeiro Norte

Lançamento

1. Jd. Bonsucesso

LandBank

2. Elevato Brasil
3. Estação Brasil
4. Estação Rio (Forja Rio)
5. Elevato Madureira
6. Oi São Cristóvão (Mirante Boa Vista)
7. Elevato Ramos
8. Luiza Vale
9. Silva Vale

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 3 - Verde

Região

Capital

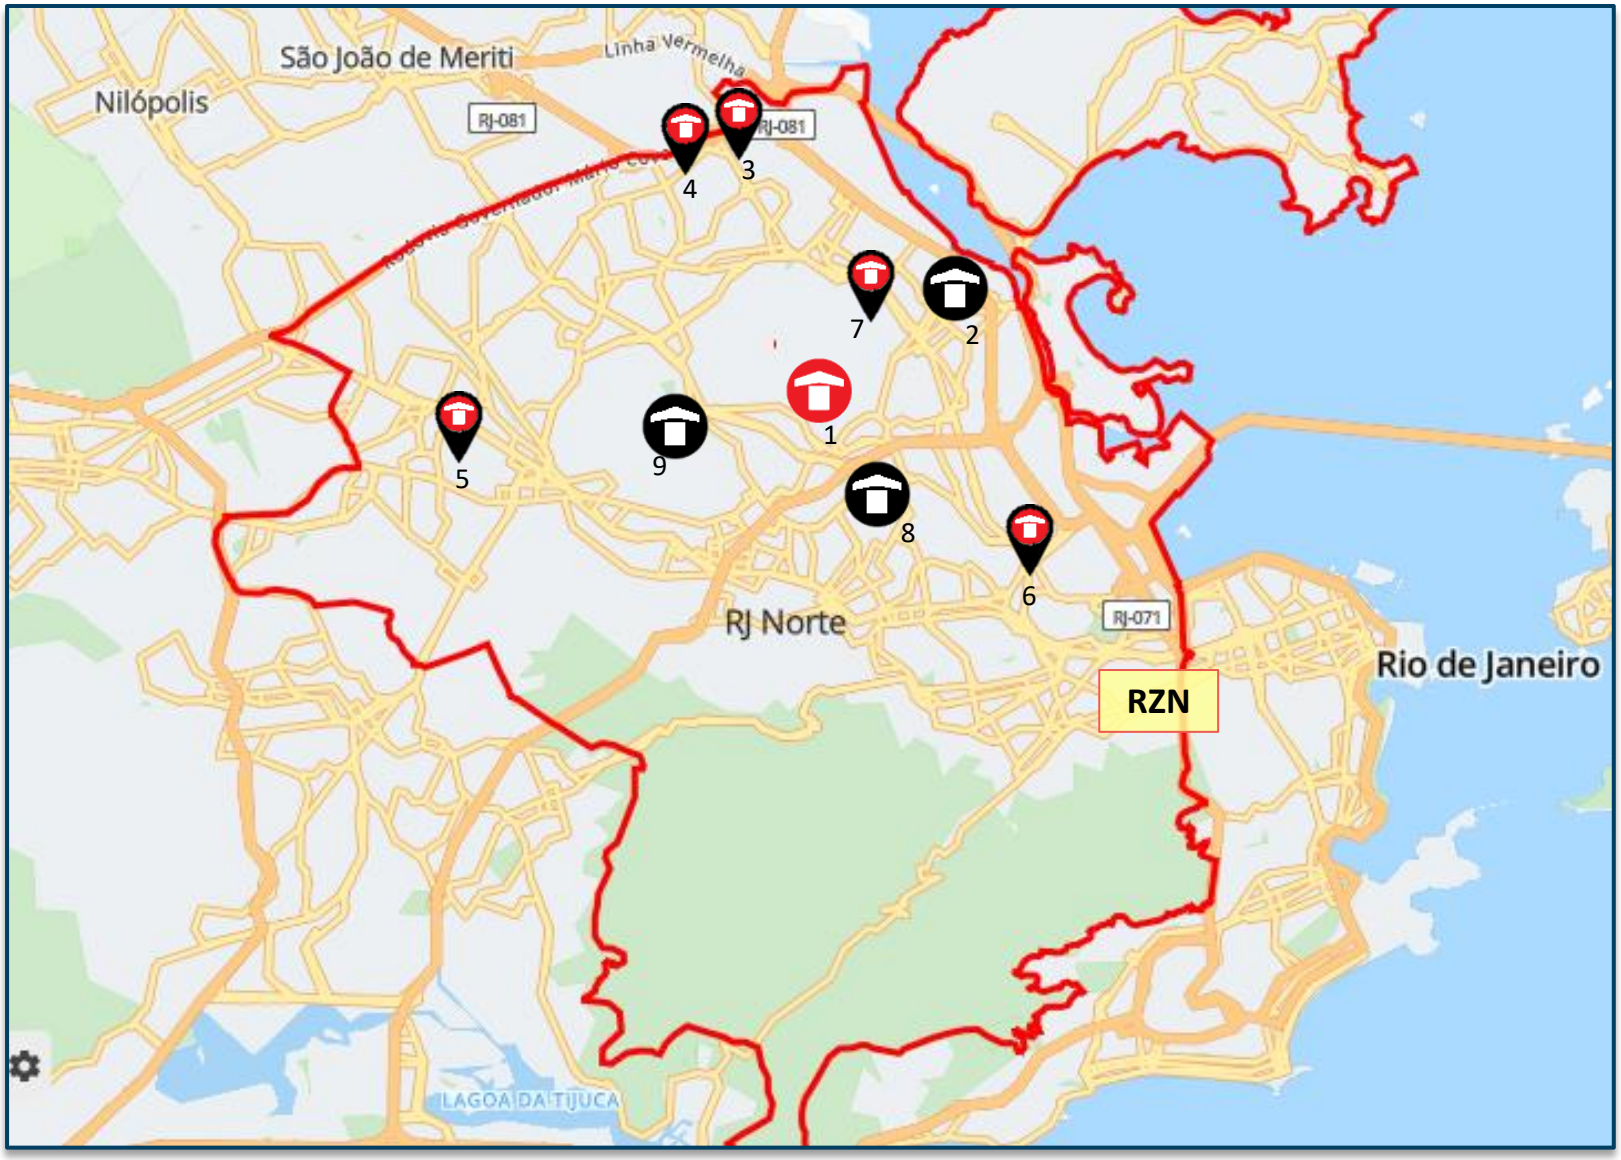

Lançados *LandBank* *Comitê*

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Macrolocalização

PRODUTO

Empreendimento RJ – LUIZA VALE
Investimento

Informações Gerais – Condomínio Único		
Terreno	Área terreno	4.399,17 m²
	Menor poligonal	4.399,17 m²
	App/fna	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento viário	Não
	Área liquida	4.399,17 m²
	Zoneamento	ZCS-J – AP3
	Ca máximo	10,50
	Ca projetado	3,93
	Gabarito máximo	T+15 (cota de soleira)
Geral	Total uh	414
	Total de vagas	0
Tipologia	Tipologia	Modular com elevador
	Gabarito	T+15(cota de soleira)
	Lâmina	01 10 PP | 01 16 PP L
	Área privativa	34,04m²
Condomínio	Unidade PCD	13 UH
	Unidade lazer | técnica	00 | 02
	Torre	02
	Fase	Única
Lazer	Lazer coberto	Salão de festas c/ churrasqueira, espaço office e espaço oficina
	Lazer descoberto	Playkids, playbaby, playpet Fitness, Praça de Jogos, piscina e quadra PP

LEGENDA:

- 01 Área de lazer
- 02 Área técnica

PRODUTO

Empreendimento RJ – LUIZA VALE
Investimento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	**Limite supercondomínio**		
	Acesso		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Atributos Infra**	Sim	Espaço para mini mercado e quadra PP e piscina
	Atributos Torre	Não	-
	Edifício Garagem	Não	-

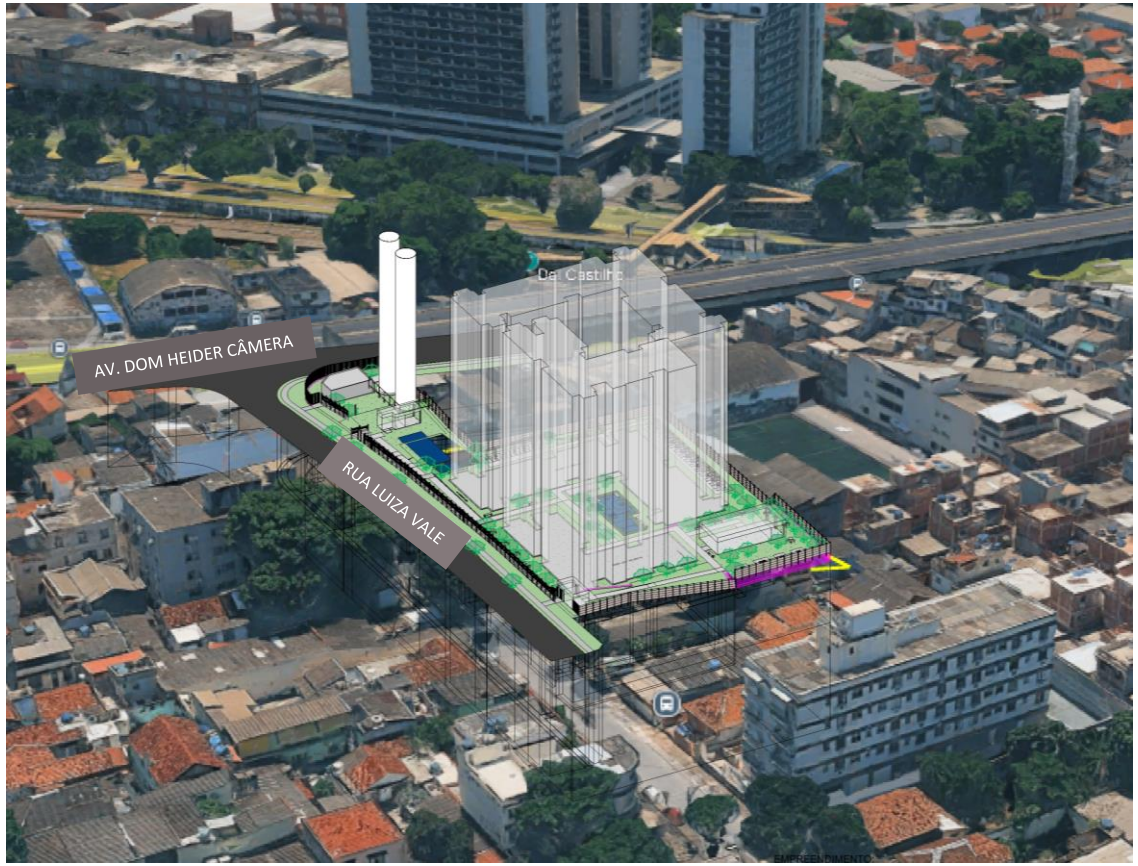

Perspectiva

Condições do Negócio

- **VALOR DO NEGÓCIO – R$ 4.225.000,00 (Composição dos valores pagos em 3 lotes : 105, 95 e 87)**

- R$ 10.000,00 a título de adiantamento para resolução do inventário pendente do lote 87 a ser depositado em conta de titularidade do proprietário

- R$ 715.000,00 (R$ 200.000,00 no lote 105, R$ 490.000,00 no lote 87 e R$ 25.000,00 no lote 95) na assinatura da ECV, a ser depositado em conta de titularidade dos proprietários, desde que superadas as resolutivas;

- Na minuta: R$ 3.500.000,00 sendo R$ 1.200.000,00 em permuta física (Correspondente a 3 unidades para o lote 87 e 2 unidades para o lote 95); R$ 2.300.000,00 em permuta financeira (Para o lote 105) correspondente a 2,3% do VGV líquido do empreendimento com mínimo garantido.
- NA VF: As 5 unidades correspondem a R$ 1.174.995,59 em permuta física somando os R$ 4.199.965,59 totais na viabilidade.

- Caso o Valor Mínimo Garantido não seja alcançado em até 6 meses após expedição do Habite-se, deveremos quitar a diferença em até 30 dias em parcela única. Caso o valor já tenha sido atingido ou superado , a obrigação será considerada quitada.

- **CORREÇÃO MONETÁRIA**
- N/A.

Condições do Negócio

➢ **PRAZOS CONTRATUAIS**

- PCV do lote 105 assinada em 19 de março de 2025.
- PCV do lote 87 assinada em 16 de janeiro de 2025.
- PCV do lote 95 assinada em 23 de janeiro de 2025.

- Prazo para aprovação do projeto e superação das resolutivas de 12 + 6 meses, quando assinaremos a ECV.

- **CONDIÇÕES RESOLUTIVAS**
- Presença de todas resolutivas padrão Tenda.

➢ **GARANTIAS**

- Para Vendedores: aval Construtora Tenda

➢ **CORRETAGEM**

- Corretagem 5% sobre o valor do negócio divido entre para Alexsandro Mendes Nocetti (50%) e Aqui Soluções Imobiliárias LTDA (50%) na ECV.
- O pagamento da parte referente ao Alexsandro Mendes Nocetti fica condicionado a regularização da sua empresa de corretagem até a data da ECV.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Implantação

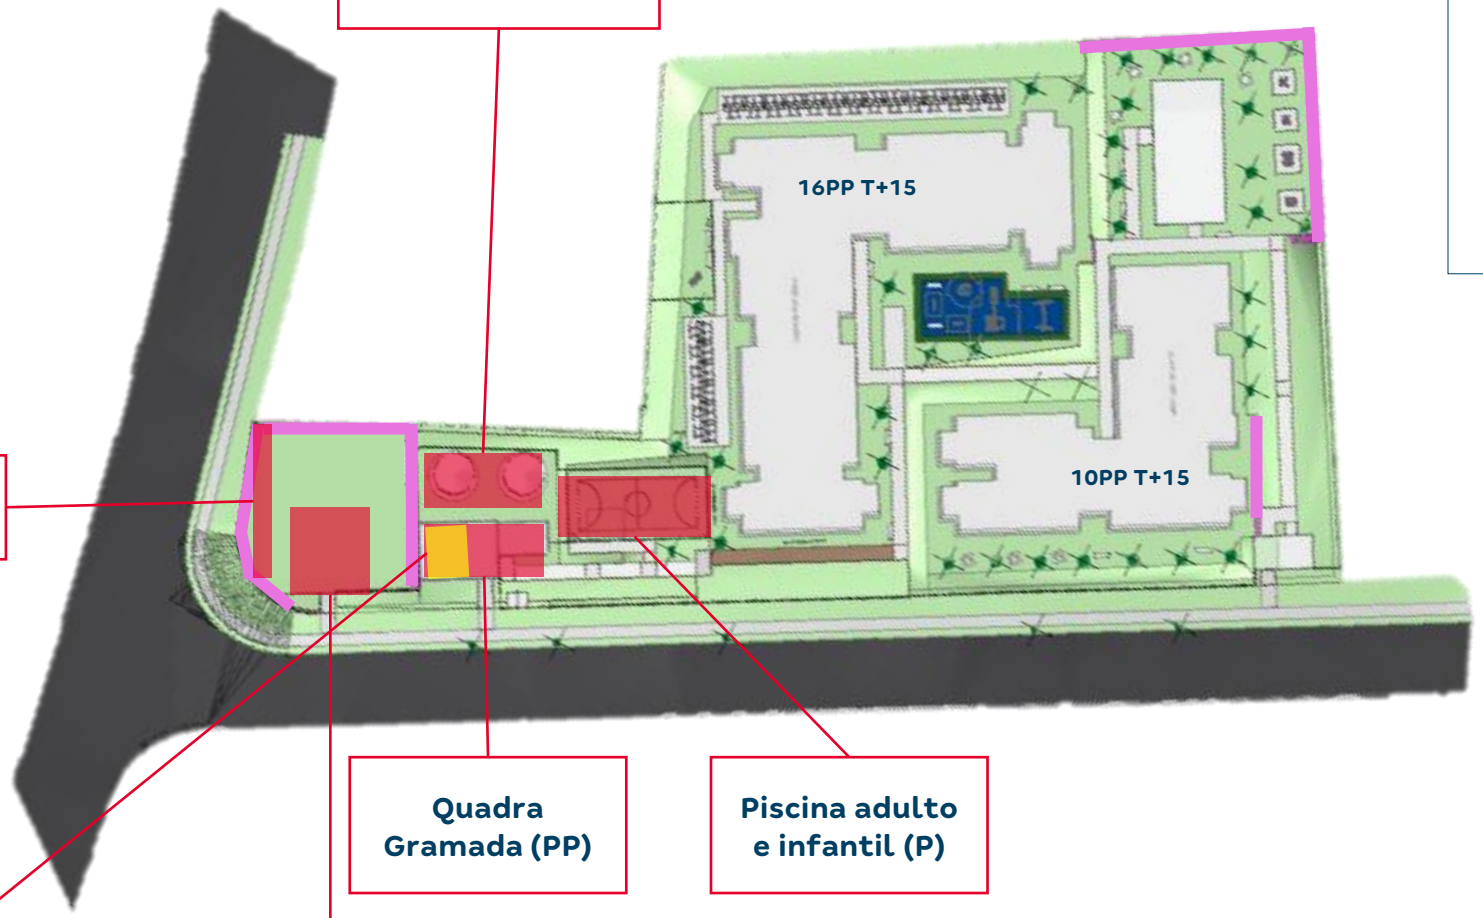

2 Reservatórios
Ø 3,80 m – 32,50 m

EEE

Enterrado
Poço de sucção
3,65 x 2,90 m

Depósito de lixo

Quadra Gramada (PP)

Piscina adulto e infantil (P)

LUIZA VALE
FASE ÚNICA

01 Torre 16PP | T+15
01 Torre 10PP | T+15
416 Unid. A Construir
414 Unid. A Vender

Implantação

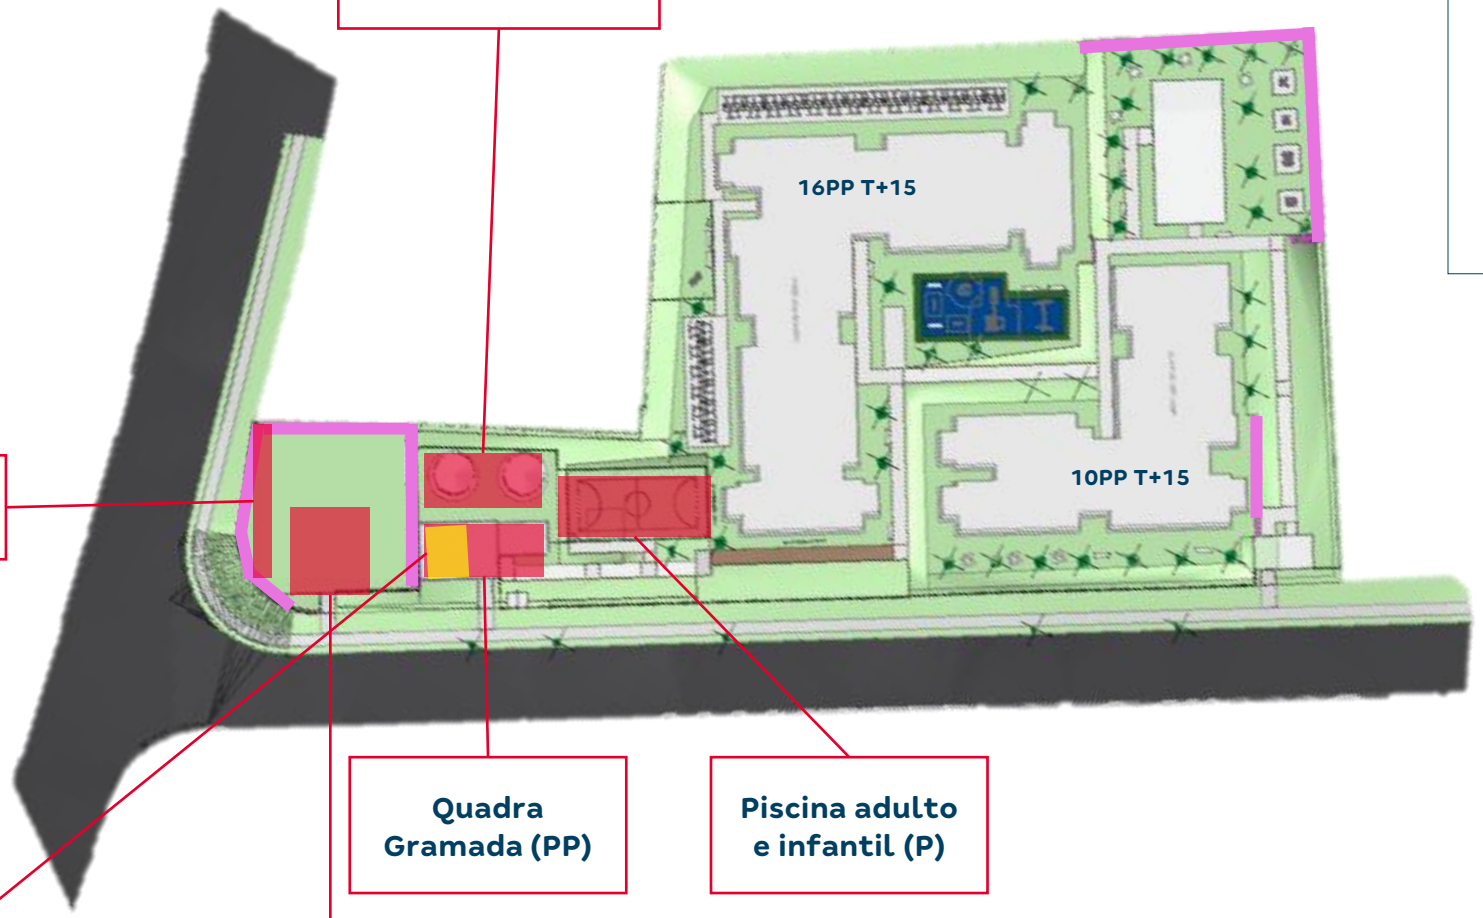

2 Reservatórios
Ø 3,80 m – 32,50 m

EEE

Enterrado
Poço de sucção
3,65 x 2,90 m

Depósito de lixo

Quadra Gramada (PP)

Piscina adulto e infantil (P)

LUIZA VALE
FASE ÚNICA

01 Torre 16PP | T+15
01 Torre 10PP | T+15
416 Unid. A Construir
414 Unid. A Vender

Custo de Construção

	LUIZA VALE CEN01 | REV00	SILVA VALE COND.01 CEN01 | REV00	ELEVATO AV.BRASIL CEN02 | REV03	ELEVATO RAMOS CEN01 | REV00
Torres	2	2	2	2
Unidades Construídas	416	496	496	496
Unidades Vendidas	414	494	494	494
Condomínios (qta.)	1	1	1	1
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	1 Torre | T+15 | 10PP | LE2A	1 Torre | T+15 | 16PP | LE3B	1 Torre | T+15 | 14PP LN | CE1A	1 Torre | T+15 | 14PP | L3A
Tipologia	1 Torre | T+15 | 16PP | LE3B	1 Torre | T+14 | 16PP | LE3B	1 Torre | T+16 | 16PP LN | LE3B	1 Torre | T+16 | 16PP | L3B
Atributos de Projeto	Piscina | Quadra	Piscina | Quadra	Quadra	Quadra de Areia
Projeto Infra	AP	AP	AP	AP
Projeto Torre	AP	AP	AP	PR
Mês Base	junho-25	junho-25	junho-25	outubro-24
Incc	1.184,462	1.184,462	1.184,462	1.149,170
LVS	abril-25	abril-25	abril-25	outubro-24
Indiretos	abril-25	abril-25	abril-25	outubro-24
Base de Preço	LPU 91	LPU 91	LPU 91	LPU 84
Takt	2x2	2x2	2+2	2x2
Prazo (mês)	17	19	18	19
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 100.703	R$ / UND R$ 95.093	R$ / UND R$ 97.158	R$ / UND R$ 97.688
Indireto	R$ 19.266	R$ 18.461	R$ 17.894	R$ 19.047
Torre	R$ 58.007	R$ 57.332	R$ 58.470	R$ 58.392
Infra	R$ 15.561	R$ 15.012	R$ 12.735	R$ 14.110
Fundação	R$ 5.781	R$ 3.535	R$ 6.257	R$ 5.780
EEE	R$ 300		R$ 247	
ETE			R$ 1.012	
Contenção	R$ 788	R$ 348	R$ 74	
Terraplenagem	R$ 1.000	R$ 404	R$ 469	R$ 360
CUSTO TOTAL II	R$ 1.256	R$ 1.311	R$ 1.529	R$ 245
Urbanização	R$ 70	R$ 485	R$ 667	R$ 95
Drenagem	R$ 147	R$ 422	R$ 91	R$ 120
Extensão de Rede Elétrica	R$ 121	R$ 51		
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 917	R$ 353	R$ 770	R$ 31
CUSTO TOTAL III				
Incorridos				
CUSTO TOTAL IV				
Aprendizado				
CUSTO TOTAL V				R$ 3.008
Atualização por INCC				R$ 3.008
CUSTO TOTAL I+II	R$ 101.959	R$ 96.404	R$ 98.687	R$ 97.934
CUSTO TOTAL I AO V	R$ 101.959	R$ 96.404	R$ 98.687	R$ 100.941

Custo de Construção

	LUIZA VALE CEN01 | REV00	SILVA VALE COND.01 CEN01 | REV00	
Torres	2	2	
Unidades Construídas	416	496	
Unidades Vendidas	414	494	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	1 Torre | T+15 | 10PP | LE2A	1 Torre | T+15 | 16PP | LE3B	
Tipologia	1 Torre | T+15 | 16PP | LE3B	1 Torre | T+14 | 16PP | LE3B	
Atributos de Projeto	Piscina | Quadra	Piscina | Quadra	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	junho-25	junho-25	
Incc	1.184,462	1184,46	
LVS	abril-25	abril-25	
Indiretos	abril-25	abril-25	
Base de Preço	LPU 91	LPU 91	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	17	19	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 100.703	R$ / UND R$ 95.093	DIF R$ 5.611
Indireto	R$ 19.266	R$ 18.461	R$ 804
Torre	R$ 58.007	R$ 57.332	R$ 675
Infra	R$ 15.561	R$ 15.012	R$ 549
Fundação	R$ 5.781	R$ 3.535	R$ 2.246
EEE	R$ 300	R$ 0	R$ 300
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 788	R$ 348	R$ 440
Terrapplenagem	R$ 1.000	R$ 404	R$ 596
CUSTO TOTAL II	R$ 1.256	R$ 1.311	-R$ 56
Urbanização	R$ 70	R$ 485	-R$ 415
Drenagem	R$ 147	R$ 422	-R$ 275
Extensão de Rede Eletrica	R$ 121	R$ 51	R$ 69
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 917	R$ 353	-R$ 353
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL	R$ 101.959	R$ 96.404	R$ 5.555

INDIRETOS

+270 | G11 – Serviços Técnicos (Diluição)
+226 | G14 – Administração (Diluição)
-630 | G15 – Canteiro (Prazo/Logística Vivência Padrão)
+210 | G16 – SSO (Diluição)
+229 | G17 – Operações (Diluição)
+461 | G18 – Ensaios (Ensaio de estacas)

TORRE

+335| Aço (Tipologia torre/ Taxa de aço)
Luiza Vale: 50 kg/m³ (16PP T+15); 54 KG/M³ (10PP T+15)
Silva Vale: 50kg/m³ (16PP T+15/ T+14)
+255| Concreto (Tipologia/ Taxa de concreto)
Luiza Vale: 14,03 m³/uh - Fck 40MPa e 30MPa
Silva Vale: 13,50 m³/ uh- Fck 40MPa, 30MPa e 25 MPa

INFRA

-142 | Outros revest. Piso (Luiza vale não tem viário)
-120 | Reservatório Metálico
Luiza Vale: 2 unid. – Ø 3.80 H=32,50 m (14.859 kg/ unid.)
Silva Vale: 2 unid. – Ø 3.50 H = 38,65 m (17.412 kg/ unid.)
+459 | Anexos (Diluição)
+123 | Enterrados (Diluição)

FUNDAÇÃO

+2.246| Projeto
Luiza Vale: EHC Ø40,50,60 cm - 10 a 12m
Silva Vale: Radier com troca de solo

CONTENÇÃO

+440 | Projeto
Luiza Vale - Contenção até 1,20 m: 21 m²; Até 2m: 28 m²; Até 3m: 159 m²
Silva Vale - Contenção até 3m: 117 m²

TERRAPLENAGEM

+596 | Projeto
Luiza Vale: Vol. Corte = 660,58 m³; Vol. Aterro = 5. 588,14 m³
Silva Vale: Vol. Corte = 1.694 m³ ; Vol. Aterro = 1.518 m³

Custo de Construção

	LUIZA VALE CEN01 | REV00	ELEVATO AV.BRASIL CEN02 | REV03	
Torres	2	2	
Unidades Construídas	416	496	
Unidades Vendidas	414	494	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	1 Torre | T+15 | 10PP | LE2A	Torre | T+15 | 14PP LN | CE1A	
Tipologia	1 Torre | T+15 | 16PP | LE3B	Torre | T+16 | 16PP LN | LE3B	
Atributos de Projeto	Piscina | Quadra	Quadra	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	junho-25	junho-25	
Incc	1.184,462	1.184,462	
LVS	março-25	abril-25	
Indiretos	março-25	abril-25	
Base de Preço	LPU 91	LPU 91	
Takt	2x2	2+2	
Prazo (mês)	17	18	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 100.703	R$ / UND R$ 97.158	DIF R$ 3.545
Indireto	R$ 19.266	R$ 17.894	R$ 1.371
Torre	R$ 58.007	R$ 58.470	-R$ 463
Infra	R$ 15.561	R$ 12.735	R$ 2.826
Fundação	R$ 5.781	R$ 6.257	-R$ 475
EEE	R$ 300	R$ 247	R$ 53
ETE	R$ 0	R$ 1.012	-R$ 1.012
Contenção	R$ 788	R$ 74	R$ 713
Terrapplenagem	R$ 1.000	R$ 469	R$ 531
CUSTO TOTAL II	R$ 1.256	R$ 1.529	-R$ 273
Urbanização	R$ 70	R$ 667	-R$ 597
Drenagem	R$ 147	R$ 91	R$ 56
Extensão de Rede Eletrica	R$ 121	R$ 0	R$ 121
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 917	R$ 770	-R$ 770
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL	R$ 101.959	R$ 98.687	R$ 3.272

INDIRETOS

+270 | G11 – Serviços Técnicos (Diluição de unidades)
+421 | G14 – Administração (Diluição de unidades)
-200 | G15 – Canteiro (Prazo)
+501 | G16 – Equipamentos (Diluição/ Logística: Bandeja de proteção/ Galeria de acesso /MO Transporte de aço)
+146 | G17 – Operações (Diluição de unidades)
+145 | G18 – Ensaios (Diluição de unidades)

TORRE

+356 | Concreto
- **Luiza Vale:** 14,03 m³/uh - Fck 40MPa e 30MPa
- **Elevato:** 13,67 m³/ uh - Fck 40MPa, 30MPa e 25MPa

-1.322 | Esquadrias de Ferro (Elevato – Caixilho especial)
+510 | Elevador (Qtd./ Preço – Cotação Otis)
- **Luiza Vale:** R$ 6.026/ uh
- **Elevato:** R$ 5.540/ uh

INFRA

+551 | Alvenaria vedação (Muro de divisa – Luiza Vale: 311m; Elevato: 23 m)
+409 | Reservatório Metálico
- **Luiza Vale:** 2 unid. – Ø 3.80 H=32,50 m (14.859 kg/ unid.)
- **Elevato:** 2 unid. – Ø 3.50 H = 34,83 m (14.522 kg/unid.)

+1.222 | Anexos (Luiza Vale tem Piscina)
+626 | Poço de sucção (Luiza vale: enterrado x Elevato: aflorado)

FUNDAÇÃO

-475 | Projeto
- **Luiza Vale:** EHC Ø40,50,60 cm - 10 a 12m
- **Elevato:** EHC Ø40,50,60 cm - 12 a 14m

CONTENÇÃO

+713 | Projeto
- **Luiza Vale** - Contenção até 1,20 m: 21 m²; Até 2m: 28 m²; Até 3m: 159 m²
- **Elevato**- Contenção até 2m: 28,11 m²

TERRAPLENAGEM

+531 | Projeto
- **Luiza Vale** - Vol. Corte = 660,58 m³; Vol. Aterro = 5. 588,14 m³
- **Elevato** - Vol. Corte = 483 m³; Vol. Aterro = 2.110m³

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Há viabilidade técnica para o empreendimento. Considerando ligação na porta.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Há viabilidade técnica para o empreendimento. Considerando extensão de 270 m até o PV localizado na esquina da Rua Bamboré com a Av. Dom Hélder Câmara.

SISTEMA DE DRENAGEM
Considerando 17 m de extensão de rede até o PV indicado na Av. Dom Hélder Câmara

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerando trecho de recomposição de passeio na testada do terreno.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	Nível 3
Elétrica	Nível 4
Gás	NA
Urbanização	Nível 5

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 05/2025.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 05/2025.

Drenagem:
- Viabilidade emitida em 03/2025.

Elétrica:
- Viabilidade emitida em 02/2024, com validade de 60 dias.

Gás:
- Não se aplica. Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado trecho de reconstituição do pavimento na testada do terreno

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 8 furos.
- Considerada Estaca hélice contínua, com diâmetros de 40,50 e 60 cm e profundidade de 10 a 12 m.

Logística

LOG_TENDAS_PERÍODOS								
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	4,00	6,00	-	TODO PERÍODO	-	UNICA	
TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	7,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA	
TENDA LAZER (LOG)	1	3,00	3,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA	
TENDA MOLDADOR (LOG)	3	<varia>	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA	

LOG_VIVÊNCIA - CONTAINERS									
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
CONTAINER ALMOXARIFADO (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	MEIO PERIODO	-	UNICA	
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO COM SANITÁRIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA	
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-	UNICA	
CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	-	TODO PERÍODO	UNICA	
CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG)	CONSIDERAR 2 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	-	UNICA	
CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	CONSIDERAR 14 MÓDULOS COM 2 ESCADAS (7 MÓDULOS NO PAV. T E 7 MÓDULOS NO PAV SUPERIOR)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	MEIO PERIODO	-	UNICA	

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS								
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA	
BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	UNICA	
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_R01	1 EQUIPAMENTO	-	-	-	TODO PERÍODO	-	UNICA	
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	-	-	UNICA	
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-	UNICA	
CREMALHEIRA CABINE DESMONTÁVEL (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOBILIZAÇÃO POR TORRE	1 DESMOBILIZAÇÃO POR TORRE	-	TODO PERÍODO	TODO PERIODO	UNICA	
MINIGRUA (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-	UNICA	
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIP	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-	UNICA	

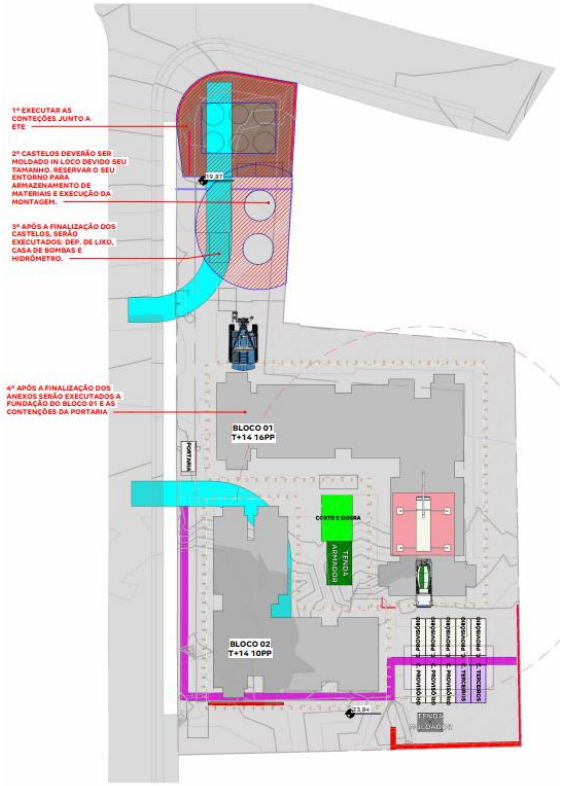

PRÉ FORMA
1 : 500

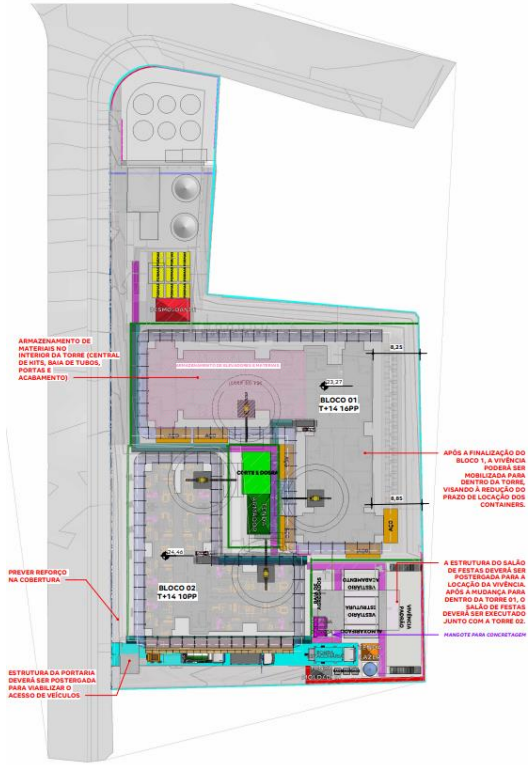

ESTRUTURA E ACABAMENTO
1 : 500

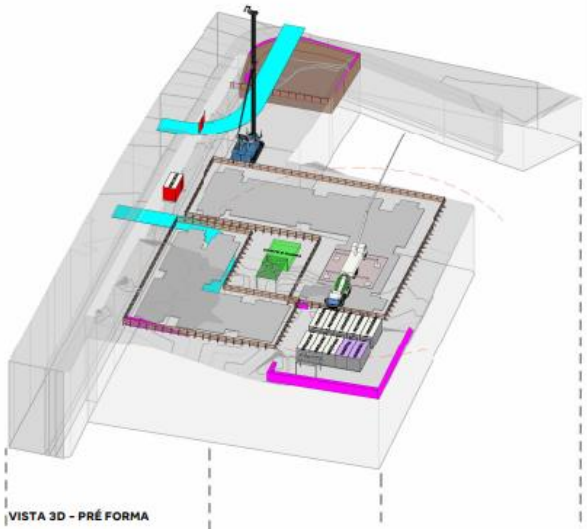

VISTA 3D - PRÉ FORMA

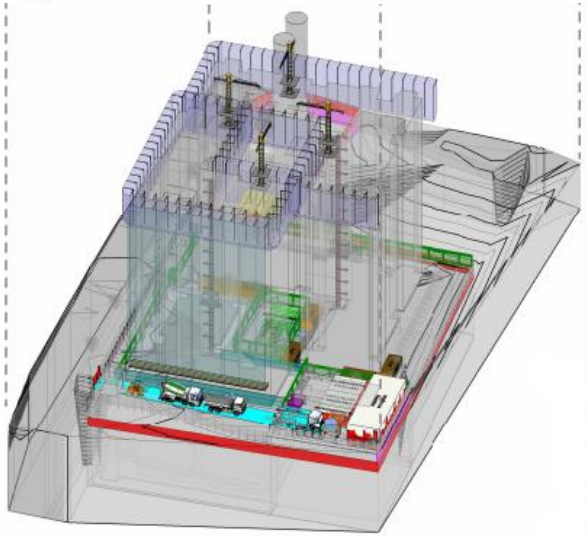

VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO

Logística

LUIZA VALE – RJ

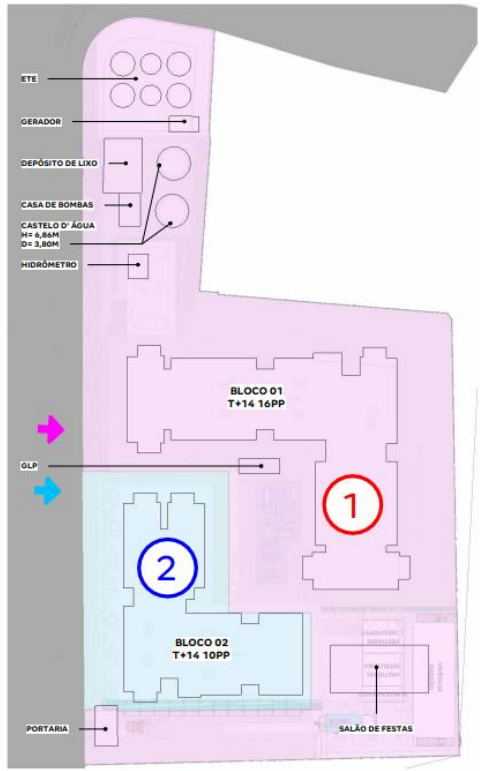

MODULAÇÃO E TOMBAMENTO
1 : 800

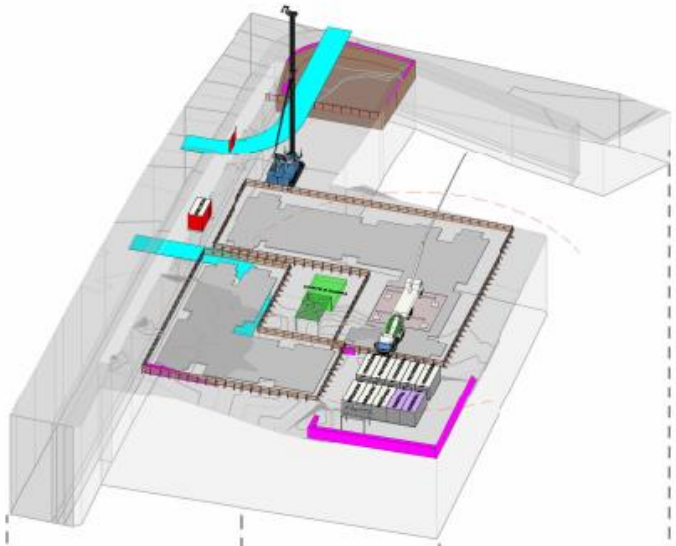

VISTA 3D - PRÉ FORMA

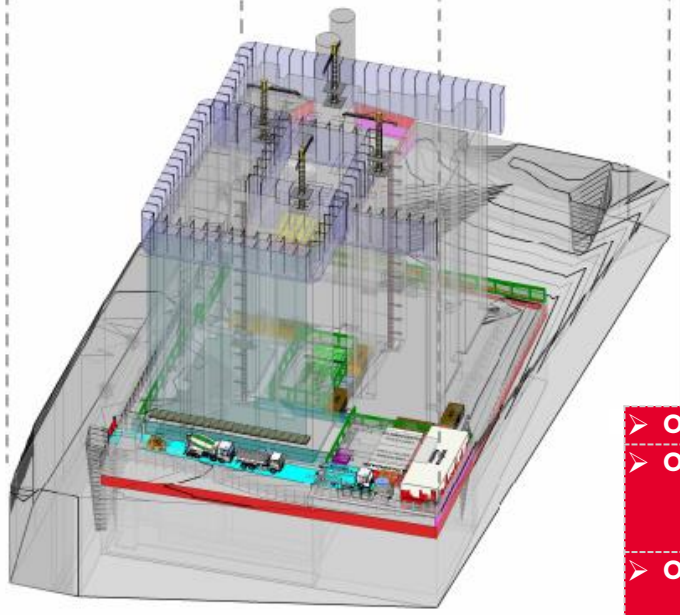

VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO

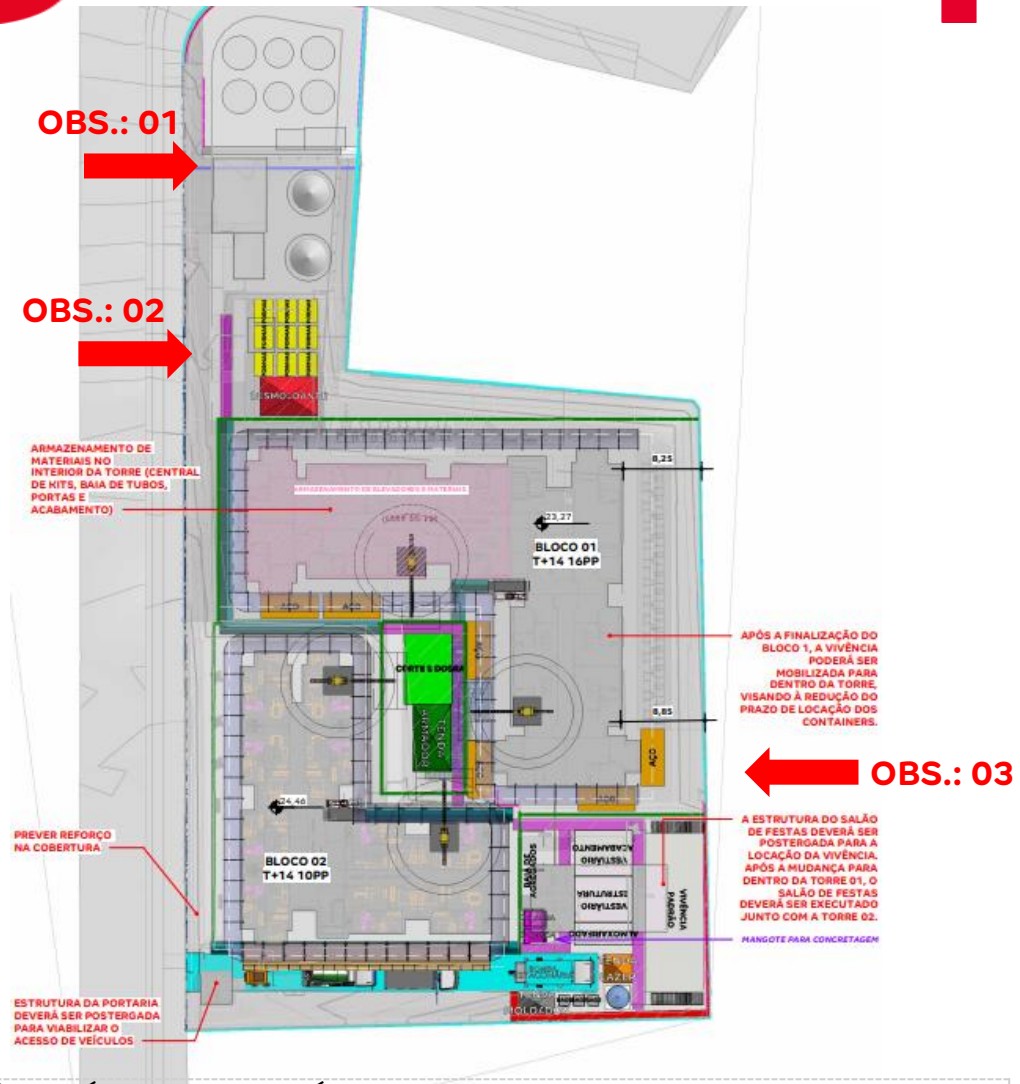

➢ **OBS. 01**	NÃO TERÁ MAIS ETE E SERÁ INCLUSA UMA PISCINA
➢ **OBS. 02**	CASTELOS DEVERÃO SER MOLDADO IN LOCO DEVIDO SEU TAMANHO. RESERVAR O NO SEU ENTORNO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DA MONTAGEM.
➢ **OBS.03**	A VIVÊNCIA PODERÁ SER MOBILIZADA PARA DENTRO DO BLOCO 01

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CUSTO PARA EQUIPE DE MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE MATERIAIS "FORMIGUINHAS" (2 FUNCIONÁRIOS ESTRUTURA, 2 FUNCIONÁRIOS ACABAMENTO E 2 FUNCIONÁRIOS PARA TRANSPORTE DE AÇO), DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DE MAQUINÁRIOS AO LONGO DA IMPLANTAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO/DESCARGA DE MATERIAIS NÃO HÁ ALCANCE DO RAIO DO MUNCK PARA MOBILIZAR E DESMOBILIZAR A CREMALHEIRA DOS BLOCOS 01 E 02. NECESSÁRIO PREVER CUSTOS COM CREMALHEIRA DE MONTAGEM MANUAL. DEVIDO AO DIÂMETRO O CASTELO SERÁ MOLDADO IN LOCO.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Rio de Janeiro Norte	RZN	22%	1.259	105	1.511	126

Empreendimento	Renda	Lançamento	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
Lançados																																	
Elevato Bonsucesso	3.444		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	7														
Landbank																																	
Estação Rio	2.885	jun-25		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	28																	
Mirante Boa Vista	**5.322**	**ago-25**				**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**17**										
Carolina Machado (Elevato Madureira)	3.894	dez-25								25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	6							
Elevato Ramos	3.563	jun-26														28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	18
Elevato Brasil	**3.598**	**jul-26**															**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
Silva Vale I	**3.298**	**set-26**																	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
Luiza Vale	**3.499**	**fev-27**																						**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**
Silva Vale - II	**3.298**	**mar-28**																															
Silva Vale - Cond III	**3.298**	**set-29**																															
Silva Vale - Cond IV	**3.298**	**mar-31**																															
Total de Vendas Lançados			**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**7**														
Total de Vendas Lançados + Landbank			**21**	**52**	**52**	**77**	**77**	**77**	**77**	**102**	**102**	**102**	**102**	**102**	**102**	**127**	**99**	**99**	**112**	**105**	**105**	**105**	**97**	**103**	**103**	**84**	**78**	**78**	**78**	**78**	**78**	**78**	**68**
Vendas Produto Comitê						**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**52**	**52**	**52**	**52**	**44**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Total de Vendas Sem o Produto Comitê						**52**	**52**	**52**	**52**	**77**	**77**	**77**	**77**	**77**	**77**	**102**	**74**	**74**	**60**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**34**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**18**
Potencial Total da Mancha			**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**
Projetos Simultâneos na Mancha			**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Projetos Simultâneos na Mancha ex Coringas			**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

No esgotamento acima não foi considerado na soma o projeto Elevato Brasil por se tratar de um projeto coringa.

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está acima do potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Luiza Vale | Mapa Concorrência

		Luiza Vale	Conquista Norte Club	Primor Carioca - Fase 1 (Torre 3)	Reserva Redentor - Fase 1
		TENDA	Direcional	MRV	MRV
	Distância Tenda (km)		2,64Km	1km	2,59Km
Região 1 Km	População	42.087	38.769	29.410	34.551
	Dens. Demográfica	13.483	12.420	9.422	11.069
	Renda (R$)	7.665	4.293	5.870	6.765
	Classe Social	B1 (8.1k a 16k)	E (Até 1,4k)	B2 (4.6k a 8.1k)	B1 (8.1k a 16k)
	PEA Dia	52.641	27.451	48.722	36.895
Quantitativo	Lançamento	out/26	03/2024	09/2023	nov/24
	Unidades	414	380	500	204
	Estoque	414	52	36	130
	VSO	23	22	22	11
	Stockout	18	2	2	12
	Preço Nominal (R$)	234.993	233.990	260.490	262.990
	Preço CEF (R$)	185.959	187.192	208.392	210.392
	Renda Comprador (R$)	3.499	3.550	4.182	4.222
	Dif Tenda (R$)		-51	-683	-723
	Factibilidade		🟡	🟢	🟢
Qualitativo	Condomínios	1	1	1	1
	Torres	2	10	1	1
	Gabarito	T+15	T+4	T+15	T+16
	Plantas (m²)	34,1m²	48,6m² e 48,6m² e 36,2m²	35,32m² e 36,5m² e 56,8m² e 35,3m² e 40,5m²	35,36m² e 36,56m² e 36,31m²
	Tipologia	2 Dorms	1 e 2 Dorms	2 Dorms	1 e 2 Dorms
	Opções	Não	Garden	Garden	Garden
	Varanda	Não	Sim	Sim	Sim
	Suite	Não	Não	Não	Não
	Dif. Entrega	Não	Não	Não	Não
	Vagas	Sem vagas	34% Vagas	40% Vagas	60% Vagas
	Lazer	Playground; salão de festas c/churrasqueira e mini mercado; mini quadra; fitness	Tem Garden, Agua Aquecida a Gas, Bosque, Cinema, Piscina, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Quadra, Quiosque, Salão de Jogos,	Tem Sacada, Bosque, Fireplace, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Sala de Reuniões / Treinamentos, Salão de Jogos,	Tem Sacada, Tem Garden, Agua Aquecida a Gas, Bosque, Cinema, Fireplace, Lago, Piscina, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Sala de Reuniões / Treinamentos, Salão de Jogos,

Farol Renda
🟢 Acima de 300
🟡 Entre 0 e 300
🔴 Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- Os empreendimentos da MRV possuem target de preço e renda acima ao previsto para o Luiza Vale.
- O ponto de atenção é o empreendimento da Direcional, que está capturando uma renda similar ao produto Tenda, portanto o Elevato Bonsucesso (Tenda) já performa na região com volume e renda previsto no parecer.

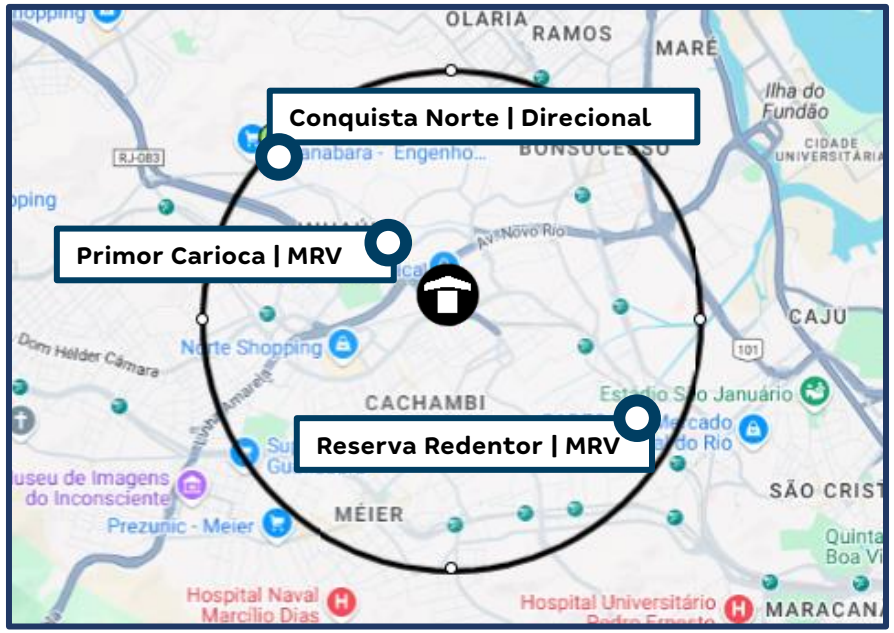

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Luiza Vale			
Tipo:	**Faixa 2**		**Faixa 2**	
Método	**Ref - Jd. Bonsucesso**		**Vision**	
Avaliação	240.000		240.000	
Renda Inicial (VF)	3.444		3.499	
Renda Final*	-		-	
% RET1	25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,25	832	0,51	1.800
FGTS	0,37	1.240	0,49	1.746
Financiamento	94,08%	164.459	96,14%	180.292
Subsídio	188,40%	5.787	137,66%	3.921
Prazo de Pró-soluto	22	22	22	22
Pró-Soluto	77,94%	21.456	78,51%	21.959
Preço Raso (RS)	193.773	193.773	209.718	209.718
TCD	71,27%	24.743	71,66%	25.276
VSO	23	23	23	23
Preço de Venda	**222.041**	**222.041**	**231.901**	**231.901**
Elasticidade	-1,587%	-1,587%	1,333%	1,333%
Preço de Venda Final	**218.516**	**218.516**	**234.993**	**234.993**
Preço Raso (R$)	**193.773**		**209.718**	
% de Raso	**88,68%**		**89,24%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

O projeto referência não está refletindo os ganhos do programa MCMV.

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Luiza Vale	
Tipo:	**Faixa 2**	
Método	**Vision**	
Avaliação	240.000	
Renda Inicial (VF)	3.499	
Renda Final*	-	
Tipo:	**VF**	**R$**
Ato	0,51	1.800
FGTS	0,49	1.746
Financiamento	96,14%	180.292
Subsídio	137,66%	3.921
Prazo de Pró-soluto	22	22
Pró-Soluto	78,51%	21.959
Preço Raso (RS)	209.718	209.718
TCD	71,66%	25.276
VSO	23	23
Preço de Venda	**231.860**	**231.860**
Elasticidade	1,333%	1,333%
Preço de Venda Final	**234.993**	**234.993**
Preço Raso (R$)	**209.718**	
% de Raso	**89,24%**	
Raso Todas as Fases	**209.718**	
Nominal Todas as Fases	**234.993**	

1

Análise de Riscos | Farol IM

IM avalia o Preço Vision como **factível**.

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região com bons indicadores sociodemográficos, como renda e PEA/Dia, o mesmo também se encontra próximo de pontos de interesses como hospital, escola e etc.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", o ponto de atenção é o empreendimento da Direcional, que está capturando uma renda similar ao produto Tenda, portanto o Elevato Bonsucesso já performa na região com volume e renda previsto no parecer. Além do ganho do programa MCMV, a diferença de preço se dá pela localização superior do Luiza Vale, conforme demostrado na tabela abaixo:

	Luiza Vale	Elevato Bonsucesso
População	42.087	55.309
Dens. Demográfica	13.483	17.691
Renda (R$)	7.665,10	3.755
Classe Social	B1 (de R$ 8.150,01 a R$ 16.186,00)	C1 (de R$ 2.713,01 a R$ 4.607,00)
PEA Dia	52.641	33.003

Abaixo segue o escalonamento da regional:

		Preço Real				Preço Normalizado (22m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Elevato Bonsucesso	**231.215**	**202.885**	**3.444**	**21**	**27**	**-4.965**	**197.920**
Luiza Vale	**240.000**	**209.718**	**3.499**	**23**	**22**	**-**	**209.718**

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Luiza Vale
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	240.000
Renda Inicial (VF)	3.499
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,51	1.800
FGTS	0,49	1.746
Financiamento	96,14%	180.292
Subsídio	137,66%	3.921
Prazo de Pró-soluto	22	22
Pró-Soluto	78,51%	21.959
Preço Raso (RS)	209.718	209.718
TCD	71,66%	25.276
VSO	23	23
Preço de Venda	**231.860**	**231.860**
Elasticidade	1,333%	1,333%
Preço de Venda Final	**234.993**	**234.993**

Preço Raso (R$)	**209.718**
% de Raso	**89,24%**
Raso Todas as Fases	**209.718**
Nominal Todas as Fases	**234.993**

1

Análise de Riscos	Farol IM
Ciclo avalia o Preço Vision como **factível**.	

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Informações Gerais – Consolidado

Luiza Vale – RJ – Região Metropolitana > 100mil RJ

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Fase única	jan-25	fev-27	ago-27	jan-29	6 meses	17 meses	fev-30	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	4,20 MM	**Incorrido Terreno:** 0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	4.399 m²	**Área Líquida do Terreno:** 4.399 m²
Cash:	0,72 MM		**Custo de terreno m²:**	954,7	**Custo de terreno m² Área Líquida:** 954,7
Permuta Financeira:	2,30 MM (2,36%)		**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 4,3% / 47,7%
Permuta Física:	1,17 MM (1,21%) - Unidades Permuta 5,00		**VaR 26 (R$ mil):**	725	**CA Máx/Proj.** 10,5 / 4,2
Ato / %VGV:	0,72 MM / 0,7%		**Incorrido de Construção:**	0,00 MM	**Incorridos de Incorporação:** 0,18 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Fase Única	T+15	209.718	414	234.993	240.000	96,1%	78,5%	71,7%

Unidades Totais:	414	**Preço Médio:**	234.993	**Renda Média:**	3.499	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.129
Unidades Tenda:	409	**Avaliação Média:**	240.000	**Ato:**	1.776 (0,51 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	16.201
VSO:	23 Unidades	**VGV Total:**	97.287.151	**FGTS:**	1.723 (0,49 Salários)	**Preço Raso Médio:**	209.718
RET Médio:	3,3%	**VGV Tenda:**	96.112.185	**% em RET 1%:**	25%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	1.391

Construção

Custo Total Unit.:	101.959	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	34,10	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**12.524.237**	**LI:**	**21,47%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**16.238.085**	**Margem Bruta Econômica:**	**42,02%**
TIR:	**92,63%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(83.220)**	**Margem Bruta REF:**	**45,02%**
Exposição de Caixa:	**15,38%**	**Δ LI:**	**1,47%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(4.450.521)**	**Margem Rasa Econômica:**	**34,39%**
Payback Contingente (21 m):	**19 m/ (-2 m)**	**LI Resiliência:**	**14,66%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**30.192.043**	**Margem Rasa REF:**	**38,40%**
Payback Consolidado:	**19 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,40%**

Informações Gerais – DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Luiza Vale	
	Nominal	%
Receita	105.560	100,0%
PIS/COFINS	(1.853)	1,8%
Custo Total	(60.127)	58,0%
Custo Terreno	(4.484)	4,3%
Custo Relacionados a Terreno	(2.503)	2,4%
Custos de Incorporação	(1.884)	1,8%
Custo de Construção	(51.257)	49,4%
Lucro Bruto Econômico	43.580	42,0%
Custo para Rateio	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	43.580	42,0%
Despesas de Selling	(9.622)	9,3%
Contingência	(2.428)	2,3%
Margem de Contribuição	31.530	30,4%
IR e CSLL	(1.516)	1,4%
Margem Líquida	30.014	28,9%
Lucro Bruto REF Unit.	117.985	45,0%
Lucro Raso REF Unit.	89.824	38,4%

R$ Mil - VPL - Compra	Luiza Vale	
	VP	%
Receitas	58.347	100,0%
PIS/COFINS	(1.009)	1,7%
Custos e Despesas Totais	(44.814)	76,8%
Custo Terreno	(2.678)	4,6%
Custo Relacionados a Terreno	(1.935)	3,3%
Custos de Incorporação	(1.385)	2,4%
Custo de Construção	(30.993)	53,1%
Despesas de Selling	(6.265)	10,7%
Contingência	(732)	1,3%
IR e CSLL	(825)	1,4%
Lucro Imobiliário	12.524	21,5%

Obrigado
