Tenda

sua próxima conquista

Comitê de Lançamento

Regional: RJ

Projeto: Estação Rio

Data Comitê: 25/07/2025

Comentários Comitê Digital 21.07.2025

Nome	Estação Rio - Lançamento	Observação - Estação Rio
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	Bom trabalho na unificação do projeto com preço e custos adequados. N é melhor projetar lançamento já em setembro para reduzir risco de ter que reaprovar em comitê?
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	Ok
Rodrigo Osmo	Discutir em comitê	(1) Projeto parece estar em região perigosa. Quão preocupante seria a localização para o ciclo (vendas)?
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Discutir em comitê	Entendo que já deveríamos aprovar projeto com desafio de preço, que deverá vir após melhora avaliação.
Amanda Da Silva Bezerra	Aprovado	Ok
Andre Luis Menegazzo Padilh	Aprovado	ok

“(1) Projeto parece estar em região perigosa. Quão preocupante seria a localização para o ciclo (vendas)?”

Resposta:

A região segue o mesmo padrão de outros lançamentos que tivemos, como os projetos Estação Guanabara I e II, localizados a 2 km do Estação Rio, os quais conseguimos vender fazendo um bom volume, construir e entregar sem situações atípicas, não tivemos problema durante a obra e nem pós obra. Usamos, inclusive, esse produto como referência inicial para precificação. Atualmente, o Estação Rio será o produto de reversão da Zona Norte, com o menor ticket, não só da Tenda na ZN, mas também do mercado, ajudando a construir a escadinha de preço, junto com os futuros lançamentos da mancha.

Seguem as últimas vendas do Estação Guanabara II realizadas em 2024*:
*(*a partir de maio/24, o estoque do produto já estava no fim, por isso, a queda no volume)*

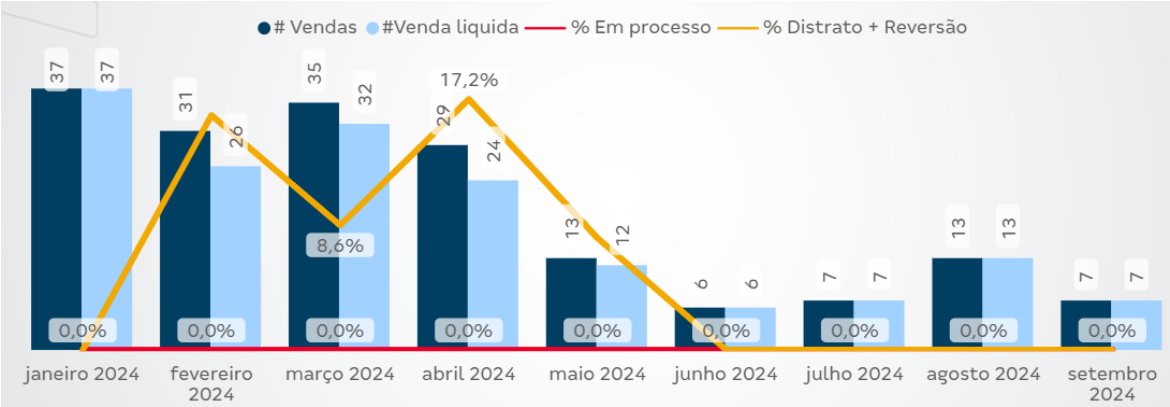

Luiz Mauricio de Garcia Paula

“Entendo que já deveríamos aprovar projeto com desafio de preço, que deverá vir após melhora avaliação.”

Resposta:
O desafio desse projeto está voltado para o VSO. Conseguimos, através da unificação, que trouxe redução de custo, atingir um preço raso e nominal aderentes com o VSO proposto.
A melhora da avaliação aumentará conforto para atingirmos o desafio de VSO com boa performance no preço nominal.
Como é o produto de reversão da ZN, a priori, não vemos espaço para desafiar preço, pois entendemos que não haverá procura por um preço mais alto nesta região. Porém, se a hipótese se mostrar contrária e o volume subir bem, podemos calibrar ao longo das vendas.

Renan Barbosa Sanches

“Bom trabalho na unificação do projeto com preço e custos adequados. N é melhor projetar lançamento já em setembro para reduzir risco de ter que reaprovar em comitê?”

Resposta:
Mantemos o lançamento previsto para agosto, que segue sendo o nosso desafio. Contudo, mesmo que escorregue para setembro, ainda estaremos dentro do prazo previsto, sem necessidade de retorno ao comitê, conforme orientações da Cartilha de Estudos Econômicos — que admite um desvio de até um mês em relação à data indicada na viabilidade. Logo, o comitê de lançamento tem validade até setembro, o que garante cobertura dentro desse cenário. Além disso, a previsão de volume de vendas na VF está concentrada em setembro, o que mantém a estratégia alinhada com o planejamento da regional.

One Page – Estação Rio – Aprovação

[1]	Cidade	Rio de Janeiro	Mancha de demanda	RZN2 - Olaria + Ramos + Bonsuce
	Regional	RJ	Cluster MPR	2 - Amarelo
	Cenário de Aprovação	Aprovação	Tipo de Aprovação	Consolidado
	Fase Anterior	N/A		
	Tipo de Comitê	Lançamento	Versão da VF	Versão 1.0: Jul
[2]	Unidades (Fases)	493 (1)	CA Máx | Proj	6,0 | 1,6
	Unidades com Vaga (%)	62 (13%)	Escritura | Lançamento	nov/24 | ago/25
	Unidades com Atributo* (%)	35 (7,1%)	Tipologia	F2 - Concreto
[3]	Valor Líquido do Terreno (% VGV)	9.313 (9,0%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
	Cash (Correção)	9.313 (IPCA)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	0,0% (0,0%)
	Valor R$/m²	745	VAR (%VGV)	000 (0,0%)
[4]	Custo Construção (%VGV)	41.470 (40,2%)	Indireto Unit.	14.887
	Prazo da Obra (meses)	13	Torre Unit.	42.045
	Custo Total Unit. (LPU):	84.118 (92)	Infra Unit.	15.794
	Início de Obra	fev-26	Fundação Unit.	7.973
[5]	Preço Nominal Unit.	208.998	VSO	38
	Preço Raso Unit.	185.707	Referência	VISION
	Avaliação Unit.	203.970	Renda (% em RET 1%)	2.745 (67,8%)

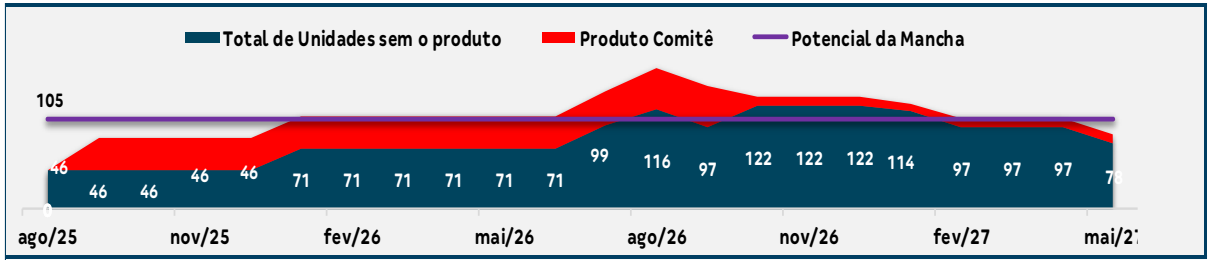

LI (Régua):	20,3% (20,0%)	Margem Bruta Econômica:	41,4%
LI Marginal:	27,0%	Margem Rasa Econômica:	33,4%
Margem Bruta REF:	43,6%	Margem Contribuição Econômica:	29,6%
Margem Rasa REF:	36,5%	Exposição (% VGV):	18.069 (17,5%)
TIR:	64,3%	VGV Total:	103.036
Payback Contingente (21 m) :	15 m/ (-6 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(13.950)
Payback Consolidado:	15	Ger. Caixa 24 meses (R$):	23.506

*Atributo: Varanda, Garden e Churrasqueira

*Valores em R$ '000

Destaques

[1] Localização

- Situado na mancha RZN, terreno está localizado no bairro de Cordovil, próximo a Av. Brasil (principal via de ligação da Zona Norte ao Centro), com estação de trem a menos de 500m de distância e ponto de ônibus na porta do terreno.

[2] Projeto e unificação

- No final de **2024, apresentamos 3 versões do projeto, T+4 modular faseado, unificado e torre vertical**, onde definimos **não seguir no vertical** (o ganho de unidades não justificou o aumento de custo e abertura em dois condomínios). **No T+4, optamos pelo faseado,** pois ainda não tínhamos uma relação custo, preço raso e VSO confortável para o unificado.
- Estamos **apresentando, para aprovação, o cenário modular unificado** com 493 uh's, 35 uh's com garden e 64 vagas sendo 2 para PCD e 62 vinculadas, em substituição ao cenário anterior faseado com a Fase 1 – 365 uh's e a Fase 2 – 128 uh's. **Unificação se tornou viável** após um trabalho conjunto da regional e corporativo em busca de eficiências na **parametrização, gerando necessidade de um menor preço raso para o volume proposto**, trazendo maior conforto e confiança para IM e Ciclo. Conseguimos assim gerar um **cenário com maior valor agregado do que o previsto em BP** em diversas frentes.

[3] Terreno

- **R$ 9.313.232** (R$ 6.695.000 original na PCV), em 24 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 379.868, sendo as duas primeiras já pagas em mai/25 e jul/25, as demais 22 parcelas serão pagas de agosto em diante. Temos a obrigação de reembolsar o valor de R$ 199mil (já considerado na viabilidade e dentro do valor do negócio) devido a uma análise ambiental antecipada, paga pelo proprietário.
- O gerenciamento de áreas contaminadas foi finalizado com a emissão do Termo Municipal de Encerramento, considerando a área remediada apta para uso residencial.

[4] Custo

- Conseguimos mais uma redução no custo em relação ao apresentado no comitê digital.

[5] Precificação

- Avaliação anterior da tipologia Hzinho era R$ 215k s/ vaga e R$ 235k c/ vaga. Recebemos uma avaliação da CEF abaixo do esperado (R$ 199k s/ vaga) e vamos contestar para aumentar os preços do tipo s/ vaga, que é o maior volume do projeto.

One Page – Estação Rio – Real

Cidade	Rio de Janeiro	**Mancha de demanda**	RZN2 - Olaria + Ramos + Bonsuce
Regional	RJ	**Cluster MPR**	2 - Amarelo
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Jul

Unidades (Fases)	493 (1)	**CA Máx | Proj**	6,0 | 1,6
Unidades com Vaga (%)	62 (13%)	**Escritura | Lançamento**	nov/24 | ago/25
Unidades com Atributo* (%)	35 (7,1%)	**Tipologia**	F2 - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	9.313 (9,0%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	9.313 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	745	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	42.117 (40,7%)	**Indireto Unit.**	14.887
Prazo da Obra (meses)	13	**Torre Unit.**	42.045
Custo Total Unit. (LPU):	85.430 (92)	**Infra Unit.**	15.794
Início de Obra	mar-26	**Fundação Unit.**	7.973

Preço Nominal Unit.	209.800	**VSO**	38
Preço Raso Unit.	186.510	**Referência**	VISION
Avaliação Unit.	203.970	**Renda (% em RET 1%)**	2.745 (67,8%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	189.457
Preço Inf. Médio Unit.	213.095	**Margem Bruta REF (%)**	42,9%
Custo Inf. Médio Unit.	121.666	**Margem Rasa REF (%)**	35,8%



LI (Régua):	**19,6% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	40,8%
LI Marginal:	26,3%	**Margem Rasa Econômica:**	32,7%
Margem Bruta REF:	42,9%	**Margem Contribuição Econômica:**	29,0%
Margem Rasa REF:	**35,8%**	**Exposição (% VGV):**	17.520 (16,9%)
TIR:	62,3%	**VGV Total:**	**103.432**
Payback Contingente (21 m) :	**16 m/ (-5 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(12.442)
Payback Consolidado:	16	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	22.807

***Atributo: Varanda, Garden e Churrasqueira**

***Valores em R$ '000**

Destaques

Visão Real:
Acréscimo de 1 mês de Psol em função da folga de início de 7 meses pelo PCP 166;
Acréscimo dos incorridos não aproveitados no custo total.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Farol Pareceres – Estação Rio

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Registro da ECV concluído em 28/03/25. Pendente registro/averbação do memorial de incorporação, convenção de condomínio e FNA que já foram protocolados junto ao RGI, com previsão de conclusão para 05/09/25 (desafio 29/08/25) . O imóvel foi adquirido em RJ (recuperação judicial) mediante UPI, que é considerada uma forma originária de propriedade, isentando o adquirente de responsabilidades anteriores, de acordo com a doutrina e jurisprudência. Informalmente, a CEF nos informou que, devido à aquisição via UPI, as certidões do antecessor estão dispensadas, contudo será necessário apresentar para contratação defesa com o plano aprovado e assembleia de credores aprovando a venda para Tenda. A RJ será monitorada até a expedição do habite-se.	Ok com ressalvas	
Legalização	O Projeto Legal está aprovado e a Licença de Obras emitida. O Licenciamento Ambiental está aprovado com Licença e Autorização emitida. Não haverá mais parcelamento em função da adequação do projeto ao atual plano diretor, não sendo necessário doação de área para este caso específico. O gerenciamento de áreas contaminadas foi finalizado com a emissão do Termo Municipal de Encerramento, considerando a área remediada pra uso residencial e a averbação deste termo na matrícula está em andamento no Registro de Imóveis.	Ok	
Produto	Ok	Ok	
GETEC	EP em desenvolvimento, concreto / aço da torre considerado input do projetista. Fundação sem projeto considerado input da Consultrix.	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos.	Ok	
Contratação	Laudo de engenharia: Pendente - Previsão de emissão em 16/08/2025. Risco: Pendente - Dependente do Laudo de Engenharia. Considerando que o mesmo saia em 16/08, a previsão da emissão da análise de risco está estimada para 28/08/2025. Jurídico: Pendente RI - Previsão de emissão em 29/08 (desafio). Com base nessa data, a conclusão da análise jurídica está estimada para 10/09/2025.	Ok com ressalvas	
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Ciclo avalia o Preço Vision como factível	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos associados	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- RZN – Rio de Janeiro Norte

Lançamento

1. Elevato Bonsucesso

LandBank

2. Elevato Brasil
3. Estação Brasil
4. Estação Rio
5. Elevato Carolina Machado
6. Mirante Boa Vista
7. Elevato Ramos
8. Silva Vale

Cluster MPR – (Comitê)

- Cluster 2 - Amarelo

Região

Capital

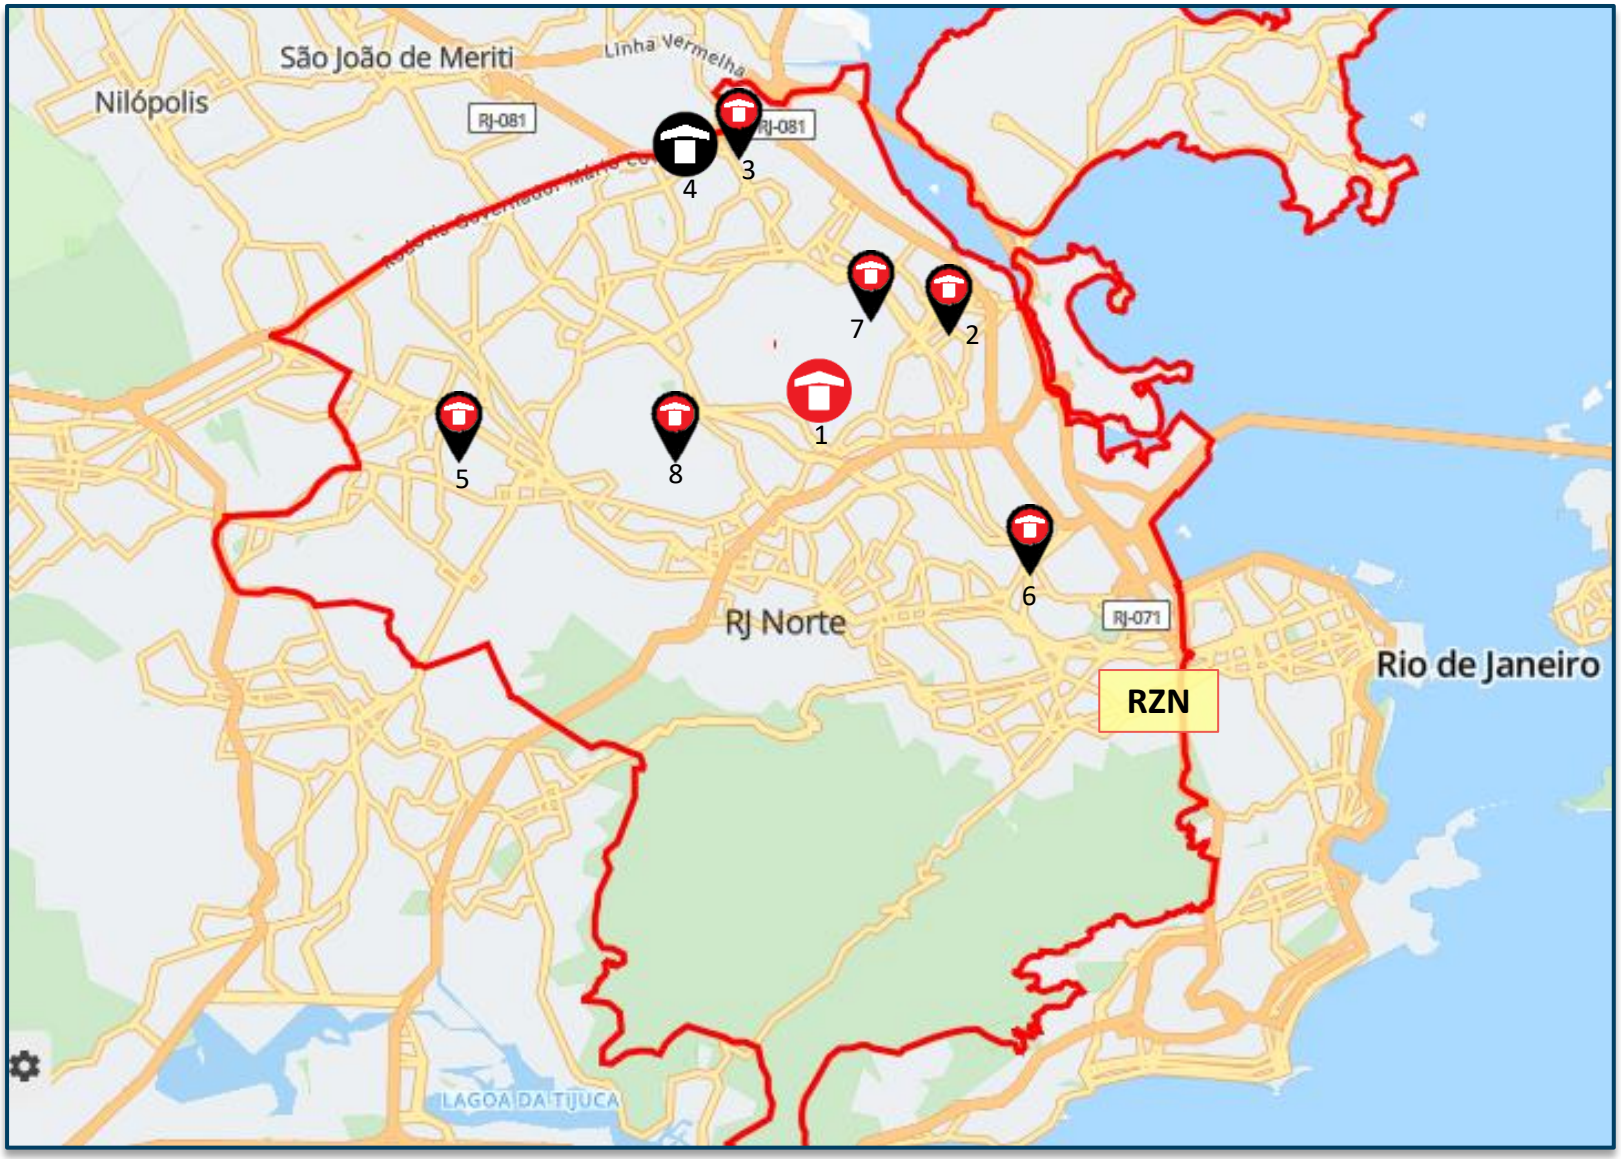

Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Estação Rio
Lançamento

Informações Gerais – Condomínio Único		
Terreno	Área terreno	12.502,00m²
	App/fna	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Não
	Zoneamento	ZFU e ZUM B (AP3)
Diretrizes Urbanística	Ca máximo	5,98
	Ca projetado	1,59
	Gabarito máximo	T+15 (COMAER)
Geral	Total uh	493
	Total de vagas exigido	Isento
	Total de vagas projetado	64 (12%)
Tipologia	Tipologia	Modular
	Gabarito	T+4
	Lâmina	16PP (5) e 10PP (2)
	Garden	35 (7%)
	Área privativa	33,97m²
Condomínio	Unidade PCD	15
	Unidade lazer|técnica	7
	Torre	7
	Fase	única
Lazer	Lazer Interno	Espaço Office, Espaço Oficina.
	Lazer Externo	Salão de Festas com churrasqueira, Churrasqueira Gourmet, Espaço Ducha, Praça dos Sabores, Quadra de Areia, Praça de Jogos, Fitness Externo e Funcional, Play Kids, Play Baby e Play Pet

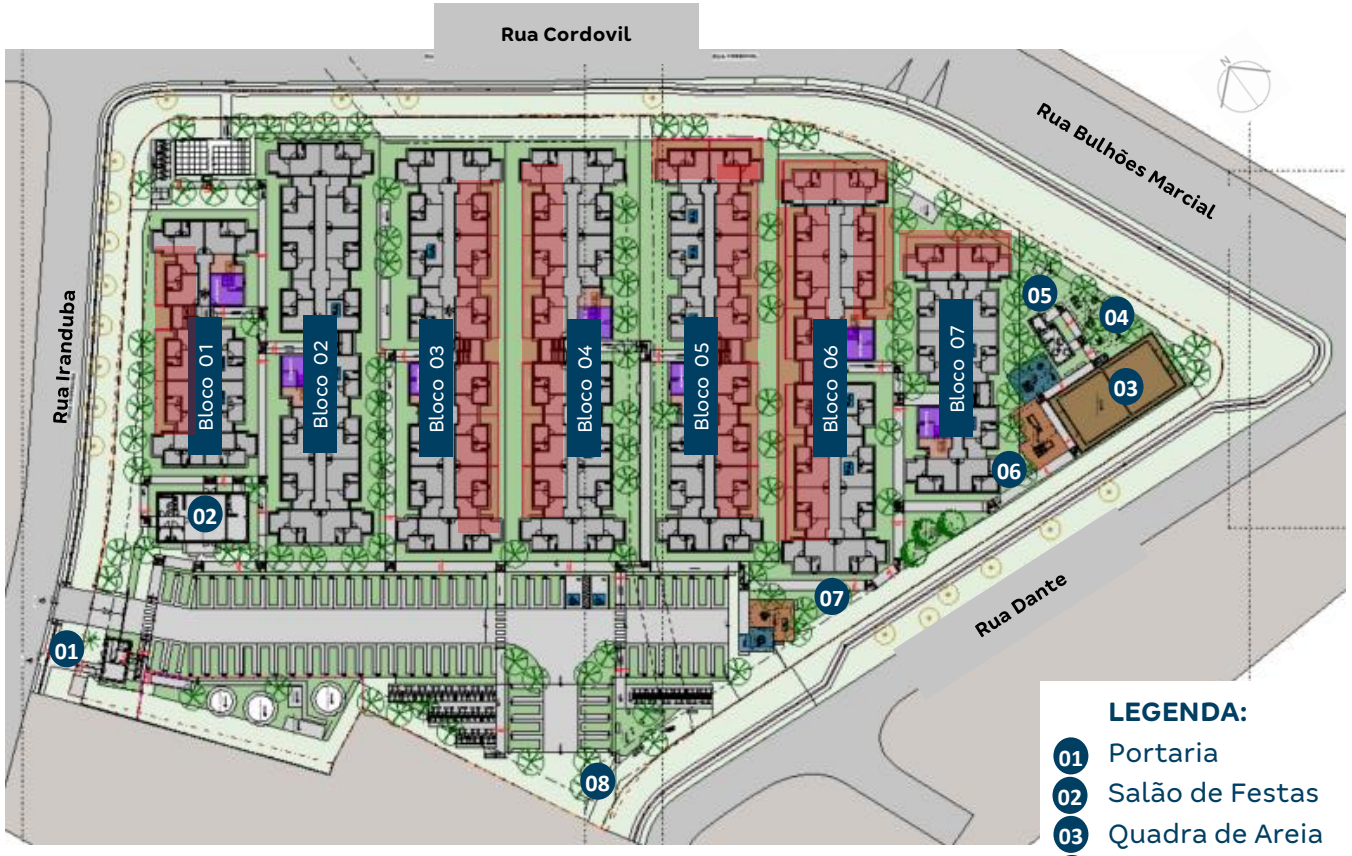

LEGENDA:

- 01 Portaria
- 02 Salão de Festas
- 03 Quadra de Areia
- 04 Ducha
- 05 Churrasqueira com banheiro
- 06 Play Kids
- 07 Play Baby e
- 08 Pet Place
- Garden

PRODUTO

Empreendimento Estação Rio
Lançamento

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**	🟢	
	Percurso do pedestre até torre	🟢	
Diferencial produto	**Faixa de renda**	2	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	Quadra de areia, Espaço Ducha
	Atributos Torre	Sim	Garden
	Edifício Garagem	Não	

Quadra de Areia

Espaço Ducha

Empreendimento Estação Rio
Lançamento

Fase Única: 493 UH e 64 vagas de veículos				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	03 (T+4)	207Uh	-	Lazer: Salão de Festas com Churrasqueira
Módulo 02	02 (T+4)	158 UH	-	-
Módulo 03	02 (T+4)	128 UH		Lazer: Play Pet, Play Baby (2), Play Kids (2), Churrasqueira Gourmet, Quadra de Areia, Churrasqueira Gourmet, Espaço Ducha, Praça dos Sabores, Fitness Externo e Funcional, Praça de Jogos

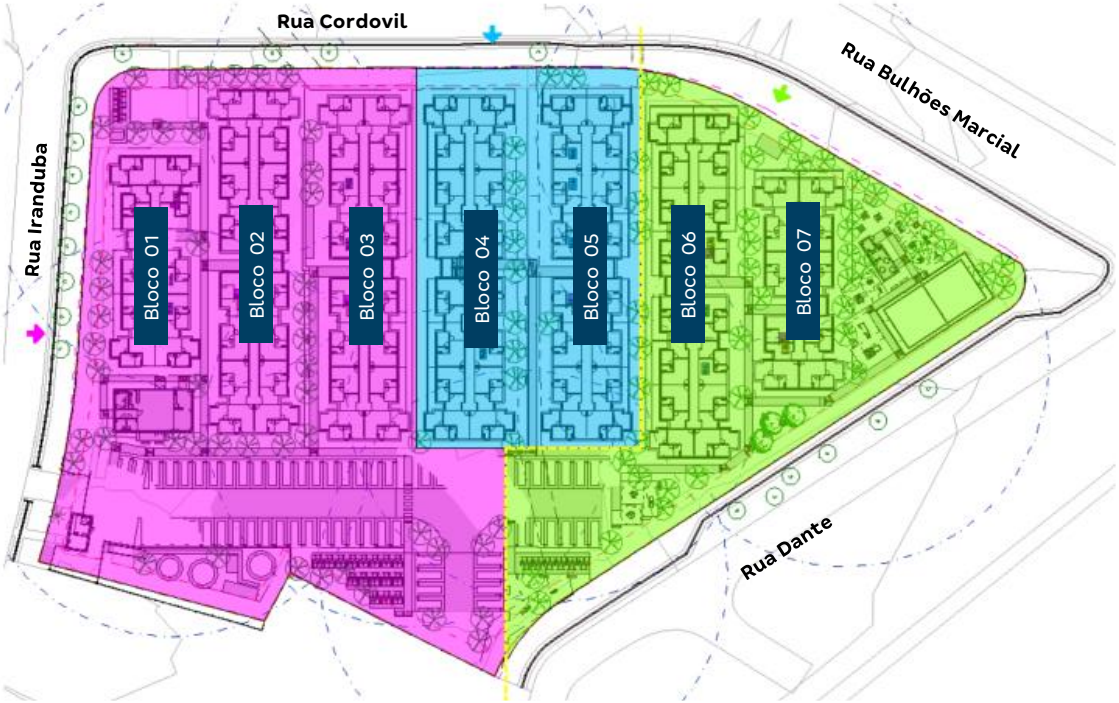

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Implantação | Google Earth

ESTAÇÃO RIO
Rio de janeiro – RJ
493 UH

Custo de Construção

	ESTAÇÃO RIO | FASE ÚNICA R.09	ESTAÇÃO RIO | FASE ÚNICA PARAMETRIZAÇÃO - R25	BOSQUE JACAREPAGUÁ | REV02
Torres	7	7	6
Unidades Construídas	500	500	420
Unidades Vendidas	493	493	414
Atributos	Quadra | Garden	Quadra	
Condomínios (qta.)	1	1	1
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	F2 MODULAR
Tipologia	2 Torres | T+4 | 10PP	2 Torre | T+4 | 10PP	1 Torre | T+04 | 10PP
Tipologia	5 Torres | T+4 | 16PP	5 Torre | T+4 | 16PP	3 Torre | T+04 | 14PP
Tipologia	-	-	2 Torre | T+04 | 16PP
Projeto Infra	AP	AP	EP
Projeto Torre	AP	AP	AP
Mês Base	julho-25	janeiro-25	abril-25
Incc	1.191,327	1.159,536	1.184,462
LVS	maio-25	novembro-24	abril-25
Indiretos	maio-25	novembro-24	abril-25
Base de Preço	LPU 92	LPU 86	LPU 91
Takt	2x2	2x2	2+2
Prazo (mês)	13	14	12
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 81.946	R$ / UND R$ 83.405	R$ / UND R$ 87.125
Indireto	R$ 14.887	R$ 16.310	R$ 16.659
Torre	R$ 42.045	R$ 41.912	R$ 41.067
Infra	R$ 15.794	R$ 16.597	R$ 17.415
Fundação	R$ 7.973	R$ 6.606	R$ 5.638
EEE	R$ 390	R$ 454	
ETE			
Contenção	R$ 298	R$ 275	R$ 1.801
Terraplenagem	R$ 558	R$ 1.253	R$ 4.545
CUSTO TOTAL II	R$ 2.172	R$ 1.916	R$ 1.735
Urbanização	R$ 608	R$ 702	R$ 141
Drenagem	R$ 885	R$ 404	R$ 1.280
Extensão de Rede Elétrica			R$ 121
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 679	R$ 811	R$ 193
CUSTO TOTAL III	R$ 1.312	R$ 1.373	
Incorridos	R$ 1.312	R$ 1.373	
CUSTO TOTAL IV			
Aprendizado			
CUSTO TOTAL V		R$ 2.339	R$ 515
Atualização por INCC		R$ 2.339	R$ 515
CUSTO TOTAL I+II	R$ 84.117	R$ 85.321	R$ 88.860
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 85.429	R$ 89.034	R$ 89.375

Custo de Construção

	ESTAÇÃO RIO | FASE ÚNICA R.09	ESTAÇÃO RIO | FASE ÚNICA PARAMETRIZAÇÃO - R25	
Torres	7	7	
Unidades Construídas	500	500	
Unidades Vendidas	493	493	
Condomínios (qta.)	1	1	
Atributos	Quadra | Garden	Quadra	
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	
Tipologia	2 Torres | T+4 | 10PP	2 Torre | T+4 | 10PP	
Tipologia	5 Torres | T+4 | 16PP	5 Torre | T+4 | 16PP	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	julho-25	janeiro-25	
Incc	1191,327	1159,536	
LVS	maio-25	novembro-24	
Indiretos	maio-25	novembro-24	
Base de Preço	LPU 92	LPU 86	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	13	14	
CUSTO TOTAL I	**R$ / UND R$ 81.946**	**R$ / UND R$ 83.405**	**DIF** -R$ 1.460
Indireto	R$ 14.887	R$ 16.310	-R$ 1.423
Torre	R$ 42.045	R$ 41.912	R$ 134
Infra	R$ 15.794	R$ 16.597	-R$ 802
Fundação	R$ 7.973	R$ 6.606	**R$ 1.367**
EEE	R$ 390	R$ 454	-R$ 64
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 298	R$ 275	R$ 24
Terrapplenagem	R$ 558	R$ 1.253	-R$ 694
CUSTO TOTAL II	**R$ 2.172**	**R$ 1.916**	R$ 256
Urbanização	R$ 608	R$ 702	-R$ 93
Drenagem	R$ 885	R$ 404	R$ 481
Extensão de Rede Eletrica	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 679	R$ 811	-R$ 132
CUSTO TOTAL III	**R$ 1.312**	**R$ 1.373**	-R$ 62
Incorridos	R$ 1.312	R$ 1.373	-R$ 62
CUSTO TOTAL IV	**R$ 0**	**R$ 0**	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	**R$ 0**	**R$ 3.276**	-R$ 3.276
Atualização por INCC		R$ 3.276	-R$ 3.276
CUSTO TOTAL	**R$ 85.429**	**R$ 89.971**	-R$ 4.542

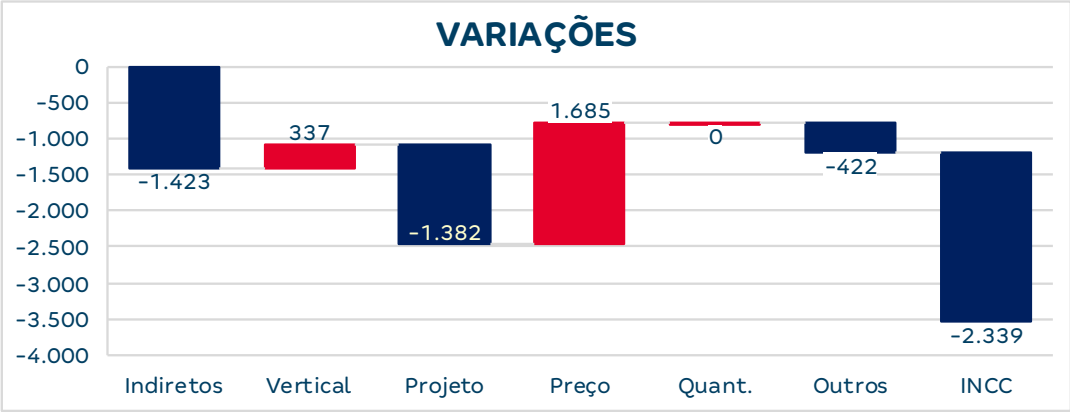

INDIRETOS
- 574 | G11
-416 | G14
- 209 | G17
- 161 | G18

VERTICAL
+ 337 | Retroalimentação

PROJETO
+ 167 | Estrutura Torre
- 219 | Gesso Acartonado
+ 454 | Garden
+120 | Esquadria de Alumínio (Torre)
- 694| Terraplenagem
- 1.309 | Reservatório
+ 123 | Fundação

PREÇO
+ 1.244 | Fundação
+ 256 | Infra Externa
+234| Muro de divisa

OUTROS
-266 | Instalações Torre
- 162 | Instalações Infra

INCC
-2. 329 | Incc

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Ligação na porta. Considerado hidrante na frente do condomínio.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Considerado 427 m de linha de recalque da Estação Elevatória de Esgoto.

SISTEMA DE DRENAGEM
Descarte na rede pública em frente ao terreno. Considerado FNA.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado passeio e grama.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 2
Drenagem	Nível 2
Elétrica	Nível 5
Gás	NA
Urbanização	Nível 5

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 12/2023, com validade em 12/2025.

Esgoto:
- Extensão com projeto aprovado.

Drenagem:
- Drenagem com projeto aprovado.

Elétrica:
- Renovação viabilidade solicitada em 24/06, previsão 24/07.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
Considerado passeio e grama.

Logística

ESTAÇÃO RIO - FASE 01

PRÉ FORMA-F1
1 : 300

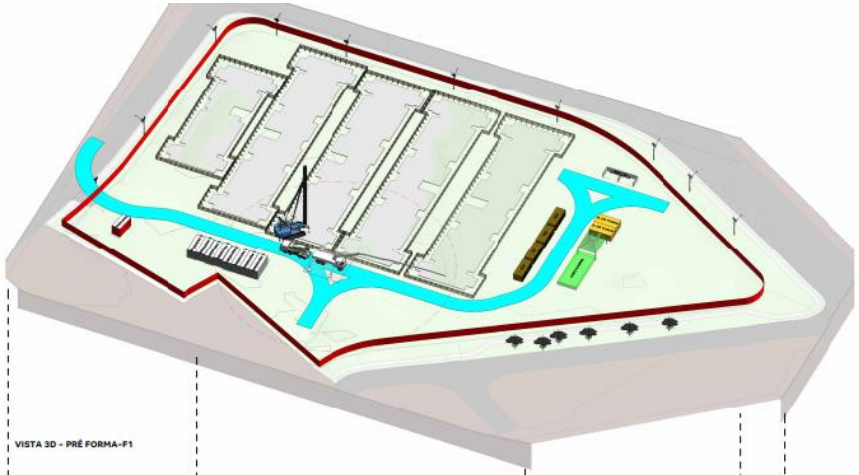

VISTA 3D - PRÉ FORMA-F1

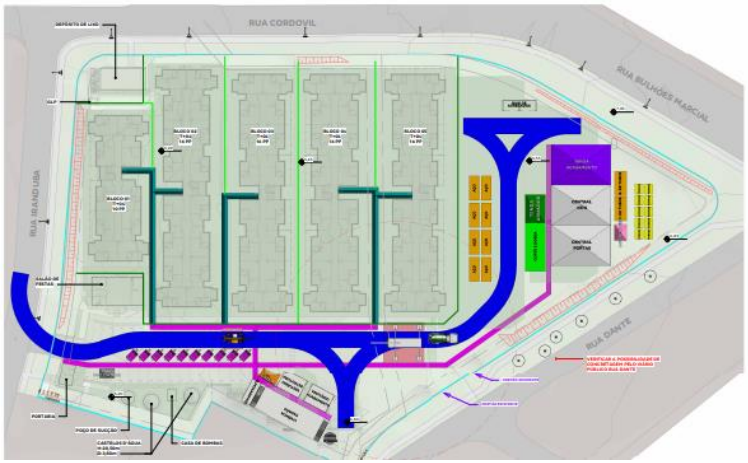

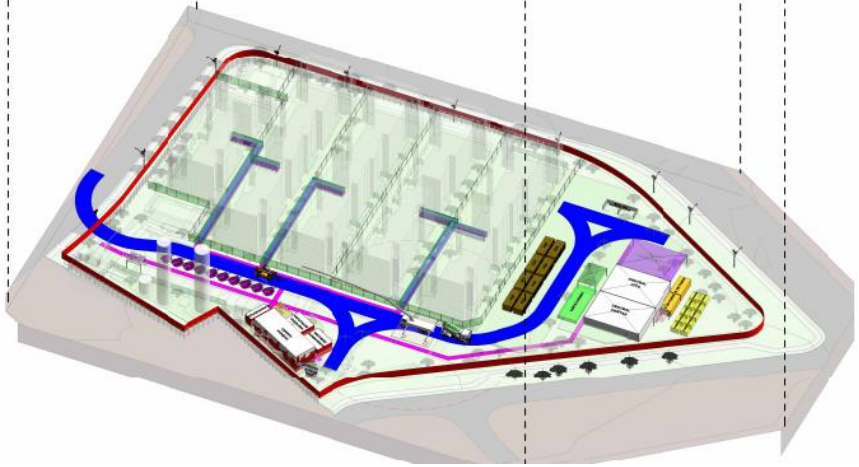

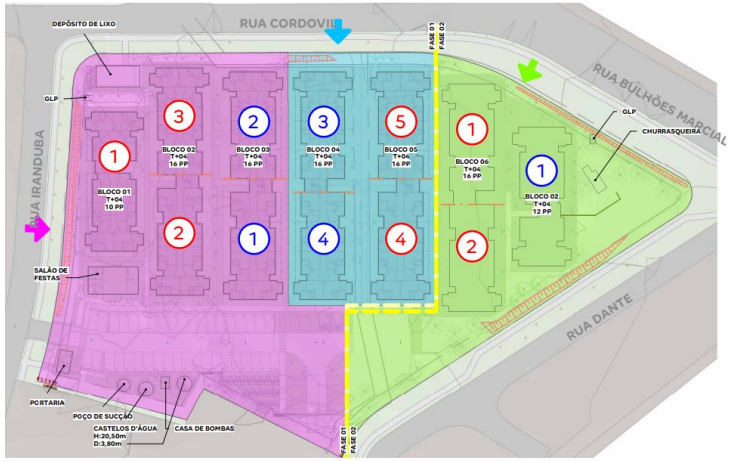

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS								
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	F1/F2	
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_R01	1 EQUIPAMENTO	-	-	-	TODO PERÍODO	-	F2	
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	F1	
PERFURATRIZ (LOG)		1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-	F1/F2	
SKYTRAK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	<varia>	<varia>	F1/F2	

Logística

ESTAÇÃO RIO – FASE 02

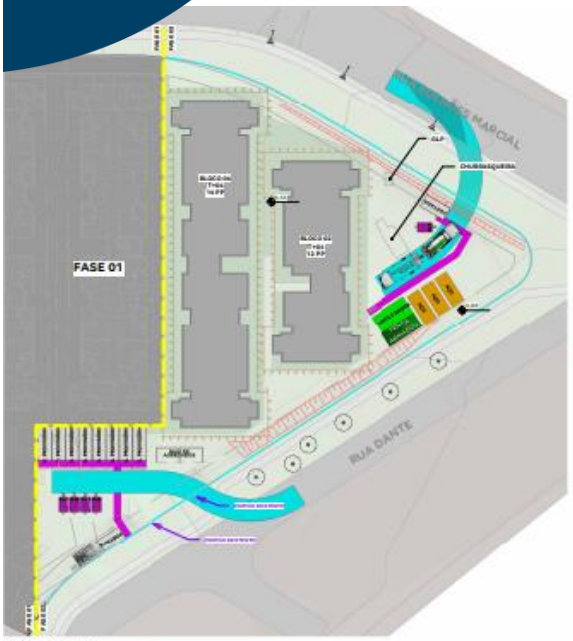

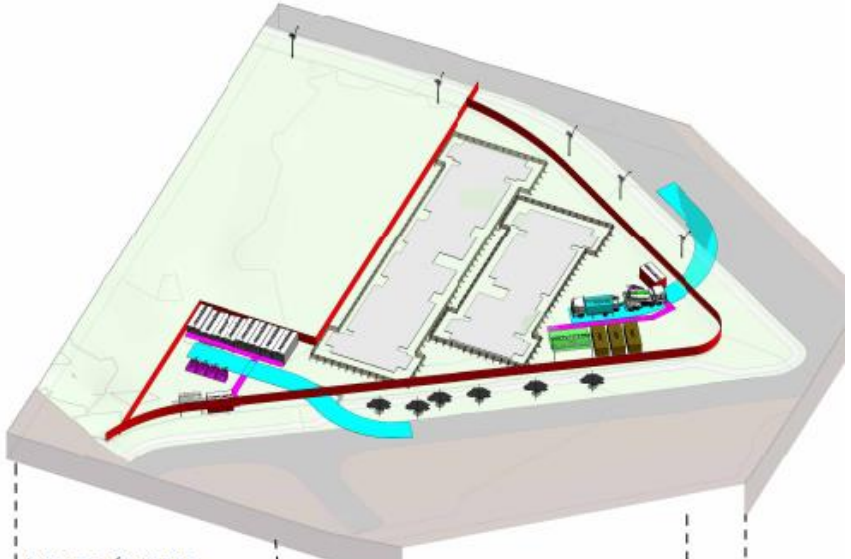

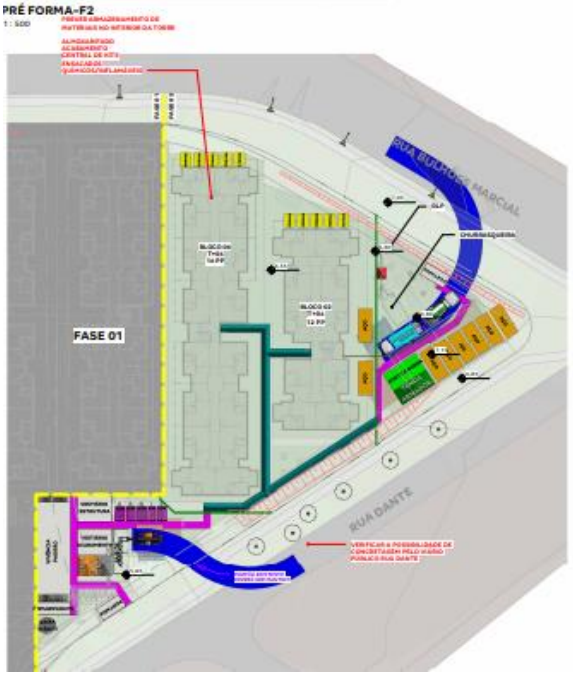

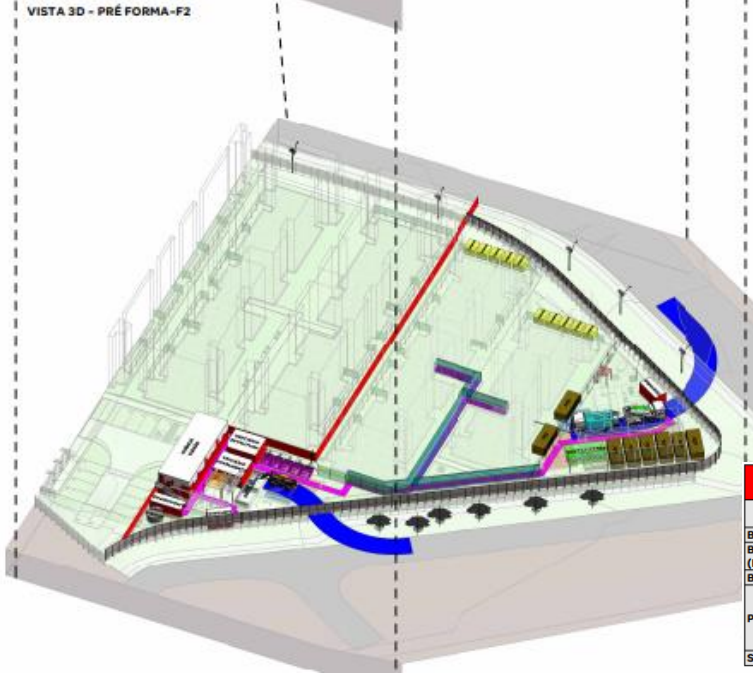

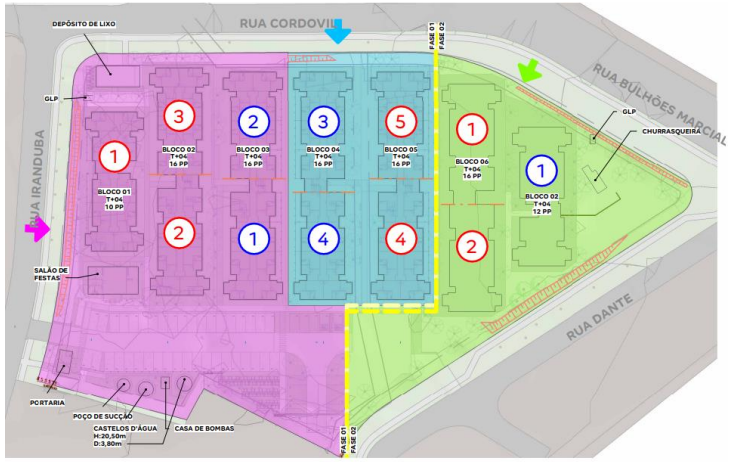

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS								
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE	CÓDIGO ORÇAMENTO
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	F1/F2	
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_R01	1 EQUIPAMENTO	-	-	-	TODO PERÍODO	-	F2	
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	F1	
PERFURATRIZ (LOG)		1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-	F1/F2	
SKYTRAK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	<varia>	<varia>	F1/F2	

PCP 166 v.01

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Conclusão Checklist	Previsão AGI
Solar Trindade - F1	mai/24	180	1	C	07/09/24	14/01/25			02/05/25			ago/25	out/25
Soul Taquá I - F1	mai/24	340	2	A	15/09/24	08/01/25	19/01/25		29/04/25	28/04/25		jul/25	set/25
Soul Taquá I - F2	mar/25	160	2	A	31/03/25	29/04/25	30/04/25		12/06/25	20/06/25		set/25	nov/25
Jardim Peônia (ex Jd Lirios VI)	out/24	460	2	A	18/12/24	13/06/25	21/06/25		24/10/25	01/11/25		fev/26	abr/26
Porto Valência - F1	jul/24	340	2	C	07/01/25	03/05/25	06/06/25		26/08/25	30/08/25		nov/25	jan/26
Reserva Carioca - F1	jul/24	340	2	C	10/05/25	27/08/25	31/08/25		10/12/25	14/12/25		mar/26	mai/26
Reserva Carioca - F2	mar/25	160	2	C	12/10/25	11/12/25	15/12/25		30/01/26	03/02/26		mai/26	jul/26
Parque Orquídea (ex R. Parque VI)	nov/24	400	2	A	27/06/25	25/10/25	02/11/25		26/02/26	06/03/26		jun/26	ago/26
Elevato Bonsucesso	nov/24	504	2	C	18/09/25	31/01/26	04/02/26		06/07/26	10/07/26		fev/27	abr/27
Bosque Jacarepaguá	jul/25	414	2	A	08/11/25	27/02/26	07/03/26		05/07/26	13/07/26		out/26	dez/26
Estação Rio (Forja Rio) - F1	ago/25	365	2	A	08/03/26	06/07/26	14/07/26		28/10/26	05/11/26		fev/27	abr/27
Parque Hortência (ex R. Parque VII)	ago/25	355	3	C	02/04/26	07/07/26	11/07/26	11/08/26	19/09/26	23/09/26	06/11/26	fev/27	abr/27
Elevato Carolina Machado	set/25	480	3	C	29/04/26	20/09/26	24/09/26	07/11/26	28/12/26	01/01/27	14/02/27	mai/27	jul/27
Mirante Boa Vista - F1+F2	out/25	442	2	A	10/06/26	29/10/26	06/11/26		15/03/27	23/03/27		jun/27	ago/27
Solar Trindade - F2	nov/25	180	3	C	30/10/26	29/12/26	02/01/27	15/02/27	05/02/27	09/02/27	25/03/27	jun/27	ago/27
Soul Taquá II - F1	nov/25	340	3	C	08/11/26	06/02/27	10/02/27	26/03/27	17/04/27	21/04/27	03/06/27	set/27	nov/27
Porto Valência - F2	jan/26	140	2	A	15/01/27	16/03/27	24/03/27		28/04/27	06/05/27		ago/27	out/27
Elevato Ramos	jun/26	494	3	C	20/10/26	18/04/27	22/04/27	04/06/27	30/07/27	03/08/27	14/09/27	dez/27	fev/28
Estação Rio (Forja Rio) - F2	jul/26	128	2	A	30/12/26	29/04/27	07/05/27		08/06/27	16/06/27		set/27	nov/27

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Rio de Janeiro Norte	RZN	22%	1.259	105	1.511	126

Empreendimento	Renda	Lançamento	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27
Elevato Bonsucesso	3.251	nov-24	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	2								
Mirante Boa Vista	4.802	jul-25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	17				
Estação Rio	**2.745**	**ago-25**		**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**37**								
Elevato Carolina Machado	3.894	dez-25						25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	6
Elevato Ramos	3.563	jun-26												28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Elevato Av Brasil	3.598	jul-26													27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Silva Vale - COND I	3.698	set-26															27	27	27	27	27	27	27	27
Total de Vendas Lançados			**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Lançados + Landbank			**46**	**84**	**84**	**84**	**84**	**109**	**109**	**109**	**109**	**109**	**109**	**137**	**164**	**144**	**132**	**132**	**132**	**124**	**107**	**107**	**107**	**88**

O Elevato Av Brasil é um projeto coringa e, ao desconsiderá-lo, não ultrapassamos o potencial da mancha.

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Estação Rio | Mapa Concorrência

		Estação Rio	Conquista Norte Club
		TENDA	Direcional
	Distância Tenda (km)		5,35Km
Região 1 Km	População	47.943	41.824
	Dens. Demográfica	15.335	13.399
	Renda (R$)	5.111	4.832
	Classe Social	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)
	PEA Dia	23.637	27.451
Quantitativo	Lançamento	ago/25	03/2024
	Unidades	493	380
	Estoque	493	46
	VSO	38	28
	Stockout	13	2
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	7	10
	Gabarito	T+4	T+4
	Plantas (m²)	34,10m² | 47,90m²	48,6m² e 48,6m² e 36,2m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Garden	Garden
	Varanda	Não	Não
	Suite	Não	Não
	Dif. Entrega	Não	-
	Vagas	13%	34% Com vaga
	Lazer	Salão de Festas com Churrasqueira, Churrasqueira Gourmet, Quadra de Areia, Espaço Ducha, Praça de Jogos, Praça dos Sabores, Fitness/Funcional Externo, 2 Play Kids, 2 Play Baby, Play Pet e 7 áreas de lazer internas aos Blocos com sugestão de uso como Espaço Office ou Espaço Oficina	Tem Garden, Agua Aquecida a Gas, Bosque, Cinema, Piscina, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Quadra, Quiosque, Salão de Jogos,

Tipologias	Empreendimento	Estação Rio				Conquista Norte Club	
	Tipologia	Sem vaga	Com vaga	Garden	Garden c/vaga	Sem vaga	Garden c/vaga
	Avaliação	199.000	234.000	207.000	242.000	237.000	268.000
	Preço Nominal	206.250	228.081	215.256	241.605	234.690	269.690
	CEF	166.706	186.771	171.324	193.084	187.752	215.752
	Renda	2.559	3.659	3.159	4.399	3.699	5.299
	% Unidades	84%	9%	3%	4%	78%	22%
	Dif Renda					1.140	900
	Farol de Factibilidade					●	●

Farol Renda

- ● Acima de 300
- ● Entre 0 e 300
- ● Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- O concorrente mapeado está localizado fora do raio de 5 km. Além disso, o projeto captura uma faixa de preço e renda superior ao produto Tenda.
- Além da baixa avaliação do Estação Rio, o preço abaixo da concorrência também se justifica pela sua localização, próxima a uma área de vulnerabilidade social com presença de grupos ligados ao crime organizado.

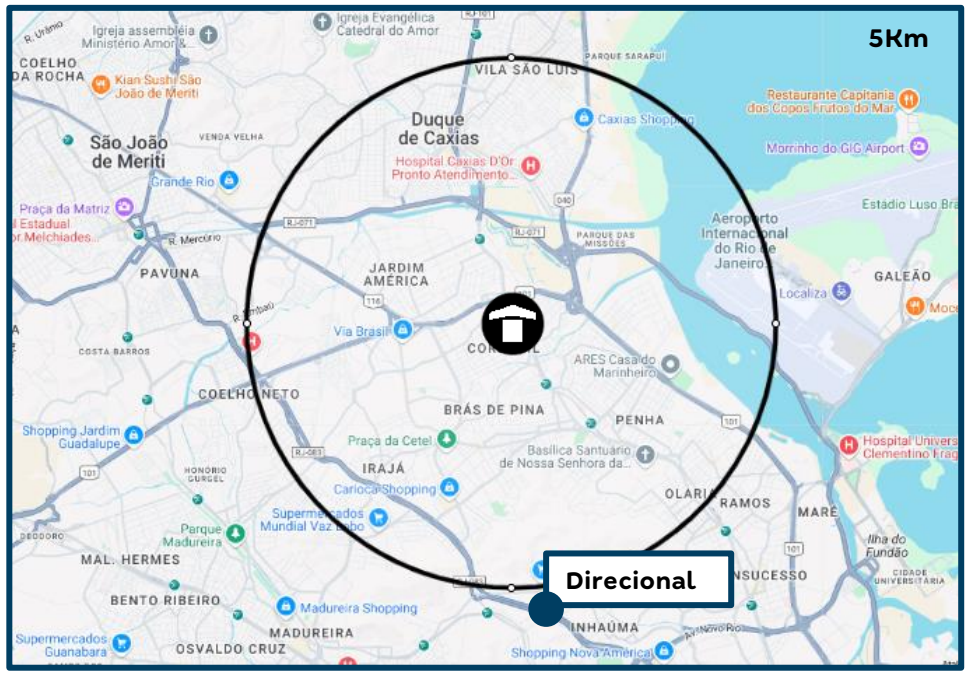

Simulação de Preço – Unificado

Informações Viabilidade

Projeto:	Estação Rio – Unificado							
Tipo:	**Sem vaga**		**Com vaga**		**Garden**		**Garden com Vaga**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	199.000		234.000		207.000		242.000	
Renda Inicial (VF)	2.559		3.659		3.159		4.399	
Renda Final*	-		-		-		-	
% RET1	75%		25%		50%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,59	1.481	0,53	1.871	1,08	3.308	0,77	3.308
FGTS	0,89	2.206	1,08	3.860	1,26	3.881	0,94	4.011
Financiamento	95,89%	142.933	98,56%	179.503	100,01%	160.896	99,40%	187.307
Subsídio	117,70%	21.568	153,97%	3.407	108,66%	6.547	140,34%	1.766
Prazo de Pró-soluto	19	19	19	19	19	19	19	19
Pró-Soluto	83,05%	14.671	67,78%	17.120	83,05%	18.110	69,65%	21.152
Preço Raso (RS)	182.858	182.858	205.761	205.761	192.742	192.742	217.544	217.544
TCD	90,69%	23.392	60,52%	22.320	70,70%	22.514	54,26%	24.062
VSO	32	32	4	4	1	1	1	1
Preço de Venda	**211.901**	**211.901**	**234.330**	**234.330**	**221.154**	**221.154**	**248.225**	**248.225**
Elasticidade	-2,667%	-2,667%	-2,667%	-2,667%	-2,667%	-2,667%	-2,667%	-2,667%
Preço de Venda Final	**206.250**	**206.250**	**228.081**	**228.081**	**215.256**	**215.256**	**241.605**	**241.605**
Preço Raso (R$)	**182.858**		**205.761**		**192.742**		**217.544**	
% de Raso	**88,66%**		**90,21%**		**89,54%**		**90,04%**	
BP25 – Não Inflacionado	**181.014**		**201.260**		**-**		**-**	
BP25 – Inflacionado	**188.124**		**209.140**		**-**		**-**	

Análise de Preço – Unificado

Informações Viabilidade

Projeto:	Estação Rio - Unificado
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	203.970
Renda Inicial (VF)	2.745
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,61	1.646
FGTS	0,92	2.477
Financiamento	96,40%	148.436
Subsídio	121,45%	18.706
Prazo de Pró-soluto	19	19
Pró-Soluto	81,19%	15.244
Preço Raso (RS)	186.510	186.510
TCD	85,97%	23.291
VSO	38	38
Preço de Venda	**215.395**	**215.395**
Elasticidade	-2,667%	-2,667%
Preço de Venda Final	**209.800**	**209.800**
Preço Raso (R$)	**186.510**	
% de Raso	**88,90%**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) IM avalia o preço do Vision como factível, visto que, o Estação Guanabara já performou na região com rendas similares ao estimado no parecer. Abaixo segue a bridge da composição de preço:

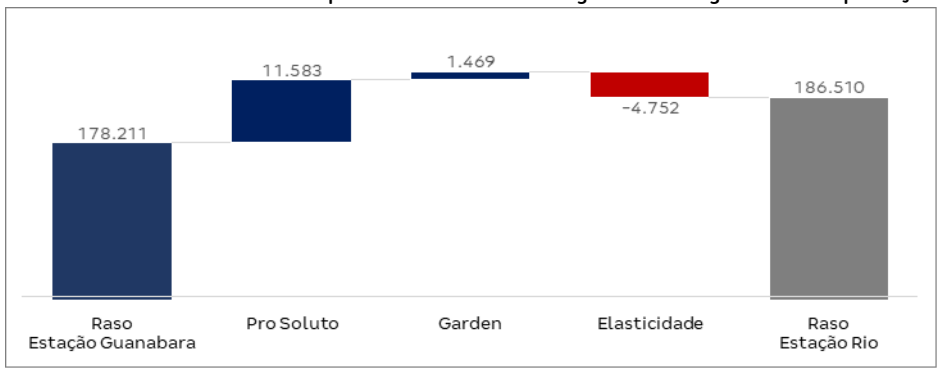

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", o concorrente mapeado está fora do raio de 5km e captura um target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda.

	Preço Real					Preço Normalizado (20m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Elevato Bonsucesso	**231.690**	**203.534**	**3.251**	**21**	**27**	**-7.182**	**196.352**
Estação Rio - Unificado	**203.970**	**187.005**	**2.740**	**38**	**20**	**-**	**187.005**

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço – Cenário Aprovação

Informações Viabilidade

Projeto:	Estação Rio - Unificado							
Tipo:	**Sem vaga**		**Com vaga**		**Garden**		**Garden com Vaga**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	199.000		234.000		207.000		242.000	
Renda Inicial (VF)	2.559		3.659		3.159		4.399	
Renda Final*	-		-		-		-	
% RET1	75%		25%		50%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,59	1.481	0,53	1.871	1,08	3.308	0,77	3.308
FGTS	0,89	2.206	1,08	3.860	1,26	3.881	0,94	4.011
Financiamento	95,89%	142.933	98,77%	179.503	100,01%	160.896	99,40%	187.307
Subsídio	117,70%	21.568	153,97%	3.407	108,66%	6.547	140,34%	1.766
Prazo de Pró-soluto	18	18	18	18	18	18	18	18
Pró-Soluto	83,05%	13.898	67,78%	16.219	83,05%	17.157	69,65%	20.038
Preço Raso (RS)	182.086	182.086	204.860	204.860	191.789	191.789	216.430	216.430
TCD	90,69%	23.392	60,52%	22.320	70,70%	22.514	54,26%	24.062
VSO	32	32	4	4	1	1	1	1
Preço de Venda	**211.108**	**211.108**	**233.404**	**233.404**	**220.174**	**220.174**	**247.081**	**247.081**
Elasticidade	-2,667%	-2,667%	-2,667%	-2,667%	-2,667%	-2,667%	-2,667%	-2,667%
Preço de Venda Final	**205.478**	**205.478**	**227.180**	**227.180**	**214.303**	**214.303**	**240.492**	**240.492**
Preço Raso (R$)	**182.086**		**204.860**		**191.789**		**216.430**	
% de Raso	**88,62%**		**90,18%**		**89,49%**		**89,99%**	
BP25 - Não Inflacionado	**179.911**		**199.878**		**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**187.020**		**207.758**		**-**		**-**	

Concorrência no Entorno:

Ciclo entende que o preço e VSO estão OK.

PARECER: Ciclo avalia o Preço Vision como Factível.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Informações Gerais – Consolidado

Estação Rio Unificado – RJ – Rio de Janeiro Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	set-20							
tipo s/ vaga		ago-25	fev-26	mar-27	6 meses	13 meses	ago-28	36 meses
tipo c/ vaga		ago-25	fev-26	mar-27	6 meses	13 meses	ago-28	36 meses
c/ garden s/ vaga		ago-25	fev-26	mar-27	6 meses	13 meses	ago-28	36 meses
c/ garden c/ vaga		ago-25	fev-26	mar-27	6 meses	13 meses	ago-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	9,31 MM	**Incorrido Terreno:** 0,38 MM	**Área do Terreno (100%):**	12.502 m²	**Área Líquida do Terreno:** 12.502 m²
Cash:	9,31 MM		**Custo de terreno m²:**	744,9	**Custo de terreno m² Área Líquida:** 744,9
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 9,0% / 49,3%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.** 6,0 / 1,6
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%		**Incorrido de Construção:**	0,94 MM	**Incorridos de Incorporação:** 2,80 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
tipo s/ vaga	T+4	182.086	414	205.478	199.000	95,9%	83,0%	90,7%
tipo c/ vaga	T+4	204.860	44	227.180	234.000	98,8%	67,8%	60,5%
c/ garden s/ vaga	T+4	191.789	17	214.303	207.000	100,0%	83,0%	70,7%
c/ garden c/ vaga	T+4	216.430	18	240.492	242.000	99,4%	69,7%	54,3%

Unidades Totais:	493	**Preço Médio:**	208.998	**Renda Média:**	2.745	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.024
Unidades Tenda:	493	**Avaliação Média:**	203.970	**Ato:**	1.679 (0,61 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.409
VSO:	38 Unidades	**VGV Total:**	103.035.962	**FGTS:**	2.520 (0,92 Salários)	**Preço Raso Médio:**	185.707
RET Médio:	2,0%	**VGV Tenda:**	103.035.962	**% em RET 1%:**	68%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	1.391

Construção

Custo Total Unit.:	84.118	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	34,10	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**15.893.777**	**LI:**	**20,29%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**18.068.551**	**Margem Bruta Econômica:**	**41,40%**
TIR:	**64,31%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(13.950.447)**	**Margem Bruta REF:**	**43,57%**
Exposição de Caixa:	**17,55%**	**Δ LI:**	**0,29%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**23.505.971**	**Margem Rasa Econômica:**	**33,41%**
Payback Contingente (21 m):	**15 m/ (-6 m)**	**LI Marginal:**	**26,99%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**33.386.331**	**Margem Rasa REF:**	**36,50%**
Payback Consolidado:	**15 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**29,64%**

DRE (Consolidado)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Estação Rio Unificado		tipo s/ vaga		tipo c/ vaga		c/ garden s/ vaga		c/ garden c/ vaga	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	102.959	100,0%	85.076	100,0%	9.997	100,0%	3.610	100,0%	4.276	100,0%
PIS/COFINS	(1.118)	1,1%	(815)	1,0%	(178)	1,8%	(49)	1,4%	(76)	1,8%
Custo Total	(59.674)	58,6%	(50.036)	59,4%	(5.352)	54,5%	(2.094)	58,8%	(2.191)	52,2%
Custo Terreno	(9.780)	9,6%	(8.213)	9,7%	(873)	8,9%	(337)	9,5%	(357)	8,5%
Custo Relacionados a Terreno	(2.300)	2,3%	(1.934)	2,3%	(204)	2,1%	(79)	2,2%	(83)	2,0%
Custos de Incorporação	(2.307)	2,3%	(1.860)	2,2%	(234)	2,4%	(117)	3,3%	(97)	2,3%
Custo de Construção	(45.287)	44,5%	(38.030)	45,1%	(4.042)	41,2%	(1.562)	43,9%	(1.653)	39,4%
Lucro Bruto Econômico	42.167	41,4%	34.225	40,6%	4.467	45,5%	1.466	41,2%	2.009	47,8%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	42.167	41,4%	34.225	40,6%	4.467	45,5%	1.466	41,2%	2.009	47,8%
Despesas de Selling	(9.615)	9,4%	(7.967)	9,5%	(914)	9,3%	(339)	9,5%	(395)	9,4%
Contingência	(2.368)	2,3%	(1.957)	2,3%	(230)	2,3%	(83)	2,3%	(98)	2,3%
Margem de Contribuição	30.183	29,6%	24.301	28,8%	3.323	33,8%	1.045	29,3%	1.515	36,1%
IR e CSLL	(915)	0,9%	(667)	0,8%	(146)	1,5%	(40)	1,1%	(62)	1,5%
Margem Líquida	29.268	28,7%	23.634	28,0%	3.177	32,4%	1.004	28,2%	1.453	34,6%
Lucro Bruto REF Unit.	92.485	43,6%	88.877	42,6%	110.533	48,0%	98.618	45,2%	125.558	51,2%
Lucro Raso REF Unit.	68.847	36,5%	65.135	35,2%	87.939	42,3%	75.722	38,7%	101.064	45,8%

R$ Mil - VPL - Compra	Estação Rio Unificado		tipo s/ vaga		tipo c/ vaga		c/ garden s/ vaga		c/ garden c/ vaga	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	78.324	100,0%	64.856	100,0%	7.673	100,0%	2.658	100,0%	3.137	100,0%
PIS/COFINS	(837)	1,1%	(612)	0,9%	(134)	1,8%	(36)	1,3%	(55)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(61.593)	78,6%	(51.478)	79,4%	(5.639)	73,5%	(2.162)	81,3%	(2.315)	73,8%
Custo Terreno	(8.442)	10,8%	(7.089)	10,9%	(753)	9,8%	(291)	11,0%	(308)	9,8%
Custo Relacionados a Terreno	(2.960)	3,8%	(2.489)	3,8%	(263)	3,4%	(102)	3,8%	(107)	3,4%
Custos de Incorporação	(2.420)	3,1%	(1.960)	3,0%	(241)	3,1%	(117)	4,4%	(102)	3,2%
Custo de Construção	(37.545)	47,9%	(31.529)	48,6%	(3.351)	43,7%	(1.295)	48,7%	(1.371)	43,7%
Despesas de Selling	(8.543)	10,9%	(7.086)	10,9%	(823)	10,7%	(293)	11,0%	(340)	10,8%
Contingência	(998)	1,3%	(825)	1,3%	(97)	1,3%	(35)	1,3%	(41)	1,3%
IR e CSLL	(685)	0,9%	(501)	0,8%	(110)	1,4%	(29)	1,1%	(45)	1,4%
Lucro Imobiliário	15.894	20,3%	12.767	19,7%	1.900	24,8%	460	17,3%	767	24,5%

Comparativo dos Estudos

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Escritura	BP - 2025 Faseado	Atual	Atual vs BP - 2025 Faseado	Δ%
Data Estudo:	novembro-24	setembro-24	julho-25	10 Meses	N/A
Lançamento:	março-25	julho-25	agosto-25	1 Meses	N/A
Uhs:	400	493	493	-	0,0%
Preço Nominal:	215.215	224.992	208.998	(15.994)	-7,1%
Preço Raso:	188.208	196.932	185.707	(11.225)	-5,7%
Preço Nominal Inflacionado:	221.902	244.381	212.280	(32.101)	-13,1%
Preço Raso Inflacionado:	194.055	213.917	188.642	(25.275)	-11,8%
Renda Média:	2.885	2.886	2.745	(141)	-4,9%
VSO:	31	19	38	20	105,4%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	4.177	4.036	4.440	404	10,0%
Avaliação:	217.450	212.581	203.970	(8.611)	-4,1%
Prazo construção F1:	13	14	13	(1)	-7,1%
Prazo de Pró-Soluto F1:	18	19	18	(1)	-5,3%
Custo Total Inf (Unit):	128.528	124.370	121.042	(3.328)	-2,7%
Custo Construção (Unit):	82.977	84.474	84.118	(356)	-0,4%
Fração de construção:	38,6%	37,3%	40,2%	3,0 p.p.	7,9%
INCC Folha Rosto:	1.141,40	1.161,58	1.191,33	30	2,6%
Custo Terreno Inf:	9.368.503	9.501.957	9.780.392	278.435	2,9%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	4.450	3.840	4.665	825	21,5%
Fração do Terreno[1]:	10,4% / 48,9%	8,6% / 46,1%	9,0% / 49,3%	0,4 p.p.	4,7%
Custo de Incorp. por uh:	6.070	0	4.679	4.679	
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	1.450.030	1.989.723	2.188.746	199.023	10,0%
Custo do Ciclo (Unit):	14.799	15.521	14.409	(1.112)	-7,2%
Lucro Imobiliário:	20,0%	23,9%	20,3%	-3,6 p.p.	-15,1%
LI Marginal:	24,6%	27,7%	27,0%	-0,7 p.p.	-2,6%
Exposição de caixa:	17,8%	15,1%	17,5%	2,5 p.p.	16,3%
TIR:	62,9%	64,5%	64,3%	-0,2 p.p.	-0,3%
Margem Bruta REF:	42,8%	49,6%	43,6%	-6,1 p.p.	-12,2%
Margem Bruta Econômica:	39,4%	47,1%	41,4%	-5,7 p.p.	-12,0%
Margem Rasa REF:	34,5%	42,5%	36,5%	-6,0 p.p.	-14,1%
Margem Rasa Econômica:	30,3%	38,8%	33,4%	-5,4 p.p.	-13,8%
Margem Contribuição Econômica:	30,0%	35,5%	29,6%	-5,9 p.p.	-16,5%
Payback Contingente (Régua 21 m):	15 m/ (-5 m)	17 m/ (-4 m)	15 m/ (-6 m)	-2	-11,8%
Payback Consolidado:	15 Meses	17 Meses	15 Meses	-2 Meses	-11,8%

Informações Gerais – Consolidado

Estação Rio Unificado – RJ – Rio de Janeiro Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	set-20							
tipo s/ vaga		ago-25	mar-26	abr-27	7 meses	13 meses	ago-28	36 meses
tipo c/ vaga		ago-25	mar-26	abr-27	7 meses	13 meses	ago-28	36 meses
c/ garden s/ vaga		ago-25	mar-26	abr-27	7 meses	13 meses	ago-28	36 meses
c/ garden c/ vaga		ago-25	mar-26	abr-27	7 meses	13 meses	ago-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	9,31 MM	**Incorrido Terreno:**	0,38 MM	**Área do Terreno (100%):**	12.502 m²	**Área Líquida do Terreno:**	12.502 m²
Cash:	9,31 MM			**Custo de terreno m²:**	744,9	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	744,9
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):**	9,0% / 49,7%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.**	6,0 / 1,6
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,94 MM	**Incorridos de Incorporação:**	2,80 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
tipo s/ vaga	T+4	182.858	414	206.250	199.000	95,9%	83,0%	90,7%
tipo c/ vaga	T+4	205.761	44	228.081	234.000	98,6%	67,8%	60,5%
c/ garden s/ vaga	T+4	192.742	17	215.256	207.000	100,0%	83,0%	70,7%
c/ garden c/ vaga	T+4	217.544	18	241.605	242.000	99,4%	69,7%	54,3%

Unidades Totais:	493	**Preço Médio:**	209.800	**Renda Média:**	2.745	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.024
Unidades Tenda:	493	**Avaliação Média:**	203.970	**Ato:**	1.679 (0,61 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.464
VSO:	38 Unidades	**VGV Total:**	103.431.514	**FGTS:**	2.520 (0,92 Salários)	**Preço Raso Médio:**	186.510
RET Médio:	2,0%	**VGV Tenda:**	103.431.514	**% em RET 1%:**	68%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	1.391

Construção

Custo Total Unit.:	85.430	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	34,10	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**15.271.223**	**LI:**	**19,60%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**17.520.073**	**Margem Bruta Econômica:**	**40,76%**
TIR:	**62,28%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(12.441.963)**	**Margem Bruta REF:**	**42,91%**
Exposição de Caixa:	**16,94%**	**Δ LI:**	**-0,40%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**22.806.822**	**Margem Rasa Econômica:**	**32,68%**
Payback Contingente (21 m):	**16 m/ (-5 m)**	**LI Marginal:**	**26,33%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**32.866.003**	**Margem Rasa REF:**	**35,78%**
Payback Consolidado:	**16 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**29,00%**

DRE (Consolidado)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Estação Rio Unificado		tipo s/ vaga		tipo c/ vaga		c/ garden s/ vaga		c/ garden c/ vaga	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	103.409	100,0%	85.441	100,0%	10.041	100,0%	3.628	100,0%	4.298	100,0%
PIS/COFINS	(1.123)	1,1%	(819)	1,0%	(179)	1,8%	(50)	1,4%	(76)	1,8%
Custo Total	(60.596)	59,2%	(50.811)	60,0%	(5.435)	55,1%	(2.126)	59,4%	(2.225)	52,7%
Custo Terreno	(9.780)	9,6%	(8.213)	9,7%	(873)	8,9%	(337)	9,4%	(357)	8,5%
Custo Relacionados a Terreno	(2.334)	2,3%	(1.962)	2,3%	(207)	2,1%	(80)	2,2%	(85)	2,0%
Custos de Incorporação	(2.310)	2,3%	(1.862)	2,2%	(234)	2,4%	(117)	3,3%	(97)	2,3%
Custo de Construção	(46.171)	45,1%	(38.773)	45,8%	(4.121)	41,8%	(1.592)	44,5%	(1.686)	39,9%
Lucro Bruto Econômico	41.689	40,8%	33.812	40,0%	4.428	44,9%	1.452	40,6%	1.997	47,3%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	41.689	40,8%	33.812	40,0%	4.428	44,9%	1.452	40,6%	1.997	47,3%
Despesas de Selling	(9.644)	9,4%	(7.990)	9,4%	(917)	9,3%	(340)	9,5%	(397)	9,4%
Contingência	(2.378)	2,3%	(1.965)	2,3%	(231)	2,3%	(83)	2,3%	(99)	2,3%
Margem de Contribuição	29.667	29,0%	23.857	28,2%	3.280	33,3%	1.029	28,8%	1.501	35,6%
IR e CSLL	(919)	0,9%	(670)	0,8%	(146)	1,5%	(41)	1,1%	(63)	1,5%
Margem Líquida	28.748	28,1%	23.187	27,4%	3.134	31,8%	988	27,6%	1.439	34,1%
Lucro Bruto REF Unit.	91.429	42,9%	87.790	41,9%	109.575	47,4%	97.719	44,6%	124.823	50,7%
Lucro Raso REF Unit.	67.792	35,8%	64.049	34,5%	86.982	41,7%	74.822	38,1%	100.328	45,2%

R$ Mil - VPL - Compra	Estação Rio Unificado		tipo s/ vaga		tipo c/ vaga		c/ garden s/ vaga		c/ garden c/ vaga	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	77.930	100,0%	64.504	100,0%	7.634	100,0%	2.657	100,0%	3.136	100,0%
PIS/COFINS	(833)	1,1%	(609)	0,9%	(134)	1,8%	(36)	1,3%	(55)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(61.826)	79,3%	(51.672)	80,1%	(5.659)	74,1%	(2.170)	81,7%	(2.324)	74,1%
Custo Terreno	(8.442)	10,8%	(7.089)	11,0%	(753)	9,9%	(291)	11,0%	(308)	9,8%
Custo Relacionados a Terreno	(2.991)	3,8%	(2.514)	3,9%	(265)	3,5%	(103)	3,9%	(109)	3,5%
Custos de Incorporação	(2.419)	3,1%	(1.959)	3,0%	(241)	3,2%	(117)	4,4%	(102)	3,2%
Custo de Construção	(37.737)	48,4%	(31.690)	49,1%	(3.368)	44,1%	(1.301)	49,0%	(1.378)	43,9%
Despesas de Selling	(8.567)	11,0%	(7.105)	11,0%	(826)	10,8%	(294)	11,1%	(341)	10,9%
Contingência	(988)	1,3%	(817)	1,3%	(96)	1,3%	(35)	1,3%	(41)	1,3%
IR e CSLL	(682)	0,9%	(498)	0,8%	(109)	1,4%	(29)	1,1%	(45)	1,4%
Lucro Imobiliário	15.271	19,6%	12.223	18,9%	1.841	24,1%	450	17,0%	757	24,2%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Obrigado!
