Tenda

sua próxima conquista

Book de Escritura e Lançamento

Regional: SP

Projeto: Tucumã

Data Comitê: 08/08/2025

Comitê Digital 04/08/2025 – Tucumã

Nome	Tucumã - Escritura + Lançamento	Observação - Tucumã
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	Ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Rodrigo Osmo	Aprovado	N/A
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Discutir em Comitê	qual o % de unidades que foi considerado como tendo isenção de ITBI no empreendimento? como temos R$2,8 mil de ITBI + emolumentos no consolidado, me leva a crer que temos espaço para uma trava sistêmica para que todas as unidades saiam no teto da isenção de ITBI, de R$235,5 em SP, certo? Acho que para otimizarmos margem e rentabilidade, cabe verificar se vale assumirmos preço teto no limite da isenção, reduzindo variação de preço do projeto (por andar, etc, para que todas as unidades sejam isentas), e melhorando o % de TCD, que está abaixo dos 8% que combinamos para agosto. Me parece que essa combinação de isenção total de ITBI e mais preço via TCD pode melhorar a LI desse projeto sem perda de VSO.
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	Ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok

Pergunta: Luiz Mauricio

Qual o % de unidades que foi considerado como tendo isenção de ITBI no empreendimento? como temos R$2,8 mil de ITBI + emolumentos no consolidado, me leva a crer que temos espaço para uma trava sistêmica para que todas as unidades saiam no teto da isenção de ITBI, de R$235,5 em SP, certo? Acho que para otimizarmos margem e rentabilidade, cabe verificar se vale assumirmos preço teto no limite da isenção, reduzindo variação de preço do projeto (por andar, etc, para que todas as unidades sejam isentas), e melhorando o % de TCD, que está abaixo dos 8% que combinamos para agosto. Me parece que essa combinação de isenção total de ITBI e mais preço via TCD pode melhorar a LI desse projeto sem perda de VSO.

Resposta:

No Tucumã, a VF de lançamento considera 100% das unidades enquadradas na isenção de ITBI (R$ 235,5K), e os R$ 2,8 mil mencionados referem-se somente aos custos de emolumentos. Ao considerar o aumento do preço médio nominal para o teto da isenção de ITBI, ajustando o % de TCD, chegamos no seguinte cenário (CEN 2):

	CEN 1 (COMITÊ)	CEN 2 (RESPOSTA)	CEN 3 (PROPOSTA)
% TCD	7,32%	8,69%	8,01%
TCD	16.979	20.470	18.725
Preço Nominal:	231.994	235.485	233.740
Preço Raso:	215.015	215.015	215.015
ITBI/Emol:	2.757	2.757	2.757
Lucro Imobiliário:	20,05%	20,56%	20,30%

Em alinhamento com o Ciclo, entendemos que o aumento das unidades em R$3.500 no preço nominal faria sentido para 50% das unidades (CEN 3), sendo importante manter o valor nominal de 231k para as unidades mais baixas visto que a concorrência tem praticado preços nominais entre 220k e 226k (Plano Vista do Carmo e Plano Mais Itaquera).

One Page – Tucumã

[1]

Cidade	São Paulo	Mancha de demanda	SP - SZL2 - São Paulo Leste 2
Regional	SP	Cluster MPR	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Real e Aprovação	Tipo de Aprovação	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura e Lançamento	Versão da VF	Versão 1.0: Jul

Unidades (Fases)	530 (1)	CA Máx | Proj	2,3 | 2,0
Unidades com Vaga (%)	0	Escritura | Lançamento	set/25 | set/25
Unidades com Atributo* (%)	0 (0,0%)	Tipologia	F2E - Concreto

[2]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	8.115 (6,6%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (N/A)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	6,6% (100,0%)
Valor R$/m²	1.533	VAR (%VGV)	000 (0,0%)

[3]

Custo Construção (%VGV)	55.992 (45,5%)	Indireto Unit.	20.068
Prazo da Obra (meses)	23	Torre Unit.	55.060
Custo Total Unit. (LPU):	105.646 (93)	Infra Unit.	16.508
Início de Obra	mar-26	Fundação Unit.	8.620

[4]

Preço Nominal Unit.	231.994	VSO	30
Preço Raso Unit.	215.015	Referência	Vision
Avaliação Unit.	241.000	Renda (% em RET 1%)	3.409 (25,0%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		Preço Raso Inf. Médio Unit.	219.325
Preço Inf. Médio Unit.	236.622	Margem Bruta REF (%)	40,8%
Custo Inf. Médio Unit.	140.062	Margem Rasa REF (%)	36,1%



[5]

LI (Régua):	20,1% (20,0%)	Margem Bruta Econômica:	37,1%
LI Marginal:	21,7%	Margem Rasa Econômica:	31,4%
Margem Bruta REF:	40,8%	Margem Contribuição Econômica:	26,3%
Margem Rasa REF:	36,1%	Exposição (% VGV):	10.106 (8,3%)
TIR:	108,0%	VGV Total:	122.957
Payback Contingente (21 m) :	19 m/ (-2 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(7.906)
Payback Consolidado:	19	Ger. Caixa 24 meses (R$):	15.747

*Atributo: Varanda, Garden e Churrasqueira

Destaques

[1] Projeto

O Terreno possui uma área de 8.263m² e está localizado na Av. Adriano Bertozzi, 696, mancha ZL2 de São Paulo, é lindeiro ao empreendimento Tamareiras e está há 50 metros dos empreendimentos Buritis e Jerivás, em uma região com bom atendimento de transporte público. O projeto é composto por 01 condomínio, 01 fase, com um total de 530UH, com a tipologia F2E PCT T+9, totalizando 04 torres, sendo 01 de 16pp, 02 torres de 14pp e 1 de 10PP. Para melhoria de acesso a torres devido aos grandes desníveis foram incluídos elevadores transfer, eliminando a necessidade de rampas.

[2] Condição Comercial: 100% Permuta Financeira

Preço global estimado de R$ 8.000.000,00, sem mínimo garantido, sem correção, sem prazo para quitação e pagos em permuta financeira na fração de 7,5% da receita líquida. Para aferição da receita líquida serão descontados 12% do VGVB, resultando em uma permuta financeira de 6,6% do VGVB. Adiantamento de R$ 250.000,00 da permuta financeira ao proprietário com destinação final ao inquilino como parte do acordo de desocupação do imóvel em Ago/2025. Garantia: Aval Tenda.

[3] Custo

Foi considerado início de obra conforme regra de ouro, 6 meses após o lançamento e PCP 166, a um custo total de R$105.646. Após a engenharia simultânea conseguimos bons resultados reduzindo custos de contenção, terraplanagem e fundação. Foram realizados 23 furos de sondagens, nos trazendo boa previsibilidade nas fundações.

[4] Preço de venda

Adotando a regra de ouro — 18 meses de venda, VSO de 30 unidades e PSOL de 28 meses — o preço foi definido com base nas simulações do Vision. Essa abordagem foi validada anteriormente no Buritis, que atingiu os valores projetados. O cenário real mantém as mesmas premissas do cenário de aprovação.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Faróis Pareceres – TUCUMÃ – ZL3

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico Imobiliário	Pela documentação analisada até o presente momento, não se verificam apontamentos relevantes que tragam impacto no registro da incorporação. Pendente escritura.	Ok	
Jurídico Aquisição	Não temos óbices jurídicos que possam obstar a aquisição. Recomendamos que os débitos de IPTU sejam quitados até a EVC e que os débitos da empresa do coprietário Daniel Ferreira Bykoff sejam monitorados até o pagamento do Saldo do Preço para eventual desconto do valor, caso necessário. Também necessário aguardar o acordo entre os proprietários e locatária para a desocupação imediata do imóvel.	Ok	
Legalização	Sem pendências.	Ok	
Produto	Sem riscos associados.	Ok	
Custos	Quantitativo de Torre (concreto/aço) e Fundação, utilizado de Engenharia de Produto.	Ok com ressalvas	
Logística	Obrigatório prever licença para concretagem pelo viário público.	Ok com ressalvas	
Contratação	Laudo engenharia previsto para 05/08 com pendência de RI e sem pendências em 22/09. Risco previsto para 30/09 e retorno da análise jurídica em 24/09.	Ok	
Inteligência de mercado	I.M. avalia preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	O Ciclo avaliou o preço e o VSO como factíveis.	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos associados.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Localização – Av. Adriano Bertozzi, 696 – Fazenda Caguaçu

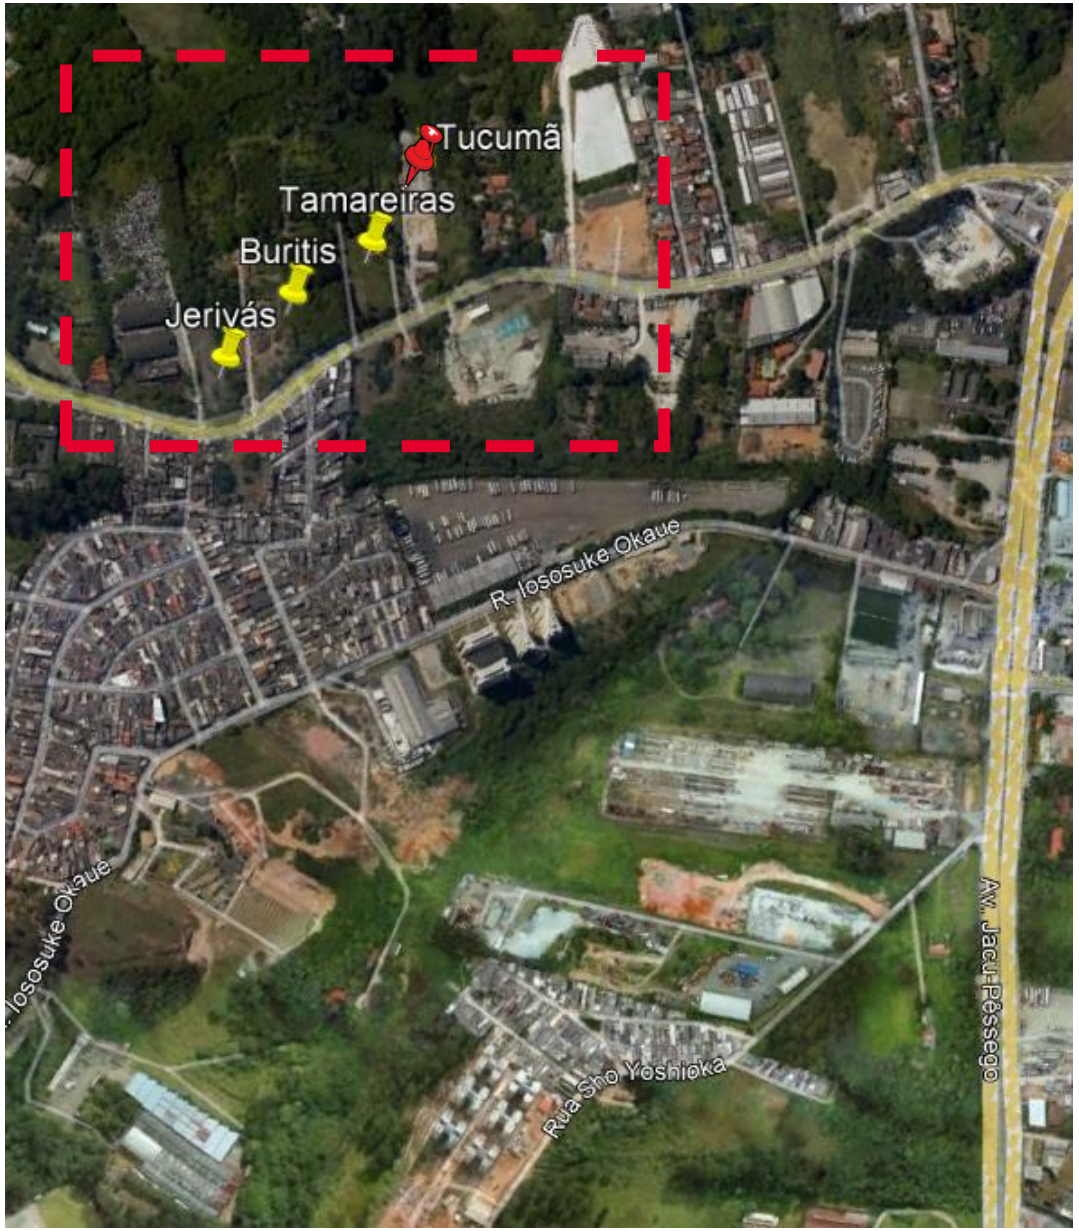

TUCUMÃ

TAMAREIRAS

BURITIS

JERIVÁS

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

• SZL – São Paulo Leste

Lançamento

1. Viva São Miguel
2. Viver Bem | Mais USP Leste
3. Viva Parque do Carmo
4. Reserva das Andorinhas
5. Palermo
6. Óasis Penha

LandBank

7. Residencial Tóquio e Quioto
8. Lar de Itaquera | Sol de Itaquera
9. Viva Azul
10. Tucumã
11. Jerivás
12. Sobral
13. Amarilis
14. Santa Etelvina

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 1 - Vermelho

Região

Capital

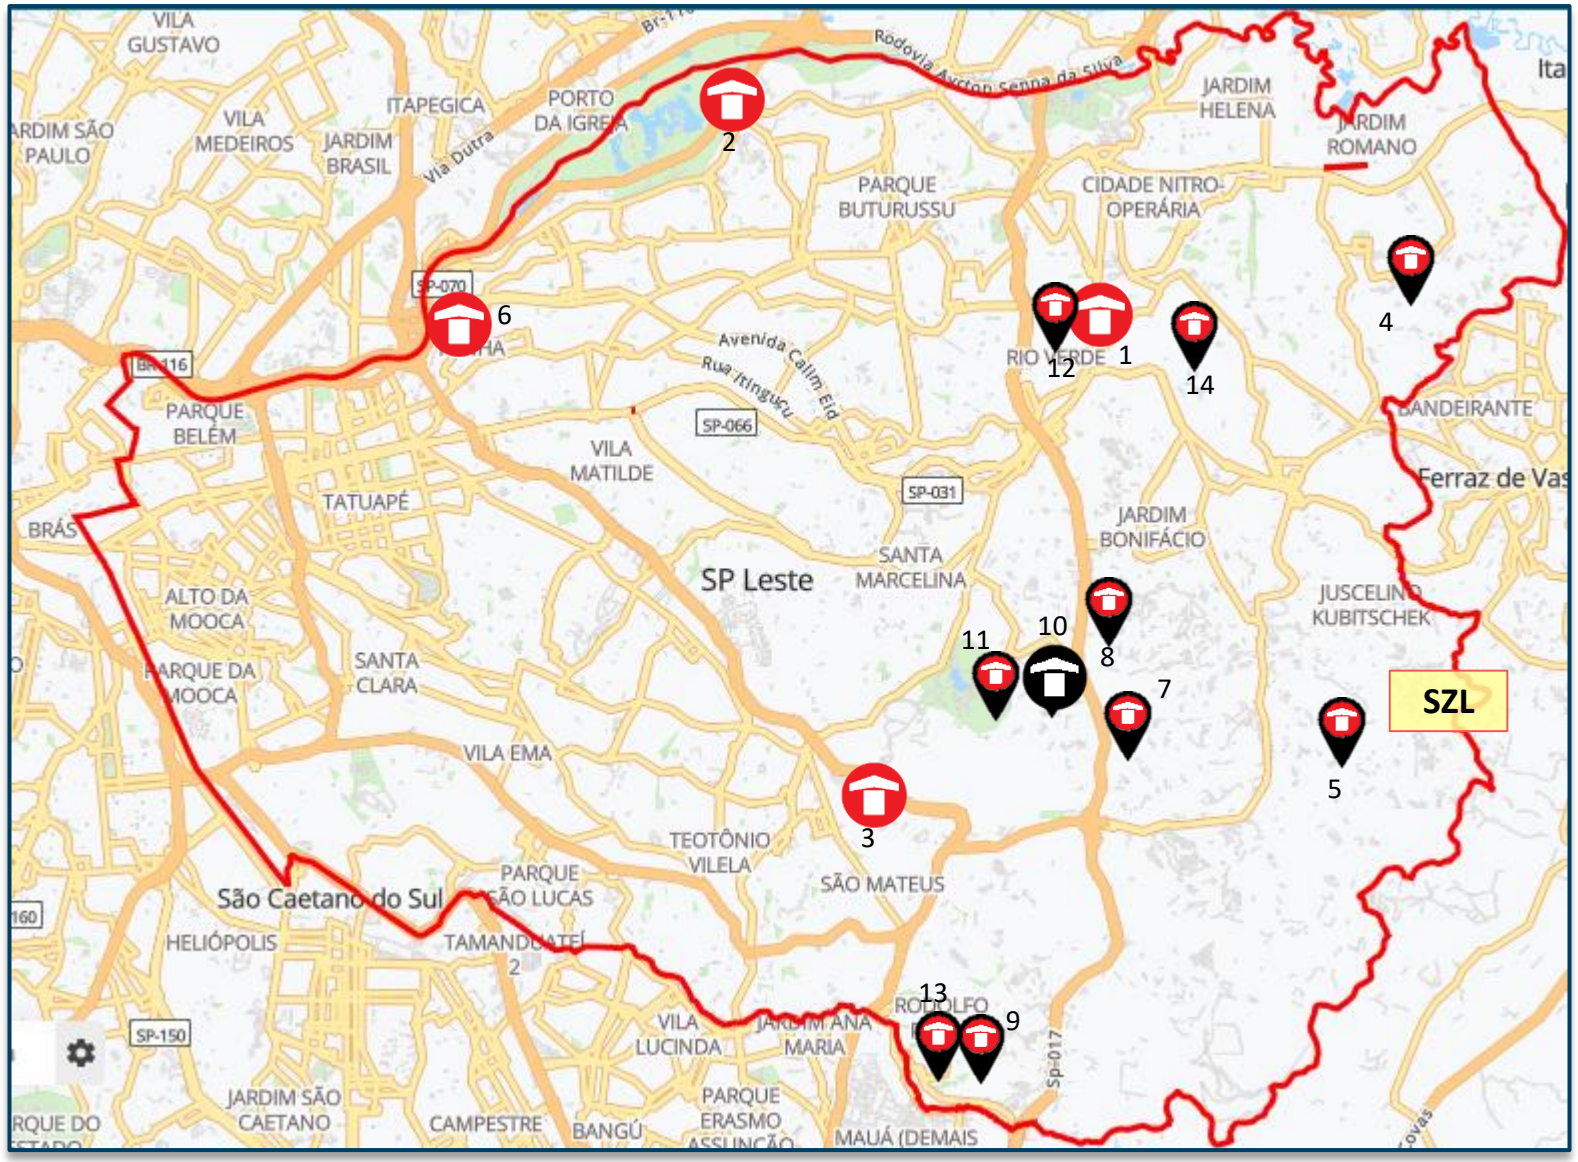

Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Tucumã
Descritivo - Escritura | Lançamento

Informações Gerais		
Terreno	**Área terreno**	8.263,30m²
	Menor poligonal	8.167,13m²
	App/fna	Sim: 2.248,05m² | Sim: 302,46m²
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Não | Não
	Área liquida	6.015,25m²
	Zoneamento	ZPI-1
	Ca máximo + Incentivo HIS	2,25 + 1,13
	Ca máximo Total	3,38
	Ca projetado	2,03
	Ca projetado sem APP	2,78
	Gabarito máximo	28m
Geral	**Total uh**	530
	Total de vagas	2 vagas externas (1 PCD e 1 C/D) (0,38%)

Informações Gerais		
Tipologia	**Tipologia**	Modular com elevador
	Gabarito	T+09
	Lâmina	01 16pp, 02 14pp e 01 10pp
	Área privativa	31,20m², 31,42m² e 31,64m²
	Varanda	-
Condomínio	**Unidade pcd**	16
	Unidade lazer|técnica	10 | 4
	Torre	04
	Fase	Única
Lazer	**Lazer Interno**	5-Sport Bar, 6-Salão de festas Gourmet, 8-Espaço office, 9-Espaço delivery/ minimarket, 11-Espaço Teen, 12-Brinquedoteca, 15-Espaço Saúde e 16-Fitness
	Lazer Externo	1-Praça de chegada, 2-bicicletários, 3- Churrasqueira Gourmet com banheiro e previsão de geladeira, 4-Play baby, 7-Praça de jogos, 10-Multipla estação, 13-Play pet, 14-Play kids

PRODUTO

Empreendimento Tucumã
Atributos de produto - Escritura | Lançamento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**	🟢	
	Percurso do pedestre até torre	🟡	6m de desnível entre a portaria e primeiro platô de torres(blocos 01 e 04) vencidos por escada e elevador, e mais 7m de desnível entre o primeiro e segundo platô de torres (bloco 02 e 03), os dois desníveis vencidos por escada + elevador
Diferencial produto	**Prime**	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	08 Lazeres externos: Churrasqueira Gourmet com banheiro e previsão de geladeira, 02 Plays baby, Espaço Relax, Praça de jogos, Multipla estação, Play Kids e Playpet
	Atributos Torre	Sim	10 Lazeres internos (Sugestão de uso): 03 Salões de festas Gourmet, Espaço delivery/ minimarket, Espaço office, Sport Bar, Espaço Teen, Brinquedoteca, Espaço Saúde e Fitness
	Edifício Garagem	Não	

	Riscos associados	Parecer	Criticidade
Produto	Não há riscos associados	ok	🟢

Portaria com cobogó

Churrasqueira Gourmet com previsão de geladeira

Play kids e play baby

Multipla Estação

PRODUTO

Empreendimento Tucumã
Modulação - Escritura | Lançamento

Fase única: 530uh (sendo 16 PCD) - 02 vagas (Sendo 1 PCD e 1 carga e descarga)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	01 Bloco (T+09)	98Uh (Sendo 3PCD)	02 vagas (Sendo 1 PCD e 1 carga e descarga)	Dos Lazeres estão contemplados no módulo 01 churrasqueira gourmet com banheiro e previsão de geladeira, play baby, espaço relax e praça de jogos, o demais lazeres não foram considerados no módulo 1, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas
Módulo 02	01 Bloco (T+09)	137UH (Sendo 4PCD)	-	Dos Lazeres estão contemplados no módulo 02 a Multipla estação, Play Kids, Play baby e play pet
	01 Bloco (T+09)	138UH (Sendo 4PCD)	-	-
	01 Bloco (T+09)	157UH (Sendo 5PCD)	-	-

* Módulo 1 (bloco 1) foi mantido conforme aprovação Caixa para garantir contratação imediata para o lançamento, o módulo 2 será ajustado para contratação em Out/25 com a unificação dos blocos 2, 3 e 4.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Condições do Negócio – TUCUMÃ – ZL3

CONDIÇÃO VIGENTE E COM FORMALIZAÇÃO NA MINUTA DE ESCRITURA COM PREVISÃO DE ASSINATURA NA 1A SEMANA DE SET/25

- **VALOR DO NEGÓCIO**
  - 530UH
  - R$ 8.000.000,00
  - R$ 979/m² área bruta

- **CONDIÇÃO**
  - 100% Permuta Financeira

- **FORMA DE PAGAMENTO**
  - Preço global estimado de R$ 8.000.000,00, sem mínimo garantido, sem correção, sem prazo para quitação e pagos em permuta financeira na fração de 7,5% da receita líquida. Para aferição da receita líquida serão descontados 12% do VGVB, resultando em uma permuta financeira de 6,6% do VGVB.
  - Adiantamento de R$ 250.000,00 da permuta financeira ao proprietário e com destinação final ao inquilino como parte do acordo de desocupação do imóvel em Ago/2025 - Solução adotada para viabilizar a desocupação.
  - Possível descontar até R$100.000,00 de eventuais remediações ambientais necessárias à consecução do negócio.

- **PRAZOS CONTRATUAIS**
  - Etapa I – Até 90 dias da assinatura do CVC (Assinada em FEV/2023) e prorrogações, para cumprimentos das resolutivas jurídicas exclusivamente. **SUPERADO**
  - Etapa II - Em até 24 meses após a superação da etapa I para apresentação de termo de renúncia e distrato do locatário, matrícula com regularização da cadeia dominial, aprovação de projeto, contratação CEF e viabilidade técnica e financeira. **Prev. SET/25**

- **GARANTIAS**
  - AVAL TENDA

- **ALTERAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS**
  - Alteração da cláusula do preço, prevendo a antecipação do valor para desocupação do imóvel, que será descontado nas primeiras parcelas da permuta financeira

- **ESCRITURA**
  - Até 24 meses da superação das condições resolutivas Etapa "I". **Prev. SET/25**

- **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA**
  - R$350.000,00, pagos em 05 parcelas mensais e reajustáveis pelo IPCA/IBGE a partir da superação de todas as resolutivas da CVC e assinatura da ECV.

Condições do Negócio – TUCUMÃ – ZL3

CONDIÇÃO ANTERIOR DO 1° ADITAMENTO ASSINADO EM DEZ/2023 PARA ATESTAR A SUPERAÇÃO DA ETAPA 1 DE RESOLUTIVAS E O AUMENTO NO NÚMERO DE UNIDADES

- **VALOR DO NEGÓCIO**
  - 530UH
  - R$ 8.000.000,00
  - R$ 979/m² área bruta

- **CONDIÇÃO**
  - 100% Permuta Financeira

- **FORMA DE PAGAMENTO**
  - Preço global estimado de R$ 8.000.000,00, sem mínimo garantido, sem correção, sem prazo para quitação e pagos em permuta financeira na fração de 7,5% da receita líquida. Para aferição da receita líquida serão descontados 12% do VGVB, resultando em uma permuta financeira de 6,6% do VGVB.
  - Primeiro pagamento previsto para o 5° dia útil do 10° mês após o lançamento.
  - Possível descontar até R$100.000,00 de eventuais remediações ambientais necessárias à consecução do negócio.

- **PRAZOS CONTRATUAIS**
  - Etapa I – Até 90 dias da assinatura do CVC (Assinada em FEV/2023) e prorrogações, para cumprimentos das resolutivas jurídicas exclusivamente.
  - Etapa II - Em até 24 meses após a superação da etapa I para apresentação de termo de renúncia e distrato do locatário, matrícula com regularização da cadeia dominial, aprovação de projeto, contratação CEF e viabilidade técnica e financeira.

- **GARANTIAS**
  - AVAL TENDA

- **ALTERAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS**
  - Inclusão do novo preço global estimado de R$ 8.000.000,00 proveniente do projeto mais otimizado de 530UH.

- **ESCRITURA**
  - Até 24 meses da superação das condições resolutivas Etapa “I”.

- **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA**
  - R$350.000,00, pagos em 05 parcelas mensais e reajustáveis pelo IPCA/IBGE a partir da superação de todas as resolutivas da CVC e assinatura da ECV.

Condições do Negócio – TUCUMÃ – ZL3

CONDIÇÃO ANTERIOR DO CONTRATO ASSINADO EM FEV/23

- **VALOR DO NEGÓCIO**
  - 432UH
  - R$ 7.000.000,00
  - R$ 857/m² área bruta

- **CONDIÇÃO**
  - 100% Permuta Financeira

- **FORMA DE PAGAMENTO**
  - Preço global estimado de R$ 7.000.000,00, sem mínimo garantido, sem correção, sem prazo para quitação e pagos em permuta financeira na fração de 8,5% da receita líquida. Para aferição da receita líquida serão descontados 12% do VGVB, resultando em uma permuta financeira de 7,48% do VGVB.
  - Primeiro pagamento previsto para o 5° dia útil do 10° mês após o lançamento.
  - Possível descontar até R$100.000,00 de eventuais remediações ambientais necessárias à consecução do negócio.

- **PRAZOS CONTRATUAIS**
  - Etapa I – Até 90 dias da assinatura do CVC (Assinada em FEV/2023) e prorrogações, para cumprimentos das resolutivas jurídicas exclusivamente.
  - Etapa II - Em até 24 meses após a superação da etapa I para apresentação de termo de renúncia e distrato do locatário, matrícula com regularização da cadeia dominial, aprovação de projeto, contratação CEF e viabilidade técnica e financeira.

- **GARANTIAS**
  - AVAL TENDA

- **ESCRITURA**
  - Até 24 meses da superação das condições resolutivas Etapa “I”.

- **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA**
  - R$350.000,00, pagos em 05 parcelas mensais e reajustáveis pelo IPCA/IBGE a partir da superação de todas as resolutivas da CVC e assinatura da ECV.

➢ **CONDIÇÕES RESOLUTIVAS:**

I – ETAPA I: Em até 90 (noventa) dias contados da data de assinatura deste contrato e prorrogações

i. a não apresentação da documentação e/ou esclarecimentos indicados nas Cláusulas 3.1, 3.2, 3.2.1 e 3.4 e no ANEXO I pelos VENDEDORES no prazo ali indicado ou a existência de qualquer apontamento nos documentos e certidões forenses que objetive, onere e/ou possa trazer vício à cadeia dominial do Imóvel e/ou possam reduzir os VENDEDORES e/ou INTERVENIENTE ANUENTE ao estado de insolvência civil, ou que traga insegurança jurídica na operação objeto deste instrumento, a exclusivo critério da COMPRADORA; **SUPERADO**

ii. a constatação, pela COMPRADORA, a seu exclusivo critério, da inviabilidade do registro das Cartas de Arrematação e da Escritura de Partilha; **SUPERADO**

iii. a não apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União de Imóvel Rural relativa ao Imóvel; **SUPERADO**

➢ **CONDIÇÕES RESOLUTIVAS:**

II– ETAPA II: Em até 24 (vinte e quatro) meses contados da superação das resolutivas ETAPA 1

iv. a não apresentação do termo de renúncia ao direito de preferência pela Locatária nos termos da minuta anexa ao presente instrumento; **SUPERADO**

v. a não apresentação pelos VENDEDORES da matrícula atualizada do Imóvel contemplando o registro das cartas de arrematação e da escritura de partilha, de modo que 100% (cem por cento) do Imóvel esteja em nome dos VENDEDORES e inteiramente livre e desembaraçado de ônus e gravames de quaisquer naturezas; **SUPERADO**

vi. a não apresentação de distrato formalizando a rescisão do Contrato de Locação, garantindo a desocupação efetiva do Imóvel de modo que este esteja apto a ser entregue inteiramente livre de pessoas e coisas na forma do presente instrumento; **Prev. AGO/25**

vii. a existência de ação de desapropriação e/ou declaração de utilidade pública que objetive o Imóvel ou parte dele; **SUPERADO**

viii. a existência de cadastro como imóvel tombado e/ou em processo de tombamento e/ou em áreas envoltórias, no IPHAN, CONDEPHAAT ou CONPRESP, que impossibilitem a adequada consecução do Empreendimento Imobiliário; **SUPERADO**

ix. a impossibilidade da realização do estudo de passivo ambiental ou a existência de qualquer tipo de contaminação do solo, subsolo e águas do Imóvel, bem como qualquer outro tipo de passivo ambiental e/ou impossibilidade de remoção de árvores que comprometam o Empreendimento que a COMPRADORA pretende desenvolver no Imóvel; **SUPERADO**

x. a existência de óbice à consecução, no Imóvel, do Empreendimento imobiliário almejado pela COMPRADORA; **SUPERADO**

xi. a não viabilidade das redes de água e esgoto existentes no local, que sejam tidas como insuficientes a garantir a vazão necessária às unidades autônomas que comporão o Empreendimento pretendido; **SUPERADO**

xii. a não viabilidade de rede elétrica para abastecimento do futuro Empreendimento; **SUPERADO**

➢ **CONDIÇÕES RESOLUTIVAS:**

II– ETAPA II: Em até 24 (vinte e quatro) meses contados da superação das resolutivas ETAPA 1

xiii. o não aperfeiçoamento de uma ou mais condições resolutivas, relativas ao terreno e ao Empreendimento, abaixo relacionadas: a) Análise da viabilidade técnica e financeira do Empreendimento. b) Análise da viabilidade comercial do Empreendimento. c) Apuração de condições técnica e eventualmente impeditivas do Imóvel; d) Análise jurídica da documentação do terreno e demais pessoas que serão analisadas, nos termos da cláusula 3.1, supra; **SUPERADO**

xiv. caso o gabarito de altura pretendido para o Empreendimento pretendido não seja aprovado no DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) e COMAER (Comando da Aeronáutica); **SUPERADO**

xv. caso o presente negócio não seja aprovado pelo Comitê de Investimento; **SUPERADO**

xvi. caso seja constatada pela COMPRADORA a existência de terceiros ocupantes nos Imóveis, existindo pessoas e coisas, que impeçam a transferência da posse para a COMPRADORA de forma inteiramente livre e desimpedida, nos termos previstos no presente instrumento; **Prev. AGO/25**

xvii. a não aprovação nos termos da legislação vigente do projeto do Empreendimento junto à Prefeitura Municipal e demais órgãos competentes, necessários para viabilizar sua edificação; **SUPERADO**

xviii. a não contratação de financiamento pela instituição financeira para construção do Empreendimento, consoante os termos e condições do Programa do Governo Federal Casa Verde e Amarela (PCVA), ou qualquer outro programa que venha a substituí-lo, inclusive por força da alteração do cenário jurídico constatado no âmbito da auditoria jurídica anteriormente realizada, a ser novamente verificado por meio da análise dos documentos e certidões em nome dos VENDEDORES e do Imóvel atualizados com 30 (trinta) dias de antecedência para a outorga da escritura de compra e venda do Imóvel, nos termos da cláusula 3.5, supra; **Prev. SET/25**

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Implantação

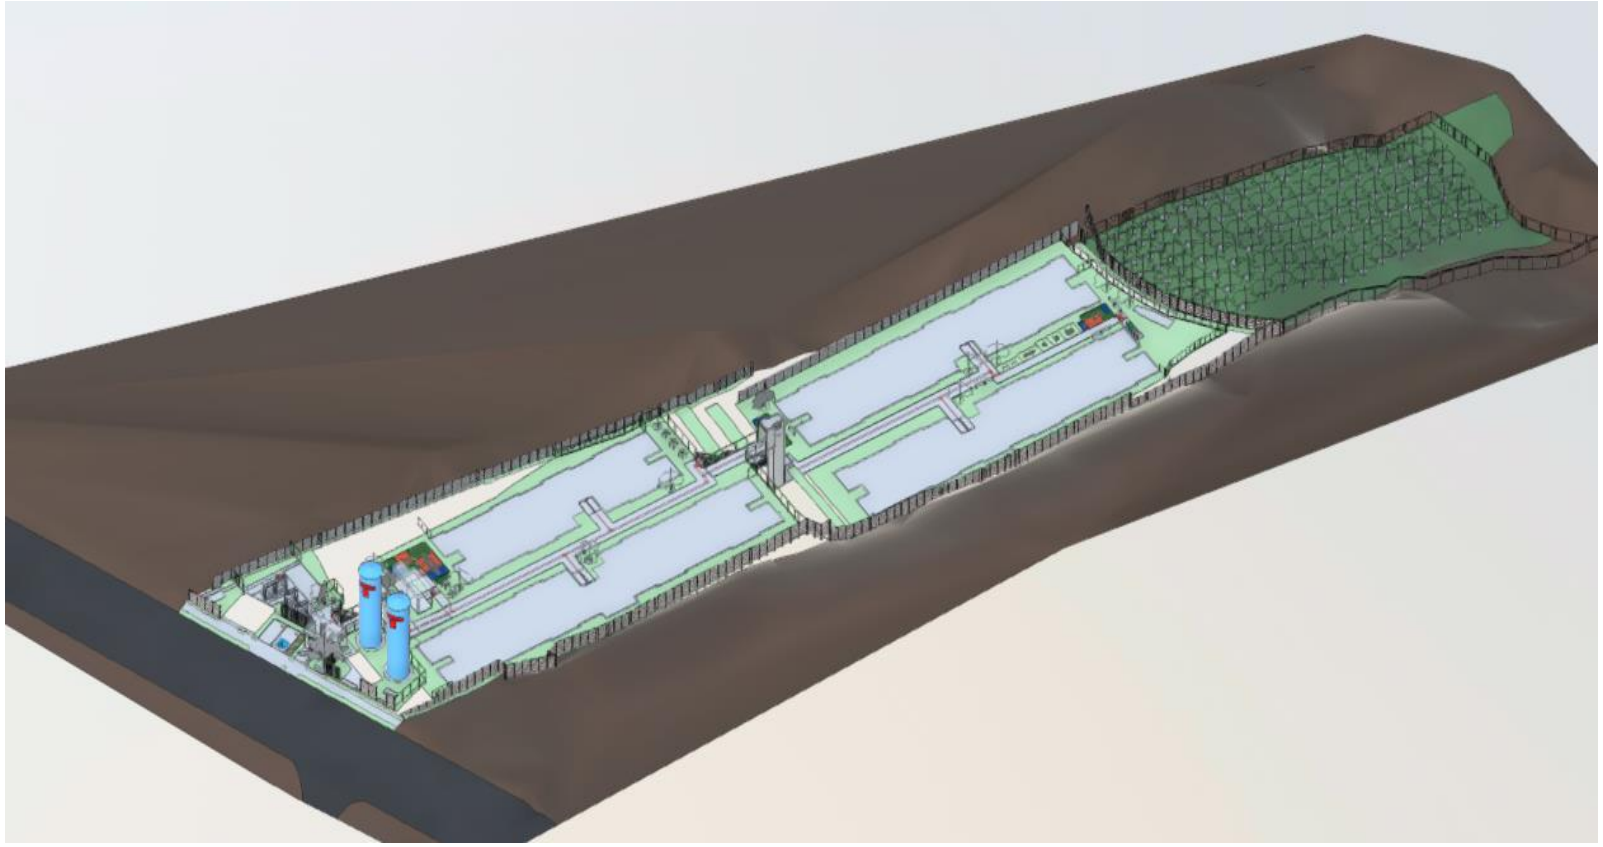

TUCUMÃ

01 Torre 10PP | T+09
02 Torres 14PP | T+09
01 Torre 16PP | T+09

540 | Á Construir
530 | U.H

Custo de Construção

	TUCUMÃ REV. 03.1	TUCUMÃ VER.02	TUCUMÃ BP 2025
Torres	4	4	4
Unidades Construídas	530	530	540
Unidades Vendidas	530	530	530
Condomínios (qta.)	1	1	1
Cidade	São Paulo - SP	São Paulo - SP	São Paulo - SP
Produto / Selo	F2E CT	F2E CT	F2E CDW
Tipologia	1 Torre | T+09 | 10PP | C1A	1 Torre | T+09 | 10PP | C1A	1 Torre | T+09 | 10PP
Tipologia	2 Torres | T+09 | 14PP | C1A	2 Torres | T+09 | 14PP | C1A	2 Torres | T+09 | 14PP
Tipologia	1 Torre | T+09 | 16PP | C1B	1 Torre | T+09 | 16PP | C1B	1 Torre | T+09 | 16PP
Projeto Infra	EP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	julho-25	abril-25	outubro-24
Incc	1.199,509	1.178,386	1.134,775
LVS	junho-25	fevereiro-25	
Indiretos	junho-25	março-25	
Base de Preço	LPU 93	LPU 89	
Takt	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	23	23	24
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 103.827	R$ / UND R$ 103.915	R$ / UND R$ 104.372
Indireto	R$ 20.068	R$ 19.910	R$ 19.635
Torre	R$ 55.060	R$ 55.301	R$ 54.202
Infra	R$ 16.508	R$ 16.460	R$ 15.251
Fundação	R$ 8.620	R$ 8.680	R$ 9.574
EEE	R$ 434	R$ 434	R$ 665
ETE			
Contenção	R$ 2.282	R$ 2.275	R$ 3.895
Terraplenagem	R$ 855	R$ 855	R$ 1.151
CUSTO TOTAL II	R$ 1.819	R$ 1.819	R$ 2.020
Urbanização			
Drenagem	R$ 739	R$ 739	R$ 650
Extensão de Rede Elétrica	R$ 283	R$ 283	R$ 421
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 797	R$ 797	R$ 949
CUSTO TOTAL III			
Incorridos			
CUSTO TOTAL IV			
Aprendizado			
CUSTO TOTAL V		R$ 1.895	R$ 6.069
Atualização por INCC		R$ 1.895	R$ 6.069
CUSTO TOTAL I+II	R$ 105.646	R$ 104.349	R$ 106.392
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 105.646	R$ 107.629	R$ 112.461

Custo de Construção

	TUCUMÃ REV. 03.1	TUCUMÃ VER.02	
Torres	4	4	
Unidades Construídas	540	540	
Unidades Vendidas	530	530	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	São Paulo - SP	São Paulo - SP	
Produto / Selo	F2E CT	F2E CT	
Tipologia	1 Torre | T+09 | 10PP | C1A	1 Torre | T+09 | 10PP | C1A	
Tipologia	2 Torres | T+09 | 14PP | C1A	2 Torres | T+09 | 14PP | C1A	
Tipologia	1 Torre | T+09 | 16PP | C1B	1 Torre | T+09 | 16PP | C1B	
Projeto Infra	EP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	julho-25	abril-25	
Incc	1199,509	1178,386	
LVS	junho-25	fevereiro-25	
Indiretos	junho-25	março-25	
Base de Preço	LPU 93	LPU 89	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	23	23	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 103.827	R$ / UND R$ 103.915	DIF -R$ 88
Indireto	R$ 20.068	R$ 19.910	R$ 158
Torre	R$ 55.060	R$ 55.301	-R$ 241
Infra	R$ 16.508	R$ 16.460	R$ 47
Fundação	R$ 8.620	R$ 8.680	-R$ 59
EEE	R$ 434	R$ 434	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 2.282	R$ 2.275	R$ 6
Terrapplenagem	R$ 855	R$ 855	R$ 0
CUSTO TOTAL II	R$ 1.819	R$ 1.819	R$ 0
Urbanização	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Drenagem	R$ 739	R$ 739	R$ 0
Extensão de Rede Eletrica	R$ 283	R$ 283	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 797	R$ 797	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 1.895	
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 1.895	-R$ 1.895
CUSTO TOTAL	R$ 105.646	R$ 107.629	-R$ 1.983

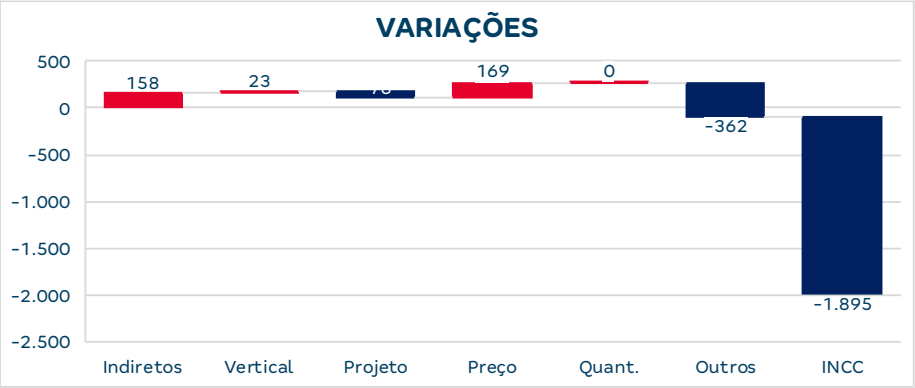

INDIRETOS
+262 | Container verticalizado

VERTICAL
+23 | Retroalimentação

PROJETO
+473 | Fundação (projeto de estacas hélice)
-581 | Lajão x Baldrame

PREÇO
+274 | Concreto/Aço

OUTROS
-430 | Inst. Torre

INCC
-1.1895 | Atualização INCC

Custo de Construção

	TUCUMÃ REV. 03.1	TUCUMÃ BP 2025
Torres	4	4
Unidades Construídas	530	540
Unidades Vendidas	530	530
Condomínios (qta.)	1	1
Cidade	São Paulo - SP	São Paulo - SP
Produto / Selo	F2E CT	F2E CDW
Tipologia	1 Torre | T+09 | 10PP | C1A	1 Torre | T+09 | 10PP
Tipologia	2 Torres | T+09 | 14PP | C1A	2 Torre | T+09 | 14PP
Tipologia	1 Torre | T+09 | 16PP | C1B	1 Torre | T+09 | 16PP
Projeto Infra	AP	
Projeto Torre	AP	
Mês Base	julho-25	outubro-24
Incc	1191,327	1134,775
LVS	maio-25	
Indiretos	abril-25	
Base de Preço	LPU 92	
Takt	2x2	2x2
Prazo (mês)	23	24

CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 103.827	R$ / UND R$ 104.372	DIF -R$ 545
INDIRETO	R$ 20.068	R$ 19.635	R$ 433
TORRE	R$ 55.060	R$ 54.202	R$ 859
INFRA	R$ 16.508	R$ 15.251	R$ 1.257
FUNDAÇÃO	R$ 8.620	R$ 9.574	-R$ 954
EEE	R$ 434	R$ 665	-R$ 231
ETE	R$ 0		R$ 0
CONTENÇÃO	R$ 2.282	R$ 3.895	-R$ 1.614
TERRAPLENAGEM	R$ 855	R$ 1.151	-R$ 295
CUSTO TOTAL II	R$ 1.819	R$ 2.020	-R$ 201
VIÁRIO	R$ 0	R$ 0	R$ 0
DRENAGEM	R$ 739	R$ 650	R$ 88
EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	R$ 283	R$ 421	-R$ 138
EXTENSÃO DE REDE HIDRÁULICA	R$ 797	R$ 949	-R$ 152
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	
INCORRIDOS	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	
APRENDIZADO	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 6.069	
ATUALIZAÇÃO POR INCC	R$ 0	R$ 6.069	-R$ 6.069
CUSTO TOTAL	R$ 105.646	R$ 112.461	-R$ 6.815

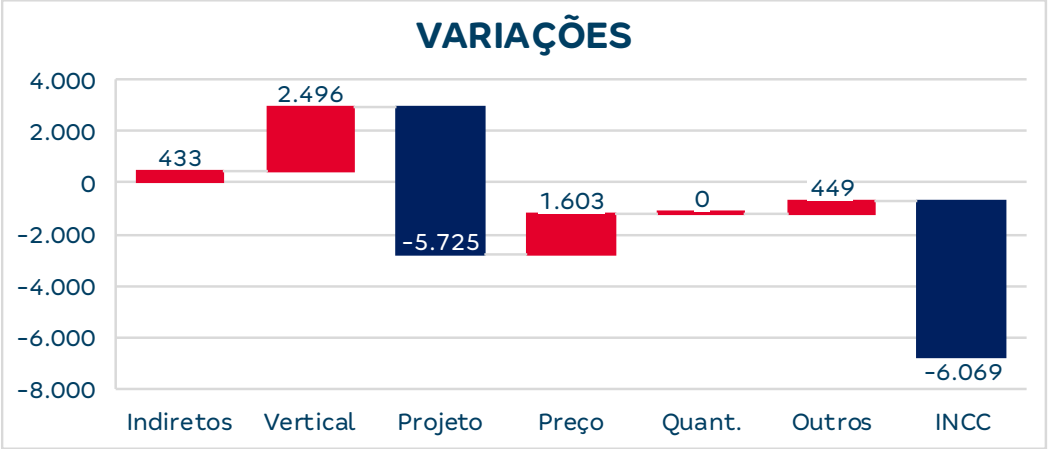

INDIRETOS
+223 | G19 – Caçambas
+262 | Container verticalizado

VERTICAL
+2.496 | Retroalimentação

PROJETO
-194 | Enterrados
-231 | EEE
-295 | Terraplenagem
-349 | Esq. Ferro Infra
-641 | Reservatório
-954 | Fundação
-1.617 | Contenção
-3.600 | G39 (CDW x CT)
+2.125 | Concreto e Aço Torre

PREÇO
+706 | Cotação Elevador Externo
+157 | Esq. Alumínio
+462 | Limpeza Torre
+274 | Concreto/Aço
-138 | Extensão de Rede Elétrica

OUTROS
+431 | Paisagismo
+1.052 | Inst. Infra
-1.216 | Inst. Torre

INCC
-6.069 | Atualização INCC

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Considerado extensão de água de 38m na Avenida Adriano Bertozzi. Tubo Ø315mm PEAD.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Considerado ligação na rede existente em frente ao empreendimento na Avenida Adriano Bertozzi de 10m em Tubo PVC OCRE Ø200mm VCA.

SISTEMA DE DRENAGEM
Considerado lançamento pela FNA, com escada hidráulica de 57m.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento feito através de GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Considera ligação na porta.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
N/A.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 2
Esgoto	Nível 2
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 5
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Projeto Aprovado.

Esgoto:
- Projeto Aprovado.

Drenagem:
- Considerado lançamento pela FNA, com escada hidráulica de 57m.

Elétrica:
- No pedido de ligação definitiva a concessionária pode vir a cobrar reformas necessárias, caso a infraestrutura existente não seja suficiente.

Gás:
- N/A

Urbanização:
- N/A.

Logística



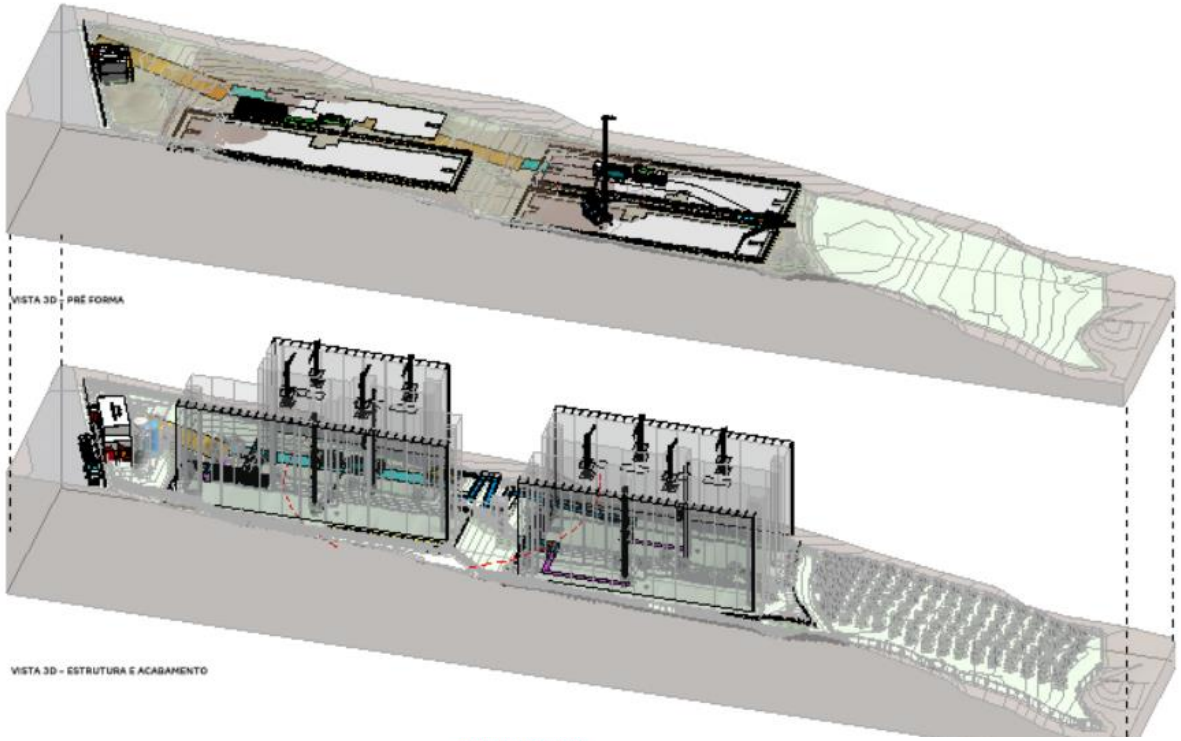

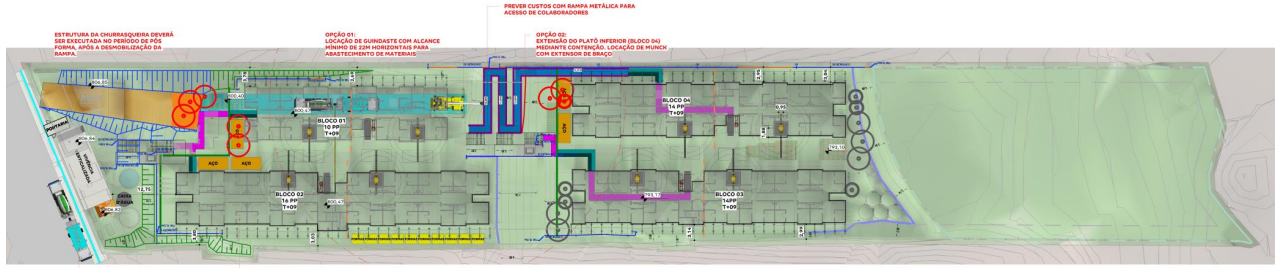



VIVENCIA - CONTAINERS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	CÓDIGO ORÇAMENTO
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO COM SANITÁRIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERÍODO	-	-	
CONTAINER VIVENCIA VERTICALIZADA (LOG)	CONSIDERAR 17 MÓDULOS DE CONTAINERS E 1 ESCADA PARA ACESSO (SENDO 6 NO PAVT., 6 NO PAV 1 E 5 NO ULTIMO PAV.)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	

TENDAS_PERÍODOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	CÓDIGO ORÇAMENTO
TENDA ARMADOR (LOG)	1	3,00	7,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	
TENDA LAZER (LOG)	1	4,00	2,50	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	CÓDIGO ORÇAMENTO
_TENDA_ESCAVADEIRA (LOG)							
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_RD1	<varia>	-	-	-	TODO PERÍODO	-	
CREMALHEIRA PCT (LOG)	2 EQUIP	1 MOB POR EQUIPAMENTO	1 DESMOB POR EQUIP	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
GUINDASTE (LOG)	1 EQUIP	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO				
MINIGRUA (LOG)	2 EQUIP	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-	
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIP	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-	

LOG_ANDAIME

EQUIPAMENTO	QUANT.	MEDIDAS	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	CÓDIGO ORÇAMENTO
ANDAIME (LOG)	1		TODO PERÍODO	-	-	

Logística

TUCUMÃ- SP

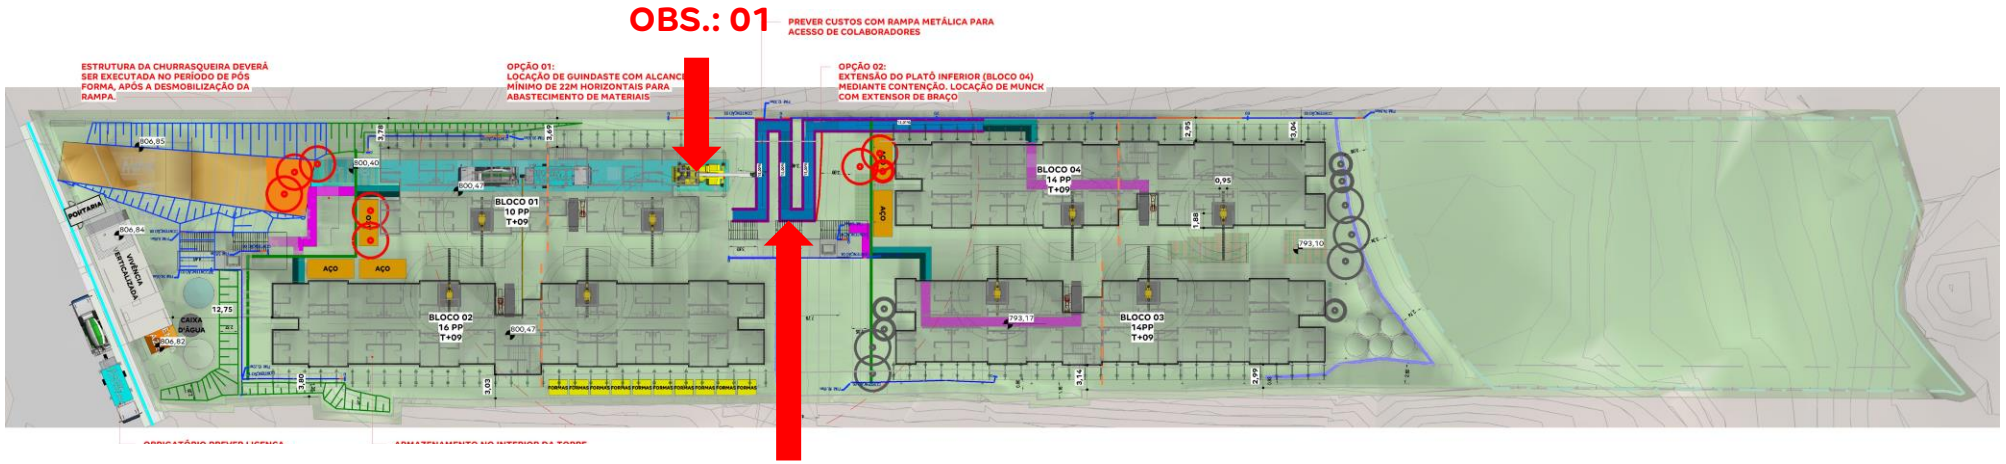

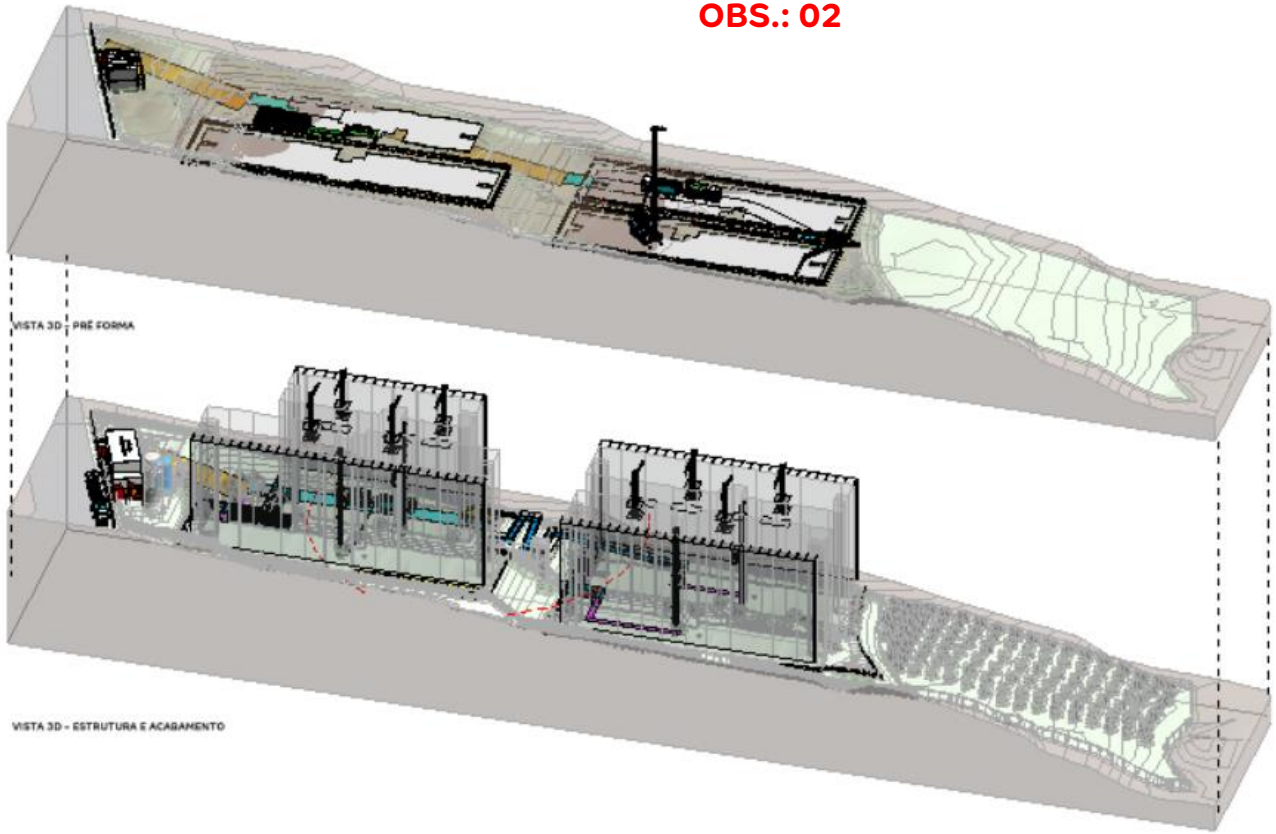

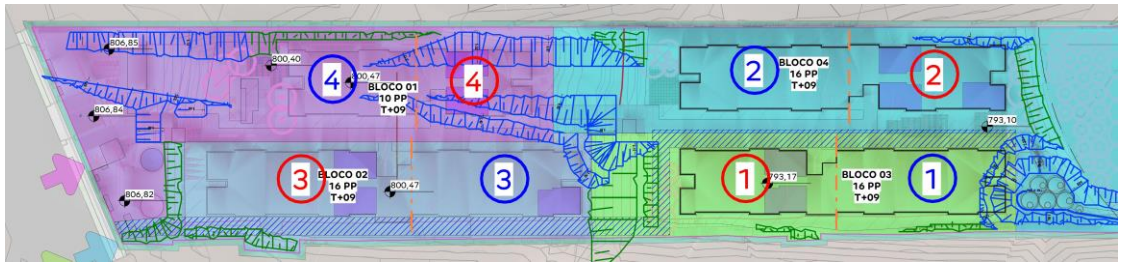

➢ OBS. 01	PREVER CUSTOS COM LOCAÇÃO DE GUINDASTE FIXO PARA ABASTECIMENTO DE MATERIAIS NO PLATÔ INFERIOR NO PERÍODO DE ESTRUTURA DOS BLOCOS 03 E 04.
➢ OBS. 02	PREVER CUSTOS COM RAMPA METÁLICA PARA ACESSO DE COLABORADORES AO PLATÔ DOS BLOCOS 03 E 04
➢ OBS. 03	RAMPA PROVISÓRIA NECESSÁRIA PARA ACESSO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DAS CONTENÇÕES E FUNDAÇÕES DAS TORRES.

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CUSTOS COM LOCAÇÃO DE GUINDASTE OU MUNCK FIXO PARA ABASTECIMENTO DE MATERIAIS NOS BLOCOS 03 E 04. PREVER CUSTOS COM RAMPA METÁLICA PARA ACESSO DE COLABORADORES AO PLATÔ DOS BLOCOS 03 E 04.
➢ **LEGALIZAÇÃO**	PREVISTO FAIXA DE TRABALHO DE 3,00m, CONFORME INDICADO NO PARECER, PARA EXECUÇÃO DO FECHAMENTO DO CONDOMÍNIO NA APP. LEGALIZAÇÃO DEVERÁ PREVER O LICENCIAMENTO. NECESSÁRIO PREVER TALUDES PROVISÓRIOS E FAIXAS DE TRABALHO (PASSAGEM DE VEÍCULO E DEPÓSITO DE MATERIAL ESCAVADO) PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS REDES PREVISTAS EM PROJETO.CASO AS FAIXAS DE TRABALHO AVANCEM SOBRE A DIVISA, ÁRVORES A PRESERVAR, APP OU ÁREAS RESTRITAS, CONSULTAR LEGALIZAÇÃO PARA LICENCIAMENTO DE FAIXA DE INTERVENÇÃO E/OU SUPRESSÃO, OU AVALIAR MELHOR SOLUÇÃO TÉCNICA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS REDES, CONTENÇÕES E TANQUES. O CÁLCULO DA FAIXA DE TRABALHO VARIA EM FUNÇÃO DA PROFUNDIDADE DA REDE EM RELAÇÃO AO PERFIL NATURAL DO TERRENO, CONFORME DIRETRIZ DE LOGÍSTICA PARA FAIXA DE TRABALHO. NECESSÁRIO UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE CALÇADA, DURANTE TODO O PERÍODO DE OBRAS. PREVER LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DO VIÁRIO PÚBLICO DURANTE AS CONCRETAGENS (FUNDAÇÕES E ESTRUTURA), CONFORME APRESENTADO (PREVISÃO CONFORME PLANO DIRETOR). PREVER LICENÇA PARA IÇAMENTO DO CASTELO PELO VIÁRIO PÚBLICO.
➢ **NEGÓCIOS**	CONCRETAGEM DAS TORRES SERÁ EM DESACORDO COM A MODULAÇÃO DA CEF. NEG: Para otimizar o cenário de ordem de concretagem das torres, na contratação junto a CEF faremos a unificação dos módulos 02, 03 e 04, sendo assim Modulo 01 – Bloco 01 e Modulo 02: Blocos 02, 03 e 04.
➢ **PRAZO DE OBRA**	DEVIDO À COMPLEXIDADE DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO, O PERÍODO DE PRÉ-FORMA POSSÍVELMENTE TERÁ UM PRAZO MAIS LONGO QUE O PADRÃO.

PCP 166

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI	Folga Inicio	Folga Aptidão	Folga Cliente	Carência CEF
Connect Jockey	set/25	708	2	A	02/04/26	29/09/26	11/10/26		06/05/27	18/05/27		mar/28	6,64	5,97	6,10	NC
Tucumã	out/25	530	2	G	29/03/26	19/10/26	17/11/26		05/04/27	04/05/27		mar/28	5,52	5,52	7,13	NC
Residencial Quioto	jun/26	691	2	G	13/11/26	06/04/27	05/05/27		11/11/27	10/12/27		out/28	5,52	5,52	8,07	NC
Life Jaguaré - F2	jun/26	685	2	A	01/01/27	07/05/27	19/05/27		06/12/27	18/12/27		out/28	6,69	6,69	8,07	NC
Bela Vista Jaraguá - F1	out/26	480	2	G	16/05/27	12/11/27	11/12/27		12/04/28	11/05/28		mar/29	7,13	7,13	7,13	NC
Villagio Università Paço das Artes - F1	nov/26	301	2	A	06/08/27	07/12/27	19/12/27		10/03/28	22/03/28		jan/29	8,82	8,82	10,10	NC
Jerivas	mar/27	903	2	A	11/08/27	11/03/28	23/03/28		17/12/28	29/12/28		out/29	4,98	4,98	5,03	NC
Nilo Cairo - F1	jun/27	606	2	G	19/10/27	13/04/28	12/05/28		22/10/28	20/11/28		set/29	4,23	4,23	9,10	NC
Acédio	nov/27	986	2	G	27/03/28	23/10/28	21/11/28		01/09/29	30/09/29		jul/30	4,46	4,46	4,07	NC
Residencial Tóquio	dez/27	668	2	A	27/06/28	18/12/28	30/12/28		13/07/29	25/07/29		mai/30	6,97	15,13	7,13	NC
Bela Vista Jaraguá - F2	mar/28	461	2	A	15/01/29	14/07/29	26/07/29		04/12/29	16/12/29		out/30	10,21	10,21	5,03	NC
Villagio Università Paço das Artes - F2	abr/28	501	2	G	13/02/29	02/09/29	01/10/29		08/02/30	09/03/30		jan/31	10,14	10,14	2,97	NC
Nilo Cairo - F2	dez/28	303	2	A	11/07/29	05/12/29	17/12/29		10/03/30	22/03/30		jan/31	6,96	6,96	11,13	NC
Viva Azul - F1	dez/28	478	2	G	13/08/29	09/02/30	10/03/30		10/07/30	08/08/30		jun/31	8,04	8,04	6,13	NC
Viver - Lar de Itaquera	jun/29	509	2	A	09/09/29	11/03/30	23/03/30		16/08/30	28/08/30		jun/31	2,87	2,87	12,20	NC
Chácara Pirituba - Amanhecer	ago/29	562	2	G	26/09/29	11/07/30	09/08/30		05/01/31	03/02/31		dez/31	1,43	1,43	8,13	NC
Villagio Università Bosque - F1	out/29	588	2	A	11/03/30	17/08/30	29/08/30		15/02/31	27/02/31		dez/31	4,91	4,91	10,17	NC
Viva Azul - F2	jun/30	478	2	G	08/10/30	06/01/31	04/02/31		07/06/31	06/07/31		mai/32	3,86	0,79	13,17	NC
Viver - Sol de Itaquera	jul/30	408	2	A	08/08/30	16/02/31	28/02/31		23/06/31	05/07/31		mai/32	0,83	0,83	14,20	NC

* No PCP 167 a data de lançamento já virá ajustada para set/25 e o inicio de obra permanecerá em mar/26.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
São Paulo Leste	SZL	35%	3.143	262	3.771	314

Empreendimento	Renda	Lançamento	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27
Viva São Miguel	3.991	jun-24	20	20	20	15															
Viver Mais	3.862	ago-24	52	31																	
Reserva Das Andorinhas	3.810	set-24	21	21	21	21	21	21	21	21	21	15									
Viva Parque Do Carmo	4.155	set-24	48	48	47																
Palermo	3.252	dez-24	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	3
Óasis Penha	5.177	jul-25	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	6			
Tucumã	**3.409**	**set-25**	**15**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**5**
Sobral	3.326	set-25		32	32	32	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	13	
Residencial Quioto	2.938	fev-26							38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Amarilis	3.034	ago-26													54	54	54	54	54	54	54
Total de Vendas Lançados			**194**	**173**	**141**	**89**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**68**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**22**	**16**	**16**	**3**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**209**	**235**	**203**	**151**	**140**	**140**	**178**	**178**	**178**	**172**	**157**	**157**	**211**	**211**	**211**	**180**	**174**	**151**	**100**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Tucumã | Mapa Concorrência

		Tucumã	Meu Plano&Parque Do Carmo	
		HMP	HMP - Faixa 1	HMP - Faixa 2
		TENDA	Plano & Plano	
	Distância Tenda (km)		500m	
Região 1 Km	População	8.347	15.488	
	Dens. Demográfica	2.669	4.962	
	Renda (R$)	4.148	4.590	
	Classe Social	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)	
	PEA Dia	9.037	11.596	
Quantitativo	Lançamento	set/25	set/24	
	Unidades	530	1.995	468
	Estoque	530	842	
	VSO	30	143	33
	Stockout	18	-	26
	Preço Nominal (R$)	231.994	199.188	222.464
	Preço CEF (R$)	180.952	183.270	191.129
	Renda Comprador (R$)	3.409	2.640	3.650
	Dif Tenda (R$)		769	-241
	Factibilidade		🔴	🟡
Qualitativo	Condomínios	1	1	
	Torres	4	7	
	Gabarito	T+9	T+9	
	Plantas (m²)	32m²	32,18m²	
	Tipologia	2 Dorms	Não	
	Opções	Não	Não	
	Varanda	Não	Não	
	Suite	Não	Não	
	Dif. Entrega	Não	Equipado e Decorado	
	Vagas	0% de Vagas	0% de Vagas	
	Lazer	Play Kids, Play Baby, Play Pet,Multipla Estação, Churrasqueira, Salões De Festas, Brinquedoteca, Espaço Saúde, Espaço Teen, 2 Espaços Offices, Sport Bar, Fitness, Espaço Delivery/Mini Market.	Churrasqueira, Playground, Piscina Adulto e Infantil, Pet Care, Mini Mercado, Salão de Festas, Mini Quadra, Brinquedoteca, Fitness/Funcional, Salão de Jogos, Espaço Influencer, Delivery, Coworking, Espaço Bem Estar, Sala de Ginástica.	

Farol Renda
🟢 Acima de 300
🟡 Entre 0 e 300
🔴 Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- Apesar do concorrente Meu Plano & Parque do Carmo, possuir preço competitivo previsto para o Produto Tenda, o projeto não possui flexibilidade na negociação com TCD, capturando tudo em preço raso, perdendo competitividade frente ao produto Tenda nas unidades Faixa 2.
- A Plano lançou o projeto posicionando 81% das unidades no Faixa 1, e recentemente migrou todas as unidades para Faixa 2. Até o momento não temos liberação de novas vendas no Faixa 1, podendo essas serem liberadas sem prévio aviso para o mercado, vale destacar que nosso volume é inferior ao praticado pela concorrência nas duas tipologias analisadas (Faixa 1 e Faixa 2).

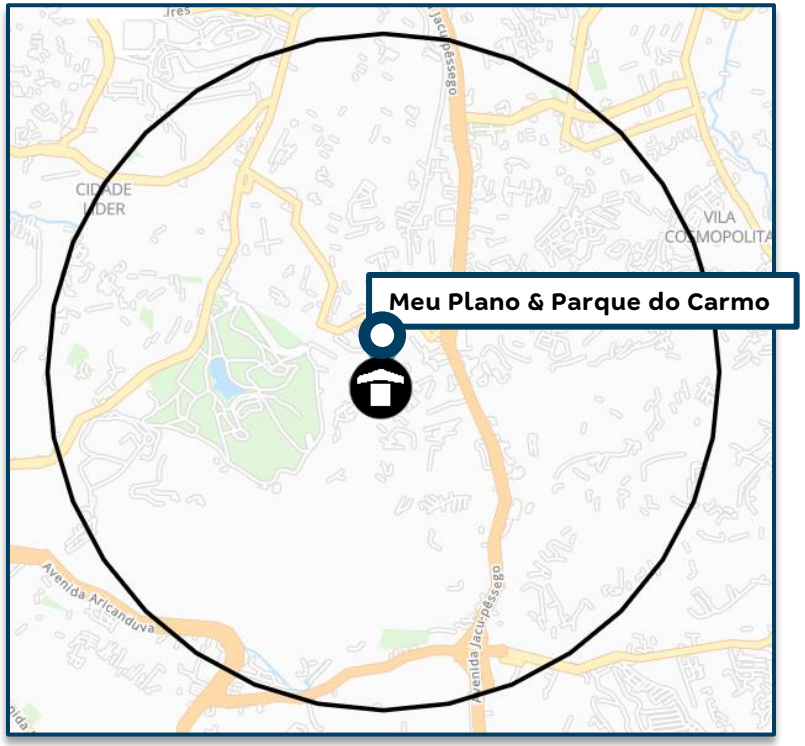

Informações Viabilidade

Projeto:	Tucumã	
Tipo:	**HMP**	
Método	**Vision**	
Avaliação	241.000	
Renda Inicial (VF)	3.409	
Renda Final*	-	
% RET1	25%	
Tipo:	**VF**	**R$**
Ato	0,69	2.337
FGTS	0,66	2.264
Financiamento	94,25%	172.852
Subsídio	166,96%	5.836
Prazo de Pró-soluto	28	28
Pró-Soluto	91,48%	31.726
Preço Raso (RS)	215.015	215.015
TCD	49,41%	16.979
VSO	30	30
Preço de Venda	**231.994**	**231.994**
Elasticidade	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**231.994**	**231.994**
Preço Raso (R$)	**215.015**	
% de Raso	**92,68%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Tucumã
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	241.000
Renda Inicial (VF)	3.409
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,69	2.337
FGTS	0,66	2.264
Financiamento	94,25%	172.852
Subsídio	166,96%	5.836
Prazo de Pró-soluto	28	28
Pró-Soluto	91,48%	31.726
Preço Raso (RS)	215.015	215.015
TCD	49,41%	16.979
VSO	30	30
Preço de Venda	**231.994**	**231.994**
Elasticidade	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**231.994**	**231.994**
Preço Raso (R$)	**215.015**	
% de Raso	**92,68%**	
Raso Todas as Fases	**215.015**	
Nominal Todas as Fases	**231.994**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região com bons indicadores sociodemográficos, como renda e PEA/Dia, o mesmo também se encontra próximo de pontos de interesses como hospital, escola, mercado e etc.

Em 2023 tivemos o projeto Buritis na mesma região que conseguiu alcançar a renda estimada pelo Vision.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", o concorrente no momento comercializa apenas com unidades Faixa 2, onde temos vantagem competitiva em renda e condições comerciais.

	Preço Real					Preço Normalizado (28m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Palermo	236.001	207.638	3.375	10	30	-1.882	205.756
Reserva das Andorinhas	230.777	210.210	3.952	17	26	2.013	207.959
Tucumã	241.000	215.015	-	30	28	-	215.015
Viver Mais	247.953	217.316	4.175	71	28	0	217.316
Viva São Miguel	234.429	204.264	3.994	22	14	16.277	220.541
Viva Parque do Carmo	242.457	224.822	4.393	39	28	0	224.822
Óasis Penha	285.839	263.044	5.100	27	33	-6.305	256.739

Ciclo Financeiro – Análise Mancha

Parecer Ciclo

O Ciclo avaliou o preço e o VSO como factíveis. O projeto está localizado em uma região de Itaquera já consolidada pela Tenda, após dois lançamentos (Tamareiras e Buritis), com grande potencial de demanda, e com preço raso competitivo frente aos projetos de sua principal concorrente na mancha, Plano&Plano.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Tucumã – SP – São Paulo Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Fase única	fev-23	set-25	mar-26	fev-28	6 meses	23 meses	set-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	9,22 MM	Incorrido Terreno: 0,00 MM	Área do Terreno (100%):	8.263 m²	Área Líquida do Terreno: 6.015 m²
Cash:	0,00 MM		Custo de terreno m²:	1.116,0	Custo de terreno m² Área Líquida: 1.533,1
Permuta Financeira:	9,22 MM (7,50%)		VaR 25 (R$ mil):	0	Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV): 7,5% / 53,0%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		VaR 26 (R$ mil):	0	CA Máx/Proj. 2,3 / 2,0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%		Incorrido de Construção:	0,48 MM	Incorridos de Incorporação: 0,88 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Fase Única	T+9	215.015	530	231.994	241.000	94,3%	91,5%	49,4%

Unidades Totais:	530	Preço Médio:	231.994	Renda Média:	3.409	ITBI+Emol. Unit. Médio:	2.757
Unidades Tenda:	530	Avaliação Média:	241.000	Ato:	2.337 (0,69 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	14.604
VSO:	30 Unidades	VGV Total:	122.956.839	FGTS:	2.264 (0,66 Salários)	Preço Raso Médio:	215.015
RET Médio:	3,3%	VGV Tenda:	122.956.839	% em RET 1%:	25%	Adc. Tx. de Aceleração Médio:	750

Construção

Custo Total Unit.:	105.646	Eventuais:	4,00%	Área priv (m²):	31,33	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	**17.380.657**	LI:	**20,05%**	Exposição de Caixa (R$):	**10.106.076**	Margem Bruta Econômica:	**37,07%**
TIR:	**108,04%**	LI Aprovação:	**20,00%**	Ger. Caixa 12 meses (R$):	**(7.906.203)**	Margem Bruta REF:	**40,81%**
Exposição de Caixa:	**8,34%**	Δ LI:	**0,05%**	Ger. Caixa 24 meses (R$):	**15.746.509**	Margem Rasa Econômica:	**31,40%**
Payback Contingente (21 m):	**19 m/ (-2 m)**	LI Marginal:	**21,75%**	Ger. Caixa Marginal (R$):	**30.786.314**	Margem Rasa REF:	**36,14%**
Payback Consolidado:	**19 meses**					Margem de Contribuição Econômica:	**26,32%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Tucumã	
	Nominal	%
Receita	121.240	100,0%
PIS/COFINS	(2.161)	1,8%
Custo Total	(74.936)	62,9%
Custo Terreno	(7.751)	6,5%
Custo Relacionados a Terreno	(990)	0,8%
Custos de Incorporação	(2.573)	2,2%
Custo de Construção	(63.621)	53,4%
Lucro Bruto Econômico	44.144	37,1%
Custo para Rateio	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	44.144	37,1%
Despesas de Selling	(10.009)	8,4%
Contingência	(2.789)	2,3%
Margem de Contribuição	31.346	26,3%
IR e CSLL	(1.768)	1,5%
Margem Líquida	29.578	24,8%
Lucro Bruto REF Unit.	96.560	40,8%
Lucro Raso REF Unit.	79.263	36,1%

R$ Mil - VPL - Compra	Tucumã	
	VP	%
Receitas	86.680	100,0%
PIS/COFINS	(1.522)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(67.778)	78,2%
Custo Terreno	(5.259)	6,1%
Custo Relacionados a Terreno	(1.042)	1,2%
Custos de Incorporação	(2.306)	2,7%
Custo de Construção	(48.310)	55,7%
Despesas de Selling	(8.599)	9,9%
Contingência	(1.016)	1,2%
IR e CSLL	(1.245)	1,4%
Lucro Imobiliário	17.381	20,1%

Comparativo de Estudos

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Reversão	Atual	Atual vs Reversão	Δ%
Data Estudo:	dezembro-23	agosto-25	20 Meses	N/A
Lançamento:	agosto-25	setembro-25	1 Meses	N/A
Uhs:	530	530	-	0,0%
Preço Nominal:	240.545	231.994	(8.551)	-3,6%
Preço Raso:	214.949	215.015	66	0,0%
Preço Nominal Inflacionado:	265.820	236.622	(29.198)	-11,0%
Preço Raso Inflacionado:	237.535	219.325	(18.210)	-7,7%
Renda Média:	3.089	3.409	320	10,4%
VSO:	29	30	1	3,4%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	7.371	3.527	(3.844)	-52,2%
Avaliação:	211.220	241.000	29.780	14,1%
Prazo construção F1:	23	23	-	0,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	28	28	-	0,0%
Custo Total Inf (Unit):	150.647	141.388	(9.260)	-6,1%
Custo Construção (Unit):	102.985	105.646	2.661	2,6%
Fração de construção:	42,8%	45,5%	2,7 p.p.	6,4%
INCC Folha Rosto:	1.084,24	1.199,51	115	10,6%
Custo Terreno Inf:	8.972.472	7.751.263	(1.221.208)	-13,6%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	2.021	1.867	(154)	-7,6%
Fração do Terreno[1]:	6,6% / 49,4%	7,5% / 53,0%	0,9 p.p.	13,6%
Custo de Incorp. por uh:	4.843	4.855	13	0,3%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	3.906.741	1.869.163	(2.037.577)	-52,2%
Custo do Ciclo (Unit):	17.527	14.604	(2.923)	-16,7%
Lucro Imobiliário:	22,4%	20,1%	-2,3 p.p.	-10,4%
Régua LI	18,0%	20,0%	2,0 p.p.	11,1%
Exposição de caixa:	8,8%	8,3%	-0,4 p.p.	-5,0%
TIR:	119,9%	108,0%	-11,9 p.p.	-9,9%
Margem Bruta Econômica:	40,0%	37,1%	-2,9 p.p.	-7,2%
Margem Contribuição Econômica:	29,7%	26,3%	1,1 p.p.	4,4%
Payback Contingente (Régua 21 m):	19 m/ (-3 m)	19 m/ (-2 m)	0,0 p.p.	0,0%
Payback Consolidado:	19	19 Meses	0 Meses	0 Meses

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

- **DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:** Avenida Adriano Bertozzi, nº 696, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, matrícula n.º 5.207 do 9º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, sob o contribuinte nº 233.050.0010-2, averbado em matrícula ("**Imóvel**").

- **PROPRIETÁRIOS TABULARES:** Daniel Ferreira Bykoff, Douglas Ferreira Bykoff, Dorian Ferreira Bykoff, Denise Ferreira Bykoff e Ariadine Soares Romeiro.

- **DA CONSULTA AO CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS):** não é objeto de análise da diligência jurídica NFA.

- **CONSIDERAÇÕES SOBRE O IMÓVEL: ESTUDOS TÉCNICOS E JURÍDICOS: (a) Retificação:** matrícula retificada; **(b) Loteamento:** foi identificado o registro do loteamento denominado "Vila Carmozina", inscrito, em 28/09/1938 (portanto na vigência do Decreto Lei nº 58/1937, que antecedeu a atual Lei Federal nº 6.766/79), no 7º Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, em que pese a certificação de inexistência de loteamento nos registros da cadeia filiatória do Imóvel (3º e 9º Registros de Imóveis) e a ausência de registro específico do Imóvel junto à referida 7ª circunscrição imobiliária. Contudo, os documentos arquivados em cartório do referido loteamento e liberados pelo registrador em forma de certidão não indicam restrições urbanísticas convencionais impostas pelo loteador. Dessa forma, apesar de o Imóvel ser parte de um loteamento registrado, é possível afirmar que, juridicamente, inexistem limitações convencionais atingindo-o. **(c) Restrições Urbanísticas:** foi identificado que há no Imóvel a ocorrência de Patrimônio Ambiental, o que decorre da presença de certos exemplares de fauna e flora, havendo a imunidade de corte e poda dos exemplares arbóreos listados no Decreto do Município de São Paulo nº 30.443/1989. No mencionado Decreto há a menção de espécies determinadas nos respectivos logradouros, todavia, não há o endereço do Imóvel em estudo listado no referido Decreto, o que leva à conclusão de que se trata de exemplar arbóreo na quadra do Imóvel e não especificamente em frente ou dentro deste. **DD Imóvel**: **(a) Área construída**: consta nos cadastros municipais área construída de 404,00m², com status "irregular" não averbada na matrícula do Imóvel **(b) Débitos Imobiliários**: (i) IPTU: R$ 22.785,20, sendo: R$ 7.134,53 do exercício de 2021, inscritos em dívida ativa, em aberto, objeto de acordo; e R$ 15.650,67 referente as parcelas vincendas do exercício de 2025 e (ii) ITR: CND – NIRF cancelado; **Multas:** não há; **(d) Ônus e Gravames**: não há; **(e) Ocupação:** o Imóvel encontra-se ocupado, a título de locação, para fins não residenciais, por Celina Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda., por força do Contrato de Locação de Imóvel não Residencial, firmado em 01/11/2013 com vigência até 31/10/2018, vigorando por prazo indeterminado, inexistindo ação renovatória em andamento, tampouco direito à renovação. Foi apresentado Termo de Renúncia do direito de preferência assinado pela Locatária em 25/03/2023, contemplando as condições comerciais do contrato, porém não foi localizada a versão atualizada do termo de preferência que contemple os termos da renegociação, conforme previsto no Primeiro Aditamento; **(f) TAC**: não há; **(g) CONDEPHAAT, CONPRESP, IPHAN:** sem restrições (conforme primeira DD); **(h) DESAP e Melhoramentos:** negativas (conforme primeira DD). No entanto a certidão de melhoramentos indica que o Imóvel é parcialmente atingido pelo alinhamento previsto pela Resolução 1.106/1975 – PRM-373, a qual indica que o Imóvel encontra-se implantado no local com pista de 14,00m de largura, de modo que atender a calçada com largura mínima de 3,00m para que se complemente a Faixa Pública de 20,00m; **(i) Função Social da Propriedade:** Imóvel não notificado; e **(j) Contas de consumo**: pendentes.

- **CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PROPRIETÁRIOS TABULARES**

- **A) DANIEL FERREIRA BYKOFF ("Daniel") e sua empresa BYKOFF ACADEMIA DE ATIVIDADES FISICAS LTDA - EPP ("Bykoff"):**
  - Passivo: R$ 82.346,60, sendo: **(i)** R$ 23.444,42 decorrentes da desconsideração da personalidade jurídica deferida nos autos de uma execução fiscal ajuizada inicialmente em face da empresa Bykoff. Apesar do referido sócio ter sido citado, o Conselho Federal de Educação Física requereu a suspensão do feito, em razão do acordo firmado entre as partes para pagamento do débito por meio de 50 parcelas, sendo a primeira parcela com vencimento em 28/02/2025 e a última em 28/02/2029; e **(ii)** 66.176,72 oriundos de uma ação de execução fiscal autuada sob nº 0002415-56.2013.8.26.0565, objetivando a cobrança de tributos federais ajuizada em face da empresa Bykoff, da qual o Vendedor Daniel é sócio e administrador com 91% das quotas. Foi requerida a penhora dos bens dos sócios com fundamento na dissolução irregular da sociedade e, em 26/09/2017, Daniel peticionou esclarecendo que a dívida foi incluída no programa de parcelamento, de modo a afastar a penhora. Desde de então, aguarda-se decisão do juiz. De acordo com o extrato de débitos da empresa, o parcelamento foi rescindido, razão pela qual, há o risco de eventual penhora que recaia sobre o Imóvel.
  - Patrimônio: não há
  - Mitigantes: (i) lapso temporal de mais de 5 anos sem qualquer movimentação processual nos autos da ação de execução fiscal nº 0002415-56.2013.8.26.0565; (ii) valor envolvido; (iii) caso recaia eventual penhora sobre o Imóvel e o Vendedor não efetue o pagamento da dívida, a Tenda poderá, nos termos das cláusulas 3.6(a), 4.4 e 3.6.3, quitar diretamente o valor, descontando o montante pago do Preço, aplicando sobre o valor pago correção pelo IPCA/IBGE, desde a data do pagamento até a data do reembolso.

- **B) 2.2. DOUGLAS FERREIRA BYKOFF:**
  - Passivo: R$ 6.828,32
  - Patrimônio: não há
  - Mitigantes: valor irrisório
  - Ponto de atenção: foi emitida a CPEN, com validade até 13/09/2025 indicando a existência de débitos não inscritos em dívida ativa, cujo valor vinculado não foi possível verificar, diante da ausência do respectivo extrato fiscal. Não obstante o débito não estar inscrito em dívida ativa e, então, não oferecer riscos à aquisição pretendida, recomendamos que avaliem a necessidade de exigir a regularização do débito em aberto, com o objetivo de possibilitar a emissão da Certidão Negativa de Débitos, e, assim, evitar questionamentos pela Caixa Econômica Federal por ocasião da aprovação do financiamento. Nesse sentido, destacamos as previsões inseridas nas Cláusulas 3.6., alínea "(a)", 3.6.3. e 4.4. do CVC, as quais concedem à V.Sas. a faculdade de pagar eventuais débitos, a título de adiantamento, descontando das parcelas vincendas do Preço.

- **CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PROPRIETÁRIOS TABULARES**

- **C) DORIAN FERREIRA BYKOFF, DENISE FERREIRA BYKOFF e ARIADINE SOARES ROMEIRO:**
  - Não foram identificados apontamentos cujo risco tenha sido reputado como possível de impactar a aquisição pretendida.

Obrigado
