Tenda

sua próxima conquista

Book de Escritura e Lançamento

Regional: BA

Projeto: Veneza Prime

Data Comitê: 25/08/2025

Questionamentos Comitê Digital – 11/08/2025

Nome	Veneza Prime - Escritura + Lançamento	Observação - Veneza Prime
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	Ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	Ok
Rodrigo Osmo	Discutir em comitê	(1) Estamos escriturando com bastante antecedência ao lançamento, sendo que precisamos pagar R$3M agora e as demais parcelas já começam a vencer. Qual é o nosso grau de conforto com relação ao risco do prazo do lançamento?; (2) Eu gostaria de escutar o ciclo sobre o risco de performance desse projeto. Estamos posicionando ele R$15K acima do Vivenda Real, que está muito próximo, para fazer um VSO parecido. Além disso, MRV e Pejota tem produtos concorrentes com preços equivalentes.
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	temos espaço para sair com preço de largada maior para as unidades com varanda?

Comitê Digital – 18/08/2025 – Respostas Rodrigo Osmo

1. Estamos escriturando com bastante antecedência ao lançamento, sendo que precisamos pagar R$3M agora e as demais parcelas já começam a vencer. Qual é o nosso grau de conforto com relação ao risco do prazo do lançamento

R: Estamos aprovando em comitê. No entanto, a escritura do imóvel só poderá ser realizada após a conclusão do ponto mais crítico do processo: a aprovação técnica junto ao município. A previsão é que a escritura ocorra em 26/09. Ressaltamos que o risco de postergação desse prazo é baixo, uma vez que o projeto já se encontra em estágio avançado na Prefeitura.

2. Eu gostaria de escutar o ciclo sobre o risco de performance desse projeto. Estamos posicionando ele R$15K acima do Vivenda Real, que está muito próximo, para fazer um VSO parecido. Além disso, MRV e Pejota tem produtos concorrentes com preços equivalentes.

Resposta do ciclo: Em relação ao Vivenda Real, o Veneza Prime apresenta uma localização superior, situada em uma área mais valorizada. Além disso, o empreendimento oferece diferenciais importantes, como varandas em 100% das unidades, pórtico de entrada diferenciado e condições de pagamento mais vantajosas, viabilizadas por uma avaliação mais elevada e um PSOL maior (Comparativo abaixo) Portanto, acreditamos que eles funcionem bem nesta escada de preço simultaneamente.

	Vivenda Real	Veneza Prime
PSOL	19	28
Avaliação média	237.317	257.696

Quanto à concorrência, a MRV possui um preço médio similar ao do Veneza Prime (244k) e está localizada em um raio relativamente próximo. No entanto, seu projeto está inserido em uma mancha de atuação distinta e em uma localização significativamente inferior, o que reduz a competição direta. O mesmo se aplica ao projeto da Pejota, que, além de estar em outra mancha de atuação, apresenta um preço significativamente mais alto (280k), afastando ainda mais qualquer impacto competitivo direto.

Comitê Digital – 18/08/2025 – Resposta Luiz Maurício

1. **temos espaço para sair com preço de largada maior para as unidades com varanda?**

   R: Hoje estamos considerando a venda das unidades com varanda R$15K acima das unidades sem varanda. Valor que acreditamos como limite e factível, tanto pela avaliação recebida quanto pelo posicionamento do Veneza Prime na escada de preço da regional. Estamos tentando junto a CEF uma melhoria na avaliação geral das varandas. A partir disso, faremos uma nova dispersão em tabela.

One Page – Veneza Prime (Cenário Aprovação)

[1]

Cidade	Salvador	Mancha de demanda	BA - SSAA - Salvador alta
Regional	BA	Cluster MPR	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Aprovação	Tipo de Aprovação	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura e Lançamento	Versão da VF	Versão 1.0: Ago

Unidades (Fases)	1675 (4)	CA Máx | Proj	3,0 | 1,7
Unidades com Vaga (%)	271 (16%)	Escritura | Lançamento	set/25 | nov/25
Unidades com Atributo* (%)	1675 (100,0%)	Tipologia	F2E - Concreto

[2]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	30.552 (7,1%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
Cash (Correção)	30.552 (IPCA)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	1.067	VAR (%VGV)	3376 (0,8%)

Custo Construção (%VGV)	168.632 (39,1%)	Indireto Unit.	17.905
Prazo da Obra (meses)	21	Torre Unit.	59.651
Custo Total Unit. (LPU):	100.676 (93)	Infra Unit.	13.024
Início de Obra	mai-26	Fundação Unit.	6.863

[3]

Preço Nominal Unit.	257.307	VSO	24
Preço Raso Unit.	233.422	Referência	VISION
Avaliação Unit.	257.696	Renda (% em RET 1%)	4.495 (0,0%)

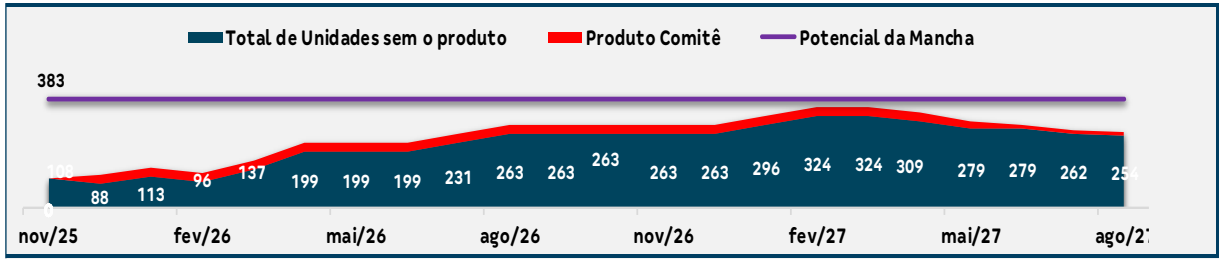

LI (Régua):	21,7% (20,0%)	Margem Bruta Econômica:	45,6%
LI Marginal:	22,2%	Margem Rasa Econômica:	39,3%
Margem Bruta REF:	48,9%	Margem Contribuição Econômica:	32,9%
Margem Rasa REF:	43,7%	Exposição (% VGV):	26.555 (5,6%)
TIR:	73,4%	VGV Total:	430.988
Payback Contingente (21 m) :	21 m/ (0 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(19.109)
Payback Consolidado:	22	Ger. Caixa 24 meses (R$):	(7.349)

Destaques

[1] Projeto

- O projeto inclui piscina, varanda e é o primeiro a contar com a nova portaria com pórtico diferenciado. Além disso, estamos em processo de solicitação do Selo Casa Azul + Caixa – Classificação Ouro, junto à Caixa Econômica Federal

[2] Condição Comercial

- O negócio foi fechado 100% em cash, totalizando R$ 29MM, sendo R$ 3MM pagos na escritura e R$ 26MM parcelados em 42 vezes. A escritura contempla dois terrenos que compõem os condomínios Veneza Prime (Lote 06) e Verona Prime (Lote 05), sendo o primeiro adquirido em caráter pró-soluto e o segundo em caráter pró-solvendo.

[3] Precificação

- Tivemos um ganho médio de avaliação e preço de 19k frente ao Vivenda Real, (projeto mais próximo Veneza Prime e que também contém unidades com varanda), evitando canibalização entre os 2 produtos. Além disso, ele forma uma escada de preço factível entre os demais produtos próximos, para que o ciclo encaixe clientes de diferentes faixas de renda.

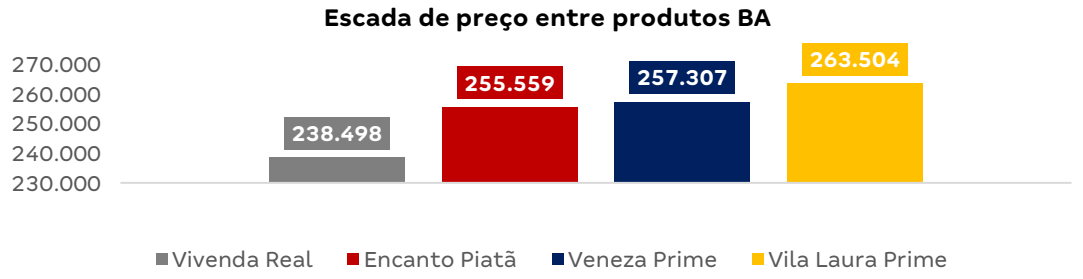

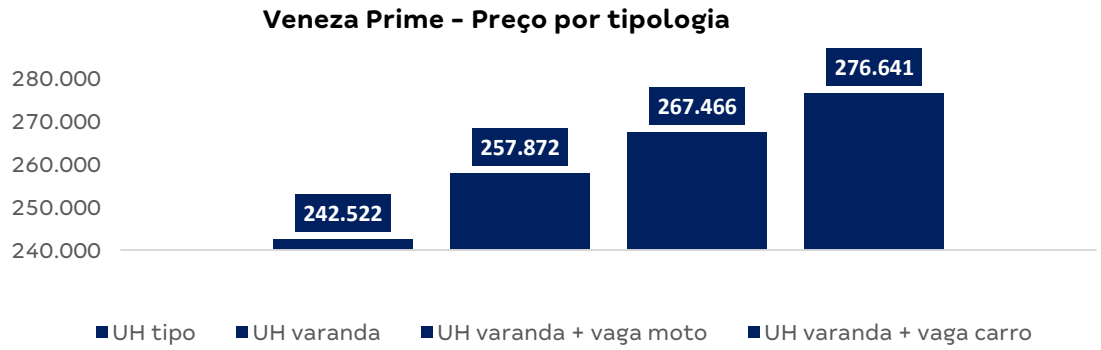

One Page – Veneza Prime (Cenário Real)

Cidade	Salvador	**Mancha de demanda**	BA - SSAA - Salvador alta
Regional	BA	**Cluster MPR**	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura e Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Ago

Unidades (Fases)	1675 (4)	**CA Máx | Proj**	3,0 | 1,7
Unidades com Vaga (%)	271 (16%)	**Escritura | Lançamento**	set/25 | nov/25
Unidades com Atributo* (%)	1675 (100,0%)	**Tipologia**	F2E - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	30.552 (7,1%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	30.552 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	1.067	**VAR (%VGV)**	3376 (0,8%)

Custo Construção (%VGV)	168.632 (39,0%)	**Indireto Unit.**	17.905
Prazo da Obra (meses)	20	**Torre Unit.**	59.651
Custo Total Unit. (LPU):	100.676 (93)	**Infra Unit.**	13.024
Início de Obra	jul-26	**Fundação Unit.**	6.863

Preço Nominal Unit.	258.093	**VSO**	24
Preço Raso Unit.	233.620	**Referência**	VISION
Avaliação Unit.	257.696	**Renda (% em RET 1%)**	4.495 (0,0%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	240.930
Preço Inf. Médio Unit.	266.408	**Margem Bruta REF (%)**	46,6%
Custo Inf. Médio Unit.	142.207	**Margem Rasa REF (%)**	41,0%



LI (Régua):	**21,8% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	45,7%
LI Marginal:	22,3%	**Margem Rasa Econômica:**	39,3%
Margem Bruta REF:	49,0%	**Margem Contribuição Econômica:**	33,0%
Margem Rasa REF:	**43,7%**	**Exposição (% VGV):**	25.772 (5,4%)
TIR:	73,9%	**VGV Total:**	**432.306**
Payback Contingente (21 m) :	**21 m/ (0 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(16.468)
Payback Consolidado:	23	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	(9.873)

Destaques

[1] PCP

- No cenário real, foi considerada a previsão de início da obra conforme PCP 167, com a obra programada para começar em julho de 2026.

Localização

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Farol Pareceres

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	a) PVC assinada, contendo as seguintes informações especiais: i) O negócio é constituído pelos imóveis objeto das matrículas n.ºs 171.942 (Verona Prime) e 171.943 (Veneza Prime) do 2º RGI de Salvador, cuja propriedade está registrada em nome da AJW Empreendimentos Imobiliários Ltda; ii) Os dois Imóveis serão adquiridos na mesma data, sendo que, para o Veneza Prime, será outorgada ECV paga com nota promissória em caráter "pro soluto", e ofertado seguro garantia, e para o Verona Prime, será outorgada ECV com nota promissória em caráter "pro solvendo" e quando formos lançar o Empreendimento, forneceremos a garantia; b) Renovação da Due Diligence dos imóveis em andamento, sem apresentar risco até a presente data, mas apontamos o seguinte: iii) apuração de remanescente em curso, sem risco aparente até o presente momento; iv) É necessária a averbação da retificação do TAC nas matrículas que desonerará a Vendedora da obrigação de reservar áreas para a duplicação da Avenida Aliomar Baleeiro — sendo 1.607,90 m² e 1.045,33 para as matrículas 171.943 e 171.942, respectivamente, nos termos do Termo de Concordância de firmado entre a Vendedora e o Município de Salvador em 15/06/2023. Embora tal providência não inviabilize a lavratura da escritura, poderá representar uma condição a ser observada para a contratação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal; v) Não há débitos de IPTU, a TENDA assumiu o pagamento do IPTU de 2025; c) Due Diligence dos vendedores: A Vendedora encontra-se solvente, seus sócios e as empresas dos sócios, possuem patrimônio superior às contingências apuradas para eles, portanto, não apresenta risco a operação. Previsão Lavratura da Escritura de Venda e Compra: 12/09/2025 (lavrar com o tecnicamente aprovado); Previsão Registro da Escritura de Venda e Compra: 26/09/2025; Previsão de Registro de Incorporação: 28/10/2025; (alvará de construção previsto para 09/10); Previsão de Averbação do Patrimônio de Afetação: 26/11/2025.	Ok com ressalvas	
Legalização	Licenças Emitidas para Lançamento: - Autorização de Supressão de Vegetação nº 042/2025, com validade até 27/03/2027; - Dispensa de Licença Ambiental emitida em 30/01/2025; - Inexigibilidade de drenagem emitida em 12/03/2025; Licenças Pendentes para Lançamento: - Alvará de construção - Previsão de emissão 09/10/2025; - Licença de conteção - Previsão de emissão 15/08/2025; - Licença de Terraplanagem - Previsão de emissão 23/10/2025; - Certidão de Desmembramento de Transcon - Previsão de emissão 19/08/2025; Licenças Pendentes para Inicio de Obra: - Obra de Logradouro Público - Esgoto - Previsão de protocolo 01/10/2025; - Obra de Logradouro Público - Drenagem - Previsão de emissão 26/09/2025; - Obra de Logradouro Público - Água - Previsão de emissão 01/10/2025.	Ok com ressalvas	
Produto	Sem riscos	Ok	
GETEC	Considerado ligação de rede de esgoto da porta. Rateio de extensão em consórcio com MRV com custo considerando apenas no Vivenda Real.	Ok	
Logística	Sem riscos	Ok	
Contratação	Laudo de engenharia com pendência de contratação previsto para 05/10/25 e sem pendência previsto para 26/10/25. Laudo de Risco previsto para 12/10/25 e retorno da análise jurídica em 03/11/25. RI previsto para o dia 28/10/25.	OK	
Inteligência de mercado	IM avalia preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	O parecer do ciclo é positivo; apesar da concorrência da MRV e da PJ, a MRV apresenta baixo estoque, e a PJ, embora próxima, não representa concorrência significativa devido à diferença de preço.	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos associados	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

SSA – Salvador

Lançamento

1. Viver Salvador
2. Jardim Armação Prime
3. Vivenda Real (Morada Real)
4. Morada das Estações
5. Encanto Piatã
6. Vale dos Lírios
7. Vila Laura Prime

LandBank

8. Jaguaribe Prime
9. Solar de Itapagipe
10. Vale das Orquídeas
11. **Veneza Prime**
12. Vista Serena
13. Vale das Tulipas
14. Portal de Salvador
15. Solar Patamares
16. Paralela Sun Prime
17. Privilege Salvador Norte

Cluster MPR – (Comitê)

- Cluster 4 - Azul

Região

Capital

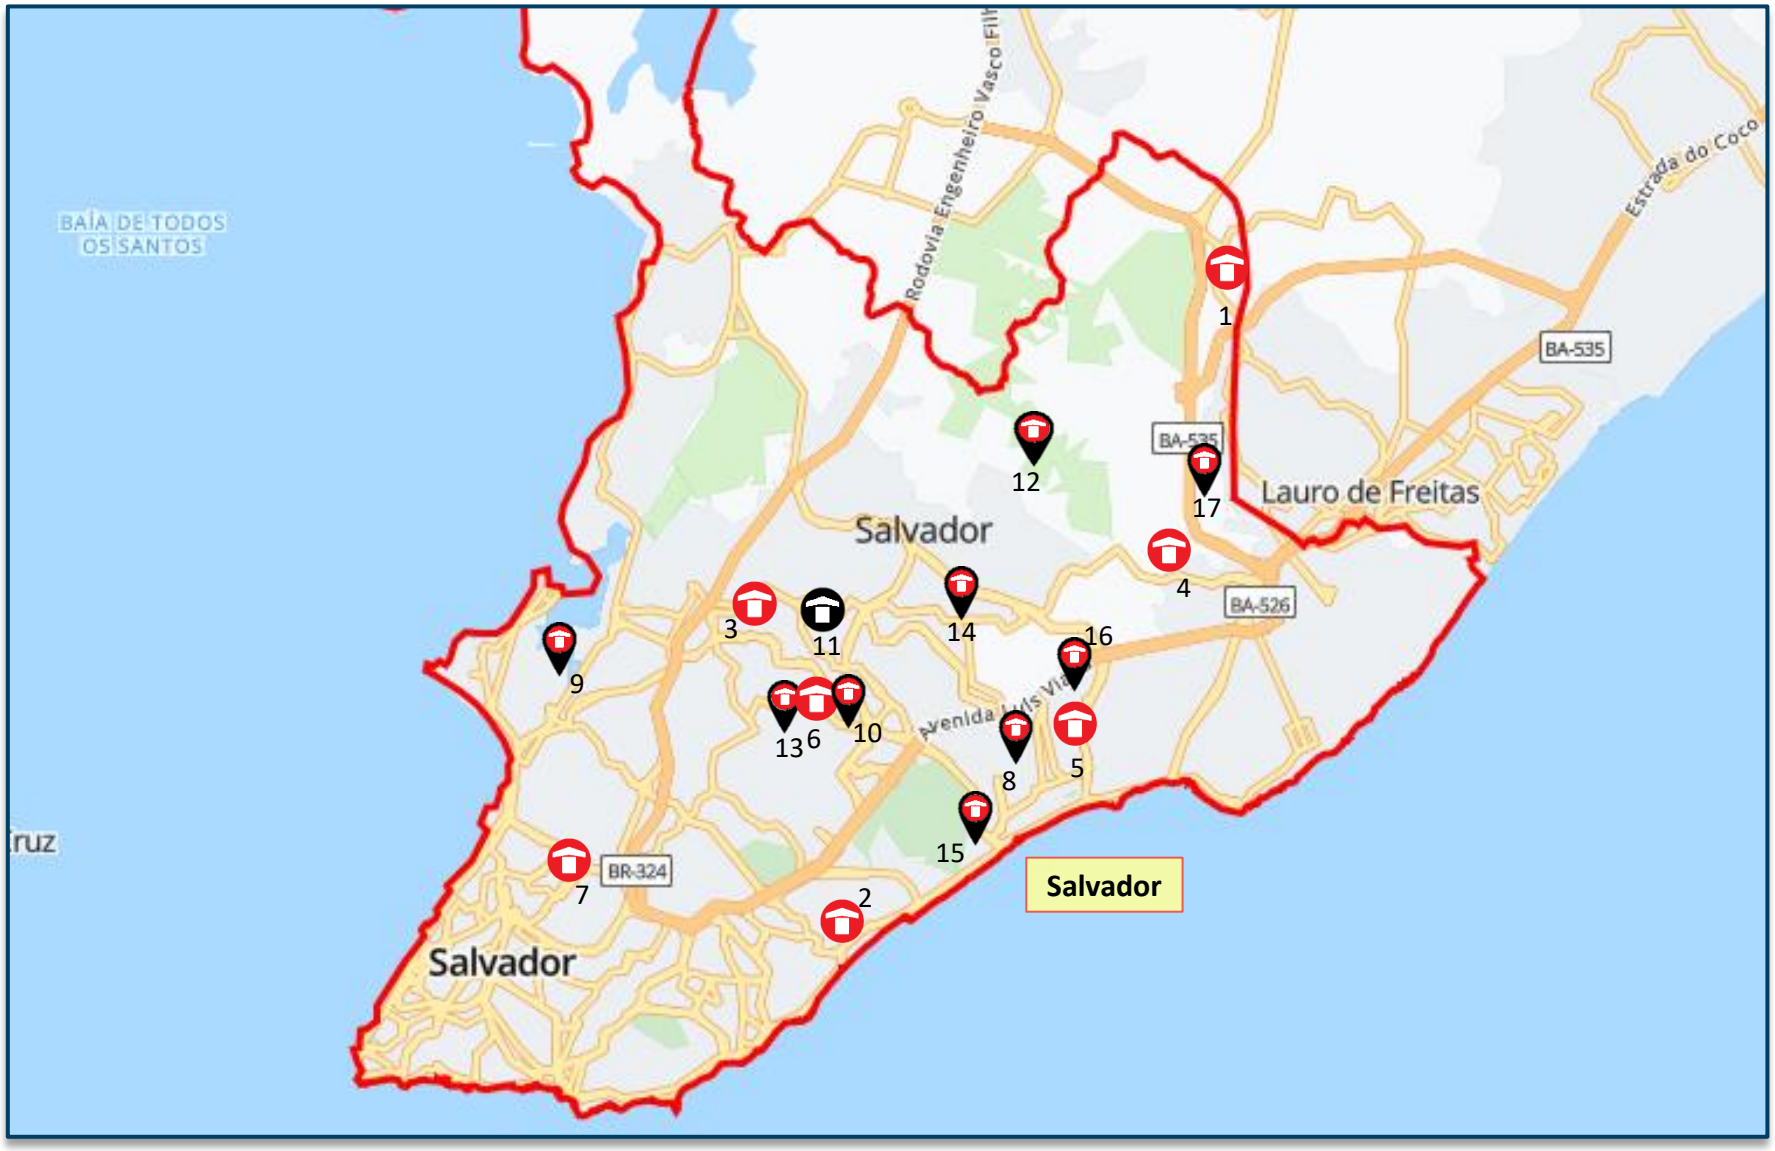

Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Veneza Prime
Escritura | Lançamento

Informações Gerais – Condomínio 01		
Terreno	**Área terreno**	30.533,09m²
	Menor poligonal	29.998,70m²
	App/fna	Sim- 287,15m²
	Reserva de calçada/ melhoramento viário	Sim- 534,39
	Área liquida	23.990,18m²
	Zoneamento	ZCMU2
	Ca máximo	3,00
	Ca básico	1,50
	Ca projetado	Cond.01 1,70 Cond.02 1,75
	Gabarito máximo	Livre
Geral	**Total uh**	Cond.01 855 Cond.02 820 Total: 1675
	Total de vagas	Cond.01 103 (12%) Cond.02 168 (20%) Total: 271 (16%)

PRODUTO

Empreendimento Veneza Prime
Escritura | Lançamento

Informações Gerais – Condomínio 01

Terreno	**Área terreno**	15.240,77m²
	Menor poligonal	14.706,38m²
	App/fna	Sim- 269,36m²
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim- 534,39
	Área liquida	11.488,97m²
Diretrizes Urbanísticas	**Zoneamento**	ZCMU2
	Ca máximo	3,00
	Ca básico	1,50
	Ca liquido	2,24
	Ca projetado	1,70
	Gabarito máximo	Livre
Geral	**Total uh**	855
	Total de vagas exigido	00 (0%)
	Total de vagas projetado	103 (12,05%)
Tipologia	**Tipologia**	Pct com elevador
	Gabarito	T+17
	Lâmina	03 16pp
	Área privativa	35,63m²/35,70m² e 35,73m²
	Varanda	768uh (89,82%)
Condomínio	**Unidade pcd**	45
	Unidade lazer|técnica	06|03
	Torre	03
	Fase	02
Lazer	**Lazer Interno**	01-Brinquedoteca, 02-esp. office, 03-fitness, 04-esp. saúde, 05-sport bar e 06-espaço teen.
	Lazer Externo	07-Sal. de festas, 08-churr. Gourmet, 09-quadra descoberta, 10-fitness, 11-funcional, 12-esp. ducha, 13-praça de chegada, 14-play baby, 15-praça de sab., 16-play pet, 17-play kids, 18-pisc. Adulto, 19-pisc. infantil, 20-pergolado pisc. e 21- esp. cultivo

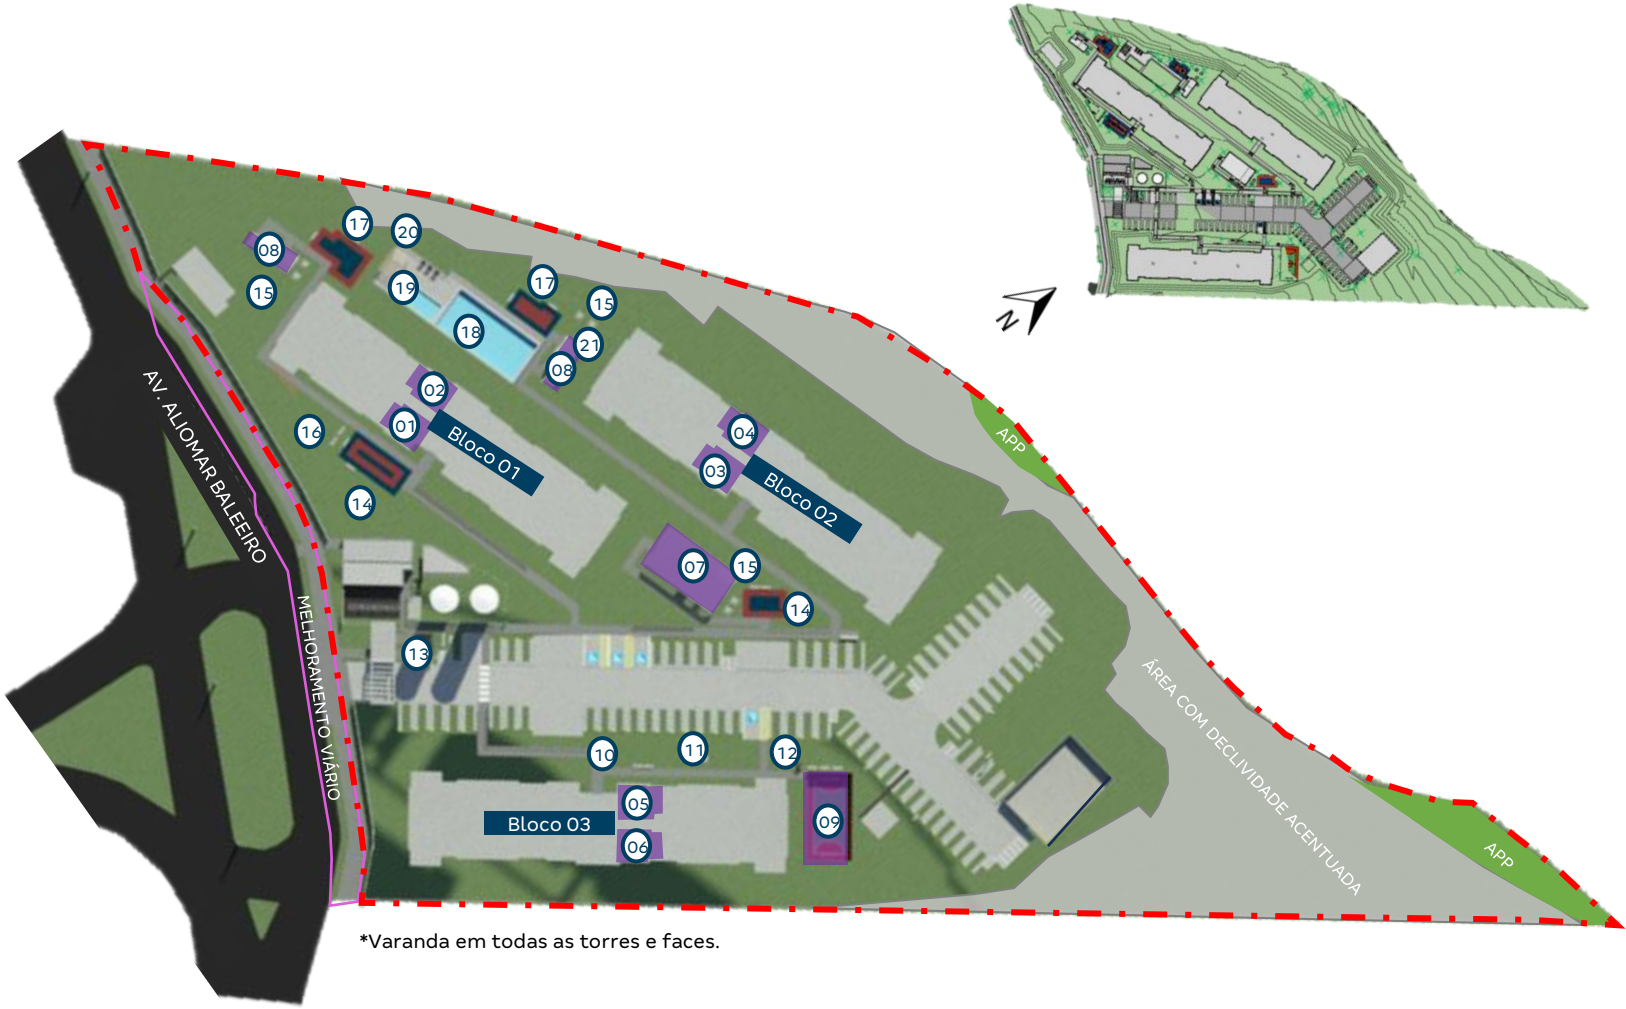

*Varanda em todas as torres e faces.

Empreendimento Veneza Prime
Escritura | Lançamento

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**	🟢	
	Percurso do pedestre até torre	🟢	
Diferencial produto	**Faixa de renda**	2	
	Prime	Sim	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	*Portaria com pórtico de veículos, quadra pavimentada descoberta, piscinas e pergolado piscina.*
	Atributos Torre	Sim	*Varanda em todas torres e faces.*
	Edifício Garagem	Não	

Piscinas e pergolado piscina (imagem ref.)

Portaria com pórtico de veículos (imagem ref.)

PRODUTO

Empreendimento Veneza Prime
Escritura

Condomínio: 855uh – 103 vagas (sendo 04 PCD, 01 embarque/desembarque e 23 de moto)				
Fase 01:570uh- 69 vagas (sendo 03 PCD, 01 embarque/desembarque e 21 de moto)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	01 Bloco (T+17)	285 Uh	69 vagas (sendo 03 PCD, 01 embarque/des. e 21 motos)	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 01 a praça de chegada, salão de festas, play kids, piscina adulto, piscina infantil, pergolado piscina, espaço cultivo, uma das churrasqueiras, uma das praças de sabores e um dos play baby Demais lazeres que não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas
Módulo 02	01 Bloco (T+17)	285 UH	-	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 02 uma das churrasqueiras gourmet, um dos baby, play pet e uma das praças dos sabores
Fase 02:285uh- 34 vagas (sendo 01 PCD e 02 de moto)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 03	01 Blocos (T+17)	285 UH	34 vagas (sendo 01 PCD e 02 motos)	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 03 o Fitness, funcional, espaço ducha e quadra descoberta.

PRODUTO

Empreendimento Veneza Prime
Lançamento

Fase 01:1:570uh- 69 vagas (sendo 03 PCD, 01 embarque/desembarque e 21 de moto)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	01 Bloco (T+17)	285 Uh	69 vagas (sendo 03 PCD, 01 embarque/des. e 21 motos)	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 01 a praça de chegada, salão de festas, play kids, piscina adulto, piscina infantil, pergolado piscina, espaço cultivo, uma das churrasqueiras, uma das praças de sabores e um dos play baby Demais lazeres que não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas
Módulo 02	01 Bloco (T+17)	285 UH	-	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 02 uma das churrasqueiras gourmet, um dos baby, play pet e uma das praças dos sabores

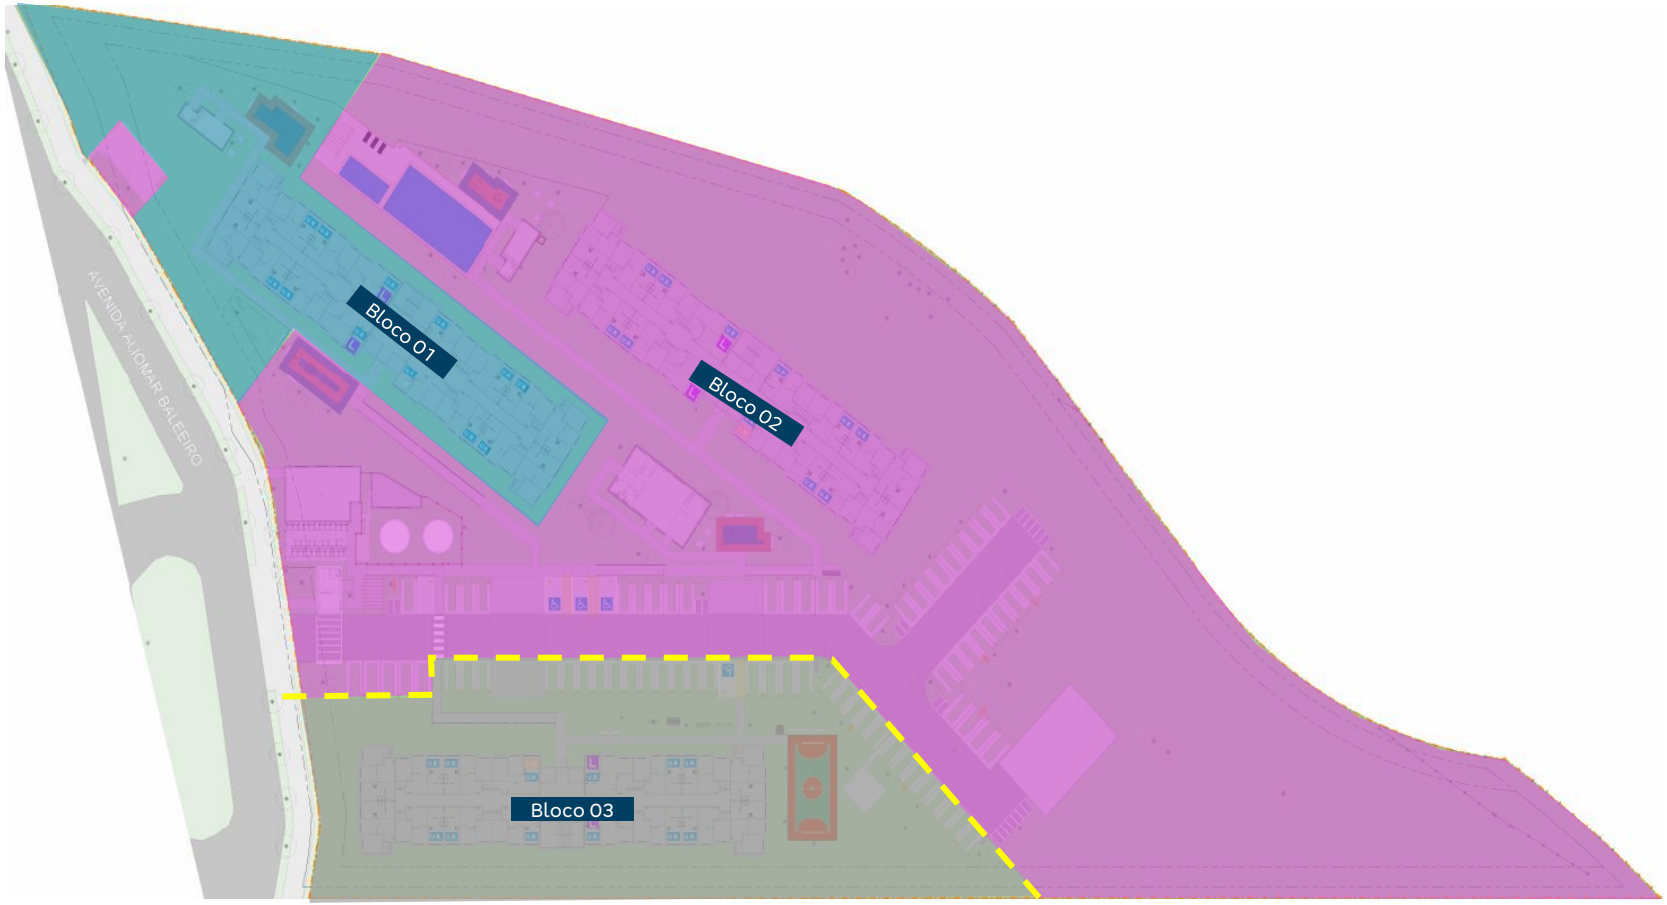

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Condições do Negócio

➢ **VALOR DO NEGÓCIO**

- O Valor do negócio é R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões), à serem pagos em cash.

➢ **CONDIÇÃO DO NEGÓCIO E PRAZOS CONTRATUAIS**

- O negócio será pago da seguinte forma:

a) R$3.000.000,00 (três milhões), que deverá será pago na data da outorga da escritura pública, ou 12 (doze) meses contados da data de 08/08/2024, o que ocorrer primeiro.

b) R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões), que será pago em 42 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$619.047,62 (Seiscentos e dezenove mil e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), vencendo a primeira 30 dias após o pagamento do item (a) e as demais no mesmo dia nos meses subsequentes.

➢ **CORREÇÃO MONETÁRIA**

- Correção pelo IPCA a contar de 2 meses antes da assinatura da PCV, até 2 meses antes da data de pagamento de cada parcela;

➢ **CORRETAGEM**

- Corretagem de 5% do valor do negócio por conta da Tenda.
- A Tenda antecipou 100K após a baixa do terreno para Landbank, caso o negócio não siga adiante será devolvido, com condições a serem regradas em contrato com o corretor;

➢ **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Contrato assinado em setembro/24;
- A condição para o fechamento do negócio, imposta pelos vendedores, é a compra conjunta dos dois imóveis.
- Contendo todas as cláusulas resolutivas padrão de saída até a escritura;
- Previsão de multa de 800k em caso de atraso superior por mais de 30 dias para a escritura, ou caso a Tenda saia do contrato em razão de falta de aprovação do projeto ou que não consiga escriturar por motivos que não sejam imputáveis aos vendedores.
- A mesma multa de 800k será aplicada aos vendedores caso a Tenda seja impedida de escriturar em decorrência de algum descumprimentos por parte dos mesmos;
- A Tenda assumiu a posse do terreno e também se responsabilizou pelo IPTU a partir de 2025, cujos os valores já estão considerados na viabilidade.

➢ **GARANTIAS**

- Tenda: N/A
- Vendedor: Seguro Fiança.

Condições Resolutivas do Negócio

(i) a não obtenção das anuências de todos os confrontantes dos **IMÓVEIS** no procedimento de apuração de remanescente das áreas, gerando judicialização do procedimento e/ou inviabilizando a implantação dos **EMPREENDIMENTOS** no tempo planejado.

(ii) a existência de ação de desapropriação, ou procedimento extrajudicial de desapropriação e/ou declaração de utilidade pública, ou previsão de implantação de vias públicas que objetive os **IMÓVEIS,** exceto aquelas que já se encontram indicadas na matrícula dos imóveis, ou parte deles de modo a prejudicar ou inviabilizar a implantação dos **EMPREENDIMENTOS** conforme projetado pela **COMPRADORA;**

(iii) a não apresentação da documentação e/ou esclarecimentos indicados nos itens 3.1 e 3.2 pela **VENDEDORA** no prazo ali indicado ou a existência de qualquer apontamento nos documentos e certidões forenses que objetive, onere e/ou possa trazer vício à cadeia dominial dos **IMÓVEIS** e/ou possa reduzir a **VENDEDORA** ou seus sócios ou as empresas das quais façam parte, ao estado de insolvência civil e/ou recuperação e/ou falência,

(iv) a existência de pessoas e/ou coisas nos **IMÓVEIS**, que impeça a transferência da posse destes de forma livre e desimpedida;

(v) a não viabilidade das redes de água e esgoto existentes no local, que sejam tidas como insuficientes a garantir a vazão necessária às unidades autônomas que comporão os **EMPREENDIMENTOS** pretendidos;

(vi) impossibilidade da realização do estudo de passivo ambiental ou existência de qualquer tipo de contaminação do solo, subsolo e águas dos **IMÓVEIS**, bem como qualquer outro tipo de passivo ambiental e/ou impossibilidade de remoção de árvores que comprometam os **EMPREENDIMENTOS** que a **COMPRADORA** pretende desenvolver nos **IMÓVEIS**, observando-se o que dispõe os itens 3.8 e 3.8.1;
(vii) o não aperfeiçoamento de uma ou mais das condições resolutivas, relativas ao terreno e/ou aos **EMPREENDIMENTOS**, abaixo relacionadas:

a) Análise positiva da viabilidade técnica e/ou financeira dos **EMPREENDIMENTOS**;
b) Análise positiva da viabilidade comercial dos **EMPREENDIMENTOS**.
c) Não apuração de condições técnica e eventualmente impeditivas dos **IMÓVEIS**;
d) Análise jurídica positiva da documentação elencada no ANEXO I,

(viii) o atraso superior a 30 (trinta) dias pela **VENDEDORA** no cumprimento das obrigações previstas no **Item 3.6**, acima;

(ix) falta de obtenção do alvará de construção dos **EMPREENDIMENTOS** a serem desenvolvidos nos **IMÓVEIS** e emissão das demais licenças pertinentes por motivo não imputável à **COMPRADORA,** ou suas obtenções contendo condicionantes, contrapartidas e/ou exigências que promovam a inviabilidade dos **EMPREENDIMENTOS**;

(x) emissão de ato do Poder Público que impeça a apresentação e aprovação de novos projetos imobiliários nos **IMÓVEIS**;

(xi) verificação da existência de qualquer medida ou ação, ainda que preparatórias, que comprovadamente impeçam a livre disposição do bem da **VENDEDORA**, ou de qualquer exigência insanável junto ao Registro Geral de Imóveis competente;

(xii) constatação de motivos de força maior que impliquem a impossibilidade da transmissão dos bens.

(xiii) qualquer alteração na legislação que implique redução do potencial construtivo dos **IMÓVEIS**;

(xiv) a inviabilidade de contratação de financiamento pela instituição financeira para construção dos **EMPREENDIMENTOS** antes mencionados, consoante os termos e condições do Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida regulado pela lei federal nº 14.620/2023 ou qualquer outro programa que venha a substituí-lo, ou, ainda, a modificação das regras atuais do programa, dos subsídios governamentais em favor dos adquirentes finais das unidades autônomas ou, ainda, das regras vigentes para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, inviabilizando total ou parcialmente o empreendimento, ou tornando sua implantação excessivamente onerosa.

(xv) a existência de qualquer ônus reais e fiscais, dúvidas, dívidas, ações, execuções, protestos, penhoras, indisponibilidades ou pendências de qualquer natureza sobre os **IMÓVEIS**, que impeça a legalização dos **EMPREENDIMENTOS ou**, transmissão através das Escrituras Públicas de Compra e Venda que não estejam indicados na documentação apresentada pela **VENDEDORA** e aprovada pela **COMPRADORA**

(xvi) se for verificada a existência de alguma determinação, judicial ou administrativa, da Prefeitura Municipal, Órgão ambiental estadual, municipal, federal, concessionárias ou demais órgãos envolvidos nos licenciamentos para edificações, bem como do Ministério Público, ou ainda a ocorrência de qualquer impedimento ambiental, jurídico, técnico, financeiro e/ou comercial que venha a inviabilizar os **EMPREENDIMENTOS** pretendidos para os **IMÓVEIS.**

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Custo de Construção

	R01 VENEZA PRIME FASE 1	R01 VENEZA PRIME FASE 2	R02 MIRANTE VERONA FASE 1	R02 MIRANTE VERONA FASE 2	R01 MIRANTE VERONA E VENEZA PRIME	R00 MIRANTE VERONA E VENEZA PRIME	R00 - PARAM. MIRANTE VERONA E VENEZA PRIME	LVS ENCANTO PIATÃ F1
Torres	2	1	2	1	6	6	6	3
Unidades Construídas	576	288	540	288	1.692	1.692	1692	576
Unidades Vendidas	570	285	535	285	1.675	1.675	1675	568
Condomínios (qta.)	2	2	1	1	1	1	1	1
Cidade	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Atributos	Varanda/Piscina/Quadra	Varanda/Piscina/Quadra	Varanda/Piscina	Varanda/Piscina	Varanda/Piscina/Quadra	Varanda/Piscina/Quadra	Piscina	Quadra
Tipologia	2 Torres | T+17 | 16PP	1 Torre | T+17 | 16PP	1 Torre | T+17 | 14PP	1 Torre | T+17 | 16PP	5 Torres | T+17 | 16PP	5 Torres | T+17 | 16PP	5 Torres | T+17 | 16PP	1 Torre | T+15 | 10PP
Tipologia			1 Torre | T+17 | 16PP		1 Torre | T+17 | 14PP	1 Torre | T+17 | 14PP	1 Torre | T+17 | 14PP	1 Torre | T+15 | 12PP
Tipologia								1 Torre | T+15 | 14PP
Projeto Infra	EP	EP	EP	EP	EP	EP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	AP	AP	AP	AP	AP	
Mês Base	julho-25	julho-25	julho-25	julho-25	julho-25	julho-25	setembro-24	junho-25
Incc	1.199,509	1.199,509	1.199,509	1.199,509	1.199,509	1.191,327	1.126,916	
LVS	junho-25	junho-25	junho-25	junho-25	junho-25	maio-25	julho-24	
Indiretos	junho-25	junho-25	junho-25	junho-25	junho-25	maio-25	julho-24	
Base de Preço	LPU 93	LPU 93	LPU 93	LPU 93	LPU 93	LPU 92	LPU 82	
Takt	2X2	2X2	2X2	2X2	2X2	2X2	2X2	
Prazo (mês)	21	16	19	15	21 | 16 | 19 | 15	21 | 16 | 19 | 15	18 | 14 | 18 | 14	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 102.416	R$ / UND R$ 92.426	R$ / UND R$ 101.902	R$ / UND R$ 94.756	R$ / UND R$ 99.248	R$ / UND R$ 98.750	R$ / UND R$ 94.651	R$ / UND R$ 104.945
Indireto	R$ 18.300	R$ 16.883	R$ 18.385	R$ 17.234	R$ 17.905	R$ 17.784	R$ 15.731	R$ 18.900
Torre	R$ 59.957	R$ 60.320	R$ 59.287	R$ 59.052	R$ 59.651	R$ 59.640	R$ 57.457	R$ 58.899
Infra	R$ 14.551	R$ 8.069	R$ 14.896	R$ 11.655	R$ 13.066	R$ 13.024	R$ 14.082	R$ 17.186
Fundação	R$ 7.355	R$ 7.154	R$ 6.592	R$ 6.640	R$ 6.955	R$ 6.863	R$ 6.069	R$ 8.383
EEE	R$ 1.068		R$ 1.081		R$ 709	R$ 706	R$ 691	
ETE								
Contenção	R$ 24		R$ 42		R$ 22	R$ 21	R$ 65	R$ 78
Terraplenagem	R$ 1.161		R$ 1.618	R$ 174	R$ 941	R$ 711	R$ 555	R$ 1.499
CUSTO TOTAL II	R$ 1.278	R$ 1.278	R$ 1.278	R$ 1.278	R$ 1.278	R$ 3.352	R$ 2.264	R$ 592
Urbanização	R$ 196	R$ 196	R$ 196	R$ 196	R$ 196	R$ 191	R$ 91	R$ 61
Drenagem							R$ 21	
Extensão de Rede Elétrica	R$ 119	R$ 119	R$ 119	R$ 119	R$ 119	R$ 119		
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 963	R$ 963	R$ 963	R$ 963	R$ 963	R$ 3.042	R$ 2.152	R$ 531
CUSTO TOTAL III								
Incorridos								
CUSTO TOTAL IV						R$ 701	R$ 6.243	
Atualização por INCC						R$ 701	R$ 6.243	
CUSTO TOTAL I+II	R$ 103.694	R$ 93.704	R$ 103.179	R$ 96.034	R$ 100.526	R$ 102.102	R$ 96.915	R$ 105.537
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 103.694	R$ 93.704	R$ 103.179	R$ 96.034	R$ 100.526	R$ 102.803	R$ 103.158	R$ 105.537

Custo de Construção

	R01 MIRANTE VERONA E VENEZA PRIME	R00 - PARAM. MIRANTE VERONA E VENEZA PRIME	
Torres	6	6	
Unidades Construídas	1692	1692	
Unidades Vendidas	1675	1675	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Salvador - BA	Salvador - BA	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	5 Torres | T+17 | 16PP	5 Torres | T+17 | 16PP	
Tipologia	1 Torre | T+17 | 14PP	1 Torre | T+17 | 14PP	
Projeto Infra	EP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	julho-25	setembro-24	
Incc	1199,509	1126,916	
LVS	junho-25	julho-24	
Indiretos	junho-25	julho-24	
Base de Preço	LPU 93	LPU 82	
Takt	2X2	2X2	
Prazo (mês)	21 | 16 | 19 | 15	18 | 14 | 18 | 14	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 99.248	R$ / UND R$ 94.651	DIF R$ 4.598
Indireto	R$ 17.905	R$ 15.731	R$ 2.173
Torre	R$ 59.651	R$ 57.457	R$ 2.194
Infra	R$ 13.066	R$ 14.082	-R$ 1.017
Fundação	R$ 6.955	R$ 6.069	R$ 886
EEE	R$ 709	R$ 691	R$ 18
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 22	R$ 65	-R$ 43
Terrapplenagem	R$ 941	R$ 555	R$ 386
CUSTO TOTAL II	R$ 1.278	R$ 2.264	-R$ 986
Urbanização	R$ 196	R$ 91	R$ 105
Drenagem	R$ 0	R$ 21	-R$ 21
Extensão de Rede Eletrica	R$ 119	R$ 0	R$ 119
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 963	R$ 2.152	-R$ 1.190
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 6.243	-R$ 6.243
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 6.243	-R$ 6.243
CUSTO TOTAL	R$ 100.526	R$ 103.158	-R$ 2.632

VARIAÇÕES

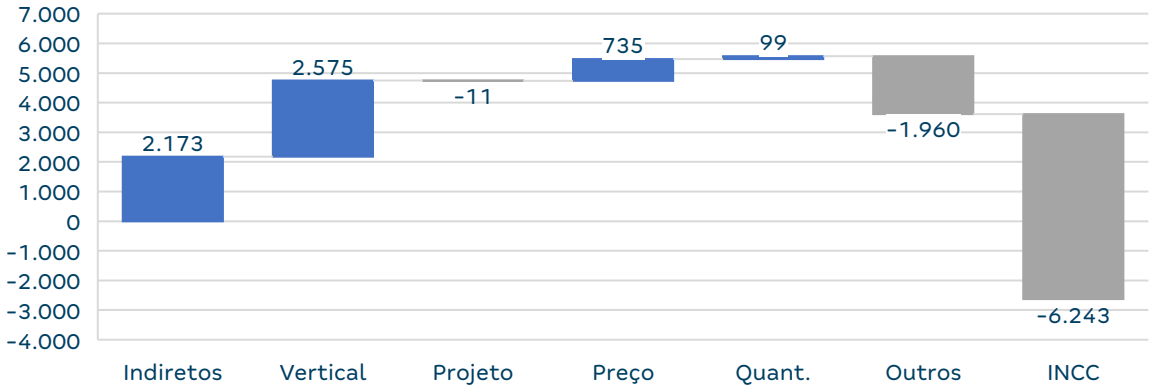

INDIRETOS
+847 | SSO (SLQA e MO apropriada)
+483 | Implantação Canteiro (Containers)
+431 | Administração
+219 | Pessoal Permanente

VERTICAL
+2.575 | Dissídio e Estepe

PROJETO
+1.165 | Uh. Varanda
+501 | Fundação Torre
-1190 | Extensão de Rede Hidráulica
-455 | Shafts e Sancas
-305 | Armação Torre
-180 | Reservatório Metálico

PREÇO
+736 | Concreto Torre
+293 | Fundação Torre
+275 | Pintura Torre
+180 | Esq. de Alumínio
-674 | Elevador

OUTROS
-915 | Instalações Torre
-842 | Instalações Infra

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Considerando substituição de rede existente da Rua dos Cursilhistas e da Rua Genaro de Carvalho no total de 1.881 metros.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Considerado ligação de rede na porta.

SISTEMA DE DRENAGEM
Considerado escada hidráulica no fundo do terreno.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado trecho de reconstituição do calçada e recomposição viária em frente ao terreno.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida 10/2024.

Esgoto:
- Viabilidade emitida 10/2024.

Drenagem:
- Não há diretriz.

Elétrica:
- Viabilidade emitida, com validade até 09/2025.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado trecho de reconstituição do calçada em frente ao terreno.

Logística – COND 1

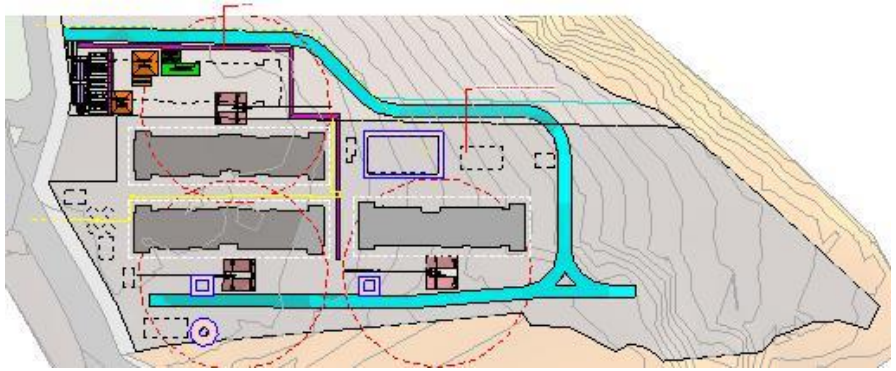

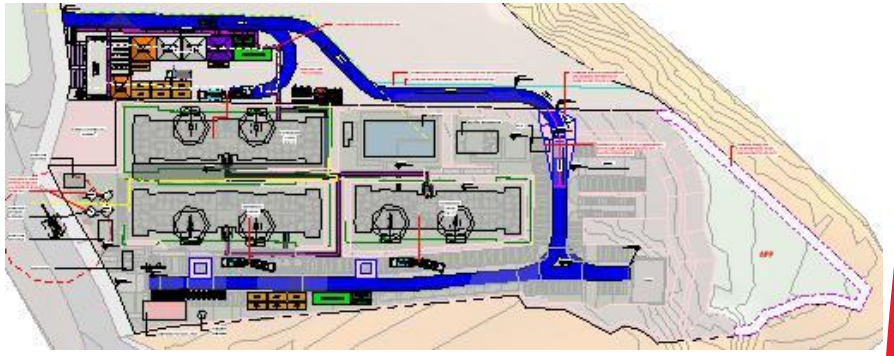

TENDAS_PERÍODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_DESMOLDANTE (LOG)	2	3,00	4,00	-	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02
_TENDA_TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	8,00	8,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
_TENDA_TENDA ARMADOR (LOG)	3	4,00	6,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02
_TENDA_TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	8,00	8,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
_TENDA_TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	8,00	8,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
_TENDA_TENDA EXTRA (LOG)	1	8,00	8,00	AJUSTAR	AJUSTAR	AJUSTAR	FASE 01 E 02
_TENDA_TENDA LAZER (LOG)	1	7,35	6,09	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02

VIVÊNCIA - CONTAINERS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_CONTAINER ALMOXARIFADO (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
_TENDA_CONTAINER PORTARIA (LOG)	1 MÓDULO COM SANITÁRIO	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
_TENDA_CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	8 MÓDULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	FASE 01 E 02
_TENDA_CONTAINER TERCEIROS (LOG)	8 MÓDULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	FASE 01 E 02
_TENDA_CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG)	2 MÓDULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	-	-	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
_TENDA_CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG)	2 MÓDULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02
_TENDA_CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	7 MÓDULOS DE CONTAINER EMBAIXO, 7 MÓDULOS EM CIMA	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMEN.	FASE
_TENDA_BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02
_TENDA_BOBCAT (LOG)	CONSIDERAR 1 UNIDADE POR FASE	1 MOBILIZAÇÃO POR FASE	1 DESMOBILIZAÇÃO POR FASE	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERIODO DE ACABAMENTO PARA CADA FASE	FASE 01 E 02
_TENDA_BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_R01	1 EQUIP PARA OS BLOCOS 00 E 00	-	-	-	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02
_TENDA_BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02
_TENDA_CAMINHÃO MUNK (LOG)	CONSIDERAR 1 UNIDADE POR FASE	1 MOBILIZAÇÃO POR FASE	1 DESMOBILIZAÇÃO POR FASE	-	MEIO PERÍODO	-	FASE 01 E 02
_TENDA_CREMALHEIRA PCT_BA (LOG)	2 UNIDADES PARA A FASE 01 E 01 UNIDADE PARA A FASE 02	1 MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO POR FASE	1 DESMOBILIZAÇÃOPOR EQUIPAMENTO POR FASE	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
_TENDA_MINIGRUA (LOG)	CONSIDERAR 2 UNIDADES PARA A FASE 01 E 2 UNIDADES PARA A FASE 02	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02

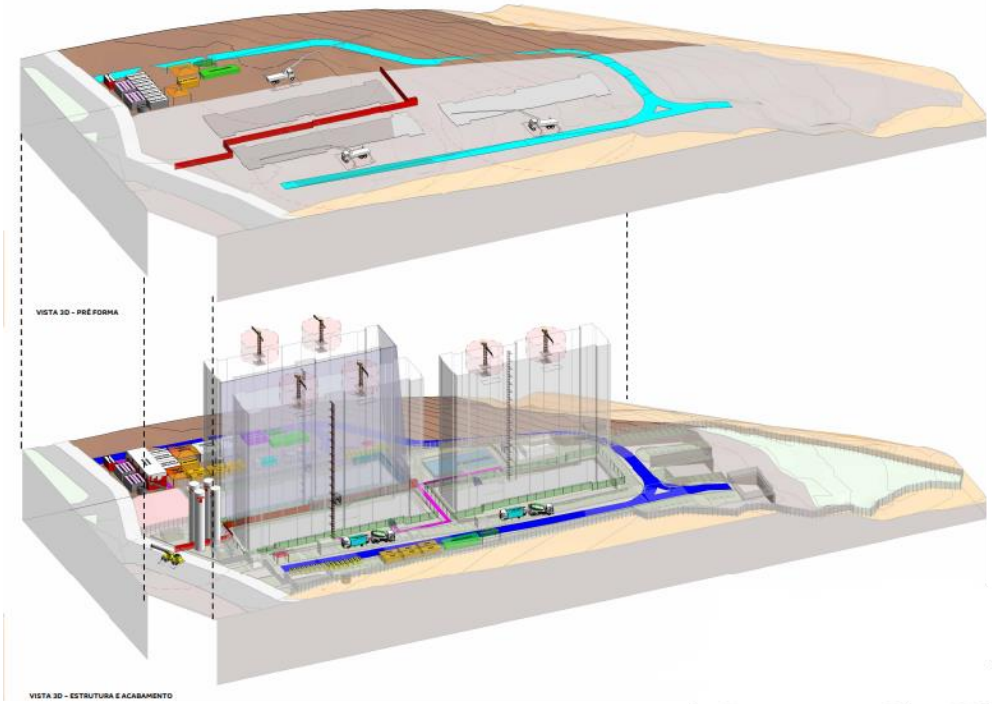



Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CUSTO E PRAZO PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS PROVISÓRIAS, CONFORME INDICADAS NA IMPLANTAÇÃO, PARA VIABILIZAR ACESSOS NO EMPREENIMENTO, GARANTINDO ASSIM A EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO/TERRAPLENAGEM. AS RAMPAS DEVERÃO SER ABSORVIDAS NO PROJETO DE TERRAPLENAGEM PROVISÓRIA, CONSIDERANDO O REFORÇO DE BASE PARA A PISTA PROVISÓRIA (CAMADA DE SACRIFÍCIO). PREVER CUSTO PARA PERDA DE CONCRETO DURANTE O PERÍODO ESTRUTURA COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA ESTACIONÁRIA PARA A CONCRETAGEM DE TODOS OS BLOCOS, NECESSÁRIO DEVIDO AO GABARITO. PREVER CUSTO DE ESCADA PROVISÓRIA PARA ACESSAR A COTA DE FUNDO DOS ENTERRADOS E EXECUTAR A ESTRUTURA.
➢ **SSO / OBRA**	CASO A OBRA OPTE POR ALTERAR O CAMINHO SEGURO DESENVOLVIDO NESTE PARECER, DEVERÁ SER PREVISTO GALERIA REFORÇADA NOS TRECHOS EM QUE O PERCURSO DE PEDESTRES COINCIDE COM ÁREA DE PROTEÇÃO PERIFÉRICA. PARA TIPOLOGIAS F02E E F2EP, INCLUIR UM EXTINTOR A. B. C. (6KG) EM CADA INTERVALO DE CINCO PAVIMENTOS DA TORRE, NÃO ULTRAPASSANDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DE 15M NO PLANO VERTICAL.
➢ **PLANEJAMENTO**	PRIORIZAR A EXECUÇÃO NO PERÍODO DE PRÉ-FORMA DOS ENTERRADOS, DEVIDO À PROJEÇÃO DOS TALUDES PROVISÓRIOS ORIUNDOS DE SUAS ESCAVAÇÕES, QUE APRESENTAM INTERFERÊNCIA COM A FUNDAÇÃO DOS BLOCOS E/OU ANEXOS.
➢ **LEGALIZAÇÃO**	PREVISTO FAIXA DE TRABALHO DE 3,00m, CONFORME INDICADO NO PARECER, PARA EXECUÇÃO DO FECHAMENTO DO CONDOMÍNIO NA APP, FECHAMENTO DA ÁREA DE DOAÇÃO E FECHAMENTO DA ÁREA INSTITUCIONAL. LEGALIZAÇÃO DEVERÁ PREVER O LICENCIAMENTO. OBRIGATÓRIO UTILIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO VIZINHO (CONDOMÍNIO 2) PARA LOCAR A ÁREA OPERACIONAL (CONTAINERS E MATERIAIS). PREVER LICENÇA PARA IÇAMENTO DO CASTELO PELO VIÁRIO PÚBLICO.

Logística – COND 2

TENDAS_PERÍODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_DESMOLDANTE (LOG)	1	3,00	4,00	-	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02
_TENDA_TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	8,00	8,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
_TENDA_TENDA ARMADOR (LOG)	2	4,00	6,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02
_TENDA_TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	8,00	8,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
_TENDA_TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	8,00	8,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
_TENDA_TENDA EXTRA (LOG)	1	8,00	8,00	AJUSTAR	AJUSTAR	AJUSTAR	FASE 01 E 02
_TENDA_TENDA LAZER (LOG)	1	3,55	4,14	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02

VIVÊNCIA - CONTAINERS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_CONTAINER ALMOXARIFADO (LOG)	1 MÓDULO DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
_TENDA_CONTAINER PORTARIA (LOG)	1 MÓDULO COM SANITÁRIO	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
_TENDA_CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	8 MÓDULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	FASE 01 E 02
_TENDA_CONTAINER TERCEIROS (LOG)	8 MÓDULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	FASE 01 E 02
_TENDA_CONTAINER VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG)	2 MÓDULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	-	-	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
_TENDA_CONTAINER VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG)	2 MÓDULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02
_TENDA_CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	7 MÓDULOS DE CONTAINER EMBAIXO, 7 MÓDULOS EM CIMA	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMEN.	FASE
_TENDA_BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02
_TENDA_BOBCAT (LOG)	CONSIDERAR 1 UNIDADE POR FASE	1 MOBILIZAÇÃO POR FASE	1 DESMOBILIZAÇÃO POR FASE	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO PARA CADA FASE	FASE 01 E 02
_TENDA_BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)_R01	1 EQUIP PARA OS BLOCOS 00 E 00	-	-	-	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02
_TENDA_BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	
_TENDA_CAMINHÃO MUNK (LOG)	CONSIDERAR 1 UNIDADE POR FASE	1 MOBILIZAÇÃO POR FASE	1 DESMOBILIZAÇÃO POR FASE	-	MEIO PERÍODO	-	FASE 01 E 02
_TENDA_CREMALHEIRA PCT_8A (LOG)	2 UNIDADES PARA A FASE 01 E 01 UNIDADE PARA A FASE 02	1 MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO POR FASE	1 DESMOBILIZAÇÃOPOR EQUIPAMENTO POR FASE	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE 01 E 02
_TENDA_MINIGRUA (LOG)	CONSIDERAR 2 UNIDADES PARA A FASE 01 E 2 UNIDADES PARA A FASE 02	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-	FASE 01 E 02

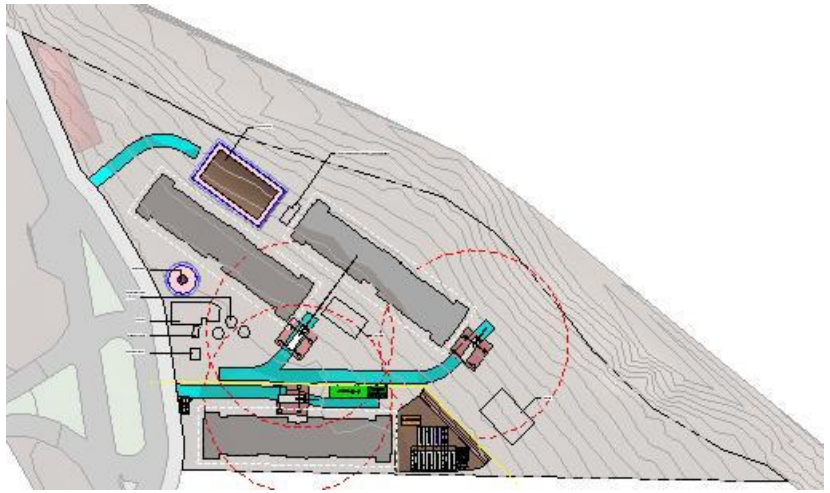

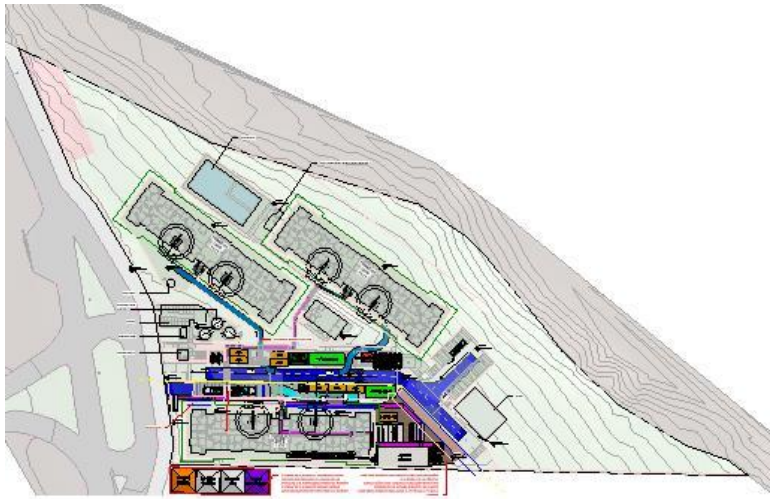

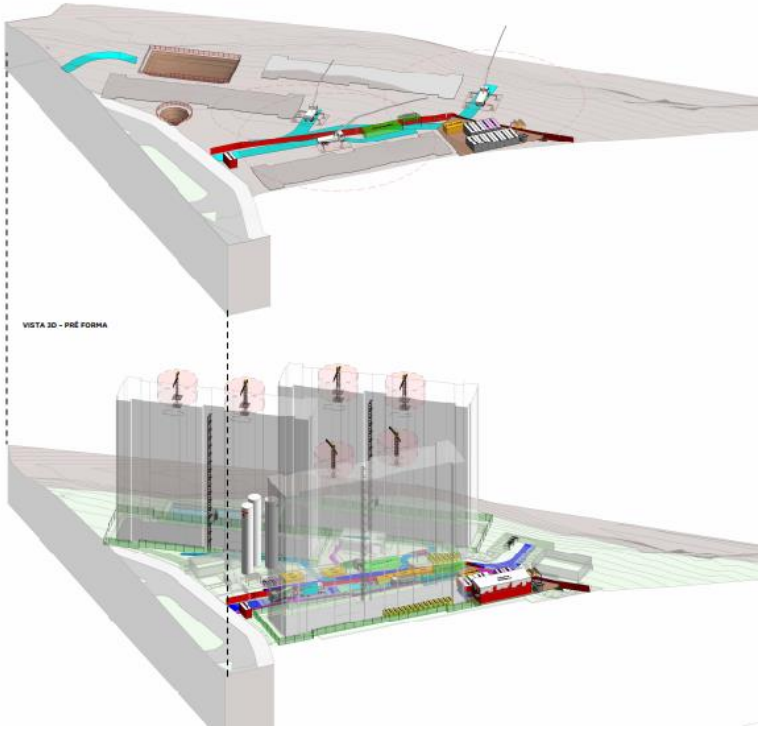

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CUSTO E PRAZO PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS PROVISÓRIAS, CONFORME INDICADAS NA IMPLANTAÇÃO, PARA VIABILIZAR ACESSOS NO EMPREENIMENTO, GARANTINDO ASSIM A EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO/TERRAPLENAGEM. AS RAMPAS DEVERÃO SER ABSORVIDAS NO PROJETO DE TERRAPLENAGEM PROVISÓRIA, CONSIDERANDO O REFORÇO DE BASE PARA A PISTA PROVISÓRIA (CAMADA DE SACRIFÍCIO). PREVER CUSTO PARA PERDA DE CONCRETO DURANTE O PERÍODO ESTRUTURA COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA ESTACIONÁRIA PARA A CONCRETAGEM DE TODOS OS BLOCOS, NECESSÁRIO DEVIDO AO GABARITO. PREVER CUSTO DE ESCADA PROVISÓRIA PARA ACESSAR A COTA DE FUNDO DOS ENTERRADOS E EXECUTAR A ESTRUTURA.
➢ **SSO / OBRA**	CASO A OBRA OPTE POR ALTERAR O CAMINHO SEGURO DESENVOLVIDO NESTE PARECER, DEVERÁ SER PREVISTO GALERIA REFORÇADA NOS TRECHOS EM QUE O PERCURSO DE PEDESTRES COINCIDE COM ÁREA DE PROTEÇÃO PERIFÉRICA. PARA TIPOLOGIAS F02E E F2EP, INCLUIR UM EXTINTOR A. B. C. (6KG) EM CADA INTERVALO DE CINCO PAVIMENTOS DA TORRE, NÃO ULTRAPASSANDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DE 15M NO PLANO VERTICAL.
➢ **PLANEJAMENTO**	PRIORIZAR A EXECUÇÃO NO PERÍODO DE PRÉ-FORMA DOS ENTERRADOS, DEVIDO À PROJEÇÃO DOS TALUDES PROVISÓRIOS ORIUNDOS DE SUAS ESCAVAÇÕES, QUE APRESENTAM INTERFERÊNCIA COM A FUNDAÇÃO DOS BLOCOS E/OU ANEXOS.

PCP 167

BA F2E					1 JOGO =	48	Aptos/mês						
Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI	Folga Inicio
V Salvador - Forte Sao Marcelo	jan/26	476	2	C	10/04/26	12/07/26	23/07/26		10/12/26	21/12/26		ago/27	2,85
Vale das Tulipas	set/25	819	3	B	19/06/26	01/11/26	03/11/26	15/11/26	23/04/27	25/04/27	07/05/27	jan/28	9,26
Veneza Prime F1	nov/25	570	2	C	14/07/26	11/12/26	22/12/26		09/06/27	20/06/27		fev/28	8,04
Morada Real	dez/25	443	3	A	17/06/26	26/12/26	28/12/26	05/01/27	29/03/27	31/03/27	08/04/27	dez/27	6,14
Jaguaribe Prime - F1	mar/26	571	3	A	31/10/26	30/03/27	01/04/27	09/04/27	29/07/27	31/07/27	07/08/27	abr/28	7,70
Vila Santiago	abr/26	356	3	B	25/11/26	24/04/27	26/04/27	08/05/27	09/07/27	11/07/27	22/07/27	mar/28	7,49
Privilege Salvador Norte	mai/26	596	2	C	15/12/26	10/06/27	21/06/27		16/12/27	27/12/27		ago/28	7,16
Portal de Salvador I - F1	jul/26	534	3	B	03/03/27	10/07/27	12/07/27	23/07/27	30/10/27	01/11/27	13/11/27	jul/28	7,71
Encanto Piatã - F3	jun/26	379	3	A	02/03/27	30/07/27	01/08/27	08/08/27	19/10/27	21/10/27	26/10/27	jun/28	8,70
V Salvador - Parque Da Cidade	ago/26	387	3	A	19/07/27	20/10/27	22/10/27	27/10/27	10/01/28	12/01/28	16/01/28	jun/28	11,28
Vista Serena	set/26	749	3	B	03/06/27	31/10/27	02/11/27	14/11/27	07/04/28	09/04/28	19/04/28	dez/28	8,73
Paralela Sun Prime - F1	out/26	508	2	C	20/06/27	17/12/27	28/12/27		26/05/28	06/06/28		fev/29	8,29
Boulevard Prime F1	nov/26	572	3	A	14/08/27	11/01/28	13/01/28	17/01/28	11/05/28	13/05/28	17/05/28	jan/29	9,07
Veneza Prime F2	abr/27	285	3	B	10/12/27	08/04/28	10/04/28	20/04/28	07/06/28	09/06/28	20/06/28	fev/29	7,98

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Salvador	SSA	45%	4.595	383	5.514	460

Empreendimento	Renda	Lançamento	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27
Morada Das Estações	3.109	dez-24	46	46	29															
Vale Dos Lirios F2	3.128	mar-25	27																	
Vila Laura Prime	5.267	abr-25	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Paralela Sun Prime - F1	4.286	nov-25		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Morada Real (Cond II - Vivenda Real)	**3.900**	**nov-25**		**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**
Veneza Prime I | F1	**4.467**	**nov-25**		**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**
Veneza Prime I | F2	**4.467**	**mai-27**																		
Verona Prime II | F1	**4.467**	**nov-28**																		
Verona Prime II | F2	**4.467**	**mai-30**																		
V Salvador - Forte Sao Marcelo	1.877	jan-26				70	70	70	70	70	70	70	10							
Vale Das Tulipas F1	3.217	fev-26					30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Jaguaribe F1 S vaga s varanda	4.739	fev-26					32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Mirante Veneza F1	3.577	mai-26								32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Vale das Orquídeas - F1	2.817	jun-26									32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
V Salvador - Parque Da Cidade	1.877	ago-26											60	70	70	70	70	70	30	
Privilege Salvador Norte	3.023	nov-26														33	33	33	33	33
Vista Serena F1	2.030	dez-26															28	28	28	28
Encanto Piatã F3	3.616	fev-27																	25	25
Paralela Sun Prime - F2	4.071	mai-27																		
Solar De Itapagipe	3.700	jul-27																		
Total de Vendas Lançados			**88**	**61**	**44**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**88**	**145**	**128**	**169**	**231**	**231**	**231**	**263**	**295**	**295**	**295**	**295**	**295**	**328**	**356**	**356**	**341**	**311**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Risco de Canibalização

Estratégia da Distribuição da Mancha

Conforme indicado no slide **"Demanda e Distribuição da Mancha"**, identificamos um potencial risco de canibalização entre os projetos Morada Real(Cond II – Vivenda Real) e Veneza, já que ambos serão lançados no mesmo período com % relevante de varanda.

Apesar de estarem localizados próximos, o Veneza Prime possui atributos superiores, tanto em termos de produto quanto de localização. Será entregue com lazer equipado e decorado, além de estar inserido em uma microrregião mais valorizada.

Para mitigar esse risco, foi definida uma estratégia que diferencia os dois empreendimentos:

- O Morada Real (Cond II – Vivenda Real) será posicionado com preço R$ 15 mil abaixo do Veneza Prime nas unidades com varanda. Com isso, passa a capturar um cliente de renda menor.

Abaixo, apresentamos uma tabela com a simulação de preços do Morada Real (Cond II – Vivenda Real) , considerando um posicionamento R$ 15 mil abaixo do Veneza Prime:

	Morada Real		Veneza Prime	
Tipologia	**Nominal**	**Raso**	**Nominal**	**Raso**
Com Varanda	245.156	221.168	260.156	236.168
Dif	-15.000	-15.000	-	-

Caso o Veneza Prime performe um preço melhor que o estimado em comitê, também temos espaço para aumentar o preço do Morada Real (Cond II – Vivenda Real).

Veneza Prime I | F1 | Mapa Concorrência

		Veneza Prime I | F1	Reserva das Flores	Reserva da Mata	Vivver Exclusive
		TENDA	MRV	MRV	Pejota
Distância Tenda (km)			464m	2,45Km	3,28Km
Região 1 Km	População	25.397	24.090	40.200	50.651
	Dens. Demográfica	8.136	7.718	12.879	16.227
	Renda (R$)	2.693	2.682	3.021	2.701
	Classe Social	E (Até 1,4k)	E (Até 1,4k)	E (Até 1,4k)	C2 (1.5k a 2.7k)
	PEA Dia	25.054	24.411	17.672	21.623
Quantitativo	Lançamento	nov/25	set/24	ago/24	07/2024
	Unidades	570	512	408	360
	Estoque	570	372	183	238
	VSO	32	16	23	19
	Stockout	18	24	8	13
Qualitativo	Condomínios	1	1	1	1
	Torres	3	4	3	3
	Gabarito	T+17	T+15	T+16	T+14
	Plantas (m²)	35,6m²	44m² | 44,86m² | 45,73m²	36,9 m² | 40,24 m²	52,56m²
	Tipologia	2 Dorms		2 Dorms	2 Dorms
	Varanda	Sim	Sim	Não	Sim
	Suite	Não	Não	Não	Sim
	Lazer	Piscina, salão de festas, quadra coberta, lazer decoberto.	Espaço Gourmet, Espaço Kids, Pet Place, Piscina Adulto, Piscina Infantil, Playground, Salão de Festas com Copa.	Espaço Gourmet, Espaço Kids, Pet Place, Piscina Adulto, Piscina Infantil, Playground, Salão de Festas com Copa.	Tem Sacada, Tem Suítes, Academia ao ar livre, Bicicletário, Churrasqueria, Espaço Gourmet, Fitness Center, Pet Place, Piscina, Playground, Quadra, Sacada, Salão de Festas, Salão de Jogos,

Diagnóstico Concorrência

- Apenas 14% do Veneza Prime irá concorrer diretamente com produtos da MRV.
- Além disso, o Vivver Exclusive está capturando uma renda próximo ao patamar previsto para unidades com varanda e vaga, com um produto 100% com suíte.
- Ainda assim, já contamos com a boa performance do Vivenda Real (Tenda) na regional.

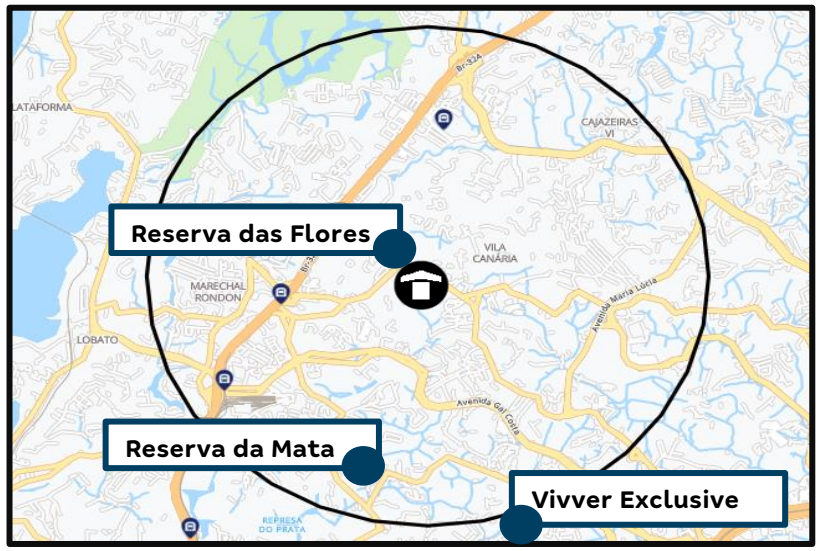

-	Veneza Prime				Reserva Das Flores					Reserva da Mata					Vivver Exclusive				
Tipologias	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol
Sem vaga	244.809	192.068	3.759	5%	-	-	-	-	-	244.174	195.339	3.892	54%	🟡	-	-	-	-	-
Varanda	260.156	201.276	4.398	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276.163	220.930	5.480	100%	🟢
Varanda | Vg Moto	269.937	202.385	4.649	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varanda | Vg Carro	279.152	217.063	5.399	9%	280.114	224.092	5.492	97%	🟡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vg Carro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.882	215.906	4.642	38%	-	-	-	-	-	-
Vg Moto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.030	198.424	3.992	6%	-	-	-	-	-	-
Garden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.890	232.712	5.692	1%	-	-	-	-	-	-
GardenVg Carro	-	-	-	-	291.190	232.952	5.692	3%	-	309.890	247.912	5.992	1%	-	-	-	-	-	-

Farol Renda
🟢 Acima de 300
🟡 Entre 0 e 300
🔴 Abaixo de 0

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Veneza Prime I | F1							
Tipo:	**Uh Tipo**		**Varanda**		**Varanda | Vg Moto**		**Varanda | Vg Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	255.179		255.983		258.600		270.189	
Renda Inicial (VF)	3.759		4.398		4.649		5.399	
Renda Final*	-		-		-		-	
% RET1	0%		0%		0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,52	2.001	0,65	2.914	0,82	3.886	0,72	3.936
FGTS	0,74	2.810	0,90	4.027	0,64	3.024	0,55	3.031
Financiamento	95,66%	185.834	95,11%	195.579	96,29%	199.362	97,63%	214.032
Subsídio	166,96%	3.425	140,61%	1.670	0,00%	0	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	28	28	28	28	28	28	28	28
Pró-Soluto	83,75%	32.027	71,47%	31.978	73,14%	34.591	64,01%	35.159
Preço Raso (RS)	226.096	226.096	236.168	236.168	240.862	240.862	256.159	256.159
TCD	49,39%	18.714	54,11%	23.988	62,04%	29.075	42,25%	22.994
VSO	2	2	26	26	1	1	3	3
Preço de Venda	**241.361**	**241.361**	**256.492**	**256.492**	**266.135**	**266.135**	**275.221**	**275.221**
Elasticidade	1,429%	1,429%	1,429%	1,429%	1,429%	1,429%	1,429%	1,429%
Preço de Venda Final	**244.809**	**244.809**	**260.156**	**260.156**	**269.937**	**269.937**	**279.152**	**279.152**
Preço Raso (R$)	**226.096**		**236.168**		**240.862**		**256.159**	
% de Raso	**92,36%**		**90,78%**		**89,23%**		**91,76%**	
BP25 - Não Inflacionado	**218.948**		**-**		**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**227.596**		**-**		**-**		**-**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Veneza Prime I | F1	
Tipo:	**Faixa 2**	
Método	**Vision**	
Avaliação	257.298	
Renda Inicial (VF)	4.467	
Renda Final*	-	
Tipo:	**VF**	**R$**
Ato	0,66	3.001
FGTS	0,85	3.843
Financiamento	95,40%	196.906
Subsídio	123,81%	1.536
Prazo de Pró-soluto	28	28
Pró-Soluto	71,45%	32.365
Preço Raso (RS)	237.652	237.652
TCD	53,17%	23.865
VSO	32	32
Preço de Venda	**257.781**	**257.781**
Elasticidade	1,429%	1,429%
Preço de Venda Final	**261.517**	**261.517**
Preço Raso (R$)	**237.652**	
% de Raso	**90,87%**	
Raso Todas as Fases	**236.586**	
Nominal Todas as Fases	**260.722**	

1

Análise de Riscos

Farol IM

IM avalia o Preço Vision como **factível**.

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região com bons indicadores sociodemográficos, como renda e PEA/Dia, o mesmo também se encontra próximo de pontos de interesses como hospital, escola e etc.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes da região têm performado renda próxima ao estimado pelo Vision, portanto o Vivenda Real (Tenda) que atualmente performa na regional, já atingiu renda e volume projetado para o Veneza Prime.

	Preço Real					Preço Normalizado (28m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
V. Salvador - Farol da Barra	192.564	179.309	2.400	38	16	10.236	189.545
Morada Das Estações	228.986	208.941	3.109	46	27	1.205	210.146
Vale Dos Lirios	229.205	204.194	3.128	46	18	10.100	214.294
Vivenda Real Cond I	236.094	220.188	3.900	48	26	2.466	222.654
Veneza Prime I | F1	257.298	237.652	4.467	32	28	-	237.652
Encanto Piatã	263.650	232.975	4.724	53	24	4.920	237.895
Vila Laura Prime	260.223	247.152	5.297	15	28	0	247.152
Jd. Armação Prime	305.810	285.695	7.500	32	21	14.826	300.521

Simulação de Preço – Fases Futuras

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pós	PSOL (m)	RET1
Veneza Prime I | F2	Uh Tipo	3.759	0,52	0,74	98,1%	167,0%	83,4%	49,2%	1	233.467	255.179	0,9804%	235.756	217.125	21	0%
Veneza Prime I | F2	Varanda	4.398	0,65	0,90	97,1%	140,6%	71,2%	53,9%	14	248.610	255.983	0,9804%	251.047	227.165	21	0%
Veneza Prime I | F2	Varanda | Vg Carro	5.399	0,72	0,55	99,0%	0,0%	63,7%	42,1%	1	266.555	270.189	0,9804%	269.168	246.276	21	0%
Verona Prime II | F1	Uh Tipo	3.759	0,52	0,74	97,0%	167,0%	83,7%	49,4%	1	236.851	255.179	1,4286%	240.234	221.521	24	0%
Verona Prime II | F1	Varanda	4.398	0,65	0,90	96,1%	140,6%	71,5%	54,1%	21	251.988	255.983	1,4286%	255.588	231.600	24	0%
Verona Prime II | F1	Varanda | Vg Moto	4.649	0,82	0,64	96,3%	0,0%	73,1%	62,0%	3	261.263	258.600	1,4286%	264.995	235.920	24	0%
Verona Prime II | F1	Varanda | Vg Carro	5.399	0,72	0,55	97,6%	0,0%	64,0%	42,3%	7	270.269	270.189	1,4286%	274.130	251.136	24	0%
Verona Prime II | F2	Uh Tipo	3.759	0,52	0,74	98,6%	167,0%	85,0%	50,1%	1	232.340	255.179	2,9412%	239.173	220.181	20	0%
Verona Prime II | F2	Varanda	4.398	0,65	0,90	97,5%	140,6%	77,8%	58,9%	13	247.484	255.983	#######	273.263	247.150	20	0%

Percepção Comercial

Parecer: O parecer do ciclo é positivo; apesar da concorrência da MRV e da PJ, a MRV apresenta baixo estoque, e a PJ, embora próxima, não representa concorrência significativa devido à diferença de preço.

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Veneza Prime I | F1							
Tipo:	**Uh Tipo**		**Varanda**		**Varanda | Vg Moto**		**Varanda | Vg Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	255.179		255.983		258.600		270.189	
Renda Inicial (VF)	3.759		4.398		4.649		5.399	
Renda Final*	-		-		-		-	
% RET1	0%		0%		0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,52	2.001	0,65	2.914	0,82	3.886	0,72	3.936
FGTS	0,74	2.810	0,90	4.027	0,64	3.024	0,55	3.031
Financiamento	96,27%	185.834	95,50%	195.579	96,29%	199.362	97,63%	214.032
Subsídio	166,96%	3.425	140,61%	1.670	0,00%	0	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	26	26	26	26	26	26	26	26
Pró-Soluto	83,75%	29.739	71,47%	29.694	73,14%	32.120	64,01%	32.648
Preço Raso (RS)	223.808	223.808	233.884	233.884	238.391	238.391	253.647	253.647
TCD	49,39%	18.714	54,11%	23.988	62,04%	29.075	42,25%	22.994
VSO	2	2	26	26	1	1	3	3
Preço de Venda	**239.106**	**239.106**	**254.240**	**254.240**	**263.699**	**263.699**	**272.745**	**272.745**
Elasticidade	1,429%	1,429%	1,429%	1,429%	1,429%	1,429%	1,429%	1,429%
Preço de Venda Final	**242.522**	**242.522**	**257.872**	**257.872**	**267.466**	**267.466**	**276.641**	**276.641**
Preço Raso (R$)	**223.808**		**233.884**		**238.391**		**253.647**	
% de Raso	**92,28%**		**90,70%**		**89,13%**		**91,69%**	
BP25 - Não Inflacionado	**216.460**		**-**		**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**225.108**		**-**		**-**		**-**	

Resumo de Preços

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pós	PSOL (m)	RET1
Veneza Prime I | F2	Uh Tipo	3.759	0,52	0,74	98,1%	167,0%	83,4%	49,2%	1	233.467	255.179	0,9804%	235.756	217.125	21	0%
Veneza Prime I | F2	Varanda	4.398	0,65	0,90	97,1%	140,6%	71,2%	53,9%	14	248.610	255.983	0,9804%	251.047	227.165	21	0%
Veneza Prime I | F2	Varanda | Vg Carro	5.399	0,72	0,55	99,0%	0,0%	63,7%	42,1%	1	266.555	270.189	0,9804%	269.168	246.276	21	0%
Verona Prime II | F1	Uh Tipo	3.759	0,52	0,74	97,0%	167,0%	83,7%	49,4%	1	236.851	255.179	1,4286%	240.234	221.521	24	0%
Verona Prime II | F1	Varanda	4.398	0,65	0,90	96,1%	140,6%	71,5%	54,1%	21	251.988	255.983	1,4286%	255.588	231.600	24	0%
Verona Prime II | F1	Varanda | Vg Moto	4.649	0,82	0,64	96,3%	0,0%	73,1%	62,0%	3	261.263	258.600	1,4286%	264.995	235.920	24	0%
Verona Prime II | F1	Varanda | Vg Carro	5.399	0,72	0,55	97,6%	0,0%	64,0%	42,3%	7	270.269	270.189	1,4286%	274.130	251.136	24	0%
Verona Prime II | F2	Uh Tipo	3.759	0,52	0,74	98,6%	167,0%	85,0%	50,1%	1	232.340	255.179	2,9412%	239.173	220.181	20	0%
Verona Prime II | F2	Varanda	4.398	0,65	0,90	97,5%	140,6%	72,5%	54,9%	13	247.484	255.983	2,9412%	254.763	230.417	20	0%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Informações Gerais – Consolidado (Cenário Aprovação)

Veneza Prime - BA - Salvador Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	ago-24							
Veneza Prime F1 - UH tipo		nov-25	mai-26	fev-28	6 meses	21 meses	nov-28	36 meses
Veneza Prime F1 - Varanda		nov-25	mai-26	fev-28	6 meses	21 meses	nov-28	36 meses
Veneza Prime F1 - Var + moto		nov-25	mai-26	fev-28	6 meses	21 meses	nov-28	36 meses
Veneza Prime F1 - Var + carro		nov-25	mai-26	fev-28	6 meses	21 meses	nov-28	36 meses
Veneza Prime F2 - UH tipo		mai-27	nov-27	mar-29	6 meses	16 meses	mai-30	36 meses
Veneza Prime F2 - Varanda		mai-27	nov-27	mar-29	6 meses	16 meses	mai-30	36 meses
Veneza Prime F2 - Var + carro		mai-27	nov-27	mar-29	6 meses	16 meses	mai-30	36 meses
Verona Prime F1 - UH tipo		nov-28	mai-29	dez-30	6 meses	19 meses	nov-31	36 meses
Verona Prime F1 - Varanda		nov-28	mai-29	dez-30	6 meses	19 meses	nov-31	36 meses
Verona Prime F1 - Var + moto		nov-28	mai-29	dez-30	6 meses	19 meses	nov-31	36 meses
Verona Prime F1 - Var + carro		nov-28	mai-29	dez-30	6 meses	19 meses	nov-31	36 meses
Veorna Prime F2 - UH tipo		mai-30	nov-30	fev-32	6 meses	15 meses	mai-33	36 meses
Verona Prime F2 - Varanda		mai-30	nov-30	fev-32	6 meses	15 meses	mai-33	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	30,55 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	28.627 m²
Cash:	30,55 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	43	**Custo de terreno m²:**	1.067,2
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	3.376
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	8.539
Ato / %VGV:	3,16 MM / 0,7%			**Incorrido de Construção:**	0,29 MM

Área Líquida do Terreno:	28.627 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	1.067,2
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	7,1% / 46,2%
CA Máx/Proj.	3,0 / 1,5
Incorridos de Incorporação:	0,83 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Veneza Prime F1 - UH tipo	T+17	223.808	26	242.522	255.179	96,3%	83,7%	49,4%
Veneza Prime F1 - Varanda	T+17	233.884	471	257.872	255.983	95,5%	71,5%	54,1%
Veneza Prime F1 - Var + moto	T+17	238.391	23	267.466	258.600	96,3%	73,1%	62,0%
Veneza Prime F1 - Var + carro	T+17	253.647	50	276.641	270.189	97,6%	64,0%	42,3%
Veneza Prime F2 - UH tipo	T+17	217.125	13	235.756	255.179	98,1%	83,4%	49,2%
Veneza Prime F2 - Varanda	T+17	227.165	248	251.047	255.983	97,1%	71,2%	53,9%
Veneza Prime F2 - Var + carro	T+17	246.276	24	269.168	270.189	99,0%	63,7%	42,1%
Verona Prime F1 - UH tipo	T+17	221.521	26	240.234	255.179	97,0%	83,7%	49,4%
Verona Prime F1 - Varanda	T+17	231.600	376	255.588	255.983	96,1%	71,5%	54,1%
Verona Prime F1 - Var + moto	T+17	235.920	49	264.995	258.600	96,3%	73,1%	62,0%
Verona Prime F1 - Var + carro	T+17	251.136	119	274.130	270.189	97,6%	64,0%	42,3%
Veorna Prime F2 - UH tipo	T+17	220.181	12	239.173	255.179	98,6%	85,0%	50,1%
Verona Prime F2 - Varanda	T+17	230.417	238	254.763	255.983	97,5%	72,5%	54,9%

Unidades Totais:	1.675	**Preço Médio:**	257.307	**Renda Média:**	4.495	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	8.839
Unidades Tenda:	1.675	**Avaliação Média:**	257.696	**Ato:**	2.977 (0,66 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	15.215
VSO:	23,5 Unidades	**VGV Total:**	430.988.493	**FGTS:**	3.792 (0,84 Salários)	**Preço Raso Médio:**	233.422
RET Médio:	4,0%	**VGV Tenda:**	430.988.493	**% em RET 1%:**	0%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit.:	100.676	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	35,60	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**52.568.179**	**LI:**	**21,68%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**26.554.635**	**Margem Bruta Econômica:**	**45,57%**
TIR:	**73,40%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(19.109.145)**	**Margem Bruta REF:**	**48,92%**
Exposição de Caixa:	**5,59%**	**Δ LI:**	**1,68%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(7.349.264)**	**Margem Rasa Econômica:**	**39,34%**
Payback Contingente (21 m):	**21 m/ (0 m)**	**LI Marginal:**	**22,20%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**145.437.298**	**Margem Rasa REF:**	**43,70%**
Payback Consolidado:	**22 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**32,89%**

DRE (Cenário Aprovação)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Veneza Prime		Veneza Prime F1 - UH tipo		Veneza Prime F1 - Varanda		Veneza Prime F1 - Var + moto		Veneza Prime F1 - Var + carro		Veneza Prime F2 - UH tipo		Veneza Prime F2 - Varanda		Veneza Prime F2 - Var + carro		Verona Prime F1 - UH tipo		Verona Prime F1 - Varanda		Verona Prime F1 - Var + moto		Verona Prime F1 - Var + carro		Veorna Prime F2 - UH tipo		Verona Prime F2 - Varanda	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	475.111	100,0%	6.260	100,0%	120.066	100,0%	6.041	100,0%	13.672	100,0%	3.330	100,0%	67.290	100,0%	6.915	100,0%	7.163	100,0%	111.902	100,0%	15.145	100,0%	37.966	100,0%	3.614	100,0%	75.747	100,0%
PIS/COFINS	(10.415)	2,2%	(137)	2,2%	(2.632)	2,2%	(132)	2,2%	(300)	2,2%	(73)	2,2%	(1.475)	2,2%	(152)	2,2%	(157)	2,2%	(2.453)	2,2%	(332)	2,2%	(832)	2,2%	(79)	2,2%	(1.660)	2,2%
Custo Total	(252.931)	54,4%	(3.720)	60,7%	(67.315)	57,3%	(3.293)	55,7%	(7.175)	53,7%	(1.816)	55,8%	(34.360)	52,2%	(3.333)	49,3%	(4.192)	59,8%	(60.573)	55,3%	(7.920)	53,5%	(19.181)	51,7%	(1.938)	54,8%	(38.116)	51,4%
Custo Terreno	(33.417)	7,2%	(519)	8,5%	(9.397)	8,0%	(459)	7,8%	(998)	7,5%	(259)	8,0%	(4.948)	7,5%	(479)	7,1%	(519)	7,4%	(7.501)	6,9%	(978)	6,6%	(2.374)	6,4%	(239)	6,8%	(4.748)	6,4%
Custo Relacionados a Terreno	(2.762)	0,6%	(40)	0,7%	(731)	0,6%	(36)	0,6%	(78)	0,6%	(21)	0,6%	(400)	0,6%	(39)	0,6%	(44)	0,6%	(643)	0,6%	(84)	0,6%	(203)	0,5%	(21)	0,6%	(422)	0,6%
Custos de Incorporação	(6.280)	1,4%	(87)	1,4%	(1.502)	1,3%	(79)	1,3%	(188)	1,4%	(60)	1,8%	(852)	1,3%	(90)	1,3%	(108)	1,5%	(1.504)	1,4%	(222)	1,5%	(486)	1,3%	(68)	1,9%	(1.035)	1,4%
Custo de Construção	(210.472)	45,3%	(3.074)	50,2%	(55.686)	47,4%	(2.719)	46,0%	(5.911)	44,2%	(1.476)	45,3%	(28.161)	42,8%	(2.725)	40,3%	(3.521)	50,3%	(50.925)	46,5%	(6.636)	44,8%	(16.117)	43,4%	(1.609)	45,5%	(31.911)	43,1%
Lucro Bruto Econômico	211.765	45,6%	2.403	39,3%	50.119	42,7%	2.615	44,3%	6.198	46,3%	1.441	44,2%	31.455	47,8%	3.430	50,7%	2.813	40,2%	48.876	44,7%	6.893	46,5%	17.953	48,3%	1.598	45,2%	35.970	48,6%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	211.765	45,6%	2.403	39,3%	50.119	42,7%	2.615	44,3%	6.198	46,3%	1.441	44,2%	31.455	47,8%	3.430	50,7%	2.813	40,2%	48.876	44,7%	6.893	46,5%	17.953	48,3%	1.598	45,2%	35.970	48,6%
Despesas de Selling	(48.005)	10,3%	(630)	10,3%	(12.073)	10,3%	(610)	10,3%	(1.362)	10,2%	(340)	10,4%	(6.866)	10,4%	(708)	10,5%	(742)	10,6%	(11.274)	10,3%	(1.515)	10,2%	(3.768)	10,1%	(368)	10,4%	(7.749)	10,5%
Contingência	(10.928)	2,4%	(144)	2,4%	(2.762)	2,4%	(139)	2,4%	(314)	2,4%	(77)	2,4%	(1.548)	2,4%	(159)	2,4%	(165)	2,4%	(2.574)	2,4%	(348)	2,4%	(873)	2,4%	(83)	2,4%	(1.742)	2,4%
Margem de Contribuição	152.832	32,9%	1.629	26,6%	35.284	30,0%	1.866	31,6%	4.522	33,8%	1.025	31,5%	23.042	35,0%	2.563	37,9%	1.907	27,2%	35.028	32,0%	5.030	34,0%	13.311	35,8%	1.146	32,4%	26.479	35,7%
IR e CSLL	(8.521)	1,8%	(112)	1,8%	(2.153)	1,8%	(108)	1,8%	(245)	1,8%	(60)	1,8%	(1.207)	1,8%	(124)	1,8%	(128)	1,8%	(2.007)	1,8%	(272)	1,8%	(681)	1,8%	(65)	1,8%	(1.358)	1,8%
Margem Líquida	144.311	31,1%	1.517	24,8%	33.130	28,2%	1.758	29,7%	4.277	32,0%	965	29,6%	21.835	33,2%	2.439	36,1%	1.778	25,4%	33.022	30,2%	4.758	32,1%	12.631	34,0%	1.081	30,6%	25.121	33,9%
Lucro Bruto REF Unit.	143.251	48,9%	104.326	42,4%	121.227	46,1%	132.146	48,3%	140.068	49,8%	124.417	47,6%	142.953	51,0%	164.914	54,6%	131.060	45,1%	147.333	48,0%	158.258	49,8%	169.216	51,4%	148.129	48,3%	170.553	51,8%
Lucro Raso REF Unit.	116.083	43,7%	85.389	37,6%	96.799	40,6%	102.434	42,0%	116.673	45,2%	103.839	43,1%	116.330	45,9%	139.277	50,4%	108.467	40,5%	118.552	42,6%	123.408	43,6%	141.654	47,0%	123.880	43,8%	139.109	46,7%

R$ Mil - VPL - Compra	Veneza Prime		Veneza Prime F1 - UH tipo		Veneza Prime F1 - Varanda		Veneza Prime F1 - Var + moto		Veneza Prime F1 - Var + carro		Veneza Prime F2 - UH tipo		Veneza Prime F2 - Varanda		Veneza Prime F2 - Var + carro		Verona Prime F1 - UH tipo		Verona Prime F1 - Varanda		Verona Prime F1 - Var + moto		Verona Prime F1 - Var + carro		Veorna Prime F2 - UH tipo		Verona Prime F2 - Varanda	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	242.431	100,0%	4.447	100,0%	83.593	100,0%	4.053	100,0%	9.576	100,0%	1.877	100,0%	37.249	100,0%	3.683	100,0%	2.873	100,0%	46.710	100,0%	6.282	100,0%	15.969	100,0%	1.220	100,0%	24.897	100,0%
PIS/COFINS	(5.234)	2,2%	(96)	2,2%	(1.805)	2,2%	(87)	2,2%	(207)	2,2%	(41)	2,2%	(804)	2,2%	(80)	2,2%	(62)	2,2%	(1.008)	2,2%	(136)	2,2%	(345)	2,2%	(26)	2,2%	(538)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(184.628)	76,2%	(3.485)	78,4%	(63.379)	75,8%	(3.104)	76,6%	(6.846)	71,5%	(1.426)	76,0%	(27.149)	72,9%	(2.647)	71,9%	(2.506)	87,2%	(36.879)	79,0%	(4.854)	77,3%	(11.823)	74,0%	(989)	81,0%	(19.541)	78,5%
Custo Terreno	(25.074)	10,3%	(389)	8,8%	(7.051)	8,4%	(344)	8,5%	(748)	7,8%	(195)	10,4%	(3.713)	10,0%	(359)	9,8%	(389)	13,5%	(5.629)	12,1%	(734)	11,7%	(1.781)	11,2%	(180)	14,7%	(3.563)	14,3%
Custo Relacionados a Terreno	(2.257)	0,9%	(41)	0,9%	(737)	0,9%	(36)	0,9%	(78)	0,8%	(18)	0,9%	(337)	0,9%	(33)	0,9%	(32)	1,1%	(463)	1,0%	(60)	1,0%	(146)	0,9%	(13)	1,1%	(263)	1,1%
Custos de Incorporação	(4.133)	1,7%	(79)	1,8%	(1.320)	1,6%	(73)	1,8%	(166)	1,7%	(43)	2,3%	(599)	1,6%	(64)	1,8%	(61)	2,1%	(829)	1,8%	(122)	1,9%	(271)	1,7%	(31)	2,5%	(473)	1,9%
Custo de Construção	(117.139)	48,3%	(2.307)	51,9%	(41.784)	50,0%	(2.040)	50,3%	(4.436)	46,3%	(890)	47,4%	(16.986)	45,6%	(1.644)	44,6%	(1.592)	55,4%	(23.024)	49,3%	(3.000)	47,8%	(7.287)	45,6%	(583)	47,8%	(11.566)	46,5%
Despesas de Selling	(28.769)	11,9%	(539)	12,1%	(10.003)	12,0%	(489)	12,1%	(1.134)	11,8%	(224)	11,9%	(4.390)	11,8%	(434)	11,8%	(345)	12,0%	(5.538)	11,9%	(749)	11,9%	(1.861)	11,7%	(145)	11,9%	(2.920)	11,7%
Contingência	(2.973)	1,2%	(52)	1,2%	(1.007)	1,2%	(51)	1,2%	(115)	1,2%	(23)	1,2%	(467)	1,3%	(48)	1,3%	(37)	1,3%	(572)	1,2%	(77)	1,2%	(194)	1,2%	(15)	1,2%	(316)	1,3%
IR e CSLL	(4.283)	1,8%	(79)	1,8%	(1.477)	1,8%	(72)	1,8%	(169)	1,8%	(33)	1,8%	(658)	1,8%	(65)	1,8%	(51)	1,8%	(825)	1,8%	(111)	1,8%	(282)	1,8%	(22)	1,8%	(440)	1,8%
Lucro Imobiliário	52.568	21,7%	865	19,5%	18.410	22,0%	861	21,2%	2.523	26,3%	411	21,9%	9.296	25,0%	956	26,0%	305	10,6%	8.823	18,9%	1.293	20,6%	3.802	23,8%	206	16,8%	4.818	19,4%

DRE (Cenário Aprovação)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Veneza Prime		Primeira Fase		Demais Fases	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	475.111	100,0%	146.039	100,0%	329.072	100,0%
PIS/COFINS	(10.415)	2,2%	(3.201)	2,2%	(7.213)	2,2%
Custo Total	(252.931)	54,4%	(81.503)	57,1%	(171.429)	53,3%
Custo Terreno	(33.417)	7,2%	(11.372)	8,0%	(22.045)	6,8%
Custo Relacionados a Terreno	(2.762)	0,6%	(885)	0,6%	(1.877)	0,6%
Custos de Incorporação	(6.280)	1,4%	(1.856)	1,3%	(4.424)	1,4%
Custo de Construção	(210.472)	45,3%	(67.390)	47,2%	(143.082)	44,5%
Lucro Bruto Econômico	211.765	45,6%	61.335	42,9%	150.430	46,7%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	211.765	45,6%	61.335	42,9%	150.430	46,7%
Despesas de Selling	(48.005)	10,3%	(14.675)	10,3%	(33.330)	10,4%
Contingência	(10.928)	2,4%	(3.359)	2,4%	(7.569)	2,4%
Margem de Contribuição	152.832	32,9%	43.301	30,3%	109.531	34,0%
IR e CSLL	(8.521)	1,8%	(2.619)	1,8%	(5.902)	1,8%
Margem Líquida	144.311	31,1%	40.681	28,5%	103.629	32,2%
Lucro Bruto REF Unit.	143.251	48,9%	122.550	46,4%		
Lucro Raso REF Unit.	116.083	43,7%	98.249	41,0%		

R$ Mil - VPL - Compra	Veneza Prime		Primeira Fase		Demais Fases	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	242.431	100,0%	101.669	100,0%	140.762	100,0%
PIS/COFINS	(5.234)	2,2%	(2.195)	2,2%	(3.039)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(184.628)	76,2%	(76.815)	75,6%	(107.813)	76,6%
Custo Terreno	(25.074)	10,3%	(8.533)	8,4%	(16.542)	11,8%
Custo Relacionados a Terreno	(2.257)	0,9%	(892)	0,9%	(1.365)	1,0%
Custos de Incorporação	(4.133)	1,7%	(1.639)	1,6%	(2.495)	1,8%
Custo de Construção	(117.139)	48,3%	(50.567)	49,7%	(66.572)	47,3%
Despesas de Selling	(28.769)	11,9%	(12.165)	12,0%	(16.605)	11,8%
Contingência	(2.973)	1,2%	(1.224)	1,2%	(1.749)	1,2%
IR e CSLL	(4.283)	1,8%	(1.796)	1,8%	(2.487)	1,8%
Lucro Imobiliário	52.568	21,7%	22.659	22,3%	29.910	21,2%

DRE (Cenário Aprovação)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Veneza Prime		Primeiro Condomínio		Demais Condomínios	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	475.111	100,0%	146.039	100,0%	329.072	100,0%
PIS/COFINS	(10.415)	2,2%	(3.201)	2,2%	(7.213)	2,2%
Custo Total	(252.931)	54,4%	(81.503)	57,1%	(171.429)	53,3%
Custo Terreno	(33.417)	7,2%	(11.372)	8,0%	(22.045)	6,8%
Custo Relacionados a Terreno	(2.762)	0,6%	(885)	0,6%	(1.877)	0,6%
Custos de Incorporação	(6.280)	1,4%	(1.856)	1,3%	(4.424)	1,4%
Custo de Construção	(210.472)	45,3%	(67.390)	47,2%	(143.082)	44,5%
Lucro Bruto Econômico	211.765	45,6%	61.335	42,9%	150.430	46,7%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	211.765	45,6%	61.335	42,9%	150.430	46,7%
Despesas de Selling	(48.005)	10,3%	(14.675)	10,3%	(33.330)	10,4%
Contingência	(10.928)	2,4%	(10.928)	7,7%	-	0,0%
Margem de Contribuição	152.832	32,9%	35.732	25,0%	117.100	36,4%
IR e CSLL	(8.521)	1,8%	(2.619)	1,8%	(5.902)	1,8%
Margem Líquida	144.311	31,1%	33.113	23,2%	111.198	34,5%
Lucro Bruto REF Unit.	143.251	54,3%	122.550	46,4%		
Lucro Raso REF Unit.	116.083	48,4%	98.249	41,0%		

R$ Mil - VPL - Compra	Veneza Prime		Primeiro Condomínio		Demais Condomínios	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	242.431	100,0%	101.669	100,0%	140.762	100,0%
PIS/COFINS	(5.234)	2,2%	(2.195)	2,2%	(3.039)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(184.628)	76,2%	(76.815)	75,6%	(107.813)	76,6%
Custo Terreno	(25.074)	10,3%	(8.533)	8,4%	(16.542)	11,8%
Custo Relacionados a Terreno	(2.257)	0,9%	(892)	0,9%	(1.365)	1,0%
Custos de Incorporação	(4.133)	1,7%	(1.639)	1,6%	(2.495)	1,8%
Custo de Construção	(117.139)	48,3%	(50.567)	49,7%	(66.572)	47,3%
Despesas de Selling	(28.769)	11,9%	(12.165)	12,0%	(16.605)	11,8%
Contingência	(2.973)	1,2%	(1.224)	1,2%	(1.749)	1,2%
IR e CSLL	(4.283)	1,8%	(1.796)	1,8%	(2.487)	1,8%
Lucro Imobiliário	52.568	21,7%	22.659	22,3%	29.910	21,2%

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	BP - 2025	Atual	Atual vs BP - 2025	Δ%
Data Estudo:	setembro-24	agosto-25	11 Meses	N/A
Lançamento:	maio-26	novembro-25	-6 Meses	N/A
Uhs:	1.675	1.675	-	0,0%
Preço Nominal:	248.840	257.307	8.467	3,4%
Preço Raso:	224.131	233.422	9.291	4,1%
Preço Nominal Inflacionado:	312.691	292.822	(19.869)	-6,4%
Preço Raso Inflacionado:	281.788	265.654	(16.134)	-5,7%
Renda Média:	3.659	4.495	836	22,8%
RET Médio:	4,00%	4,00%	0,0 p.p.	0,0%
% em RET 1%:	0,00%	0,00%	0,0 p.p.	
VSO:	24	24	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	10.247	10.780	533	5,2%
Avaliação:	242.514	257.696	15.182	6,3%
Prazo construção F1:	19	21	2	10,5%
Prazo de Pró-Soluto F1:	24	26	2	8,3%
Custo Total Inf (Unit):	161.462	151.004	(10.458)	-6,5%
Custo Construção (Unit):	97.936	100.676	2.740	2,8%
Fração de construção:	39,4%	39,1%	-0,2 p.p.	-0,6%
INCC Folha Rosto:	1.153,73	1.199,51	46	4,0%
Custo Terreno Inf:	33.530.039	33.416.686	(113.353)	-0,3%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	1.955	1.649	(306)	-15,6%
Fração do Terreno[1]:	8,0% / 47,4%	7,1% / 46,2%	-0,9 p.p.	-11,3%
Custo de Incorp. por uh:	5.005	3.750	(1.255)	-25,1%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	17.163.511	18.056.011	892.500	5,2%
Custo do Ciclo (Unit):	14.714	15.215	501	3,4%
LI Resiliência:	6,9%	10,8%	3,9 p.p.	56,1%
Lucro Imobiliário:	17,3%	21,7%	4,4 p.p.	25,6%
LI Marginal:	17,3%	22,2%	4,9 p.p.	28,6%
Exposição de caixa:	9,6%	5,6%	-4,0 p.p.	-41,8%
TIR:	41,2%	73,4%	32,2 p.p.	78,0%
Margem Bruta REF:	48,8%	48,9%	0,1 p.p.	0,3%
Margem Bruta Econômica:	45,9%	45,6%	-0,3 p.p.	-0,6%
Margem Rasa REF:	43,2%	43,7%	0,5 p.p.	1,2%
Margem Rasa Econômica:	39,3%	39,3%	0,1 p.p.	0,2%
Margem Contribuição Econômica:	32,9%	32,9%	0,0 p.p.	0,1%
Payback Contingente (Régua 21 m):	35 m/ (14 m)	21 m/ (0 m)	-14	-40,0%
Payback Consolidado:	35 Meses	22 Meses	-13 Meses	-37,1%

Informações Gerais – Consolidado (Cenário Real)

Veneza Prime - BA - Salvador Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	ago-24							
Veneza Prime F1 - UH tipo		nov-25	jul-26	mar-28	8 meses	20 meses	nov-28	36 meses
Veneza Prime F1 - Varanda		nov-25	jul-26	mar-28	8 meses	20 meses	nov-28	36 meses
Veneza Prime F1 - Var + moto		nov-25	jul-26	mar-28	8 meses	20 meses	nov-28	36 meses
Veneza Prime F1 - Var + carro		nov-25	jul-26	mar-28	8 meses	20 meses	nov-28	36 meses
Veneza Prime F2 - UH tipo		mai-27	nov-27	fev-29	6 meses	15 meses	mai-30	36 meses
Veneza Prime F2 - Varanda		mai-27	nov-27	fev-29	6 meses	15 meses	mai-30	36 meses
Veneza Prime F2 - Var + carro		mai-27	nov-27	fev-29	6 meses	15 meses	mai-30	36 meses
Verona Prime F1 - UH tipo		nov-28	mai-29	dez-30	6 meses	19 meses	nov-31	36 meses
Verona Prime F1 - Varanda		nov-28	mai-29	dez-30	6 meses	19 meses	nov-31	36 meses
Verona Prime F1 - Var + moto		nov-28	mai-29	dez-30	6 meses	19 meses	nov-31	36 meses
Verona Prime F1 - Var + carro		nov-28	mai-29	dez-30	6 meses	19 meses	nov-31	36 meses
Veorna Prime F2 - UH tipo		mai-30	nov-30	fev-32	6 meses	15 meses	mai-33	36 meses
Verona Prime F2 - Varanda		mai-30	nov-30	fev-32	6 meses	15 meses	mai-33	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	30,55 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	28.627 m²
Cash:	30,55 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	43	**Custo de terreno m²:**	1.067,2
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	3.376
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	8.539
Ato / %VGV:	3,16 MM / 0,7%			**Incorrido de Construção:**	0,29 MM

Área Líquida do Terreno:	28.627 m²		
Custo de terreno m² Área Líquida:	1.067,2		
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	7,1% / 46,1%		
CA Máx/Proj.	3,0 / 1,5		
Incorridos de Incorporação:	0,83 MM		

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Veneza Prime F1 - UH tipo	T+17	226.096	26	244.809	255.179	95,7%	83,7%	49,4%
Veneza Prime F1 - Varanda	T+17	236.168	471	260.156	255.983	95,1%	71,5%	54,1%
Veneza Prime F1 - Var + moto	T+17	240.862	23	269.937	258.600	96,3%	73,1%	62,0%
Veneza Prime F1 - Var + carro	T+17	256.159	50	279.152	270.189	97,6%	64,0%	42,3%
Veneza Prime F2 - UH tipo	T+17	217.125	13	235.756	255.179	98,1%	83,4%	49,2%
Veneza Prime F2 - Varanda	T+17	227.165	248	251.047	255.983	97,1%	71,2%	53,9%
Veneza Prime F2 - Var + carro	T+17	246.276	24	269.168	270.189	99,0%	63,7%	42,1%
Verona Prime F1 - UH tipo	T+17	221.521	26	240.234	255.179	97,0%	83,7%	49,4%
Verona Prime F1 - Varanda	T+17	231.600	376	255.588	255.983	96,1%	71,5%	54,1%
Verona Prime F1 - Var + moto	T+17	235.920	49	264.995	258.600	96,3%	73,1%	62,0%
Verona Prime F1 - Var + carro	T+17	251.136	119	274.130	270.189	97,6%	64,0%	42,3%
Veorna Prime F2 - UH tipo	T+17	220.181	12	239.173	255.179	98,6%	85,0%	50,1%
Verona Prime F2 - Varanda	T+17	230.417	238	254.763	255.983	97,5%	72,5%	54,9%

Unidades Totais:	1.675	**Preço Médio:**	258.093	**Renda Média:**	4.495	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	8.903
Unidades Tenda:	1.675	**Avaliação Média:**	257.696	**Ato:**	2.977 (0,66 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	15.262
VSO:	23,5 Unidades	**VGV Total:**	432.306.213	**FGTS:**	3.792 (0,84 Salários)	**Preço Raso Médio:**	233.620
RET Médio:	4,0%	**VGV Tenda:**	432.306.213	**% em RET 1%:**	0%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit.:	100.676	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	35,60	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**52.799.081**	**LI:**	**21,80%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**25.771.581**	**Margem Bruta Econômica:**	**45,68%**
TIR:	**73,91%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(16.468.131)**	**Margem Bruta REF:**	**49,00%**
Exposição de Caixa:	**5,41%**	**Δ LI:**	**1,80%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(9.872.596)**	**Margem Rasa Econômica:**	**39,32%**
Payback Contingente (21 m):	**21 m/ (0 m)**	**LI Marginal:**	**22,31%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**146.339.297**	**Margem Rasa REF:**	**43,67%**
Payback Consolidado:	**23 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**32,99%**

DRE (Cenário Real)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Veneza Prime		Veneza Prime F1 - UH tipo		Veneza Prime F1 - Varanda		Veneza Prime F1 - Var + moto		Veneza Prime F1 - Var + carro		Veneza Prime F2 - UH tipo		Veneza Prime F2 - Varanda		Veneza Prime F2 - Var + carro		Verona Prime F1 - UH tipo		Verona Prime F1 - Varanda		Verona Prime F1 - Var + moto		Verona Prime F1 - Var + carro		Veorna Prime F2 - UH tipo		Verona Prime F2 - Varanda	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	476.579	100,0%	6.326	100,0%	121.270	100,0%	6.104	100,0%	13.812	100,0%	3.330	100,0%	67.283	100,0%	6.917	100,0%	7.163	100,0%	111.902	100,0%	15.145	100,0%	37.966	100,0%	3.614	100,0%	75.747	100,0%
PIS/COFINS	(10.447)	2,2%	(139)	2,2%	(2.658)	2,2%	(134)	2,2%	(303)	2,2%	(73)	2,2%	(1.475)	2,2%	(152)	2,2%	(157)	2,2%	(2.453)	2,2%	(332)	2,2%	(832)	2,2%	(79)	2,2%	(1.660)	2,2%
Custo Total	(253.211)	54,3%	(3.738)	60,4%	(67.645)	57,0%	(3.309)	55,4%	(7.208)	53,4%	(1.811)	55,6%	(34.255)	52,1%	(3.323)	49,1%	(4.192)	59,8%	(60.574)	55,3%	(7.920)	53,5%	(19.181)	51,7%	(1.938)	54,8%	(38.117)	51,4%
Custo Terreno	(33.417)	7,2%	(519)	8,4%	(9.397)	7,9%	(459)	7,7%	(998)	7,4%	(259)	8,0%	(4.948)	7,5%	(479)	7,1%	(519)	7,4%	(7.501)	6,9%	(978)	6,6%	(2.374)	6,4%	(239)	6,8%	(4.748)	6,4%
Custo Relacionados a Terreno	(2.768)	0,6%	(41)	0,7%	(734)	0,6%	(36)	0,6%	(78)	0,6%	(21)	0,6%	(399)	0,6%	(39)	0,6%	(45)	0,6%	(644)	0,6%	(84)	0,6%	(204)	0,5%	(21)	0,6%	(423)	0,6%
Custos de Incorporação	(6.278)	1,3%	(87)	1,4%	(1.506)	1,3%	(80)	1,3%	(187)	1,4%	(60)	1,8%	(846)	1,3%	(90)	1,3%	(108)	1,5%	(1.504)	1,4%	(222)	1,5%	(486)	1,3%	(68)	1,9%	(1.035)	1,4%
Custo de Construção	(210.749)	45,2%	(3.092)	50,0%	(56.008)	47,2%	(2.735)	45,8%	(5.946)	44,0%	(1.471)	45,2%	(28.062)	42,6%	(2.716)	40,1%	(3.521)	50,3%	(50.925)	46,5%	(6.636)	44,8%	(16.117)	43,4%	(1.609)	45,5%	(31.911)	43,1%
Lucro Bruto Econômico	212.921	45,7%	2.450	39,6%	50.967	43,0%	2.661	44,6%	6.301	46,6%	1.446	44,4%	31.553	47,9%	3.442	50,9%	2.813	40,2%	48.875	44,7%	6.893	46,5%	17.953	48,3%	1.598	45,2%	35.969	48,6%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	212.921	45,7%	2.450	39,6%	50.967	43,0%	2.661	44,6%	6.301	46,6%	1.446	44,4%	31.553	47,9%	3.442	50,9%	2.813	40,2%	48.875	44,7%	6.893	46,5%	17.953	48,3%	1.598	45,2%	35.969	48,6%
Despesas de Selling	(48.200)	10,3%	(637)	10,3%	(12.204)	10,3%	(617)	10,3%	(1.377)	10,2%	(341)	10,5%	(6.886)	10,5%	(711)	10,5%	(742)	10,6%	(11.274)	10,3%	(1.515)	10,2%	(3.780)	10,2%	(368)	10,4%	(7.749)	10,5%
Contingência	(10.961)	2,4%	(146)	2,4%	(2.789)	2,4%	(140)	2,4%	(318)	2,4%	(77)	2,4%	(1.547)	2,4%	(159)	2,4%	(165)	2,4%	(2.574)	2,4%	(348)	2,4%	(873)	2,4%	(83)	2,4%	(1.742)	2,4%
Margem de Contribuição	153.760	33,0%	1.667	26,9%	35.974	30,3%	1.904	31,9%	4.607	34,1%	1.029	31,6%	23.119	35,1%	2.573	38,0%	1.907	27,2%	35.027	32,0%	5.030	34,0%	13.300	35,8%	1.146	32,4%	26.478	35,7%
IR e CSLL	(8.547)	1,8%	(113)	1,8%	(2.175)	1,8%	(109)	1,8%	(248)	1,8%	(60)	1,8%	(1.207)	1,8%	(124)	1,8%	(128)	1,8%	(2.007)	1,8%	(272)	1,8%	(681)	1,8%	(65)	1,8%	(1.358)	1,8%
Margem Líquida	145.213	31,2%	1.554	25,1%	33.799	28,5%	1.794	30,1%	4.359	32,3%	969	29,8%	21.912	33,3%	2.449	36,2%	1.778	25,4%	33.020	30,2%	4.758	32,1%	12.619	34,0%	1.081	30,6%	25.120	33,9%
Lucro Bruto REF Unit.	143.882	49,0%	105.941	42,7%	122.851	46,3%	133.970	48,5%	141.920	50,0%	124.830	47,7%	143.366	51,2%	165.327	54,7%	131.057	45,1%	147.330	48,0%	158.255	49,8%	169.213	51,4%	148.126	48,3%	170.549	51,8%
Lucro Raso REF Unit.	116.095	43,7%	85.844	37,6%	97.259	40,6%	102.993	42,0%	117.247	45,2%	102.989	43,0%	115.474	45,8%	138.287	50,3%	108.464	40,5%	118.550	42,6%	123.406	43,6%	141.652	47,0%	123.877	43,8%	139.106	46,7%

R$ Mil - VPL - Compra	Veneza Prime		Veneza Prime F1 - UH tipo		Veneza Prime F1 - Varanda		Veneza Prime F1 - Var + moto		Veneza Prime F1 - Var + carro		Veneza Prime F2 - UH tipo		Veneza Prime F2 - Varanda		Veneza Prime F2 - Var + carro		Verona Prime F1 - UH tipo		Verona Prime F1 - Varanda		Verona Prime F1 - Var + moto		Verona Prime F1 - Var + carro		Veorna Prime F2 - UH tipo		Verona Prime F2 - Varanda	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	242.212	100,0%	4.423	100,0%	83.219	100,0%	4.049	100,0%	9.535	100,0%	1.888	100,0%	37.450	100,0%	3.695	100,0%	2.873	100,0%	46.710	100,0%	6.282	100,0%	15.969	100,0%	1.220	100,0%	24.897	100,0%
PIS/COFINS	(5.229)	2,2%	(95)	2,2%	(1.797)	2,2%	(87)	2,2%	(206)	2,2%	(41)	2,2%	(809)	2,2%	(80)	2,2%	(62)	2,2%	(1.008)	2,2%	(136)	2,2%	(345)	2,2%	(26)	2,2%	(538)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(184.184)	76,0%	(3.456)	78,1%	(62.839)	75,5%	(3.079)	76,0%	(6.789)	71,2%	(1.435)	76,0%	(27.323)	73,0%	(2.664)	72,1%	(2.506)	87,2%	(36.880)	79,0%	(4.854)	77,3%	(11.829)	74,1%	(989)	81,0%	(19.542)	78,5%
Custo Terreno	(25.074)	10,4%	(389)	8,8%	(7.051)	8,5%	(344)	8,5%	(748)	7,8%	(195)	10,3%	(3.713)	9,9%	(359)	9,7%	(389)	13,5%	(5.629)	12,1%	(734)	11,7%	(1.781)	11,2%	(180)	14,7%	(3.563)	14,3%
Custo Relacionados a Terreno	(2.262)	0,9%	(41)	0,9%	(740)	0,9%	(36)	0,9%	(79)	0,8%	(18)	0,9%	(336)	0,9%	(33)	0,9%	(32)	1,1%	(464)	1,0%	(60)	1,0%	(147)	0,9%	(13)	1,1%	(264)	1,1%
Custos de Incorporação	(4.125)	1,7%	(79)	1,8%	(1.317)	1,6%	(73)	1,8%	(165)	1,7%	(43)	2,3%	(597)	1,6%	(64)	1,7%	(61)	2,1%	(829)	1,8%	(122)	1,9%	(271)	1,7%	(31)	2,5%	(473)	1,9%
Custo de Construção	(116.548)	48,1%	(2.272)	51,4%	(41.150)	49,4%	(2.009)	49,6%	(4.368)	45,8%	(898)	47,6%	(17.139)	45,8%	(1.659)	44,9%	(1.592)	55,4%	(23.024)	49,3%	(3.000)	47,8%	(7.287)	45,6%	(583)	47,8%	(11.566)	46,5%
Despesas de Selling	(28.920)	11,9%	(545)	12,3%	(10.110)	12,1%	(494)	12,2%	(1.146)	12,0%	(225)	11,9%	(4.403)	11,8%	(435)	11,8%	(345)	12,0%	(5.538)	11,9%	(749)	11,9%	(1.866)	11,7%	(145)	11,9%	(2.920)	11,7%
Contingência	(2.975)	1,2%	(52)	1,2%	(1.002)	1,2%	(50)	1,2%	(114)	1,2%	(23)	1,2%	(474)	1,3%	(49)	1,3%	(37)	1,3%	(572)	1,2%	(77)	1,2%	(194)	1,2%	(15)	1,2%	(316)	1,3%
IR e CSLL	(4.279)	1,8%	(78)	1,8%	(1.470)	1,8%	(72)	1,8%	(168)	1,8%	(33)	1,8%	(662)	1,8%	(65)	1,8%	(51)	1,8%	(825)	1,8%	(111)	1,8%	(282)	1,8%	(22)	1,8%	(440)	1,8%
Lucro Imobiliário	52.799	21,8%	871	19,7%	18.583	22,3%	883	21,8%	2.540	26,6%	412	21,8%	9.319	24,9%	951	25,7%	305	10,6%	8.822	18,9%	1.293	20,6%	3.796	23,8%	205	16,8%	4.818	19,4%

DRE (Cenário Real)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Veneza Prime		Primeira Fase		Demais Fases	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	476.579	100,0%	147.513	100,0%	329.066	100,0%
PIS/COFINS	(10.447)	2,2%	(3.234)	2,2%	(7.213)	2,2%
Custo Total	(253.211)	54,3%	(81.901)	56,8%	(171.310)	53,2%
Custo Terreno	(33.417)	7,2%	(11.372)	7,9%	(22.045)	6,8%
Custo Relacionados a Terreno	(2.768)	0,6%	(889)	0,6%	(1.879)	0,6%
Custos de Incorporação	(6.278)	1,3%	(1.859)	1,3%	(4.418)	1,4%
Custo de Construção	(210.749)	45,2%	(67.781)	47,0%	(142.968)	44,4%
Lucro Bruto Econômico	212.921	45,7%	62.379	43,2%	150.543	46,8%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	212.921	45,7%	62.379	43,2%	150.543	46,8%
Despesas de Selling	(48.200)	10,3%	(14.835)	10,3%	(33.365)	10,4%
Contingência	(10.961)	2,4%	(3.393)	2,4%	(7.569)	2,4%
Margem de Contribuição	153.760	33,0%	44.151	30,6%	109.609	34,1%
IR e CSLL	(8.547)	1,8%	(2.646)	1,8%	(5.902)	1,8%
Margem Líquida	145.213	31,2%	41.506	28,8%	103.707	32,2%
Lucro Bruto REF Unit.	143.882	49,0%	124.201	46,6%		
Lucro Raso REF Unit.	116.095	43,7%	98.723	41,0%		

R$ Mil - VPL - Compra	Veneza Prime		Primeira Fase		Demais Fases	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	242.212	100,0%	101.226	100,0%	140.986	100,0%
PIS/COFINS	(5.229)	2,2%	(2.185)	2,2%	(3.044)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(184.184)	76,0%	(76.163)	75,2%	(108.021)	76,6%
Custo Terreno	(25.074)	10,4%	(8.533)	8,4%	(16.542)	11,7%
Custo Relacionados a Terreno	(2.262)	0,9%	(896)	0,9%	(1.367)	1,0%
Custos de Incorporação	(4.125)	1,7%	(1.633)	1,6%	(2.492)	1,8%
Custo de Construção	(116.548)	48,1%	(49.799)	49,2%	(66.748)	47,3%
Despesas de Selling	(28.920)	11,9%	(12.295)	12,1%	(16.625)	11,8%
Contingência	(2.975)	1,2%	(1.219)	1,2%	(1.756)	1,2%
IR e CSLL	(4.279)	1,8%	(1.788)	1,8%	(2.491)	1,8%
Lucro Imobiliário	52.799	21,8%	22.878	22,6%	29.921	21,2%

DRE (Cenário Real)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Veneza Prime		Primeiro Condomínio		Demais Condomínios	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	476.579	100,0%	147.513	100,0%	329.066	100,0%
PIS/COFINS	(10.447)	2,2%	(3.234)	2,2%	(7.213)	2,2%
Custo Total	(253.211)	54,3%	(81.901)	56,8%	(171.310)	53,2%
Custo Terreno	(33.417)	7,2%	(11.372)	7,9%	(22.045)	6,8%
Custo Relacionados a Terreno	(2.768)	0,6%	(889)	0,6%	(1.879)	0,6%
Custos de Incorporação	(6.278)	1,3%	(1.859)	1,3%	(4.418)	1,4%
Custo de Construção	(210.749)	45,2%	(67.781)	47,0%	(142.968)	44,4%
Lucro Bruto Econômico	212.921	45,7%	62.379	43,2%	150.543	46,8%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	212.921	45,7%	62.379	43,2%	150.543	46,8%
Despesas de Selling	(48.200)	10,3%	(14.835)	10,3%	(33.365)	10,4%
Contingência	(10.961)	2,4%	(10.961)	7,6%	-	0,0%
Margem de Contribuição	153.760	33,0%	36.583	25,4%	117.177	36,4%
IR e CSLL	(8.547)	1,8%	(2.646)	1,8%	(5.902)	1,8%
Margem Líquida	145.213	31,2%	33.937	23,5%	111.276	34,6%
Lucro Bruto REF Unit.	143.882	54,0%	124.201	46,6%		
Lucro Raso REF Unit.	116.095	48,2%	98.723	41,0%		

R$ Mil - VPL - Compra	Veneza Prime		Primeiro Condomínio		Demais Condomínios	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	242.212	100,0%	101.226	100,0%	140.986	100,0%
PIS/COFINS	(5.229)	2,2%	(2.185)	2,2%	(3.044)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(184.184)	76,0%	(76.163)	75,2%	(108.021)	76,6%
Custo Terreno	(25.074)	10,4%	(8.533)	8,4%	(16.542)	11,7%
Custo Relacionados a Terreno	(2.262)	0,9%	(896)	0,9%	(1.367)	1,0%
Custos de Incorporação	(4.125)	1,7%	(1.633)	1,6%	(2.492)	1,8%
Custo de Construção	(116.548)	48,1%	(49.799)	49,2%	(66.748)	47,3%
Despesas de Selling	(28.920)	11,9%	(12.295)	12,1%	(16.625)	11,8%
Contingência	(2.975)	1,2%	(1.219)	1,2%	(1.756)	1,2%
IR e CSLL	(4.279)	1,8%	(1.788)	1,8%	(2.491)	1,8%
Lucro Imobiliário	52.799	21,8%	22.878	22,6%	29.921	21,2%

Obrigado.
