Tenda

sua próxima conquista

Book de Lançamento

Regional: RS

Projeto: Alto da Colina

Data Comitê: 25/09/2025

Comitê Digital – 16.09.2025

Nome	Alto da Colina - Lançamento	Observação - Alto da Colina
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Discutir em comitê	Gostaria de debater em comitê o quão confortável estamos na pratica deste preço com este VSO. o projeto, ao ser unificado, exige um VSO de 39 vendas líquidas, mais alto do que a performance de qualquer projeto até aqui pós fim do cheque com excecao do solar do bosque (que vende a 177 de raso, portanto 25k abaixo do apresentado para o alto da colina). Gostaria de ver um cenário faseado do projeto, que talvez seja mais protetivo para a empresa e tende a gerar menos entropia no ciclo e na obra e dá um respiro melhor para nos reestruturarmos. Se o projeto vender bem, lançamos a 2a fase e unificamos a obra. Mas preferiria que a inércia fosse o que indica maior probabilidade aqui, o que no caso, parece ser um VSO menor.
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	pq os projetos da MRV estão com preço de avaliação superior ao nosso? Qual a chance de termos cheque?
Rodrigo Osmo	Aprovado	N/A

Pergunta Renan Sanches

- **Gostaria de debater em comitê o quão confortável estamos na pratica deste preço com este VSO. o projeto, ao ser unificado, exige um VSO de 39 vendas líquidas, mais alto do que a performance de qualquer projeto até aqui pós fim do cheque com excecao do solar do bosque (que vende a 177 de raso, portanto 25k abaixo do apresentado para o alto da colina). Gostaria de ver um cenário faseado do projeto, que talvez seja mais protetivo para a empresa e tende a gerar menos entropia no ciclo e na obra e dá um respiro melhor para nos reestruturarmos. Se o projeto vender bem, lançamos a 2a fase e unificamos a obra. Mas preferiria que a inércia fosse o que indica maior probabilidade aqui, o que no caso, parece ser um VSO menor.**

R: O preço inicial (R$ 202k / 39 VSO) tem sustentação, já que o Alto da Colina apresenta avaliação superior (R$ 232k vs. R$ 221k) e renda média maior em relação ao produto referência (Quinta do Lago – Bolsena). Esses indicadores reforçam aderência, mesmo diante do desafio comercial.

O cenário faseado foi testado, mas mostrou-se inviável: aumento de R$ 4k/uh no custo de indiretos, LI reduzida para 17,9% e MB Rasa da 1ª fase em apenas 23,6%, devido à necessidade de executar toda a infraestrutura logo no início.

Mesmo que a referência aponte um Preço Raso de 211k/uh para um cenário de queda de volume (VSO 30) o condomínio apresenta financials mínimos com o Preço Raso de 207,8k/uh, que é o Raso validado em prévia do BP26.

Pelo motivos acima, somado a perspectiva de retorno de 7 mil cheques a partir de outubro, mantemos o cenário de VSO 39 em fase única.

	Comitê Anterior Fase Única	Simulação Faseado Consolidado	Delta	1ª Fase	Queda de Volume Única c/ 30 VSO	LI Mínima Única c/ 30 VSO
Uhs	696	696		316	696	696
VSO	39	19	-20	17	30	30
Preço Raso	202.871	210.005	7.134	209.490	211.205	207.823
Meses PSOL	27	22	-6	22	27	27
Custo Raso	100.680	104.342	3.662	118.214	100.680	100.680
MB Rasa	30,8%	31,3%	0,5%	23,5%	33,2%	32,1%
LI	20,1%	17,8%	-2,3%	12,7%	21,1%	20,0%

Perguntas Luiz Mauricio

➢ **Pq os projetos da MRV estão com preço de avaliação superior ao nosso?**

R: As avaliações mais altas da MRV podem ser explicadas por dois fatores principais:

- Produto T+4 com diferenciais específicos: unidades maiores (39m² vs. 36m² no Alto da Colina) e, no caso do Porto São Miguel, piscina como atributo adicional.
- Histórico de vendas em curso: os projetos da MRV já estão em comercialização há mais tempo (lançados em 2023 e 2024), o que possibilitou reequilibrar a avaliação via regra da Caixa, uma vez que vêm performando acima do valor inicialmente avaliado.

	Vertical Alto da Colina	T+4 Porto Versalhes	T+4 Porto São Miguel
Churras + Varanda + Vaga	251.000	252.000	
Churras + Varanda	237.000	240.000	259.000
Só varanda	229.000		
Só Churras	233.000		
Só Vaga		237.000	255.000
Sem Nada	225.000	226.000	246.000
Metragem Uh sem varanda	36	39	39
R$/m² UH sem nada	6.250	5.795	6.308
Piscina	Não	Não	Sim

➢ **Qual a chance de termos cheque?**

R: Altíssimas. Das 6 etapas necessárias para o lançamento da Fase 2 do programa, 5 já foram completas, restando pendente somente a publicação do Edital. Estimamos que esta segunda fase dure por 6 meses (out -> mar)

One Page – Alto da Colina - Cenário Real & Aprovação

[1]

Cidade	Porto Alegre	**Mancha de demanda**	RS - PZN - Porto Alegre Zona Norte
Regional	RS	**Cluster MPR**	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Set

[2]

Unidades (Fases)	696 (1)	**CA Máx | Proj**	3,0 | 2,1
Unidades com Vaga (%)	126 (18%)	**Escritura | Lançamento**	ago/25 | set/25
Unidades com Varandas (%)	330 (47,4%)	**Tipologia**	F2E - Concreto

[3]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	9.469 (6,0%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	9.469 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	793	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[4]

Custo Construção (%VGV)	72.544 (46,3%)	**Indireto Unit.**	16.952
Prazo da Obra (meses)	22	**Torre Unit.**	57.629
Custo Total Unit. (LPU):	104.230 (94)	**Infra Unit.**	15.719
Início de Obra	mar-26	**Fundação Unit.**	8.147

[5]

Preço Nominal Unit.	224.978	**VSO**	39
Preço Raso Unit.	202.871	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	232.598	**Renda (% em RET 1%)**	3.243 (33,3%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	206.990
Preço Inf. Médio Unit.	229.538	**Margem Bruta REF (%)**	41,4%
Custo Inf. Médio Unit.	134.587	**Margem Rasa REF (%)**	35,0%



[6]

LI (Régua):	**20,1% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	38,4%
LI Marginal:	21,5%	**Margem Rasa Econômica:**	30,8%
Margem Bruta REF:	41,4%	**Margem Contribuição Econômica:**	28,1%
Margem Rasa REF:	**35,0%**	**Exposição (% VGV):**	19.280 (12,4%)
TIR:	105,4%	**VGV Total:**	**156.585**
Payback Contingente (21 m) :	**20 m/ (-1 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(17.318)
Payback Consolidado:	20	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	17.801

Destaques

Cenário aprovação igual cenário Real – Folga de Início de 6 meses e VSO na Regra de Ouro de 18 meses.

[1] Terreno localizado no município de **Porto Alegre**, no bairro Rubem Berta. Sequência do empreendimento Quinta do Lago Bolsena, com stockout desde julho/2025.

- Empreendimento **fase única, com 696 UHs** na tipologia modular, contando com 4 torres de 16 pavimentos. Possui 18% de vagas de estacionamento, **totalizando 126 vagas**.
- Empreendimento **com varanda em 330 unidades (47%)** e **churrasqueira em 286 unidades (41%)**.

[2] Projeto não captura o CA Máx, devido ao grande atingimento viário que gera uma Faixa Não Edificante na testada do imóvel.

[3] Negócio 100% cash, com valor de R$ 9.468.636 (**6,1% de fração do VGV**) corrigido pelo IPCA desde assinatura (Original: 9MM).
- Ato de R$**629.715,00 pagos na escritura, outorgada em 19/08/2025.**
- Restante do valor a ser pago em 35 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 252.540,61 cada.
Corretagem: R$ 377.828 (4% do Preço Terreno) pagos em 3 parcelas.
Seguro garantia: R$110.243,18.

[4] Custo de obra em R$104.230/Uh;
Projeto para reforço de EBE em desenvolvimento, custo atual estimado em Pré-Orçamento de R$1MM.

[5] Preço de venda desconsiderando subsídio estadual (20k/uh)
Precificação dos Atributos: Churrasqueira (9k); Varanda (12k); Vaga (14k);

[6] Entrega acima dos Financials mínimos exigidos.

***Valores em R$ 1000**

PORTO ALEGRE – ZONA NORTE

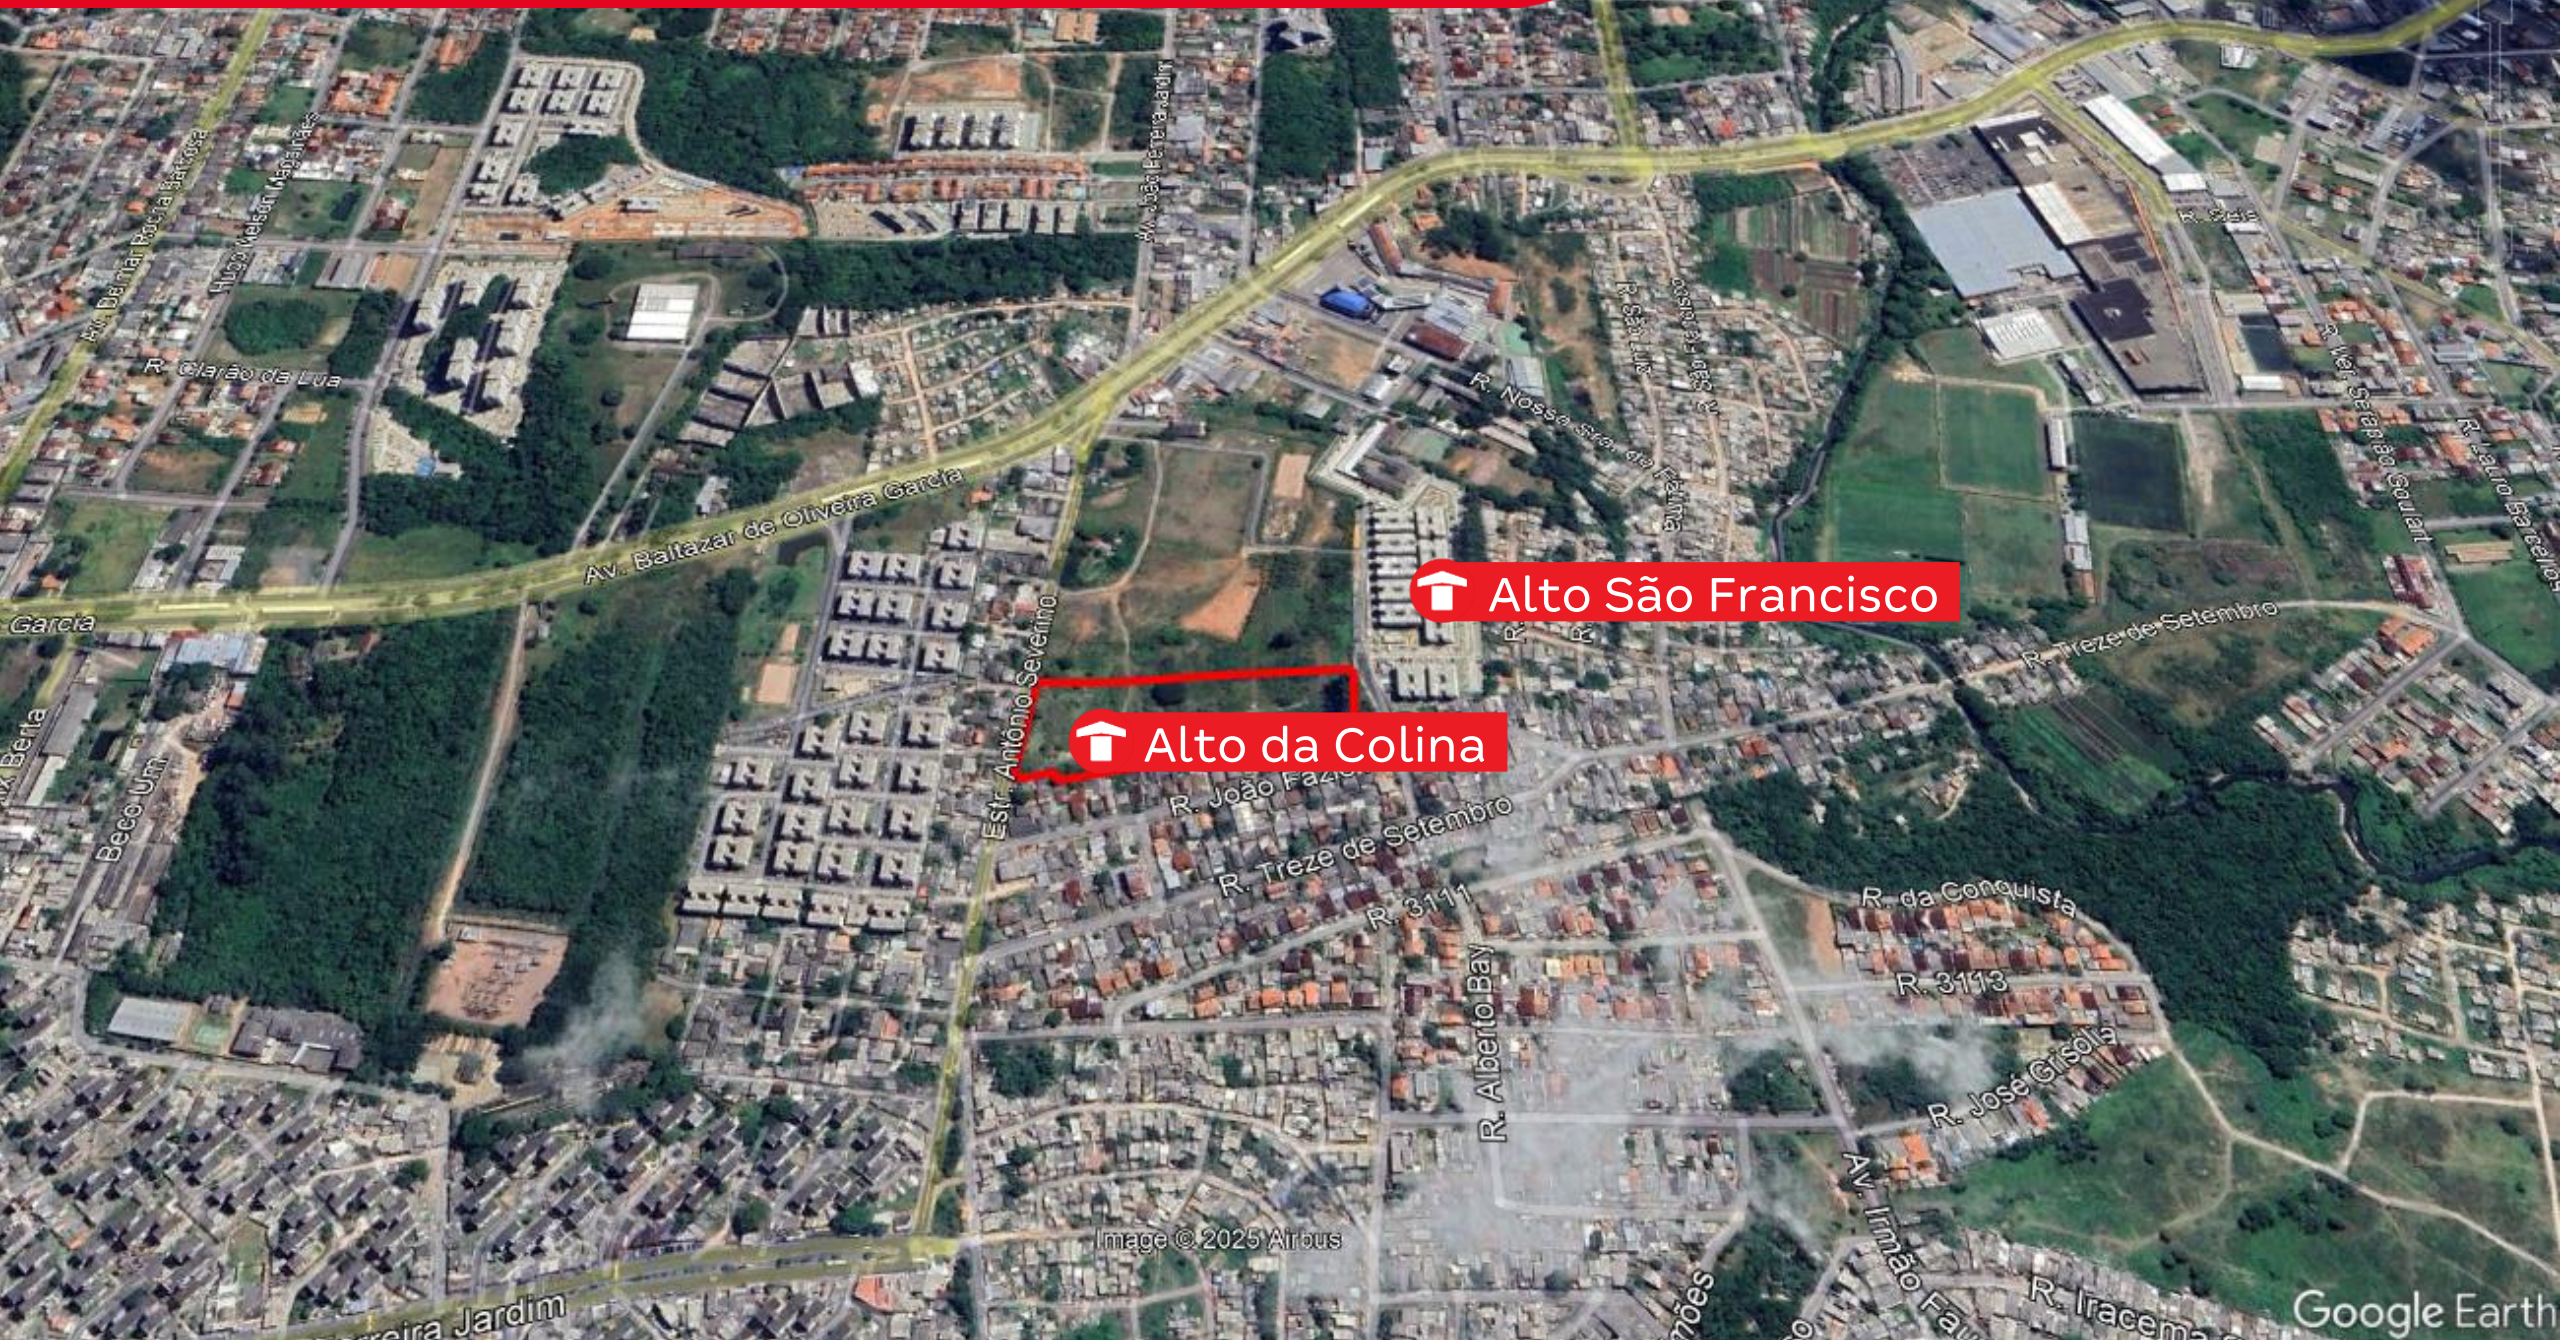

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Pareceres

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	**1) Escritura de Venda e Compra** lavrada em 18/08. Rerratificação da Escritura será lavrada até 19/09. Previsão de registro de ambas até 26/09. **2) Registro da Incorporação** - até 26/09, mediante emissão de Certidão, pelo Cartório de Registro de Imóveis, com a indicação do "R" da Incorporação Imobiliária. **3) Averbação do Patrimônio de Afetação** - até 15/10.	Ok com ressalvas	
Legalização	Pentende emissão do Termo de Anuência Prévia da Metroplan. / Pendente aprovação do Projeto Arquitetônico. / Pendente emissão da Autorização de Manejo da Vegetação.	Ok com ressalvas	
Produto	Sem riscos associados.	Ok	
GETEC	Sem riscos associados.	Ok	
Infra Externa	A concessionária DMAE sinalizou a necessidade de reforma de EBE de destino, projeto em desenvolvimento, custo atual estimado.	Ok com ressalvas	
Logística	O projeto considerando o condomínio em fase única, ainda será elaborado (22/09).	Ok com ressalvas	
Contratação	**Laudo de engenharia:** Ainda não há laudo de engenharia, ofício respondido em agosto aguardando retorno. **Laudo de Risco:** Pendente - Dependente do Laudo de Engenharia. **Laudo Jurídico:** Pendente RI - Previsão de emissão em 26/09. Com base nessa data, a conclusão da análise jurídica está estimada para 08/10/2025.	Ok com ressalvas	
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Vision como factível.	Ok	
Comercial/Ciclo	Sem riscos associados.	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos associados.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- PZN – Porto Alegre Norte + Alvorada

Lançamento

1. Quinta do Lago
2. Solar do Bosque

LandBank

3. Quintana Parque
4. Estância do Sol
5. Monte Verde
6. Alto da Colina - Dallaesquina
7. Gran Boulevard
8. Alto da Encosta
9. Alvorecer Village
10. Sonata
11. Gran Miami

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 1 - Vermelho

Região

Capital

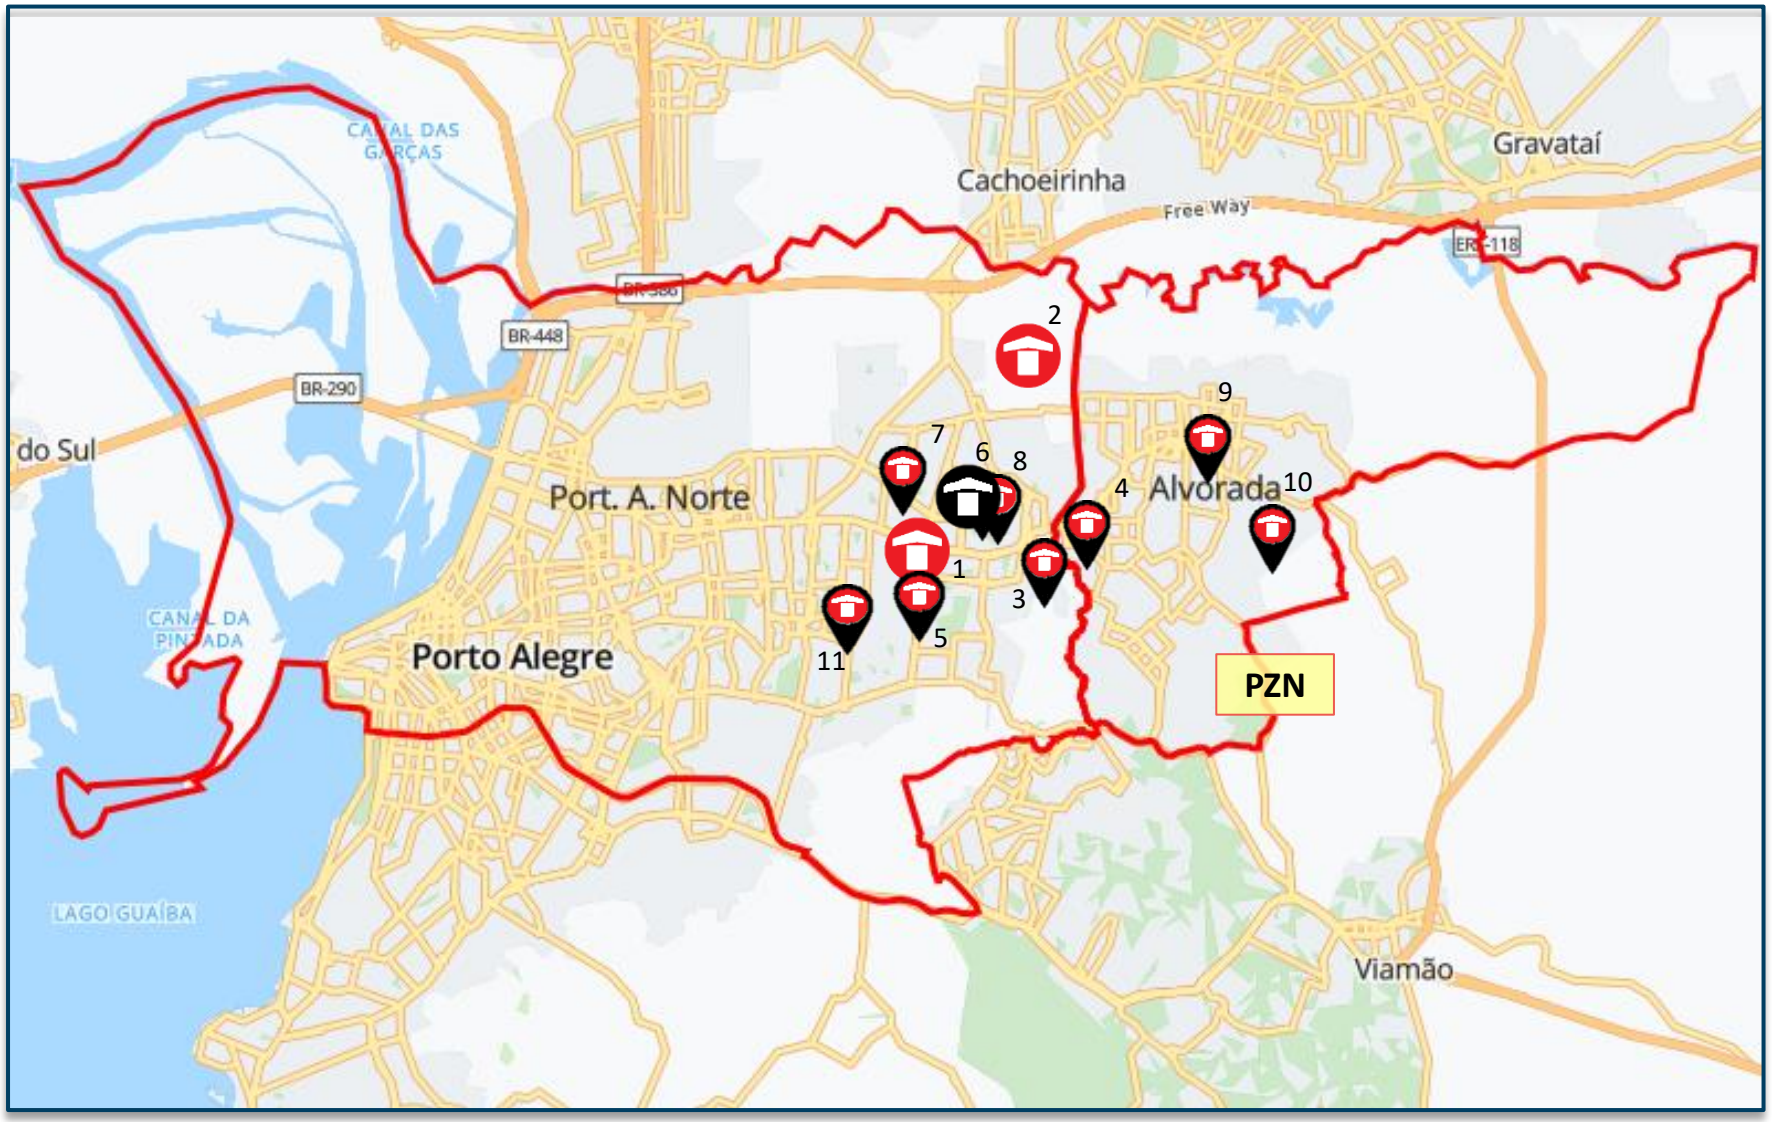

Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Alto da Colina
Descritivo - Lançamento

Informações Gerais – Condomínio Único		
Terreno	Área terreno	15.587,11m²
	Menor poligonal	15.587,11m²
	App/fna	Não/Não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Não/Sim – 3.653,48m²
	Área liquida	11.933,63m²
Diretrizes Urbaní sticas	Zoneamento	Zona de Ocupação Intensiva Subunidade 01 e 02
	Ca máximo	3,00
	Ca básico	1,30
	Ca liquido	2,08
	Ca projetado	2,08 (PLCE 011-24)
	Gabarito máximo	Livre (PLCE 011-24)
Geral	Total uh	696
	Total de vagas exigido	0%
	Total de vagas projetado	126 (18 %)
Tipologia	Tipologia	IS2 Flex com elevador
	Gabarito	T+15
	Lâmina	02 10PP e 02 12PP
	Área privativa	35,44m² | 35,64m² | 35,90m² | 35,72m²
	Varanda	330uh (47,5%)
Condomínio	Unidade pcd	22
	Unidade lazer|técnica	08 | 04
	Torre	04
	Fase	02

Lazeres Internos :

1. Salão de Festas Gourmet
2. Espaço delivery
3. Espaço Office
4. Espaço oficina
5. Fitness
6. Brinquedoteca

Lazeres Externos :

7. Chimarródromo
8. Espaço Relax
9. Funcional Externo
10. Praça de jogos
11. Play Baby
12. Play Kids
13. Quadra gramada e espaço ducha
14. Salão de festas c/ churrasqueira
15. Fitness Externo
16. Play pet
17. Churrasqueira Gourmet

Varandas

Empreendimento Alto da Colina
Atributos de produto - Lançamento

Descrição		Criticidade	Observação
Usabilidade	Acesso Empreendimento	●	
	Percurso do pedestre até torre	●	
Diferencial produto	Faixa de renda	2	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	Quadra gramada e portaria com pórtico de veículos
	Atributos Torre	Sim	Varanda com churrasqueira (piloto)
	Edifício Garagem	Não	

Play Kids

Churrasqueira Gourmet

Quadra Gramada

Chimarródromo

Empreendimento Alto da Colina
Modulação - Lançamento

Fase 1: 316 uh (sendo 06 U.R) - 85 vagas (Sendo 01 PCD, 1 de carga e descarga e 12 de moto) | Fase 2: 380 uh (sendo 16 U.R.) – 54 vagas (sendo 02 PCD)					
Módulo		**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01		02 Blocos (T+15)	316 Uh	85 vagas (Sendo 01 PCD, 51 de carro, 1 de carga e descarga e 12 de moto)	Todos Lazeres estão contemplados no Módulo 01: o espaço relax, chimarródromo, funcional externo, praça de jogos, play baby, play kids, espaço ducha, quadra descoberta, fitness externo, play pet, churrasqueira gourmet e salão de festas com churrasqueira.
Módulo 02		02 Blocos (T+15)	380 UH	54 vagas (sendo 02 PCD e 52 de carro)	-

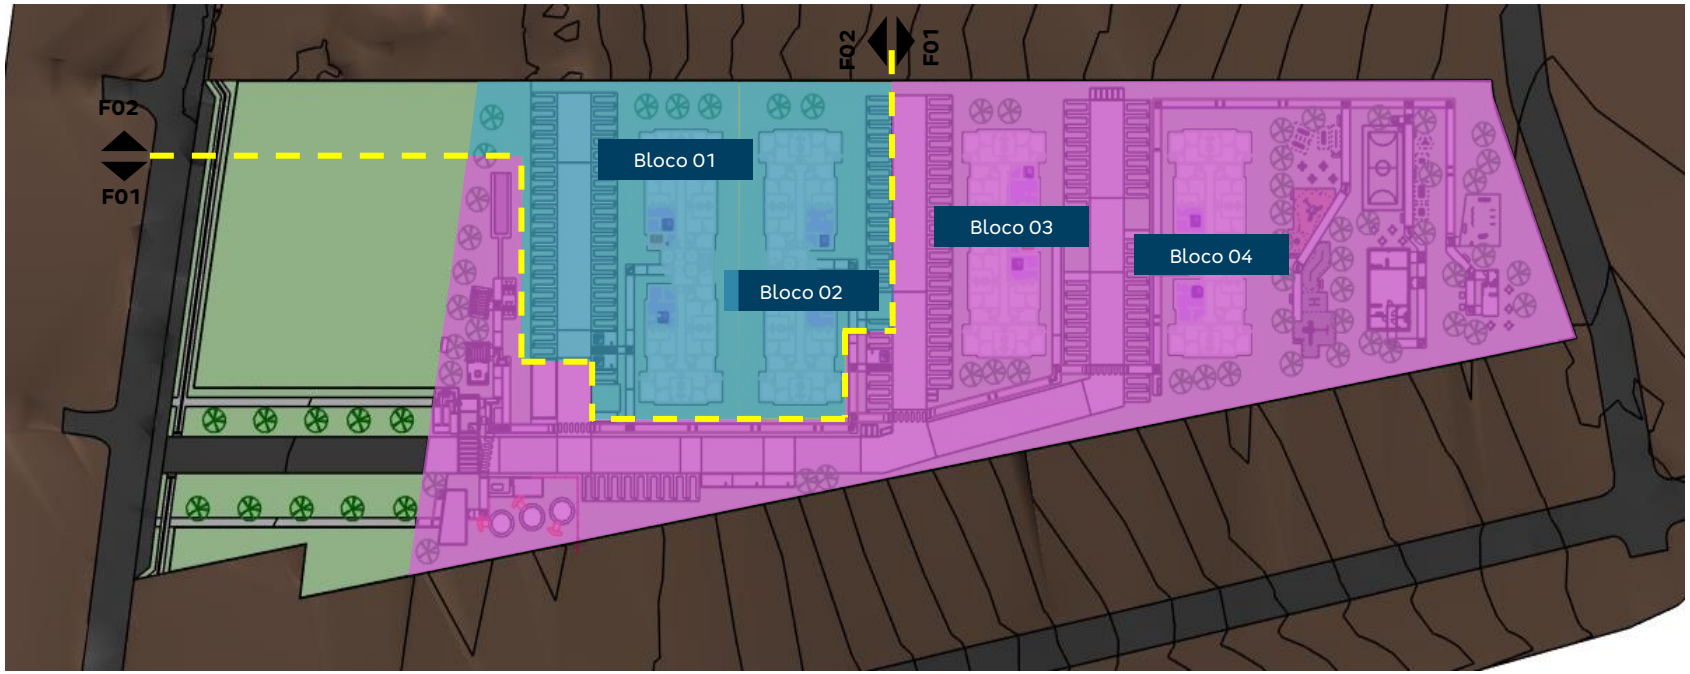

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Custo de Construção

	ALTO DA COLINA UNICA REV02 - LANÇAMENTO	ALTO DA COLINA UNICA REV01 - ESCRITURA	QUINTA DO LAGO BOLSENA LVS 07/25
Torres	4	4	2
Unidades Construídas	704	704	256
Unidades Vendidas	696	696	251
Total Unidades Vendidas	696	696	251
Condomínios (qta.)	1	1	1
Cidade	Porto Alegre - RS	Porto Alegre - RS	Porto Alegre - RS
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	2 Torre | T+15 | 10PP | C1A	2 Torre | T+15 | 10PP | C1A	1 Torre | T+15 | 16PP | C3A
Tipologia	2 Torre | T+15 | 12PP | C1A	2 Torre | T+15 | 12PP | C1A	-
Churrasqueira	160	160	75
Varanda	210	210	-
Churrasqueira + Varanda	120	120	-
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	setembro-25	julho-25	
Incc	1.210,471	1.199,509	
LVS	julho-25	junho-25	
Indiretos	julho-25	junho-25	
Base de Preço	LPU 94	LPU 93	
Takt	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	22	22	17
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 100.680	R$ / UND R$ 101.898	R$ / UND R$ 111.310
Indireto	R$ 16.952	R$ 17.446	R$ 22.965
Torre	R$ 57.629	R$ 57.676	R$ 56.967
Infra	R$ 15.719	R$ 16.435	R$ 16.904
Fundação	R$ 8.147	R$ 7.665	R$ 12.965
EEE	R$ 231	R$ 231	
ETE			
Contenção	R$ 793	R$ 1.353	R$ 281
Terraplenagem	R$ 1.209	R$ 1.092	R$ 1.227
CUSTO TOTAL II	R$ 3.380	R$ 3.380	R$ 9.240
Urbanização			R$ 6.831
Drenagem	R$ 94	R$ 94	R$ 959
Extensão de Rede Elétrica	R$ 112	R$ 112	R$ 497
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 3.174	R$ 3.174	R$ 952
CUSTO TOTAL III	R$ 170	R$ 170	R$ 16
Incorridos	R$ 170	R$ 170	R$ 16
CUSTO TOTAL IV			R$ 1.500
Aprendizado			R$ 1.500
CUSTO TOTAL V		R$ 964	
Atualização por INCC		R$ 964	
CUSTO TOTAL I+II	R$ 104.060	R$ 105.278	R$ 120.549
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 104.230	R$ 106.411	R$ 122.065

Custo de Construção

	ALTO DA COLINA UNICA REV02 - LANÇAMENTO	ALTO DA COLINA UNICA REV01 - ESCRITURA	
Torres	4	4	
Unidades Construídas	704	704	
Unidades Vendidas	696	696	
Total Unidades Vendidas	696	696	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Porto Alegre - RS	Porto Alegre - RS	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	2 Torre | T+15 | 10PP | C1A	2 Torre | T+15 | 10PP | C1A	
Tipologia	2 Torre | T+15 | 12PP | C1A	2 Torre | T+15 | 12PP | C1A	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	setembro-25	julho-25	
Incc	1210,471	1199,509	
LVS	julho-25	junho-25	
Indiretos	julho-25	junho-25	
Base de Preço	LPU 94	LPU 93	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	22	22	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 100.680	R$ / UND R$ 101.898	DIF -R$ 1.218
INDIRETO	R$ 16.952	R$ 17.446	-R$ 494
TORRE	R$ 57.629	R$ 57.676	-R$ 47
INFRA	R$ 15.719	R$ 16.435	-R$ 716
FUNDAÇÃO	R$ 8.147	R$ 7.665	R$ 482
EEE	R$ 231	R$ 231	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CONTENÇÃO	R$ 793	R$ 1.353	-R$ 560
TERRAPLENAGEM	R$ 1.209	R$ 1.092	R$ 117
CUSTO TOTAL II	R$ 3.380	R$ 3.380	R$ 0
VIÁRIO	R$ 0	R$ 0	R$ 0
DRENAGEM	R$ 94	R$ 94	R$ 0
EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	R$ 112	R$ 112	R$ 0
EXTENSÃO DE REDE DIDRÁULICA	R$ 3.174	R$ 3.174	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 170	R$ 170	R$ 0
INCORRIDOS	R$ 170	R$ 170	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
APRENDIZADO	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 964	-R$ 964
ATUALIZAÇÃO POR INCC	R$ 0	R$ 964	-R$ 964
CUSTO TOTAL	R$ 104.230	R$ 106.411	-R$ 2.182

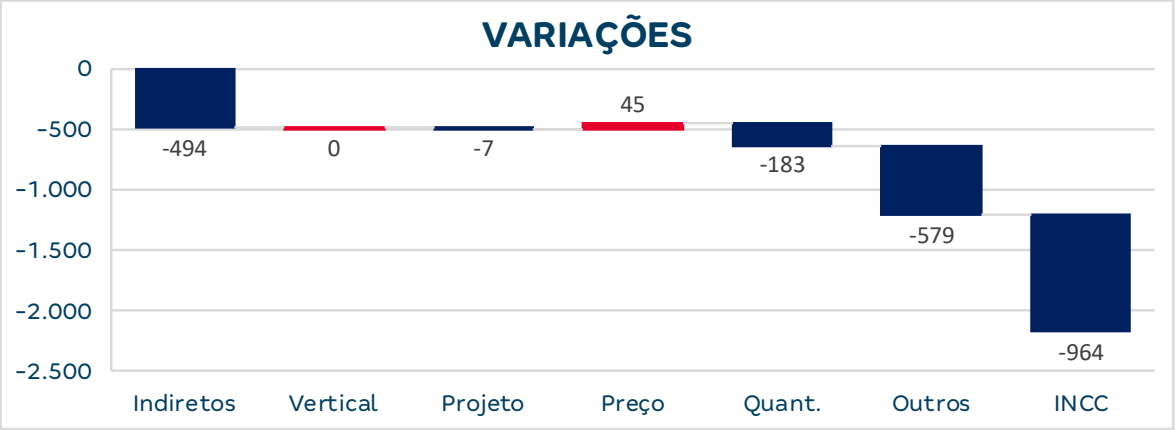

INDIRETOS
-106 | Ensaios (Diárias topografo)
-300 | Equipamentos (EPIs e preços)

PROJETO
+482 | Fundação (sondagem e rebaixos)
+395 | Reservatório metálico (kg)
+117 | Terraplanagem
-560 | Contenção (otimização)
-371 | Anexos (qtt concreto e aço)

PREÇO
+ 83 | Estrutura de concreto
- 85 | Revestimento cerâmico

QUANTIDADE
-183 | Muro de divisa (qtt fundação)

OUTROS
-547 | Instalações Infra
-32 | Instalações Torre

INCC
-964

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Necessidade de execução de 26 m de extensão de rede para abastecimento de água.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Necessidade de execução de 702 m de extensão de rede pressurizada para descarte de efluente na rede coletora, estimando reforma da EBE da concessionaria.

SISTEMA DE DRENAGEM
Necessidade de execução de 50 m de extensão de rede.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Orçamento da equatorial emitido com mudança necessária na rede.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado trecho de reconstituição do passeio de pedestres, pavimentação e área gramada.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 4
Drenagem	Nível 3
Elétrica	NA
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 09/2024 para 702 uh, com validade de 02 anos.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 09/2024 para 702 uh, com validade de 02 anos.

Drenagem:
- Viabilidade emitida em 09/2024 para 702 uh, com validade de 02 anos.

Elétrica:
- Orçamento da equatorial emitido com mudança necessária na rede.

Gás:
- Não se aplica

Urbanização:
- Execução de gramado, pavimento de concreto e passeios para acesso ao condomínio e posteamento elétrico.

Fundação:
- Considerada fundação com estacas hélice continua de Ø60 e Ø80 de comprimento máximo de 15m

Logística

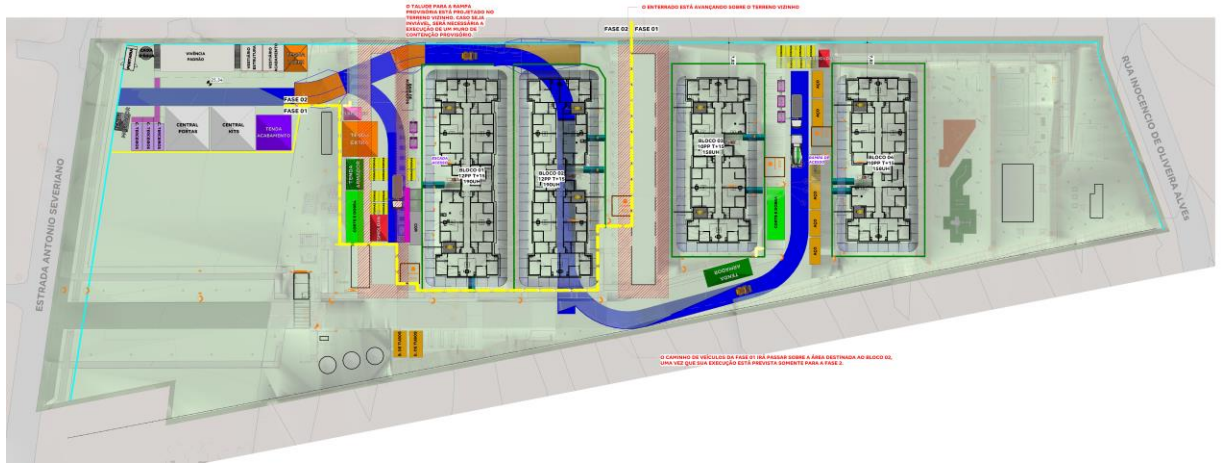

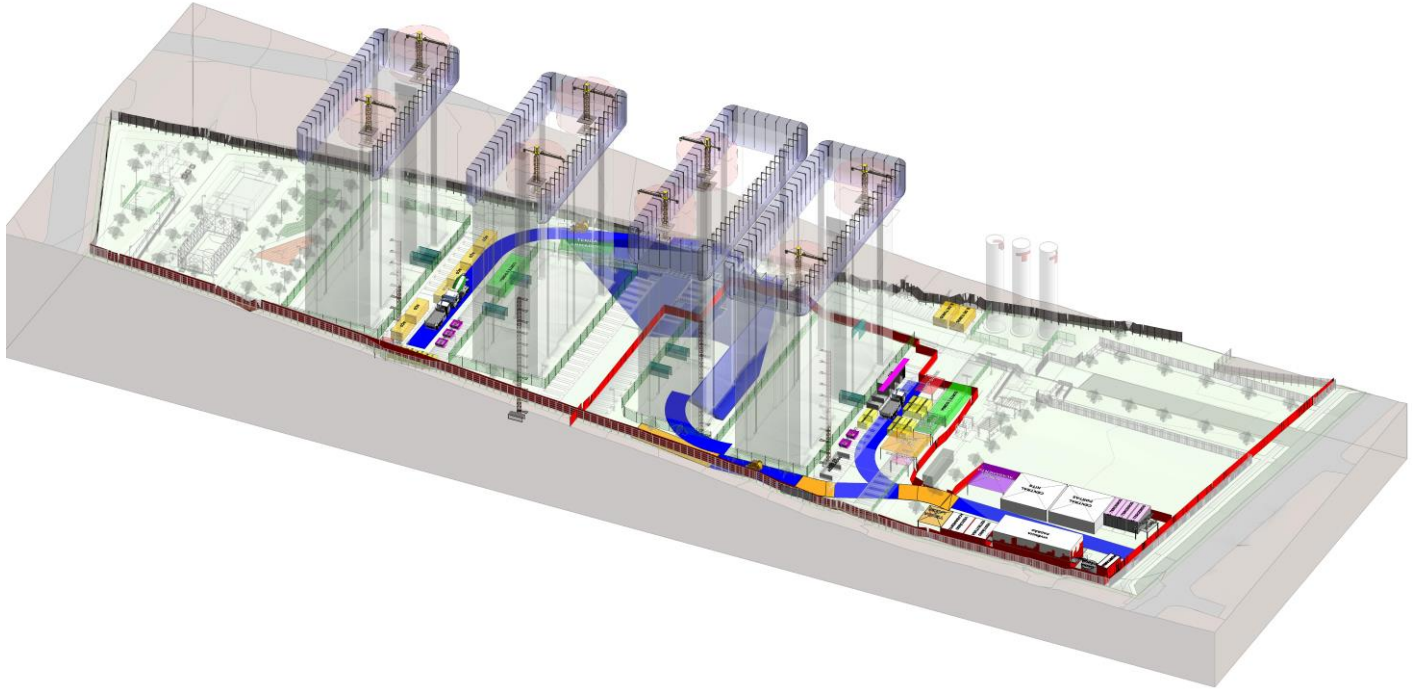

EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PREFORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
BETONEIRA (LOG)	VARIAVEL	-	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	FASE01 E 02
BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO PARA CADA FASE	1 MOBILIZAÇAO POR FASE	1 DESMOBILIZAÇAO POR FASE	-	TODO PERIODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERIODO DE ACABAMENTO	FASE01 E 02
BOMBA ESTACIONARIA PADRAO (LOG)_R01	1 EQUIPAMENTO PARA TODOS OS BLOCOS	-	-	-	TODO PERIODO	-	FASE01 E 02
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIAVEL	-	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	FASE01 E 02
CAMINHAO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇAO	1 DESMOBILIZAÇAO	-	CONSIDERAR MEIO PERIODO DE ESTRUTURA	-	FASE01
CAMINHAO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇAO	1 DESMOBILIZAÇAO	-	CONSIDERAR MEIO PERIODO DE ESTRUTURA	-	FASE02
CREMALHEIRA PCT (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOBILIZAÇAO POR EQUIPAMENTO	1 DESMOBILIZAÇAO POR EQUIPAMENTO		TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE01
CREMALHEIRA PCT (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOBILIZAÇAO POR EQUIPAMENTO	1 DESMOBILIZAÇAO POR EQUIPAMENTO		TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE02
GUINDASTE (LOG)	1 EQUIPAMENTO PARA ÇAMENTO DOS CASTELOS	1 MOBILIZAÇAO	1 DESMOBILIZAÇAO	-	-	-	FASE01
MINIGRUA (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERIODO	-	FASE01
MINIGRUA (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERIODO	-	FASE02
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIPAMENTO PARA CADA FASE	1 MOBILIZAÇAO	1 DESMOBILIZAÇAO	CONSIDERAR PERIODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-	FASE01 E 02

VIVENCIA - CONTAINERS								
DESCRIÇAO	QUANTIDADE	TAMANHO MODULOS	MOBILIZAÇAO	DESMOBILIZAÇAO	PREFORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MODULO COM SANITARIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇAO	1 DESMOBILIZAÇAO	TODO PERIODO	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE01 E 02
CONTAINER PROVISORIO (LOG)	CONSIDERAR 3 MODULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇAO	1 DESMOBILIZAÇAO	TODO PERIODO	-	-	FASE01 E 02
CONTAINER TERCEIROS (LOG)	CONSIDERAR 3 MODULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇAO	1 DESMOBILIZAÇAO	TODO PERIODO	-	-	FASE01 E 02
CONTAINER VESTIARIO ACABAMENTO (LOG)	CONSIDERAR 2 MODULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇAO	1 DESMOBILIZAÇAO	-	-	TODO PERIODO	FASE01 E 02
CONTAINER VESTIARIO ESTRUTURA (LOG)	CONSIDERAR 2 MODULOS DE CONTAINER (EQUIPE VERTICAL)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇAO	1 DESMOBILIZAÇAO	-	TODO PERIODO	-	FASE01 E 02
CONTAINER VIVENCIA PADRAO (LOG)	CONSIDERAR 14 MODULOS COM 2 ESCADAS (7 MODULOS NO PAV. TE 7 MODULOS NO PAV SUPERIOR)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇAO	1 DESMOBILIZAÇAO	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE01 E 02

TENDAS_PERIODOS							
DESCRIÇAO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PREFORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	2	4,00	<varia>	-	TODO PERIODO	-	FASE01 E 02
GAIOLA DE INFLAMAVEIS (LOG)	1	3,00	4,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE01
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	8,00	8,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE01 E 02
TENDA ARMADOR (LOG)	2	4,00	7,00	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	FASE01 E 02
TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	10,65	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	FASE02
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	10,00	10,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE01 E 02
TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	10,00	10,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE01 E 02
TENDA EXTRA (LOG)	1	8,00	8,00	AJUSTAR	AJUSTAR	AJUSTAR	FASE01
TENDA LAZER (LOG)	1	5,95	5,13	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE01 E 02
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	3,00	4,00	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	FASE01 E 02

PCP-168

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI
Parque Paris	set/23	400	2	A	29/03/24	06/08/24	19/09/24		07/01/25	14/01/25		set/25
Morada do Campo I - F2	jan/24	180	2	B	23/09/24	09/11/24	15/11/24		13/01/25	18/01/25		jul/25
Quinta do Lago - F3 | Cond 02 Garda	fev/24	300	2	B	19/09/24	14/01/25	19/01/25		12/04/25	21/04/25		ago/25
Acqua Sena - F2	fev/24	220	2	A	09/11/24	08/01/25	15/01/25		17/03/25	21/03/25		ago/25
Ipanema Residence - F2	jun/24	240	2	A	02/01/25	18/03/25	22/03/25		29/05/25	03/06/25		out/25
Morada do Campo II	ago/24	540	2	B	28/12/24	13/04/25	22/04/25		23/09/25	29/09/25		mar/26
Morada Serena (M1, M2 e M3)	nov/24	380	2	A	24/02/25	30/05/25	04/06/25		19/09/25	27/09/25		mar/26
Quinta do Lago - F4 | Cond 04 Bolsena	dez/24	251	2	B	30/04/25	24/09/25	30/09/25		12/12/25	18/12/25		set/26
Acqua Danúbio - F1	jan/25	388	2	A	10/06/25	19/10/25	27/10/25		18/02/26	26/02/26		nov/26
Parque Ventura III F1	mai/25	440	2	B	27/07/25	13/12/25	19/12/25		02/05/26	08/05/26		fev/27
Solar do Bosque - F1+F2	jun/25	690	3	A	04/09/25	19/02/26	27/02/26	03/05/26	10/08/26	05/08/26	18/08/26	jan/27
Morada Serena (M4)	nov/24	120	1	B	24/02/25	09/05/26			24/07/26			jan/27
Alto da Colina	set/25	696	3	A	24/03/26	11/08/26	06/08/26	19/08/26	05/01/27	31/12/26	13/01/27	out/27
Atilio 1407 - F1	out/25	446	2	B	02/08/26	14/01/27	29/01/27		05/06/27	05/07/27		abr/28
Acqua Danúbio - F2	fev/26	209	2	A	21/09/26	01/01/27	06/01/27		08/03/27	13/03/27		nov/27

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Porto Alegre Norte + Alvorada	PZN	52%	1.481	123	1.778	148

Empreendimento	Renda	Lançamento	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27
SOLAR DO BOSQUE	2.123	jun-25	53	53	53	53	53	53	53	53	53	1									
Alto da Colina	**3.243**	**set-25**		**39**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**	**33**
Monte Verde	2.859	abr-26			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Gran Miami - F1	3.757	out-26															22	22	22	22	22
Total de Vendas Lançados			**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**53**	**92**	**118**	**118**	**118**	**118**	**118**	**118**	**118**	**66**	**65**	**65**	**65**	**65**	**87**	**87**	**87**	**87**	**81**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Alto da Colina | Mapa Concorrência

		Alto da Colina	Porto São Miguel	Porto Versalhes
		TENDA	MRV	MRV
	Distância Tenda (km)		1,2km	4,8km
Região 1 Km	População	28.202	26.708	16.246
	Dens. Demográfica	9.035	8.556	5.205
	Renda (R$)	4.955	5.622	5.449
	Classe Social	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 (2.7k a 4.6k)
	PEA Dia	10.567	12.119	16.673
Quantitativo	Lançamento	set/25	06/2023	11/2024
	Unidades	696	480	220
	Estoque	696	14	42
	VSO	39	17	37
	Stockout	18	1	1
Qualitativo	Condomínios	1	1	1
	Torres	4	6	4
	Gabarito	T+15	T+4	T+4
	Plantas (m²)	36m²	38m² e 54m² e 38,4m² e 46,55m²	38,4m²
	Tipologia	2 Dorms	1 e 2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Garden	Não
	Varanda	Sim	Sim	Sim
	Suite	Não	Sim	Sim
	Dif. Entrega	Não	Equipado e Decorado	Equipado e Decorado
	Vagas	17%	40%	40%
	Lazer	Chimarródromo, espaço relax, playkids, playbaby, praça de jogos, funcional externo, quadra descoberta, espaço ducha,fitness externo, salão de festas com churrasqueira, churrasqueira gourmet, espaço cultivo, playpet. Internos:espaço saúde, salão de festas gourmet (2), espaço office, fitness, espaço teen, brinquedoteca.	Tem Garden, Bicicletário, Churrasqueria, Espaço Gourmet, Pet Place, Piscina, Piscina infantil, Playground, Salão de Festas,	Tem Sacada, Bicicletário, Churrasqueria, Fireplace, Playground, Sacada, Varanda Gourmet,

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência mapeada possui target de preço e renda superior ao estimado para o Alto da Colina, apesar da tipologia de Varanda e Vaga do Porto Versalhes ser similar ao nosso, nossa tipologia possui churrasqueira, e o projeto deles é T+4.

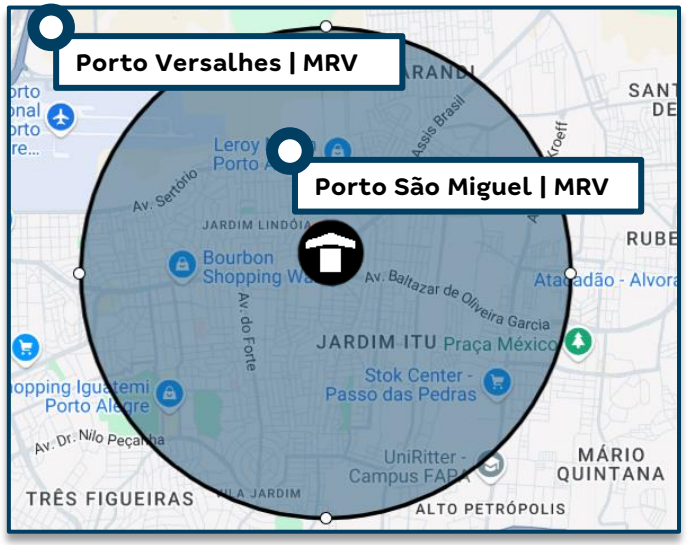

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

-	Alto da Colina				Porto São Miguel					Porto Versalhes				
Tipologias	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol
Sem Vaga	213.002	167.491	2.849	17%	251.990	201.592	4.000	8%	●	226.990	181.592	3.205	42%	●
Churrasqueira	220.512	173.410	3.230	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varanda	228.305	180.766	3.394	26%	271.990	217.592	4.375	31%	●	250.990	200.792	3.925	24%	●
Varanda e Churrasqueira	235.451	184.539	3.590	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varanda, Churrasqueira e Vaga	245.387	189.846	3.700	33%	285.990	228.792	4.750	1%	●	254.990	203.992	4.100	7%	●
Uh Tipo - Com Vaga	-	-	-	-	254.990	203.992	4.100	25%	-	237.990	190.392	3.565	19%	-
Garden - Sem Vaga	-	-	-	-	265.990	212.792	4.250	15%	-	-	-	-	-	-
Garden - Com Vaga	-	-	-	-	285.990	228.792	4.750	18%	-	254.990	203.992	4.100	8%	-

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Alto da Colina									
Tipo:	**Sem Vaga**		**Churrasqueira**		**Varanda**		**Varanda e Churrasqueira**		**Varanda, Churrasqueira e Vaga**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	225.000		233.000		229.000		237.000		251.000	
Renda Inicial (VF)	2.849		3.230		3.394		3.590		3.700	
Renda Final*	-		-		-		-		-	
% RET1	50%		25%		25%		25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,47	1.313	0,56	1.805	0,39	1.318	0,51	1.805	0,65	2.371
FGTS	0,31	880	0,19	614	0,43	1.447	0,17	614	0,58	2.110
Financiamento	94,13%	155.046	94,39%	163.761	96,57%	174.176	96,04%	180.041	95,47%	184.307
Subsídio	103,67%	11.565	182,55%	9.034	150,95%	5.143	161,04%	3.884	158,66%	3.428
Prazo de Pró-soluto	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Pró-Soluto	81,38%	22.743	69,82%	22.125	75,01%	24.972	73,64%	25.934	82,64%	29.997
Preço Raso (RS)	191.548	191.548	197.339	197.339	207.056	207.056	212.278	212.278	222.214	222.214
TCD	74,71%	21.454	71,17%	23.173	62,12%	21.250	64,04%	23.173	62,13%	23.173
VSO	13	13	7	7	10	10	2	2	7	7
Preço de Venda	**214.939**	**214.939**	**222.517**	**222.517**	**230.381**	**230.381**	**237.591**	**237.591**	**247.618**	**247.618**
Elasticidade	-0,901%	-0,901%	-0,901%	-0,901%	-0,901%	-0,901%	-0,901%	-0,901%	-0,901%	-0,901%
Preço de Venda Final	**213.002**	**213.002**	**220.512**	**220.512**	**228.305**	**228.305**	**235.451**	**235.451**	**245.387**	**245.387**
Preço Raso (R$)	**191.548**		**197.339**		**207.056**		**212.278**		**222.214**	
% de Raso	**89,93%**		**89,49%**		**90,69%**		**90,16%**		**90,56%**	
BP25 - Não Inflacionado	**173.333**		**-**		**-**		**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**180.158**		**-**		**-**		**-**		**-**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Alto da Colina
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	232.598
Renda Inicial (VF)	3.243
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,50	1.614
FGTS	0,36	1.175
Financiamento	95,13%	167.819
Subsídio	143,27%	7.676
Prazo de Pró-soluto	27	27
Pró-Soluto	77,36%	24.587
Preço Raso (RS)	202.871	202.871 (1)
TCD	68,13%	22.108
VSO	39	39 (2)
Preço de Venda	**227.005**	**227.005**
Elasticidade	-0,901%	-0,901%
Preço de Venda Final	**224.978**	**224.978**

Preço Raso (R$)	**202.871**
% de Raso	**90,17%**
Raso Todas as Fases	**202.871**
Nominal Todas as Fases	**224.978**

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região com bons indicadores sociodemográficos, como renda e PEA/Dia, o mesmo também se encontra próximo de pontos de interesses como hospital, escola e etc.

2) A renda estimada para o Alto da Colina superou a observada no Quinta do Lago, até então principal referência na região. Apesar do ponto de atenção quanto ao volume de vendas previsto, o incremento de atributos do produto deverá sustentar a renda adicional necessária para a performance do projeto.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes mapeados possuem target de preço e renda superior ao previsto para o produto Tenda.

	Preço Real					Preço Normalizado (27m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Solar do Bosque	201.260	176.776	2.713	43	25	1.423	178.199
Quinta do Lago - Bolsena	222.317	189.762	3.007	37	21	5.275	195.037
Alto da Colina	232.598	202.871	3.243	39	27	-	202.871

Entorno

Distâncias - Mobilidade

- Av. Baltazar de O. Garcia – 240 m
- Av. Sertório – 3,2 km
- Av. Bernardino Silveira Amorim – 1,4 km

Raio 2,5 Km

- Centro de Alvorada
- Atacadão Alvorada
- Complexo Cultural Porto Seco POA

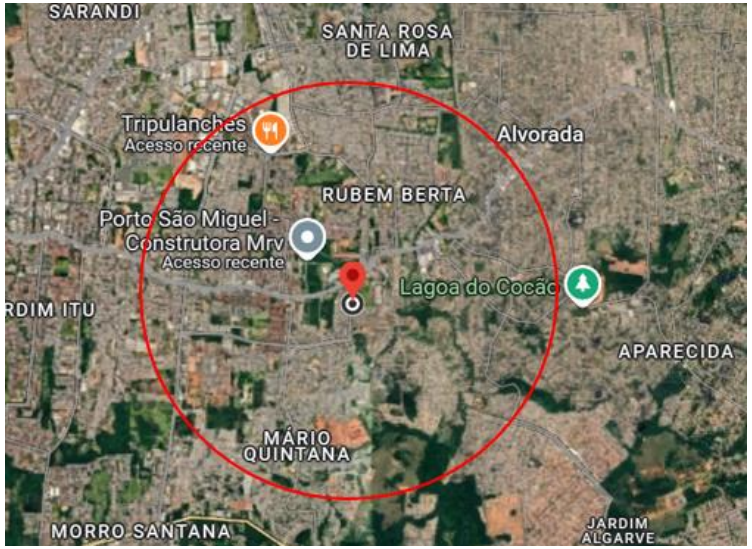

Concorrência

Porto Versalhes (MRV) – 4,8 km

- Preço Cheio (UH mais barata): R$ 227.000
- Avaliação: R$ 226.000
- Renda: R$ 3.300
- Estoque: 26
- 40% Vaga de Estacionamento
- Diferenciais: chuveiro a gás, circuito fechado de TV para segurança, opção de garden

Porto Essenza (MRV) – 3,9 km

- Preço Cheio (UH mais barata): R$ 255.000
- Avaliação: R$ 255.000
- Renda: R$ 3.800
- Estoque: 84
- 50% Vaga de Estacionamento
- Diferenciais: opção suíte, , chuveiro a gás, lazer equipado, piscina, vestiário, circuito fechado de TV para segurança.

Parecer: Acreditamos que o preço é POSSÍVEL com o VSO proposto. Entendemos que esse empreendimento atenderá a demanda orgânica da sua microrregião, suprindo o stockout gerado pelo Quinta do Lago Bolsena.

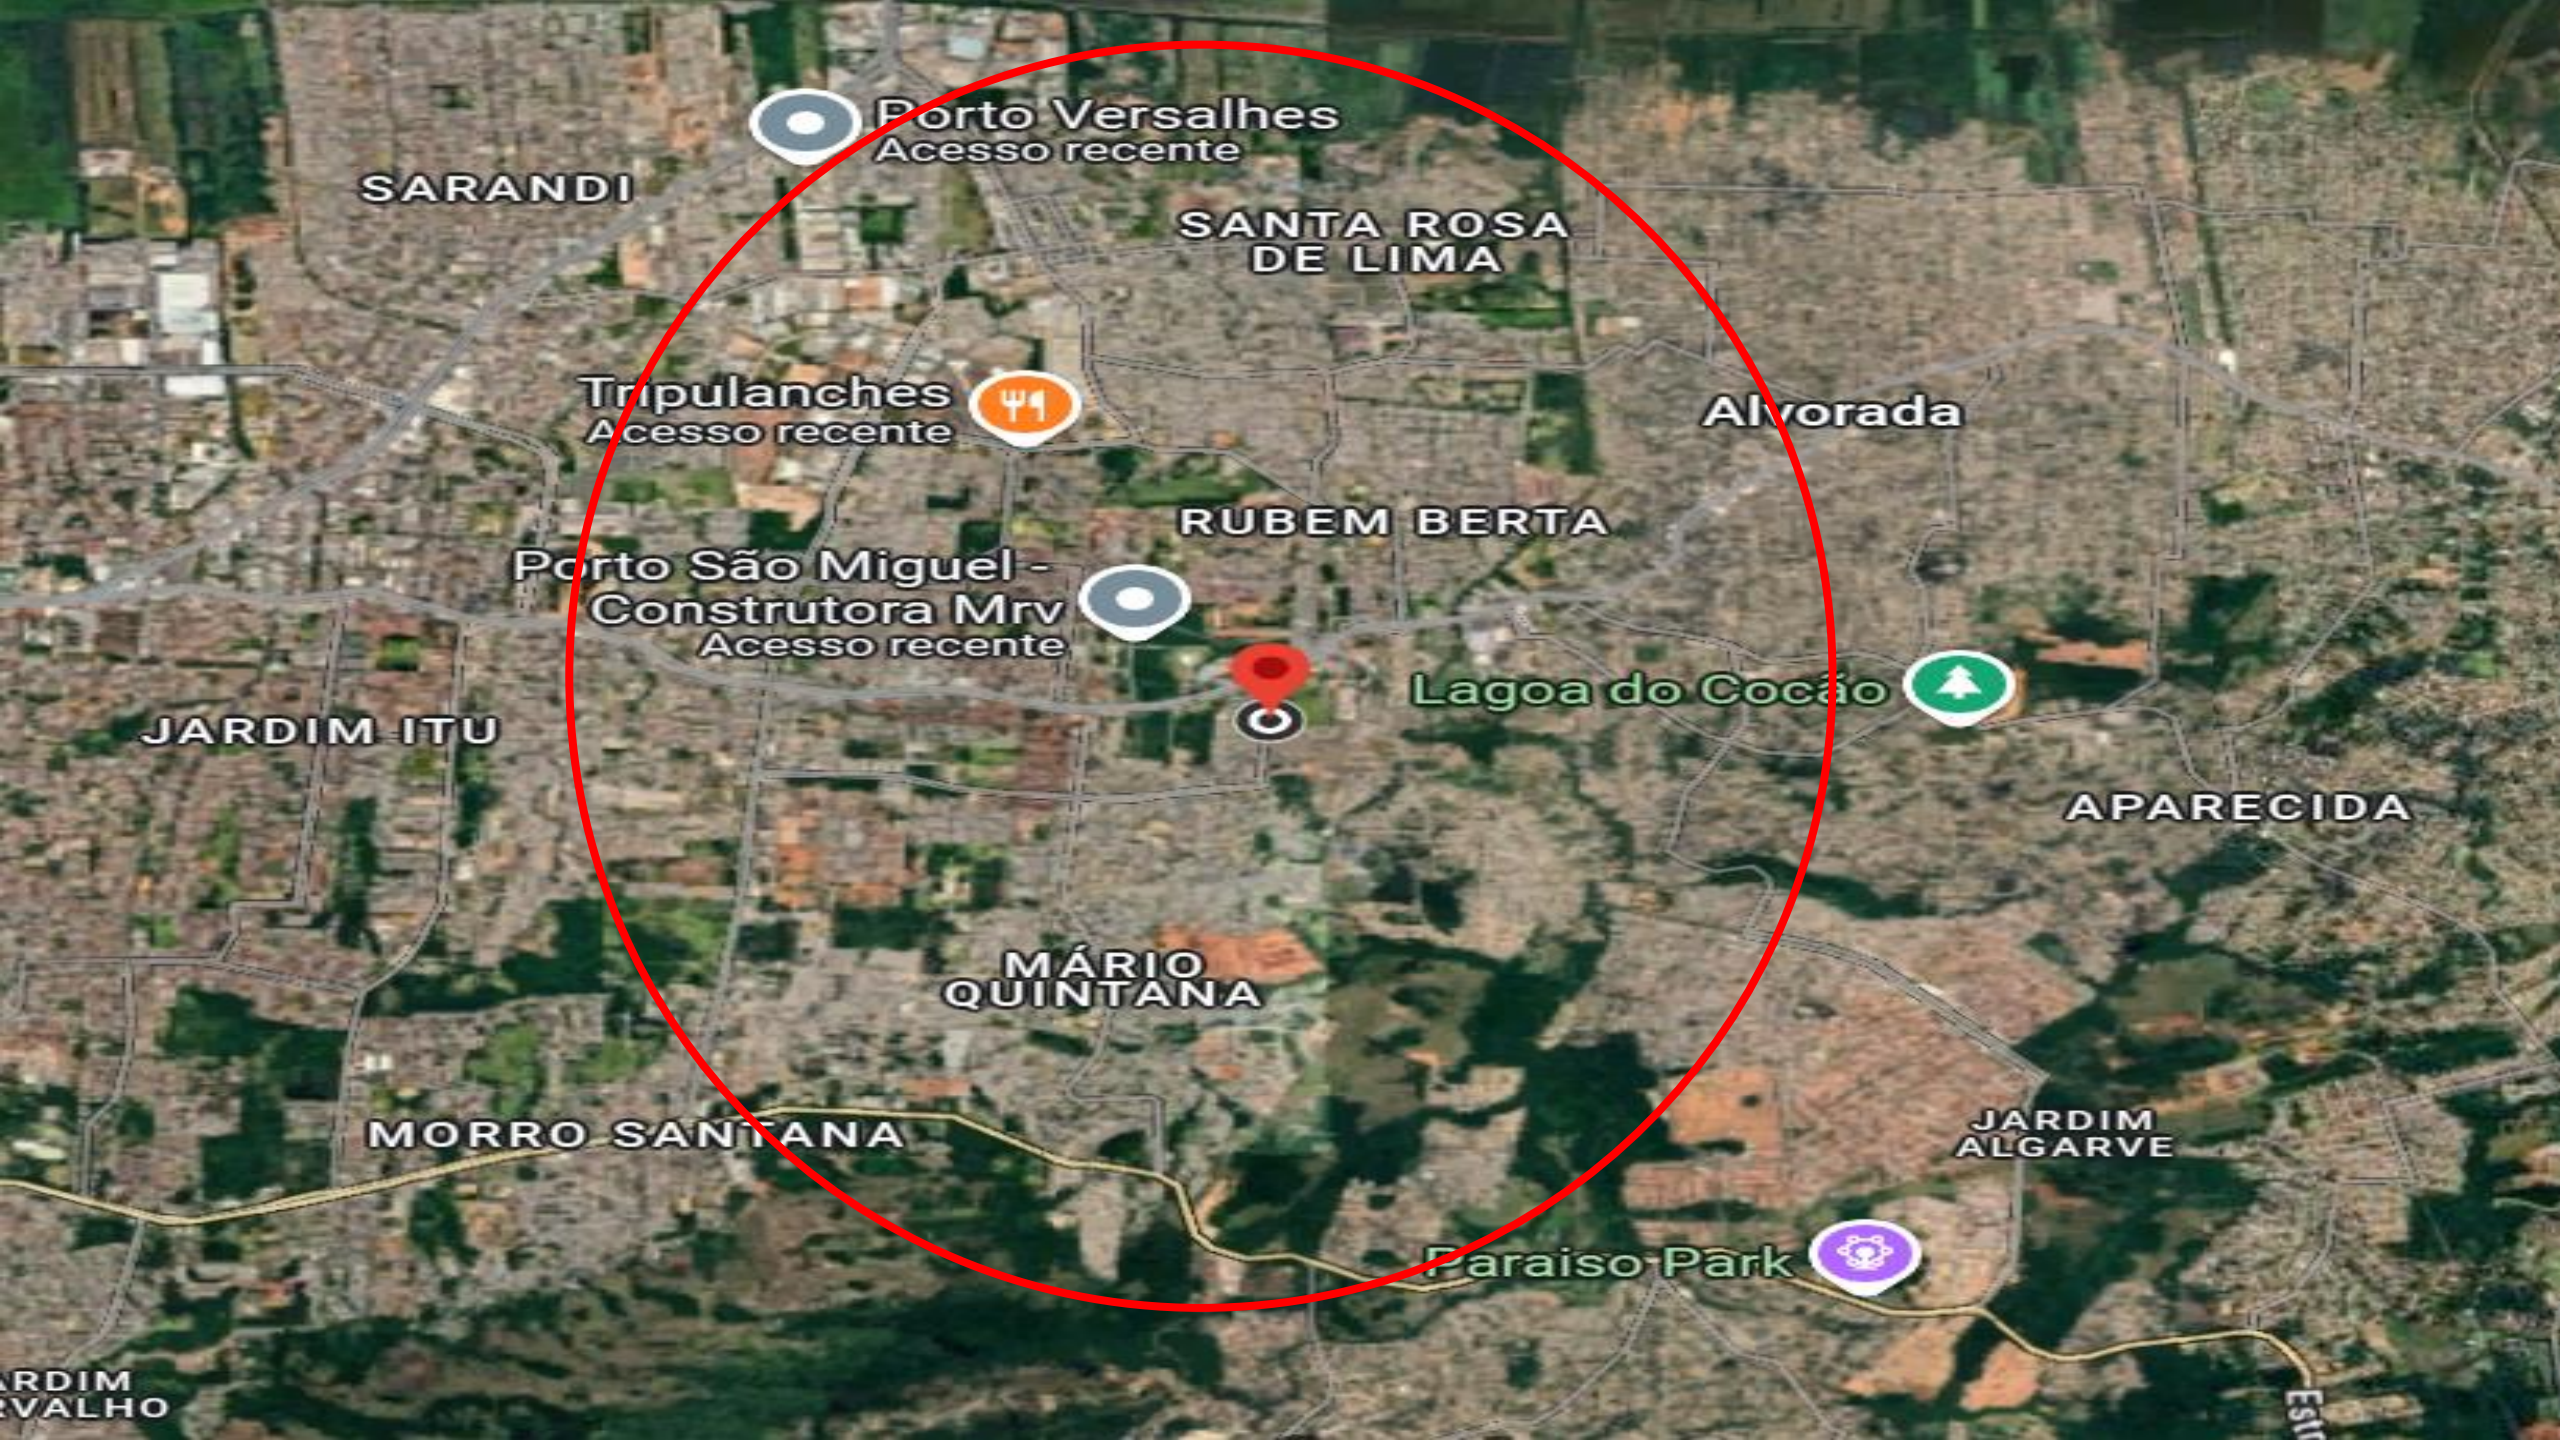
Porto Versalhes
Acesso recente
SARANDI
SANTA ROSA
DE LIMA
Tripulanches
Acesso recente
Alvorada
RUBEM BERTA
Porto São Miguel -
Construtora Mrv
Acesso recente
Lagoa do Cocão
JARDIM ITU
APARECIDA
MÁRIO
QUINTANA
MORRO SANTANA
JARDIM
ALGARVE
Paraíso Park

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Informações Gerais – Consolidado

Alto da Colina – RS – Porto Alegre Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	out-23							
vaga/varan/chur		set-25	mar-26	jan-28	6 meses	22 meses	set-28	36 meses
vaga/churras		set-25	mar-26	jan-28	6 meses	22 meses	set-28	36 meses
varanda		set-25	mar-26	jan-28	6 meses	22 meses	set-28	36 meses
churras		set-25	mar-26	jan-28	6 meses	22 meses	set-28	36 meses
tipo		set-25	mar-26	jan-28	6 meses	22 meses	set-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	9,47 MM	**Incorrido Terreno:**	0,63 MM	**Área do Terreno (100%):**	15.587 m²	**Área Líquida do Terreno:**	11.934 m²
Cash:	9,47 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	319	**Custo de terreno m²:**	607,5	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	793,4
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):**	6,0% / 52,4%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.**	3,0 / 2,1
Ato / %VGV:	0,63 MM / 0,4%			**Incorrido de Construção:**	0,11 MM	**Incorridos de Incorporação:**	0,65 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
vaga/varan/chur	T+15	222.214	120	245.387	251.000	95,5%	82,6%	62,1%
vaga/churras	T+15	212.278	30	235.451	237.000	96,0%	73,6%	64,0%
varanda	T+15	207.056	180	228.305	229.000	96,6%	75,0%	62,1%
churras	T+15	197.339	136	220.512	233.000	94,4%	69,8%	71,2%
tipo	T+15	191.548	230	213.002	225.000	94,1%	81,4%	74,7%

Unidades Totais:	696	**Preço Médio:**	224.978	**Renda Média:**	3.243	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	1.206
Unidades Tenda:	696	**Avaliação Média:**	232.598	**Ato:**	1.617 (0,5 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.736
VSO:	39 Unidades	**VGV Total:**	156.585.033	**FGTS:**	1.163 (0,36 Salários)	**Preço Raso Médio:**	202.871
RET Médio:	3,0%	**VGV Tenda:**	156.585.033	**% em RET 1%:**	33%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	800

Construção

Custo Total Unit.:	104.230	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	36,00	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**22.488.264**	**LI:**	**20,12%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**19.279.584**	**Margem Bruta Econômica:**	**38,43%**
TIR:	**105,41%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(17.318.056)**	**Margem Bruta REF:**	**41,37%**
Exposição de Caixa:	**12,38%**	**Δ LI:**	**0,12%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**17.800.566**	**Margem Rasa Econômica:**	**30,84%**
Payback Contingente (21 m):	**20 m/ (-1 m)**	**LI Marginal:**	**21,53%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**42.496.534**	**Margem Rasa REF:**	**34,98%**
Payback Consolidado:	**20 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**28,14%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Alto da Colina		vaga/varan/chur		vaga/churras		varanda		churras		tipo	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	155.746	100,0%	29.186	100,0%	7.050	100,0%	40.848	100,0%	29.876	100,0%	48.786	100,0%
PIS/COFINS	(2.573)	1,7%	(520)	1,8%	(126)	1,8%	(727)	1,8%	(532)	1,8%	(668)	1,4%
Custo Total	(94.314)	61,6%	(16.220)	56,6%	(4.055)	58,6%	(24.432)	60,9%	(18.403)	62,7%	(31.205)	64,9%
Custo Terreno	(10.152)	6,6%	(1.750)	6,1%	(438)	6,3%	(2.625)	6,5%	(1.984)	6,8%	(3.355)	7,0%
Custo Relacionados a Terreno	(1.190)	0,8%	(205)	0,7%	(51)	0,7%	(308)	0,8%	(232)	0,8%	(393)	0,8%
Custos de Incorporação	(1.227)	0,8%	(170)	0,6%	(43)	0,6%	(358)	0,9%	(213)	0,7%	(443)	0,9%
Custo de Construção	(81.746)	53,4%	(14.094)	49,2%	(3.524)	50,9%	(21.141)	52,7%	(15.973)	54,4%	(27.014)	56,1%
Lucro Bruto Econômico	58.859	38,4%	12.446	43,4%	2.870	41,4%	15.688	39,1%	10.942	37,3%	16.913	35,1%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	58.859	38,4%	12.446	43,4%	2.870	41,4%	15.688	39,1%	10.942	37,3%	16.913	35,1%
Despesas de Selling	(12.176)	7,9%	(2.278)	7,9%	(548)	7,9%	(3.186)	7,9%	(2.337)	8,0%	(3.827)	8,0%
Contingência	(3.582)	2,3%	(671)	2,3%	(162)	2,3%	(940)	2,3%	(687)	2,3%	(1.122)	2,3%
Margem de Contribuição	43.101	28,1%	9.497	33,1%	2.160	31,2%	11.563	28,8%	7.917	27,0%	11.963	24,9%
IR e CSLL	(2.105)	1,4%	(425)	1,5%	(103)	1,5%	(595)	1,5%	(435)	1,5%	(547)	1,1%
Margem Líquida	40.995	26,8%	9.072	31,6%	2.057	29,7%	10.968	27,3%	7.482	25,5%	11.416	23,7%
Lucro Bruto REF Unit.	94.951	41,4%	115.684	46,2%	104.983	43,8%	98.330	42,2%	90.709	40,3%	82.688	38,1%
Lucro Raso REF Unit.	72.402	35,0%	92.070	40,6%	81.430	37,7%	76.660	36,3%	67.028	33,2%	60.810	31,1%

R$ Mil - VPL - Compra	Alto da Colina		vaga/varan/chur		vaga/churras		varanda		churras		tipo	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	111.759	100,0%	21.028	100,0%	5.069	100,0%	29.406	100,0%	21.240	100,0%	35.016	100,0%
PIS/COFINS	(1.819)	1,6%	(369)	1,8%	(89)	1,8%	(516)	1,8%	(373)	1,8%	(472)	1,3%
Custos e Despesas Totais	(87.452)	78,3%	(15.270)	72,6%	(3.801)	75,0%	(22.728)	77,3%	(17.015)	80,1%	(28.639)	81,8%
Custo Terreno	(8.108)	7,3%	(1.398)	6,6%	(350)	6,9%	(2.097)	7,1%	(1.584)	7,5%	(2.680)	7,7%
Custo Relacionados a Terreno	(1.237)	1,1%	(213)	1,0%	(53)	1,1%	(320)	1,1%	(242)	1,1%	(409)	1,2%
Custos de Incorporação	(1.073)	1,0%	(146)	0,7%	(37)	0,7%	(315)	1,1%	(186)	0,9%	(390)	1,1%
Custo de Construção	(63.556)	56,9%	(10.958)	52,1%	(2.739)	54,0%	(16.437)	55,9%	(12.419)	58,5%	(21.003)	60,0%
Despesas de Selling	(10.645)	9,5%	(2.001)	9,5%	(488)	9,6%	(2.785)	9,5%	(2.021)	9,5%	(3.350)	9,6%
Contingência	(1.344)	1,2%	(252)	1,2%	(61)	1,2%	(353)	1,2%	(258)	1,2%	(421)	1,2%
IR e CSLL	(1.488)	1,3%	(302)	1,4%	(73)	1,4%	(422)	1,4%	(305)	1,4%	(387)	1,1%
Lucro Imobiliário	22.488	20,1%	5.389	25,6%	1.179	23,3%	6.162	21,0%	3.853	18,1%	5.905	16,9%

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Alto da Colina		Primeira Fase	
	Nominal	%	Nominal	%
Receita	**155.746**	**100,0%**	**155.746**	**100,0%**
PIS/COFINS	(2.573)	1,7%	(2.573)	1,7%
Custo Total	**(94.314)**	**61,6%**	**(94.314)**	**61,6%**
Custo Terreno	(10.152)	6,6%	(10.152)	6,6%
Custo Relacionados a Terreno	(1.190)	0,8%	(1.190)	0,8%
Custos de Incorporação	(1.227)	0,8%	(1.227)	0,8%
Custo de Construção	(81.746)	53,4%	(81.746)	53,4%
Lucro Bruto Econômico	**58.859**	**38,4%**	**58.859**	**38,4%**
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	**58.859**	**38,4%**	**58.859**	**38,4%**
Despesas de Selling	(12.176)	7,9%	(12.176)	7,9%
Contingência	(3.582)	2,3%	(3.582)	2,3%
Margem de Contribuição	**43.101**	**28,1%**	**43.101**	**28,1%**
IR e CSLL	(2.105)	1,4%	(2.105)	1,4%
Margem Líquida	**40.995**	**26,8%**	**40.995**	**26,8%**
Lucro Bruto REF Unit.	**94.951**	**41,4%**	**94.951**	**41,4%**
Lucro Raso REF Unit.	**72.402**	**35,0%**	**72.402**	**35,0%**

R$ Mil - VPL - Compra	Alto da Colina		Primeira Fase	
	VP	%	VP	%
Receitas	**111.759**	**100,0%**	**111.759**	**100,0%**
PIS/COFINS	(1.819)	1,6%	(1.819)	1,6%
Custos e Despesas Totais	**(87.452)**	**78,3%**	**(87.452)**	**78,3%**
Custo Terreno	(8.108)	7,3%	(8.108)	7,3%
Custo Relacionados a Terreno	(1.237)	1,1%	(1.237)	1,1%
Custos de Incorporação	(1.073)	1,0%	(1.073)	1,0%
Custo de Construção	(63.556)	56,9%	(63.556)	56,9%
Despesas de Selling	(10.645)	9,5%	(10.645)	9,5%
Contingência	(1.344)	1,2%	(1.344)	1,2%
IR e CSLL	(1.488)	1,3%	(1.488)	1,3%
Lucro Imobiliário	**22.488**	**20,1%**	**22.488**	**20,1%**

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Escritura	Atual	Atual vs Escritura	Δ%
Data Estudo:	julho-25	setembro-25	2 Meses	N/A
Lançamento:	setembro-25	setembro-25	0 Meses	N/A
Uhs:	696	696	-	0,0%
Preço Nominal:	225.486	224.978	(507)	-0,2%
Preço Raso:	202.688	202.871	183	0,1%
Preço Nominal Inflacionado:	232.665	229.538	(3.127)	-1,3%
Preço Raso Inflacionado:	209.149	206.990	(2.159)	-1,0%
Renda Média:	3.205	3.243	38	1,2%
RET Médio:	2,79%	3,00%	0,2 p.p.	7,6%
% em RET 1%:	40,30%	33,26%	-7,0 p.p.	-17,5%
VSO:	39	39	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	2.023	2.006	(18)	-0,9%
Avaliação:	232.598	232.598	-	0,0%
Prazo construção F1:	22	22	-	0,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	27	27	-	0,0%
Custo Total Inf (Unit):	137.903	135.509	(2.393)	-1,7%
Custo Construção (Unit):	105.448	104.230	(1.218)	-1,2%
Fração de construção:	46,8%	46,3%	-0,4 p.p.	-0,9%
INCC Folha Rosto:	1.191,33	1.210,47	19	1,6%
Custo Terreno Inf:	10.238.172	10.151.599	(86.573)	-0,8%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	1.038	1.709	672	64,7%
Fração do Terreno[1]:	6,0% / 52,8%	6,0% / 52,4%	0,0 p.p.	0,0%
Custo de Incorp. por uh:	1.997	1.762	(235)	-11,8%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	1.408.110	1.395.854	(12.255)	-0,9%
Custo do Ciclo (Unit):	14.769	14.736	(33)	-0,2%
Lucro Imobiliário:	20,0%	20,1%	0,1 p.p.	0,5%
LI Marginal:	20,3%	21,5%	1,2 p.p.	5,9%
Exposição de caixa:	11,9%	12,4%	0,4 p.p.	3,7%
TIR:	107,3%	105,4%	-1,9 p.p.	-1,8%
Margem Bruta REF:	41,2%	41,4%	0,2 p.p.	0,4%
Margem Bruta Econômica:	38,2%	38,4%	0,2 p.p.	0,6%
Margem Rasa REF:	34,6%	35,0%	0,4 p.p.	1,1%
Margem Rasa Econômica:	30,4%	30,8%	0,5 p.p.	1,6%
Margem Contribuição Econômica:	27,9%	28,1%	0,2 p.p.	0,7%
Payback Contingente (Régua 21 m):	20 m/ (-1 m)	20 m/ (-1 m)	0	0,0%
Payback Consolidado:	20 Meses	20 Meses	0 Meses	0,0%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Obrigado
