Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento

Regional: RJ

Projeto: Elevato Maracanã– RZN1

Data Comitê: 25/09/2025

Questionamentos Comitê 22/09/2025

Nome	Elevato Maracanã - Ampliado de Investimento	Observação - Elevato Maracanã
Renan Barbosa Sanches	Discutir em comitê	Dúvida: não podemos sair por viabilidade financeira se não comprovarmos a equação? Ou poderíamos sair mas não teríamos a devolução do sinal?
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Alejandro Octavio Abiusi	Discutir em comitê	1) Não entendi muito bem a negociação. Estamos amarrando a nossa possibilidade de desistir por viabilidade financeira ao custo de construção + terreno. Pra isso teremos que abrir nosso custo de construção pro terrenista? 2) Queria entender melhor o fluxo financeiro da MRV no produto Reserva Redentor. A unidade com preço CEF de 196k é de 1 dorm?
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Discutir em comitê	o pagamento do sinal está condicionado a confirmação da resolução dos passivos da proprietária, em especial junto ao Banco do Brasil, correto?
Rodrigo Osmo	Aprovado	N/A

Questionamentos

Renan Barbosa Sanches: *Dúvida: não podemos sair por viabilidade financeira se não comprovarmos a equação? Ou poderíamos sair mas não teríamos a devolução do sinal?*

Alejandro Octavio Abiusi: *1) Não entendi muito bem a negociação. Estamos amarrando a nossa possibilidade de desistir por viabilidade financeira ao custo de construção + terreno. Pra isso teremos que abrir nosso custo de construção pro terrenista?*

Resposta: Com exceção da cláusula resolutiva referente à viabilidade técnica, comercial e financeira, que foi objeto de negociação com os terrenistas, as demais cláusulas constantes de nossa (PCV) foram aprovadas em sua redação original. Dessa forma, caso qualquer uma das cláusulas resolutivas inviabilize a continuidade do projeto, o valor do sinal, (R$ 500 mil), será integralmente devolvido.

Conforme acordado com vendedores, a aplicação da cláusula resolutiva por inviabilidade financeira, técnica ou comercial está condicionada ao atingimento de um percentual superior a 65% na razão previamente. Sendo a razão superior a 65%, a eventual saída do negócio acarretará a perda do sinal. Caso seja abaixo dos 65% não teremos como desistir do negócio. Ressaltamos que, de acordo com a PCV assinada, o percentual atualmente apurado é de 59%, conforme demonstrado na tabela que consta na PCV (vide abaixo).

Unidades		446
Preço Médio Un.	R$	245.000,00
VGV	R$	109.270.000,00
Terreno	R$	8.500.000,00
Obra	R$	55.750.000,00

8%	Terreno / VGV
51%	Obra / VGV
59%	(TERRENO + OBRA) / VGV

É importante destacar que os valores apresentados e aceitos pelos vendedores são estimativas, não havendo detalhamento dos custos nem definição de com chegamos aos valores de venda. Para exercer o direito de rescisão por inviabilidade técnica, comercial e financeira, precisaremos demonstrar o que impactou negativamente a razão - seja por aumento nos custos de construção ou redução nos valores de venda projetados.

Gostaríamos de destacar os principais diferenciais deste terreno, que incluem sua localização estratégica nas proximidades da UERJ, do Maracanã e com fácil acesso a metrô e trem. Ressaltamos, ainda, a baixa fração do terreno (7,2%), e há potencial de valorização do preço das unidades.

Questionamentos

Alejandro Octavio Abiusi: *2) Queria entender melhor o fluxo financeiro da MRV no produto Reserva Redentor. A unidade com preço CEF de 196k é de 1 dorm?*

Resposta: O projeto da MRV é composto por unidades de 2 dormitórios, com possibilidade de conversão para unidade PNE. O preço de venda apresentado no slide de concorrência corresponde às unidades de 2 dormitórios.

DEL CASTILHO	PRIMOR CARIOCA	Av. Pastor Martin Luther King Jr 1003	Abril/2026	CONSTRUÇÃO	R$ 252.450,00	R$ 4.000,00	1,2%	54X	21%	60X (28%) - SEM ANUAIS	R$ 750,00	ITBI E REGISTRO GRÁTIS
TRIAGEM	RESERVA REDENTOR	Rua Dr. Garmier, 640	Julho/2027	CONSTRUÇÃO	R$ 236.890,00	R$ 3.800,00	1,2%	54X	20,75%	60X (28%) - SEM ANUAIS	GRÁTIS	ITBI E REGISTRO GRÁTIS
ANCHIETA	RESIDENCIAL TULUM	Rua Delfina da Cunha, 173	PRONTO	ÚLTIMAS UNIDADES	R$ 240.290,00	R$ 4.000,00	1,2%	52X	20%	60X (28%) - SEM ANUAIS	R$ 750,00	ITBI E REGISTRO GRÁTIS

Luiz Mauricio de Garcia Paula: *o pagamento do sinal está condicionado a confirmação da resolução dos passivos da proprietária, em especial junto ao Banco do Brasil, correto?*

Resposta: O pagamento do sinal será realizado após a conclusão positiva da Due, que engloba a comprovação dos pagamentos dos acordos ao BB e demais pontos indicados no farol jurídico.

One Page – Elevato Maracanã

[1]	Cidade	Rio de Janeiro	Mancha de demanda	RJ - RZN1 - Méier + Cachambi + Lins
	Regional	RJ	Cluster MPR	4 - Azul
	Cenário de Aprovação	Aprovação	Tipo de Aprovação	Consolidado
	Fase Anterior	N/A		
	Tipo de Comitê	Investimento	Versão da VF	Versão 1.0: Set
[2]	Unidades (Fases)	467 (1)	CA Máx | Proj	4,5 | 4,5
	Unidades com Vaga (%)	0 (0%)	Escritura | Lançamento	set/26 | jan/27
	Unidades com Varandas (%)	0 (0,0%)	Tipologia	F2E - Concreto
[3]	Valor Líquido do Terreno (% VGV)	8.731 (7,2%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
	Cash (Correção)	8.731 (INCC)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	0,0% (0,0%)
	Valor R$/m²	1.941	VAR (%VGV)	514 (0,4%)
[4]	Custo Construção (%VGV)	48.780 (40,0%)	Indireto Unit.	19.404
	Prazo da Obra (meses)	19	Torre Unit.	59.322
	Custo Total Unit. (LPU):	104.455 (94)	Infra Unit.	17.087
	Início de Obra	jul-27	Fundação Unit.	5.199
	Preço Nominal Unit.	261.029	VSO	26
	Preço Raso Unit.	237.203	Referência	Vision
	Avaliação Unit.	264.000	Renda (% em RET 1%)	5.199 (0,0%)
	Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		Preço Raso Inf. Médio Unit.	259.136
	Preço Inf. Médio Unit.	285.129	Margem Bruta REF (%)	45,5%
	Custo Inf. Médio Unit.	155.399	Margem Rasa REF (%)	40,0%



LI (Régua):	20,1% (20,0%)	Margem Bruta Econômica:	42,1%
LI Resiliência:	7,8% (N/A)	Margem Rasa Econômica:	35,6%
Margem Bruta REF:	45,5%	Margem Contribuição Econômica:	30,5%
Margem Rasa REF:	40,0%	Exposição (% VGV):	23.167 (17,9%)
TIR:	72,8%	VGV Total:	121.901
Payback Contingente (21 m) :	20 m/ (-1 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(796)
Payback Consolidado:	20	Ger. Caixa 24 meses (R$):	(17.994)

Destaques

[1] Imóvel localizado na Zona Norte em área nobre e de alta valorização para a Tenda (localização Premium), no bairro de São Francisco Xavier, divisa com os bairros de Vila Isabel, Maracanã e Tijuca, com frente para a R. São Francisco Xavier principal via da localidade. Entorno com farto transporte público, como Estação de metrô/ trem do Maracanã, Estação de trem da São Francisco Xavier e pontos de ônibus para diversos bairros da Zona Norte e Centro. Proximidade com Estadio do Maracanã, Quinta da Boa Vista, Bioparque do Rio e Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); serviços próximos como Shopping Tijuca, Hospital Policlínica Universitária Piquet Carneiro, Firjan SENAI e outros.

[2] Implantação de Tipologia Vertical com 2 torre em L 14PP T+16. CA projetado = 4,5 (100% de aproveitamento) com 467 unidades. O projeto não contempla vagas. Em virtude da falta de parâmetros técnicos para o caixilho acústico nível 3, apontado como necessário para as portas das varandas pelo laudo acústico e a falta de percepção de preço, não foram consideradas varandas nesse momento para baixa de landbank. Contudo, com o aprofundamento do estudo, teremos um upside real para desenvolvimento do projeto que certamente contará com varandas.

[3] Valor do terreno: R$ 8,5MM cash, com R$ 500k de sinal em até 90 dias após PCV (set/2025), contra DD positiva e aprovação no comitê, tendo como garantia da devolução do valor, caso a Tenda não siga com o negócio por não superar as resolutivas, a AF do terreno ou seguro garantia em favor da Tenda. Em relação a resolutiva de viabilidade técnica e financeira, esta só poderá ser acionada para a devolução do sinal, no caso de custo de terreno + custo de construção supere a proporção de 65% do VGV.; R$ 3MM 30 dias após a ECV desde que superadas resolutivas; e saldo de R$ 5MM, divido em 12x de R$ 416,66k. Todos os valores serão corrigidos pelo INCC, data base março/25. Na VF, o valor corrigido é de R$ 8,73 MM.

[4] Foram incorporados no custo, elementos construtivos para o enquadramento no faixa 3 que são reservatório de retardo e reuso, além de atributos de piscina, churrasqueira gourmet, pórtico premium e quadra gramada.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Farol Pareceres – Elevato Maracanã

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico Imobiliário	Due Diligence em andamento, pendente conclusão da análise patrimonial prevista para 22/09 **(necessária para baixa e pagamento do sinal)**. Pontos de atenção e pendências: (i) O contrato foi assinado em 18/06/2025, prevendo prazo de até 90 dias (até 16/09/2025) para realização dos estudos técnicos iniciais do imóvel. Decorrido o prazo, a Tenda deverá informar sua intenção de prosseguir, sob pena de resolução automática do contrato, sem necessidade de justificativa em razão de resolutivas. (ii) A Vendedora integra grupo econômico com mais de 85 empresas em diversos estados, com cerca de 2.500 processos identificados. Para mitigação de riscos, será necessária a assinatura de aditivo contratual com declarações e garantias da Vendedora quanto à inexistência de contingências que possam afetar o imóvel, além da obrigação de indenizar e manter a Tenda indene por passivos decorrentes de atos, fatos ou omissões da Vendedora, de sua controladora ou de empresas do grupo econômico **(ponto para baixa)**. (ii.i) Especificamente em relação à Vendedora, foi identificado passivo judicial de aproximadamente R$ 41 milhões, referente a execuções movidas pelo Banco do Brasil, sobre o qual foram celebrados acordos (aguardando comprovação de pagamento para confirmação da extinção) (ponto para baixa). Com exceção da certidão da Receita Federal (positiva com efeitos de negativa por débitos de R$ 217 mil com exigibilidade suspensa), as demais certidões fiscais encontram-se negativas. (iii) Necessária a autorização, em assembleia ou mediante decisão unânime por escrito de todos os sócios quotistas, para a alienação de bens imóveis da sociedade, conforme previsto na cláusula sexta do Contrato Social (**ponto para baixa**) (iv) O imóvel apresenta débitos de IPTU (exercício 2024), no valor aproximado de R$ 348 mil, que deverão ser quitados até a assinatura da ECV. O contrato prevê a possibilidade de antecipação desses pagamentos pela Tenda, caso necessário, com posterior abatimento do valor, corrigido pelo INCC. (v) Há pagamento de sinal de R$ 500.000,00 até 16/09/2025, vinculado à aprovação em comitê e assinatura de AF ou seguro para garantir o pagamento. Após o pagamento do sinal, em caso de rescisão do contrato por alguma cláusula resolutiva, a Tenda deverá apresentar todos os documentos que justifiquem a rescisão, assim como entregar à Vendedora todos os projetos e estudos realizados. (vi) Qualquer alteração no estado físico ou registral do imóvel dependerá de autorização expressa da Vendedora. **O contrato não possui a cláusula resolutiva master padrão, tendo sido ajustada para permitir a saída da Tenda nos casos de inviabilidade técnica, comercial e/ou financeira, quando a equação econômico-financeira do empreendimento se mostrar inviável, considerando que a relação entre (custo do terreno + construção do empreendimento) e o VGV, à época da análise, supere a proporção de 65% (nessa hipotéses o sinal permancerá retido em favor da Vendedora).** A resolutiva master jurídica permanece inalterada. O prazo contratual é de 15 meses. Em caso de atraso na outorga da escritura, aplica-se multa à Tenda de 0,033% ao dia sobre o valor total do negócio, limitada a 10%, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês ou fração, calculados pro rata die, desde a data do inadimplemento até o efetivo adimplemento da obrigação.	Ok com ressalvas	
Legalização	Será necessário retificar metragens, em razão de divergências identificadas entre a matrícula e as medidas aferidas in loco. Em função dessa adequação, haverá um decréscimo na área total, já contemplado no projeto. O Laudo de estudo geológico indicou a necessidade de implantação de um muro de contenção na parte posterior do terreno devido ao desnível em relação ao confrontante. Os custos estão previstos no orçamento da GETEC.	Ok com ressalvas	
Produto	Sem riscos associados.	Ok	
GETEC	As varandas não foram consideradas, uma vez que o laudo acústico aponta caixilhos classe 3 (Tipologia RJ as varandas são nos dormitórios). Caso seja necessária a inclusão deste custo o orçamento deverá ser revisado.	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos associados.	Ok	
Inteligência de mercado	IM avalia o preço como factível.	Ok	
Comercial/Ciclo	CICLO avalia o preço como factível.	Ok	
Estudos Econômicos	Sem riscos associados.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- RZN – Rio de Janeiro Norte

Lançamento

1. Elevato Bonsucesso

LandBank

2. Elevato Brasil
3. Estação Brasil
4. Estação Rio (Forja Rio)
5. Elevato Carolina Machado
6. Mirante Boa Vista
7. Elevato Ramos
8. Silva Vale
9. Elevato Maracanã

Cluster MPR – (Comitê)

- Cluster 4 - Azul

Região

Capital

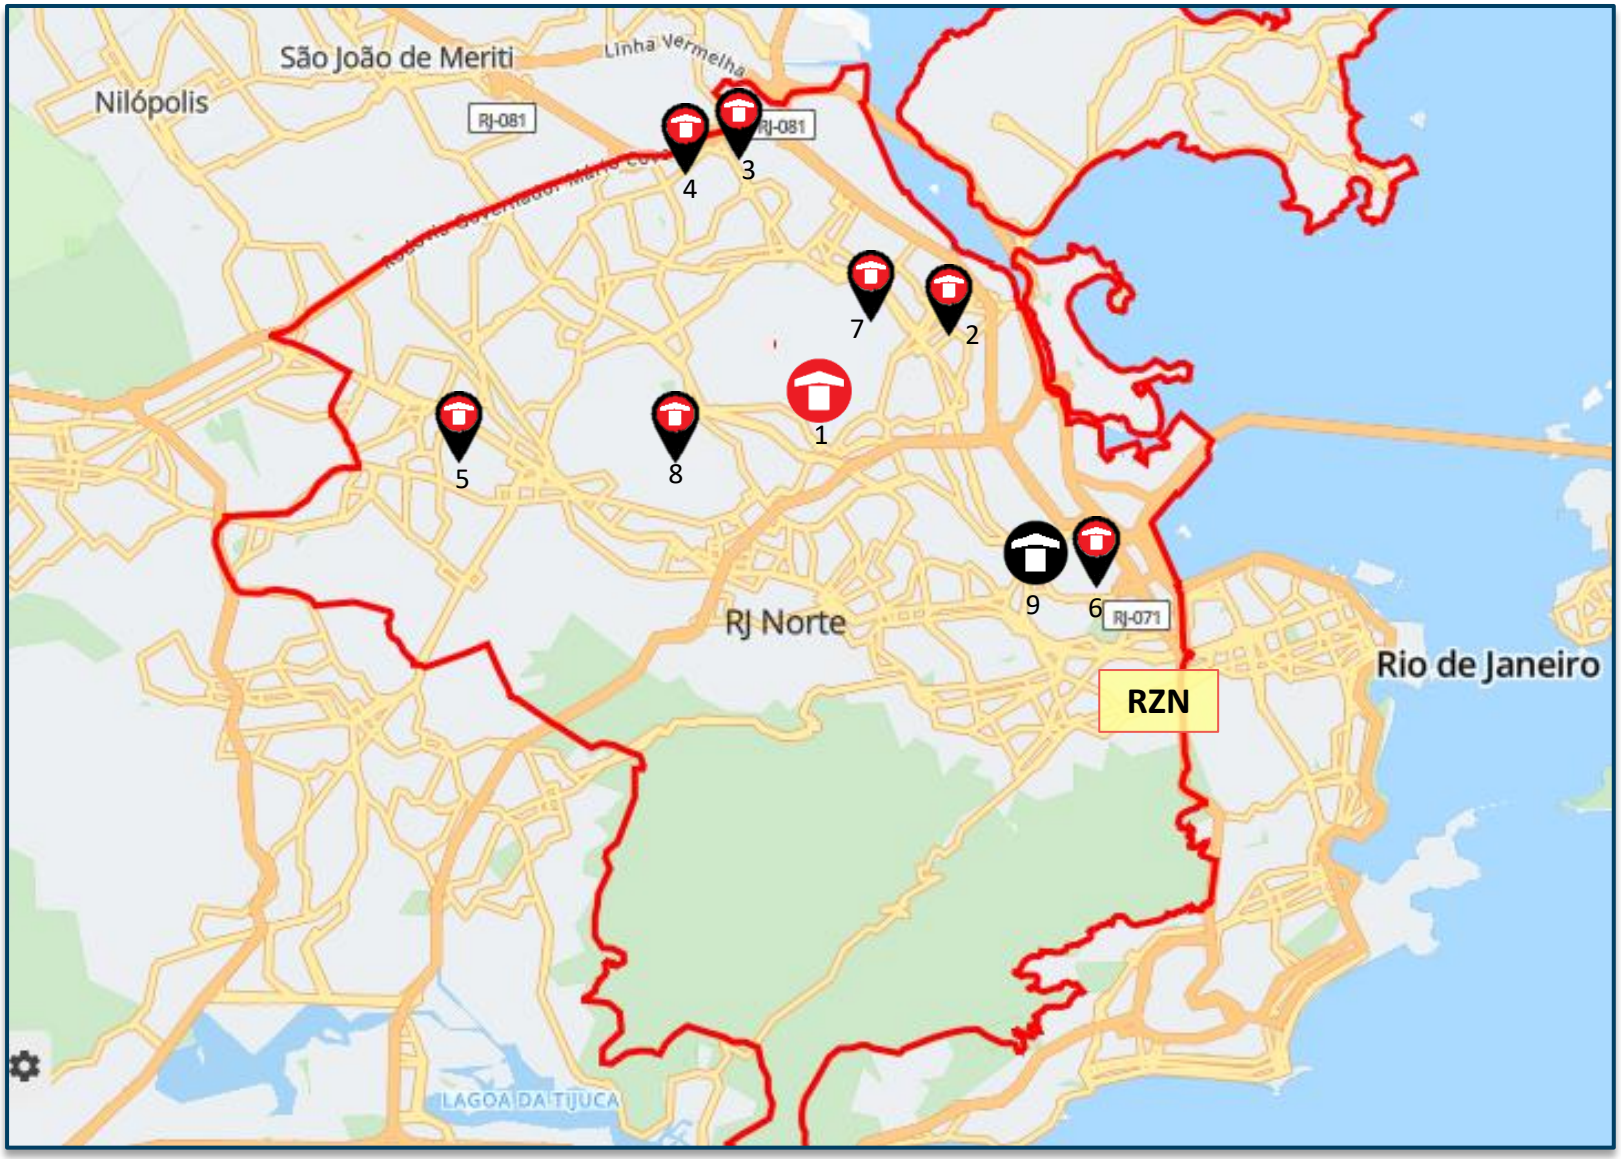

Lançados *LandBank* *Comitê*

Macrolocalização

1 – Complexo do Maracanã
2 – UERJ
3 – BIO Parque
4 – Quinta da Boa Vista
5 – CADEG RJ
6 – Escola Municipal Marechal Carlos
7 – Hospital Municipal Barata Ribeiro
8 – Policlínica Universitária Piquet Carneiro
9 – Estação São Francisco Xavier
10 – Estação Trem/ Metro - Maracanã

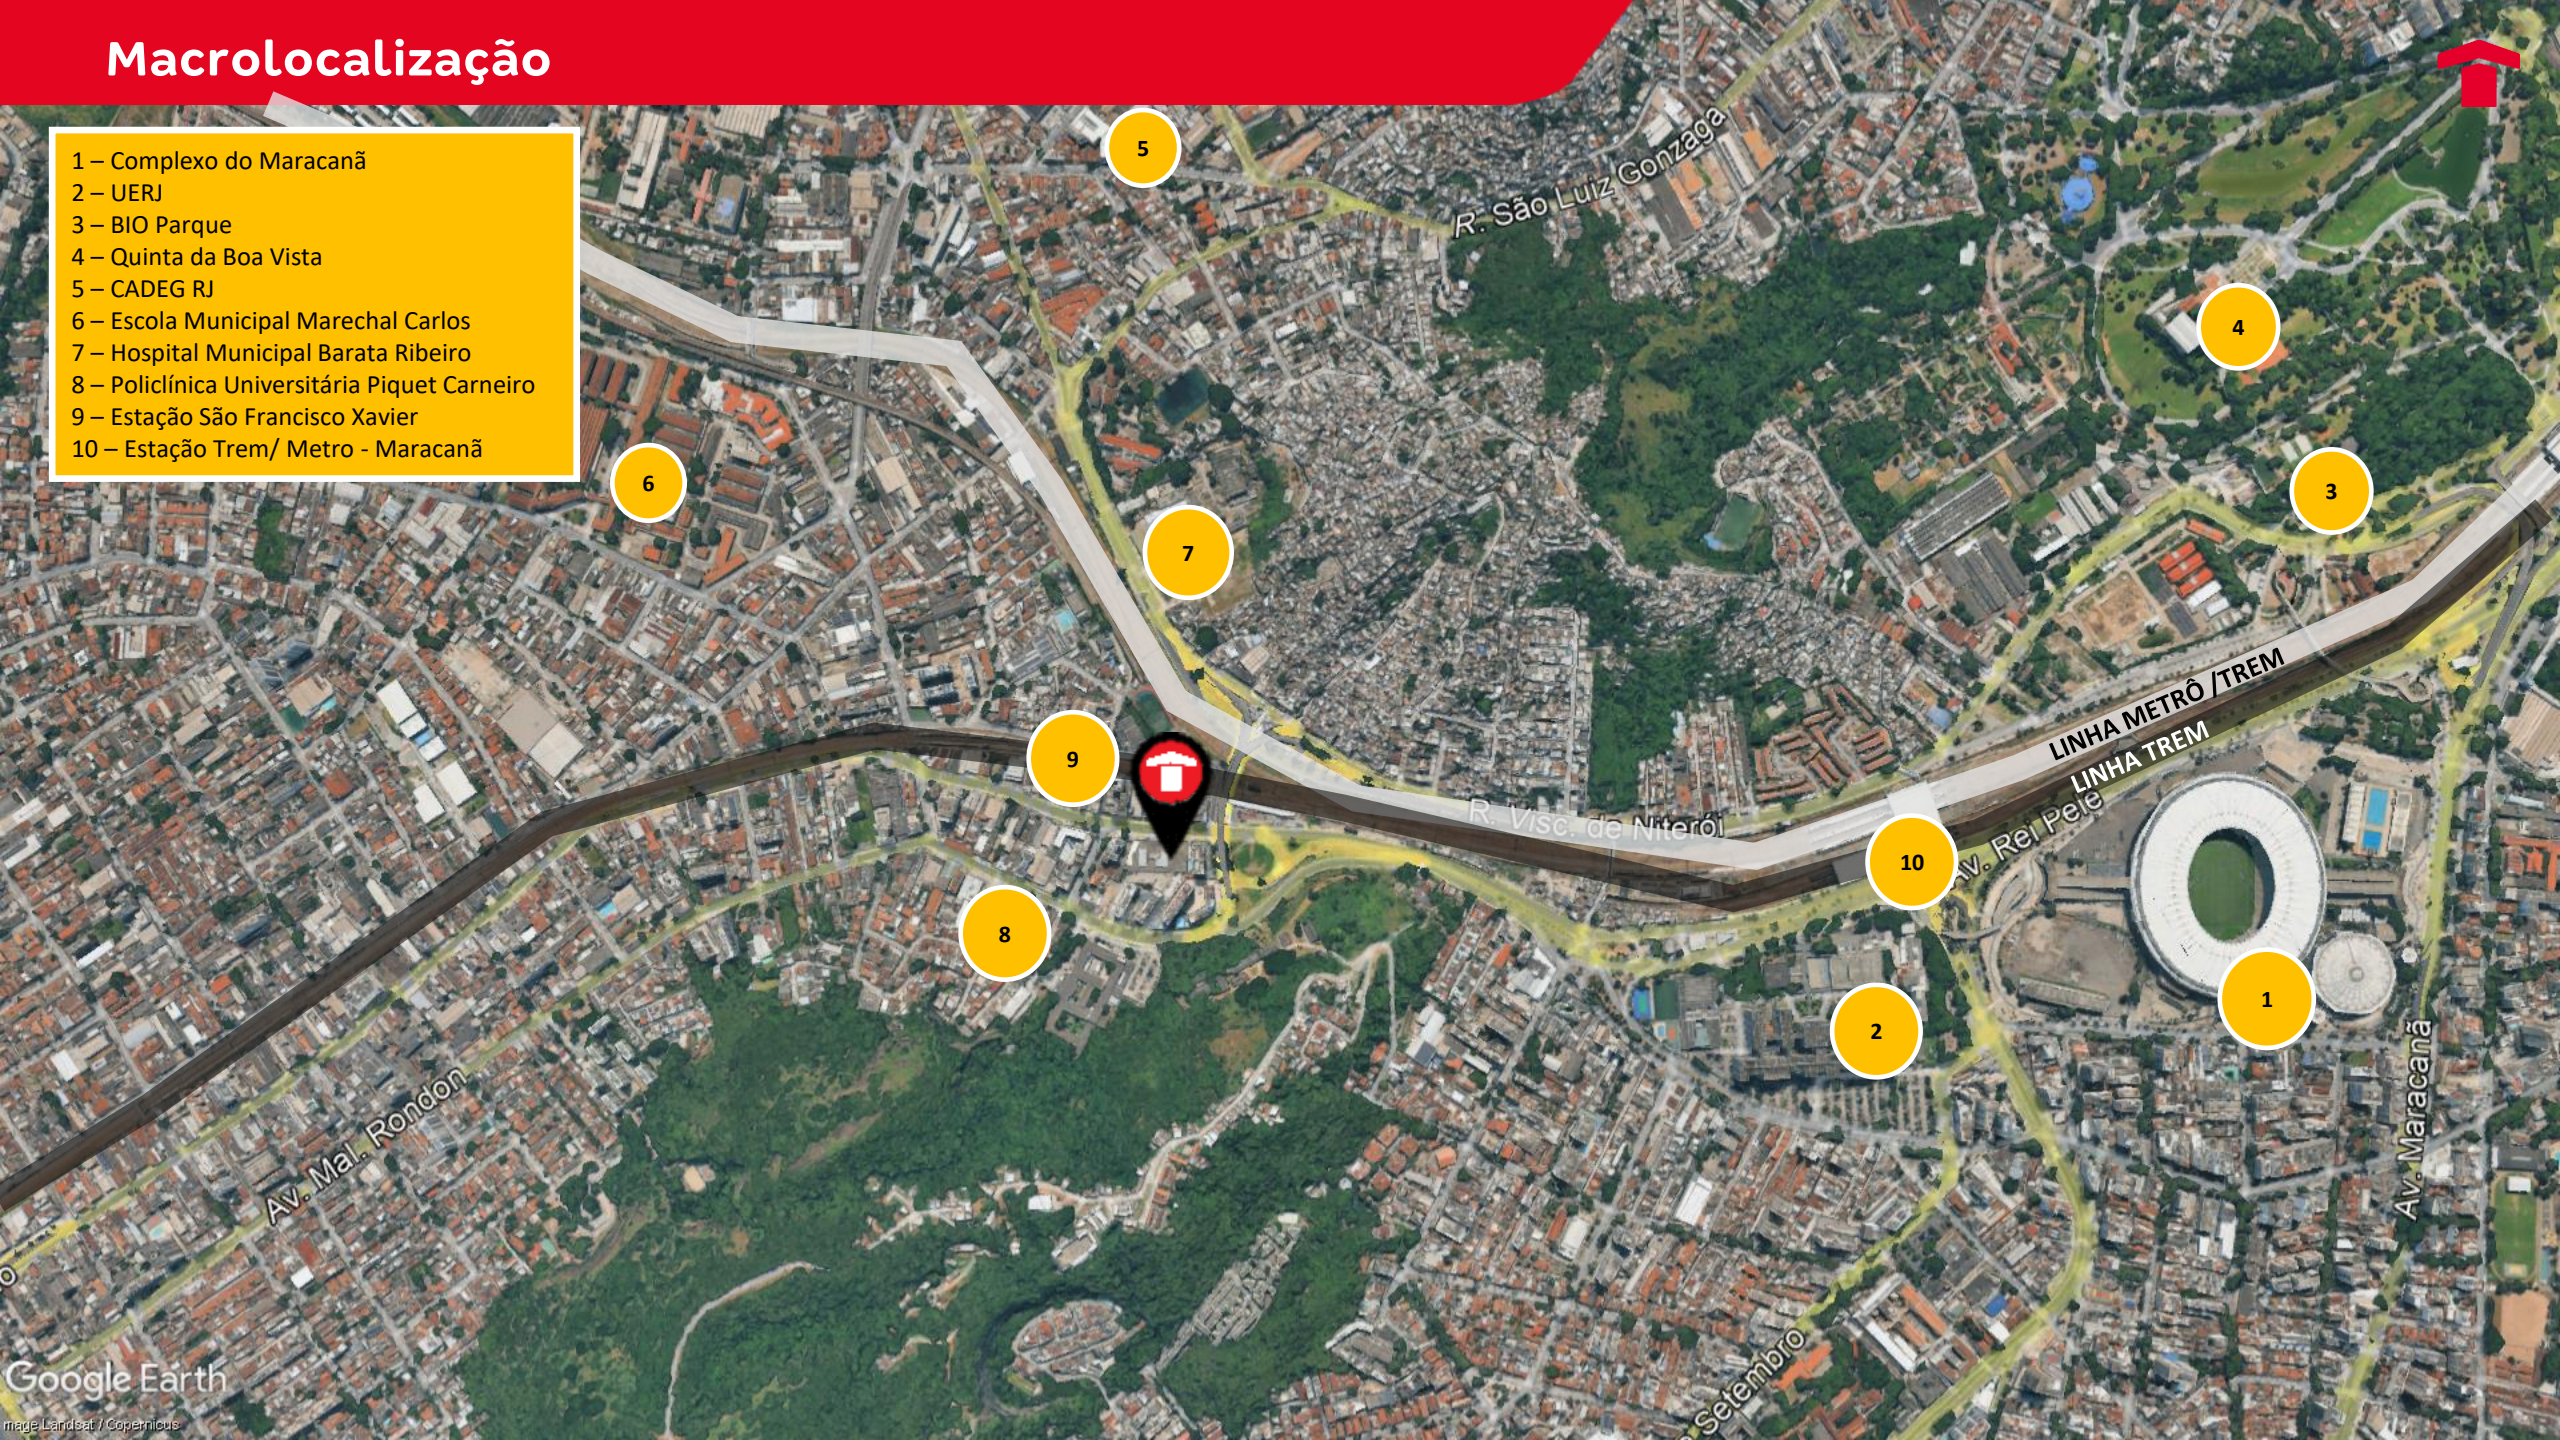

PRODUTO

Empreendimento Elevato Maracanã (Superfor)
Investimento

Informações Gerais – Condomínio Único		
Terreno	**Área terreno**	4.681,53m²
	Menor poligonal	4.498,18m²
	APP/FNA	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento viário	Sim – 11m do eixo da via
	Área liquida	4.498,18m²
	Zoneamento	ZUM C - AP 3
	Ca máximo	4,5
	Ca projetado	4,5
	Gabarito máximo	T+21 (legislação)
Geral	**Total UH**	467
	Total de vagas	470 (100,64% bicicletas)
Tipologia	**Tipologia**	Modular com elevador
	Gabarito	T+16
	Lâmina	02 - 14PP LE3A
	Área privativa	34,10m²
Condomínio	**Unidade UA**	15 (3%)
	Unidade lazer| técnica	07|02
	Torre	02
	Fase	Única
Lazer	**Lazer coberto**	2 Espaço office, Brinquedoteca, 2 Fitness, Espaço saúde, Espaço Teen, SportBar, Espaço Oficina, Salão de festas e churrasqueira gourmet
	Lazer descoberto	Piscina com Praça do Sossego, Play kids, Play baby, Quadra gramada, Fitness externo, Play pet, Praça ponto de encontro e Praça de Chegada

LEGENDA:

- Área de lazer 01
- Área técnica 02

PRODUTO

Empreendimento Elevato Maracanã (Superfor)
Investimento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	Limite supercondomínio		
	Acesso		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	Atributos Infra	Sim	Portaria com pórtico, piscina e quadra gramada
	Atributos Torre	Não	
	Edifício Garagem	Não	-

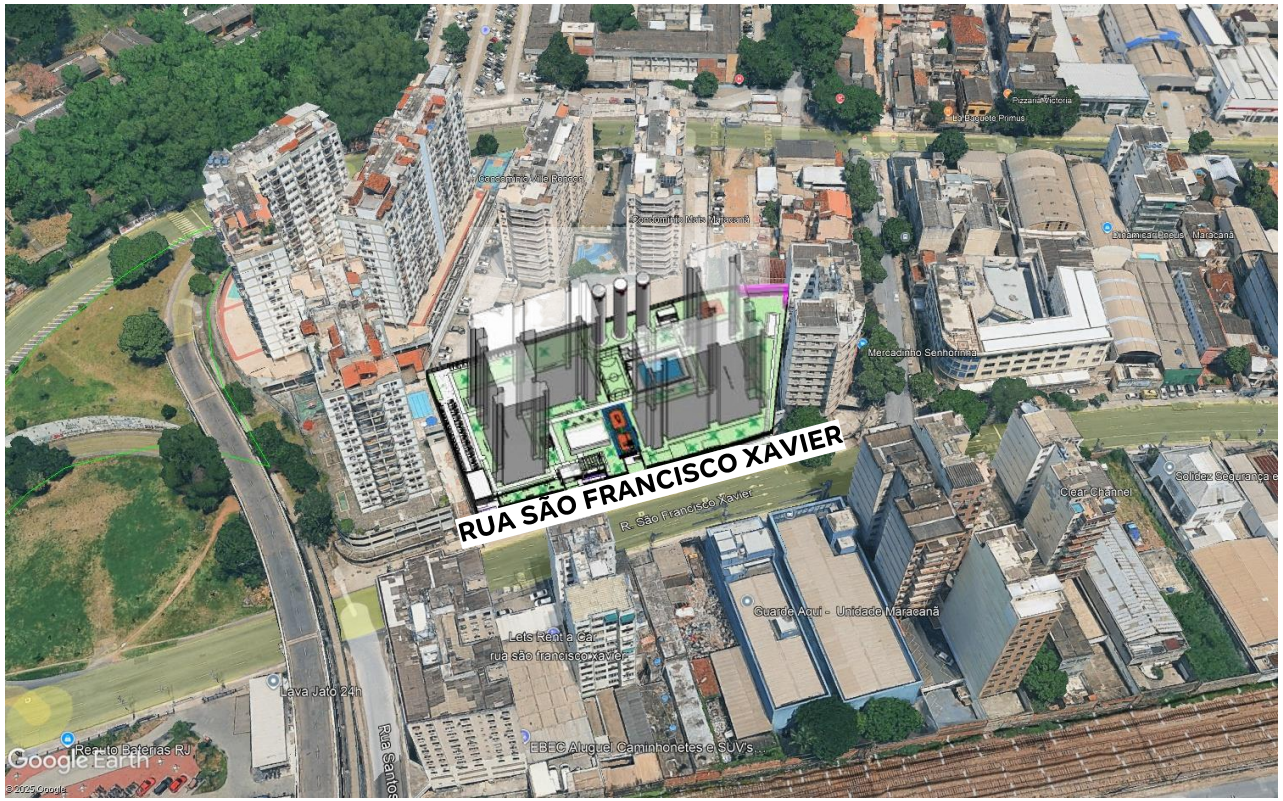

Perspectiva

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Condições do Negócio

- **VALOR DO NEGÓCIO: R$ 8.500.000,00**

- R$ 500.000,00 em cash em até 90 dias (set/25) após assinatura da PCV, garantidos por AF do imóvel, desde que superadas cumulativamente as seguintes condições:
  i) a conclusão positiva dos estudos técnicos preliminares a serem no imóvel;
  ii) a aprovação em comitê;
  iii) a conclusão positiva da Due Diligence inicial;
- R$ 3.000.000,00 em dinheiro 30 dias após a ECV desde que superadas as resolutivas;
- R$ 5.000.000,00 em dinheiro divido em 12 x de R$ 416.666,67;
- Todos os valores serão corrigidos pelo INCC da data base março/25 ate a presente assinatura da PCV. Na VF : R$ 8.731.437,32 corrigidos pela INCC até a data da assinatura da PCV.

- **PRAZOS CONTRATUAIS**

- PCV assinada em 18 de junho de 2025.
- Prazo para aprovação do projeto e superação das resolutivas de 12 + 3 meses, quando assinaremos a ECV.

- **CONDIÇÕES RESOLUTIVAS**

- Presença de todas resolutivas, sendo que a resolutiva master (inviabilidade técnica , financeira e comercial) só poderá ser aplicada caso a equação econômica e financeira do empreendimento se torne inviável, ou seja, que a relação do custo de terreno + construção do empreendimento comparado relativamente ao VGV do empreendimento, ao tempo da análise, supere a proporção de 65%. Nessa hipótese, o sinal será retido com a vendedora.

- **GARANTIAS**

- Para Vendedores: aval Construtora Tenda e Seguro Garantia no valor de R$ 8.000.000,00 em favor dos vendedores
- Para Tenda: AF sobre o imóvel ou seguro garantia, garantindo devolução do sinal.

- **CORRETAGEM**

- Corretagem 5% sobre o valor do negócio pagos para Makkil LTDA.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Custo de Construção

	ELEVATO MARACANÃ (SUPERFOR) CEN01 | REV00	ELEVATO NOVA IGUAÇU CEN02 | REV02	SILVA VALE COND.01 CEN01 | REV00
Torres	2	2	2
Unidades Construídas	476	608	496
Unidades Vendidas	467	606	494
Total Unidades Vendidas	467	606	494
Condomínios (qta.)	1	1	1
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Nova Iguaçu - RJ	Rio de Janeiro - RJ
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	2 Torres | T+16 | 14PP | LE3A	2 Torres | T+18 | 16PP | CE1B	1 Torre | T+15 | 16PP | LE3B
Tipologia	-	-	1 Torre | T+14 | 16PP | LE3B
Varanda	-	288	-
Projeto Infra	AP	AP	AP
Projeto Torre	AP	AP	AP
Atributos	Piscina | Quadra Portaria Premium	Piscina | Quadra | Varanda	Piscina | Quadra
Mês Base	setembro-25	agosto-25	junho-25
Incc	1.210,471	1.210,471	1.184,462
LVS	julho-25	junho-25	abril-25
Indiretos	julho-25	junho-25	abril-25
Base de Preço	LPU 94 R01	LPU 94	LPU 91
Takt	2+2	2x2	2x2
Prazo (mês)	19	20	19
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 101.951	R$ / UND R$ 100.486	R$ / UND R$ 95.093
Indireto	R$ 19.404	R$ 18.264	R$ 18.461
Torre	R$ 59.322	R$ 56.918	R$ 57.332
Infra	R$ 17.087	R$ 16.222	R$ 15.012
Fundação	R$ 5.199	R$ 6.960	R$ 3.535
EEE		R$ 194	
ETE		R$ 1.138	
Contenção	R$ 630	R$ 5	R$ 348
Terraplenagem	R$ 309	R$ 785	R$ 404
CUSTO TOTAL II	R$ 2.504	R$ 1.572	R$ 1.311
Urbanização	R$ 307		R$ 485
Drenagem	R$ 1.310	R$ 436	R$ 422
Extensão de Rede Elétrica	R$ 214	R$ 572	R$ 51
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 672	R$ 565	R$ 353
CUSTO TOTAL III			
Incorridos			
CUSTO TOTAL IV			
Aprendizado			
CUSTO TOTAL V			R$ 2.117
Atualização por INCC			R$ 2.117
CUSTO TOTAL I+II	R$ 104.455	R$ 102.058	R$ 96.404
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 104.455	R$ 102.058	R$ 98.521

Custo de Construção

	ELEVATO MARACANÃ (SUPERFOR) CEN01 | REV00	ELEVATO NOVA IGUAÇU CEN02 | REV02	
Torres	2	2	
Unidades Construídas	476	608	
Unidades Vendidas	467	606	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Nova Iguaçu - RJ	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	2 Torres | T+16 | 14PP | LE3A	2 Torres | T+18 | 16PP | CE1B	
Tipologia	-	-	
Varanda	-	288	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Atributos	Piscina | Quadra Portaria Premium	Piscina | Quadra | Varanda	
Mês Base	setembro-25	agosto-25	
Incc	1210,471	1210,471	
LVS	julho-25	junho-25	
Indiretos	julho-25	junho-25	
Base de Preço	LPU 94 R01	LPU 94	
Takt	2+2	2x2	
Prazo (mês)	19	20	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 101.951	R$ / UND R$ 100.486	DIF R$ 1.466
Indireto	R$ 19.404	R$ 18.264	R$ 1.140
Torre	R$ 59.322	R$ 56.918	R$ 2.403
Infra	R$ 17.087	R$ 16.222	R$ 866
Fundação	R$ 5.199	R$ 6.960	-R$ 1.761
EEE	R$ 0	R$ 194	-R$ 194
ETE	R$ 0	R$ 1.138	-R$ 1.138
Contenção	R$ 630	R$ 5	R$ 625
Terrapplenagem	R$ 309	R$ 785	-R$ 476
CUSTO TOTAL II	R$ 2.504	R$ 1.572	R$ 931
Urbanização	R$ 307	R$ 0	R$ 307
Drenagem	R$ 1.310	R$ 436	R$ 875
Extensão de Rede Eletrica	R$ 214	R$ 572	-R$ 357
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 672	R$ 565	R$ 107
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL	R$ 104.455	R$ 102.058	R$ 2.397

INDIRETOS | Diluição

+185 | G11 – Serviços Técnicos
+495 | G14 – Administração
+425 | G15 – Canteiro

TORRE

+352 | Concreto - Preço
Maracanã: 14,24 m³/uh – 52 kg/m³ (14PP T+16) – R$/m³ 713,65
Nova Iguaçu: 13,29 m³/uh – 55 kg/m³- (16PP T+18) – R$/m³ 699,16
+237 | Cerâmica – Projeto/Diluição
+1.573 | Elevador - Diluição
Maracanã: 6.285,71 R$/uh
8 Elevadores : 2+2 – 1+1,5 m/s
Nova Iguaçu: 4.921,05 R$/uh
8 Elevadores : 2+2 – 1,75+2,5 m/s

INFRA

-600 | Outros Rev.piso – Projeto | Maracanã não tem pavimentação e vaga.
+1.020 | Instalações Elétrica hidráulica - Maracanã tem CTS
-491 | Reservatório Metálico
Maracanã: altura de 28,33m - Ø 3.80 – 3 unid.
Nova Iguaçu: altura de 46m - Ø 3.80 – 3 unid.
+1.090 | Anexos – Projeto e Diluição | Maracanã tem portaria Premium e CTS
-185 | Enterrados - Projeto

FUNDAÇÃO

-1.761 | Projeto / Diluição
Maracanã: Radier com troca de solo – Rachão
Nova Iguaçu: Estaca hélice Ø 40,Ø 50,Ø 60 e Ø 70 – 12m

TERRAPLENAGEM

-476 | Projeto / Preço
Maracanã - Corte: 268,73m³ / Aterro com importe: 895,09m³
Nova Iguaçu– Aterro com importe: 5.274,76 m³

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Necessário a execução de extensão de rede com 85m aproximadamente, na rua São Francisco Xavier até cobrir toda a testada

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Necessário a execução aproximadamente de extensão de rede com 80m, substituir 12m e interligar no PV existente na Rua São Francisco Xavier.

SISTEMA DE DRENAGEM
Necessário a execução de extensão de rede com 133m aproximadamente, na rua São Francisco Xavier

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado Passeio, grama, guia e sarjeta na testada do imóvel e sinalização.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	Nível 3
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	Nível 5

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 08/2025, com validade em 08/2027.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 08/2025, com validade em 08/2027.

Drenagem:
- Viabilidade emitida em 07/2025.

Elétrica:
- Viabilidade emitida em 08/2025, com validade 60 dias. Considerado Remoção do poste conforme solicitação Logística

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado Passeio, grama, guia e sarjeta na testada do imóvel e sinalização.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 08 furos sondagem á percussão e 05 furos de sondagem mista .
- Considerada Radier com troca de solo – rachão 3m.

Logística

VIVÊNCIA - CONTAINERS								
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41m X 4,90m	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	UNICA
CONTAINER VIVÊNCIA VERTICALIZADA (LOG)	CONSIDERAR 17 MÓDULOS DE CONTAINER SOBREPOSTOS (6 NO TÉRREO, 6 NO 1° PVTO E 5 NO 2° PVTO)	2,41 X 6,10 m	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA

UNICA

LOG_LAZER							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
FUMODROMO PEQUENO (LOG)	1	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	ÚNICA
TENDA LAZER	2	-	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	ÚNICA

ÚNICA

TENDAS_PERÍODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
GAIOLA DE INFLAMÁVEIS (LOG)	1	3,00	4,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	ÚNICA
TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	7,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	ÚNICA
TENDA ARMADOR (LOG)	1	5,00	8,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	ÚNICA
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	6,00	8,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	ÚNICA
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	5,00	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	ÚNICA
TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	5,15	21,84	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	ÚNICA
TENDA EXTRA (LOG)	1	4,00	15,00	TODO PERÍODO	-	-	ÚNICA
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	3,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	ÚNICA

ÚNICA

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	UNICA
BOBCAT (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	UNICA
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)	1 EQUIPAMENTO PARA CADA BLOCO	-	-	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-	UNICA
CREMALHEIRA CABINE DESMONTÁVEL (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB DE CREMALHEIRA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB DE CREMALHEIRA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA
MINIGRUA (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-	UNICA
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO.	-	-	UNICA

UNICA

LOG_ANDAIME						
EQUIPAMENTO	QUANT.	MEDIDAS	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
ANDAIME (LOG)	1	IGUAL PISCINA	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	UNICA

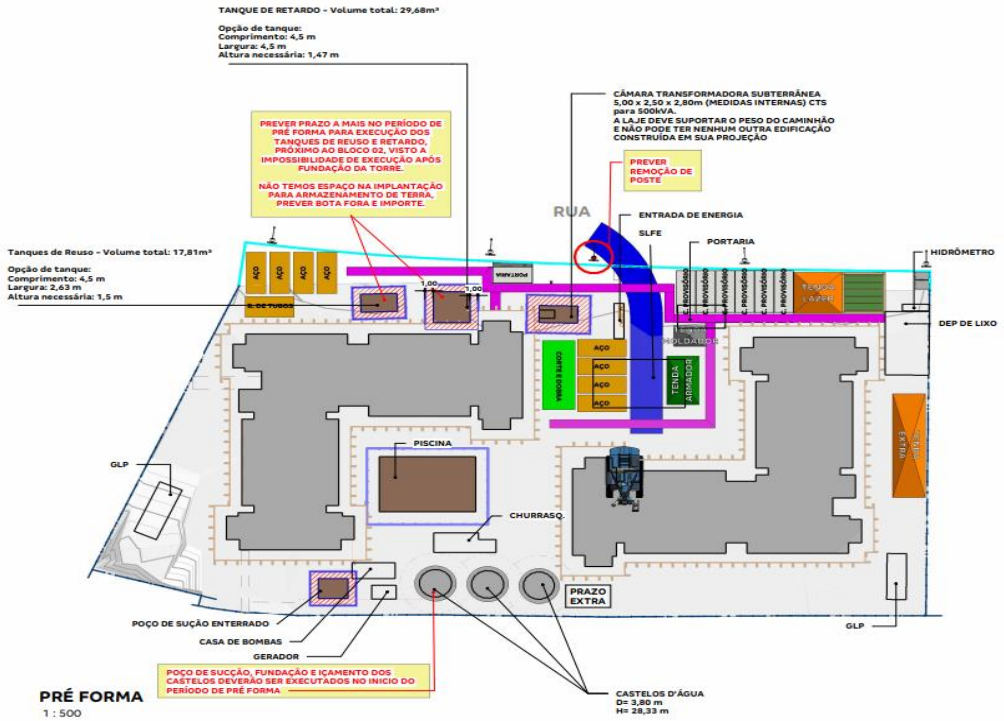

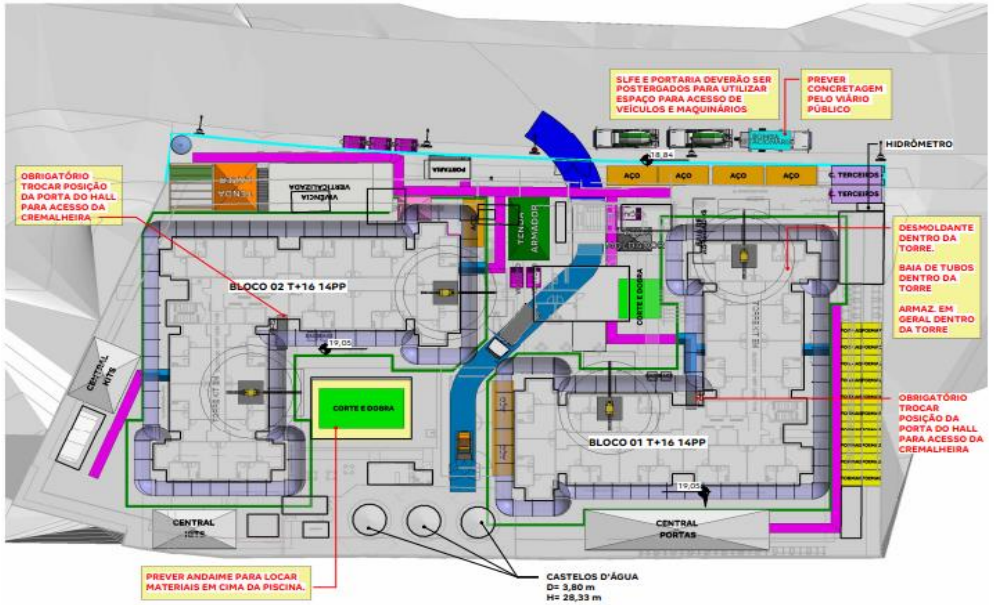

Ref: Parecer AP RJ – Superfor - LOGT-0-RJ-0200-LF-PC10-LE3A-14PP-AP-LOG-801-C01-PAAP-R01

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Rio de Janeiro Norte	RZN	22%	1.560	130	1.872	156

Empreendimento	Renda	Lançamento	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28	jul/28	ago/28	set/28	out/28
Elevato Bonsucesso	2.350	nov-24	16																					
Mirante Boa Vista	4.802	jan-26	25	25	25	25	25	25	17															
Elevato Carolina Machado	3.894	fev-26	25	25	25	25	25	25	6															
Elevato Ramos	3.563	abr-26	28	28	28	28	28	28	28	28	28	18												
Elevato Brasil	3.598	jul-26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	8								
Silva Vale - COND I	3.698	set-26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	8						
Elevato Maracanã	**5.199**	**jan-27**		**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**25**			
Silva Vale - COND II	3.698	mar-28																28	28	28	28	28	28	28
Total de Vendas Lançados			**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**148**	**158**	**158**	**158**	**158**	**158**	**131**	**108**	**108**	**98**	**80**	**80**	**80**	**61**	**53**	**62**	**54**	**54**	**53**	**28**	**28**	**28**

Embora o potencial da mancha tenha sido ultrapassado, o Elevato Brasil se apresenta como um projeto coringa.

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está acima do potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Elevato Maracanã | Mapa Concorrência

		Elevato Maracanã	Reserva Redentor	Vivaz Zona Norte	Beon Porto Residencial	Vivaz Connection Zona Norte
		TENDA	MRV	Vivaz	Riva	Vivaz
	Distância Tenda (km)		1,26Km	416m	2,92Km	1,68Km
Região 1 Km	População	43.744	34.565	37.036	12.260	42.984
	Dens. Demográfica	14.014	11.074	11.865	3.928	13.771
	Renda (R$)	9.799	6.754	7.194	6.265	8.187
	Classe Social	B2 (4.6k a 8.1k)	B2 (4.6k a 8.1k)	B2 (4.6k a 8.1k)	C1 (2.7k a 4.6k)	B2 (4.6k a 8.1k)
	PEA Dia	37.582	36.812	37.384	49.826	38.321
Quantitativo	Lançamento	jan/27	10/2024	05/2022	06/2023	abr/25
	Unidades	467	204	474	361	284
	Estoque	467	90	61	151	151
	VSO	26	13	11	8	33
	Stockout	18	7	6	19	5
Qualitativo	Condomínios	1	1	1	1	1
	Torres	2	2	3	1	4
	Gabarito	T+16	T+16	T+12	T+20	T+9
	Plantas (m²)	34,10m²	35,36m² e 36,56m² e 36,31m²	47m² e 40m² e 37m²	33,76m² e 28,81m²	37,2m² e 37,6 m²
	Tipologia	2 Dorms	1 e 2 Dorms	2 Dorms	1 e 2 Dorms	1 e 2 Dorms
	Opções	Não	Garden	Não	Não	Não
	Varanda	Não	Sim	Sim	Sim	Não
	Vagas	Sem vaga	55% Com vaga	60% Com vaga	Com vaga	6% Com vaga
	Lazer	Coberto : 2 Espaço office, Brinquedoteca, 2 Fitness, Espaço saúde, Espaço Teen, SportBar, Espaço Oficina, Salão de festas e churrasqueira gourmet. Descoberto : Piscina, Play kids, Play baby, Quadra gramada, Fitness externo, Play pet, Praça ponto de encontro	Churrasqueira condominial, elevador social, academia, academia externa, piscina adulto, piscina infantil, playground, portaria, salão de festas.	Tem Sacada, Bosque, Campo de Futebol, Cinema, Decorado, Espaço Gourmet, Lago, Piscina Aquecida, Piso Elevado, Praça, Sala de Reuniões / Treinamentos, Salão de Jogos, Sauna Seca,	Tem Sacada, Bosque, Campo de Futebol, Cinema, Decorado, Espaço Gourmet, Lago, Lounge, Piscina, Piscina Aquecida, Sala de Reuniões / Treinamentos, Salão de Jogos, Sauna Seca,	Academia, brinquedoteca, churrasqueira condominial, elevador social, lounge, pet place, piscina adulto, playground, portaria, salão de festas, segurança, terraço.

Diagnóstico Concorrência

- O projeto "Reserva Redentor" da MRV e o "Vivaz Connection" da Vivaz possuem target de preço e renda próximo ao estimado para o produto Tenda. Segundo os dados sociodemográficos, o projeto está localizado em uma região com menor atratividade e infraestrutura. O Elevato Maracanã, por sua vez, está em uma área mais valorizada, próximo ao parque Quinta da Boa Vista e ao Porto Maravilha. Os mapas no slide seguinte evidencia que a região se destaca pela infraestrutura e pela forte atividade comercial.

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

-	Elevato Maracanã					Reserva Redentor				Vivaz Zona Norte				Beon Porto Residencial				Vivaz Connection Zona Norte			
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol
Sem Varanda	264.000	261.029	205.717	5.199	100%	245.053	196.042	3.834	🔴	-	-	-	-	-	-	-	-	259.693	207.754	5.299	🟡
Varanda	-	-	-	-	-	253.125	202.500	4.069	-	287.590	230.072	5.699	-	332.614	266.091	6.600	-	269.641	215.713	5.399	-
Varanda + Vaga	-	-	-	-	-	280.441	224.353	4.507	-	-	-	-	-	382.876	306.301	7.599	-	330.491	264.393	6.599	-
Garden c/vaga	-	-	-	-	-	351.610	281.288	6.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suíte c/vaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.214	268.171	6.699	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vg Carro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.053	261.642	6.499	-

Elevato Maracanã | Mapa de Atratividade

A localização do Elevato Maracanã é significativamente superior à do empreendimento da MRV e Vivaz (Vivaz Connection). O projeto está inserido em uma região economicamente ativa, com melhor infraestrutura, maior atratividade e uma boa média de renda. A seguir, apresentamos um comparativo entre as regiões dos empreendimentos.

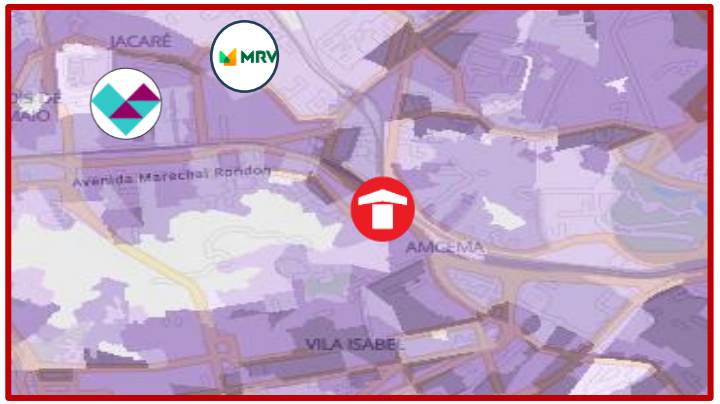

Elevato Maracanã está localizado em uma região mais ativa economicamente.

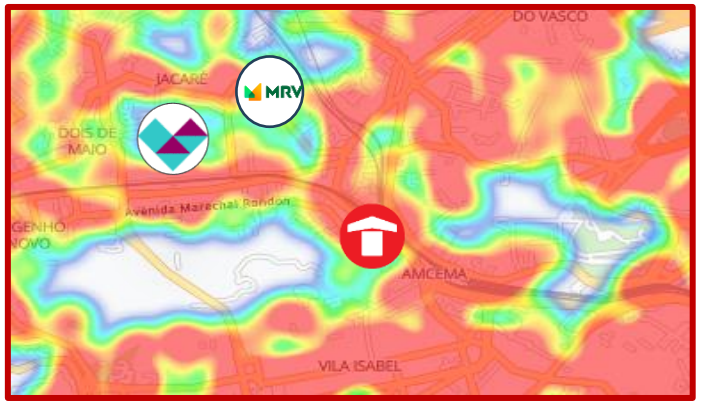

A região do Elevato Maracanã se destaca pela melhor infraestrutura e forte atividade comercial, representadas pela intensidade da cor vermelha.

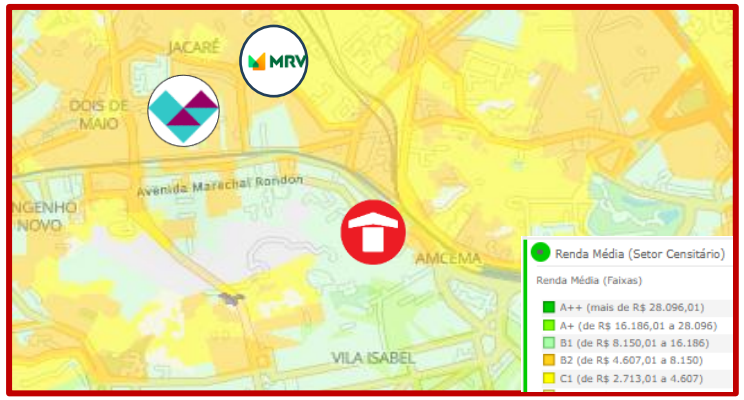

O mapa demonstra que o Elevato Maracanã está localizado em uma região cujo entorno apresenta uma boa renda média.

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Elevato Maracanã
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	264.000
Renda Inicial (VF)	5.199
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,91	4.583
FGTS	1,10	5.548
Financiamento	97,99%	200.169
Subsídio	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	24	24
Pró-Soluto	59,34%	26.903
Preço Raso (RS)	237.203	237.203
TCD	45,46%	23.826
VSO	26	26
Preço de Venda	**268.939**	**268.939**
Elasticidade	-3,030%	-3,030%
Preço de Venda Final	**261.029**	**261.029**
Preço Raso (R$)	**237.203**	
% de Raso	**90,87%**	
Raso Todas as Fases	**237.203**	
Nominal Todas as Fases	**261.029**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M considera o preço Vision como factível. Visto que o projeto está localizado em uma região com ótimos indicadores sociodemográficos e deve ser favorecido pela alta demanda da região. Além disso, conta com o atributo piscina.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", O projeto "Reserva Redentor" da MRV e o "Vivaz Connection" da Vivaz possuem target de preço e renda competitivos. No entanto, Elevato Maracanã, por sua vez, está em uma área mais valorizada, próximo ao parque Quinta da Boa Vista, Porto Maravilha e ao estádio Maracanã.

Abaixo, segue o escalonamento da Regional:

	Preço Real					Preço Normalizado (24m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Elevato Bonsucesso	233.762	204.983	2.350	18	25	-1.070	203.913
Elevato Maracanã	264.000	237.203	5.199	26	24	-	237.203
Mirante Boa Vista *Comitê*	308.756	249.487	5.322	25	24	0	249.487

Análise de Preço – Ciclo Financeiro

Informações Viabilidade

Projeto:	Elevato Maracanã
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	264.000
Renda Inicial (VF)	5.199
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,91	4.583
FGTS	1,10	5.548
Financiamento	97,99%	200.169
Subsídio	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	24	24
Pró-Soluto	59,34%	26.903
Preço Raso (RS)	237.203	237.203
TCD	45,46%	23.826
VSO	26	26
Preço de Venda	**268.939**	**268.939**
Elasticidade	-3,030%	-3,030%
Preço de Venda Final	**261.029**	**261.029**

Preço Raso (R$)	**237.203**
% de Raso	**90,87%**
Raso Todas as Fases	**237.203**
Nominal Todas as Fases	**261.029**

1

Análise de Riscos	Farol Ciclo
Ciclo avalia o Preço Vision como **factível**.	

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Informações Gerais – Consolidado

Elevato Maracanã – RJ – Região Metropolitana > 100mil RJ

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Fase única	jun-25	jan-27	jul-27	fev-29	6 meses	19 meses	jan-30	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	8,73 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	4.498 m²
Cash:	8,73 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	14	**Custo de terreno m²:**	1.941,1
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	514
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	4.366
Ato / %VGV:	0,51 MM / 0,4%			**Incorrido de Construção:**	0,00 MM

Área Líquida do Terreno:	4.498 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	1.941,1
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	7,2% / 47,2%
CA Máx/Proj.	4,5 / 4,5
Incorridos de Incorporação:	0,06 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Fase Única	T+16	237.203	467	261.029	264.000	98,0%	59,3%	45,5%

Unidades Totais:	467	**Preço Médio:**	261.029	**Renda Média:**	5.199	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.129
Unidades Tenda:	467	**Avaliação Média:**	264.000	**Ato:**	4.726 (0,91 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	17.996
VSO:	26 Unidades	**VGV Total:**	121.900.633	**FGTS:**	5.721 (1,1 Salários)	**Preço Raso Médio:**	237.203
RET Médio:	4,0%	**VGV Tenda:**	121.900.633	**% em RET 1%:**	0%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	1.391

Construção

Custo Total Unit.:	104.455	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	34,10	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**15.182.490**	**LI:**	**20,08%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**23.167.283**	**Margem Bruta Econômica:**	**42,12%**
TIR:	**72,78%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(795.936)**	**Margem Bruta REF:**	**45,50%**
Exposição de Caixa:	**17,93%**	**Δ LI:**	**0,08%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(17.993.742)**	**Margem Rasa Econômica:**	**35,62%**
Payback Contingente (21 m):	**20 m/ (-1 m)**	**LI Resiliência:**	**7,81%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**36.297.194**	**Margem Rasa REF:**	**40,03%**
Payback Consolidado:	**20 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,50%**

Informações Gerais – DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Elevato Maracanã	
	Nominal	%
Receita	129.236	100,0%
PIS/COFINS	(2.830)	2,2%
Custo Total	(73.165)	57,9%
Custo Terreno	(9.365)	7,4%
Custo Relacionados a Terreno	(2.114)	1,7%
Custos de Incorporação	(3.429)	2,7%
Custo de Construção	(58.258)	46,1%
Lucro Bruto Econômico	53.241	42,1%
Custo para Rateio	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	53.241	42,1%
Despesas de Selling	(11.713)	9,3%
Contingência	(2.972)	2,4%
Margem de Contribuição	38.556	30,5%
IR e CSLL	(2.315)	1,8%
Margem Líquida	36.240	28,7%
Lucro Bruto REF Unit.	129.730	45,5%
Lucro Raso REF Unit.	103.737	40,0%

R$ Mil - VPL - Compra	Elevato Maracanã	
	VP	%
Receitas	75.592	100,0%
PIS/COFINS	(1.630)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(58.779)	77,8%
Custo Terreno	(7.424)	9,8%
Custo Relacionados a Terreno	(1.689)	2,2%
Custos de Incorporação	(2.591)	3,4%
Custo de Construção	(36.744)	48,6%
Despesas de Selling	(8.075)	10,7%
Contingência	(923)	1,2%
IR e CSLL	(1.334)	1,8%
Lucro Imobiliário	15.182	20,1%

Obrigado
