Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento Ampliado
Regional: Campinas
Projeto: São Martinho
Data Comitê: 14/11/2025

Questionamentos – Comitê Digital 10/11/25

Nome	São Martinho - Ampliado de Investimento	Observação - São Martinho
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	aprovado. dúvida: será q conseguimos alguma solução para adensar mais?
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Discutir em comitê	quais saõ as restrições aqui para um melhor aproveitamento do CA?
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Rodrigo Osmo	Discutir em comitê	(1) Estamos longe de esgotar o CA desse projeto, e metade da área líquida do terreno está ocupada por vagas. Além disso o pagamento do terreno está definido em um número fixo de 27 unidades. A conta do Edifício Garagem não fecharia nesse projeto?; (2) Discussão filosófica: em permutas físicas, deveríamos considerar o custo da unidade como sendo o VGV ou deveríamos considerar somente uma receita menor (pela não venda dessas unidades)? Já tivemos essa discussão antes, mas queria resgatá-la; minha impressão é que a segunda opção criaria os incentivos mais alinhados (não precisar vender as unidades traz uma série de benefícios: custos evitados (selling, ITBI) e possibilidade de um VSO menor

Questionamento – Renan

"Será que conseguimos alguma solução para adensar mais?"

Originalmente, simulamos cenários com e sem edifício garagem, e a versão com edifício garagem não viabilizou a LI.
Para garantir o comitê em 2025, optamos por seguir com o cenário viável e evoluímos para o Anteprojeto e parametrização.
Após o comitê, iniciaremos um PDA, assim como foi realizado no terreno do Furacão 2000, para otimizar a implantação do edifício garagem e, assim, conseguirmos adensar o terreno diante das limitações de ocupação existentes.

350 uhs - Edifício Garagem

604 uhs - Edifício Garagem

Questionamento – Luiz Maurício

"Quais são as restrições aqui para um melhor aproveitamento do CA?"

Apesar de o coeficiente de aproveitamento ser computado sobre a área total do terreno (10.447,21 m²), há uma incidência de APP (Área de Preservação Permanente), o que restringe a poligonal útil de ocupação do condomínio 7.001,41m²). Considerando a área liquida de ocupação (menor poligonal) o projeto desenvolvido atingiu 1,8 de CA da área.

– Área Liquida (Menor Poligonal)

Questionamentos – Rodrigo Osmo

1. ***"Estamos longe de esgotar o CA desse projeto, e metade da área líquida do terreno está ocupada por vagas. Além disso o pagamento do terreno está definido em um número fixo de 27 unidades. A conta do Edifício Garagem não fecharia nesse projeto?;***

A regional optou por seguir com o comitê de investimento com vaga ao tempo, considerando que a área útil de ocupação do terreno é limitada em função da APP. Dessa forma, para alcançar o máximo adensamento possível, o edifício-garagem acabou se tornando muito vertical e ineficiente, resultando em um alto custo e inviabilizando a continuidade nesse formato.
A regional iniciará um PDA, em conjunto com as áreas técnicas, com o objetivo de viabilizar a implantação do deck park de forma mais eficiente, em paralelo à aprovação do projeto.

2. ***"Discussão filosófica: em permutas físicas, deveríamos considerar o custo da unidade como sendo o VGV ou deveríamos considerar somente uma receita menor (pela não venda dessas unidades)? Já tivemos essa discussão antes, mas queria resgatá-la; minha impressão é que a segunda opção criaria os incentivos mais alinhados (não precisar vender as unidades traz uma série de benefícios: custos evitados (selling, ITBI) e possibilidade de um VSO menor."***

Resposta de EE:

Hoje a VF considera a entrada de uma receita referente ao preço de venda inflacionado das UHs, no mesmo fluxo das entradas provenientes de vendas. A linha de custo terreno de Permuta Física segue exatamente o mesmo fluxo. Em resumo, permuta física não altera VPL, mas altera margens e LI (muda denominador).
O VSO considerado na VF já é o líquido. E a não ser que a regional tenha em contrato que deve arcar com gastos de registro (ITBI) a VF desconsidera esses gastos atrelados as permutas físicas no cálculo. O Selling também não é impactado pelas permutas físicas.

One Page – São Martinho - Real

Cidade	Campinas	**Mancha de demanda**	CPS - CP - Campinas
Regional	CPS	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Investimento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Nov

Unidades (Fases)	350 (1)	**CA Máx | Proj**	2,2 | 1,2
Unidades com Vaga (%)	175 (50%)	**Escritura | Lançamento**	nov/27 | dez/27
Unidades com Varandas (%)	168 (48%)	**Tipologia**	F2E - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	10.266 (10,2%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	34 (100,0%)
Cash (Correção)	0 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	1.466	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	42.433 (42,0%)	**Indireto Unit.**	23.847
Prazo da Obra (meses)	19	**Torre Unit.**	57.840
Custo Total Unit. (LPU):	121.236 (LPU 95)	**Infra Unit.**	20.288
Início de Obra	jun-28	**Fundação Unit.**	6.837

Preço Nominal Unit.	288.964	**VSO**	18
Preço Raso Unit.	268.477	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	295.961	**Renda (% em RET 1%)**	5.271 (0,0%)

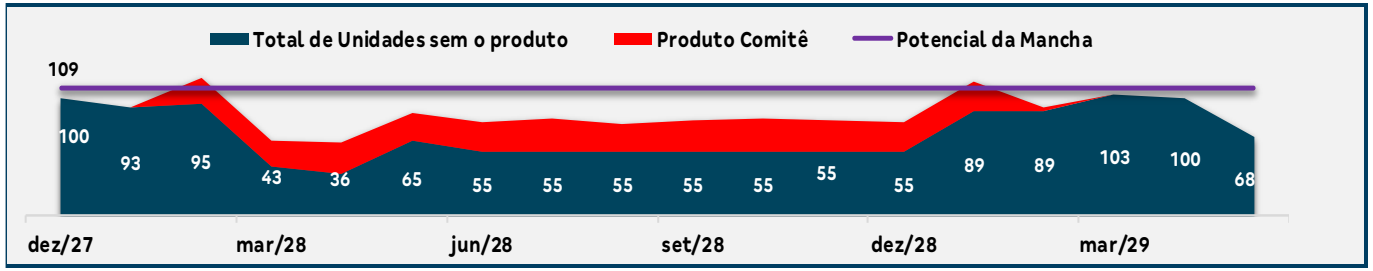

LI (Régua):	**20,9% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	38,2%
LI Resiliência:	14,1% (N/A)	**Margem Rasa Econômica:**	33,4%
Margem Bruta REF:	43,1%	**Margem Contribuição Econômica:**	27,3%
Margem Rasa REF:	**38,7%**	**Exposição (% VGV):**	10.947 (10,1%)
TIR:	135,4%	**VGV Total:**	**101.137**
Payback Contingente (21 m) :	**19 m/ (-2 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(36)
Payback Consolidado:	19	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	(448)

Destaques

[1] Produto: Destaque por tratar-se de dois terrenos que unificados terão 10.477,21 m² de área bruta e 7.001,41 m² de área líquida. Utilizando a nova tipologia com 350 UH em 2 torres (08PP/12PP T+15/T+18) com 175 vagas de garagem comercializáveis, **varanda** em 48% das unidades e piscina. Região nobre de Campinas, com alto potencial de demanda, poucos concorrentes e preço competitivo.

[2] Condição Comercial: R$7.128.000,00 (contrato), sendo 27 unidades a serem construídas no local com vaga de garagem avaliadas em R$264.000,00 cada. Em viabilidade o pagamento de terreno está com o valor de R$8.213.865,52 (valor nominal da unidade superior ao valor de contrato).

[3] Legalização: Os terrenos são fruto de um parcelamento antigo e não aprovado via Prefeitura, por isso teremos que passar pelo processo de cadastramento e unificação para emissão da certidão de diretrizes. Além disso, o cronograma de legalização está sendo considerado aprovação de EIV, assinatura de TAC e aprovação do Graprohab.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Farol Pareceres – São Martinho

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Com base no relatório preliminar de Due Diligence emitido em 04/11/2025, foi constatada a existência de passivo consideravel em nome dos vendedores, contudo em consulta prévia de patrimônio pudemos identificar a possível existência de imóveis de propriedade destes, além da não exposição do caixa da CIA, considerando que a totalidade da operação se trata de uma dação em pagamento. Isto posto, para a confirmação de que não existem óbices e/ou elementos jurídicos intransponíveis capazes de impedir ou colocar em risco a aquisição pretendida, é necessário a conclusão da comprovação patrimonial, o que somente poderá ser feito com a conclusão das assinaturas da procuração, bem como com a disponibilização de documentos/esclarecimentos personalíssimos dos vendedores.	Ok com ressalvas	
Legalização	A esteira de aprovação está prevendo os seguintes processos: Cadastramento e unificação dos terrenos junto à PMC Aprovação junto ao Graprohab – outro empreendimento na região não conseguiu dispensa pois o Graprohab considerou que era necessário fazer extensão e não prolongamento de rede Aprovação de EIV e assinatura de TAC Diretriz viária 76-B prevê uma Coletora II com largura de 14m na rua de acesso ao terreno. Atualmente o leito carroçável já possui 8,16m, por isso estimamos que será necessário apenas deixar espaço para 3m de calçada. Porém, essa informação será confirmada durante o processo de cadastramento.	Ok com ressalvas	
Produto	Sem considerações	Ok	
GETEC	Sem considerações	Ok	
Logística	Sem considerações	Ok	
Inteligência de mercado	IM avalia o preço vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	O Ciclo validou o preço e VSO como viáveis. O projeto está estrategicamente localizado em região nobre de Campinas A área apresenta forte potencial de demanda e, mesmo diante da presença do concorrente acima, estamos com preços competitivos.	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos associados.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

CPS - Campinas

Lançamento

1. Portal das Quaresmeiras

LandBank

2. Vista Ouro Verde
3. Monte Alto
4. Vista da Mata | Vale da Mata
5. Gran Vista
6. Portal Monte Alto
7. Solar das Flores (Abacateiro)
8. Chacarás Morumbi
9. São Martinho

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 3 - Verde

Região

Capital

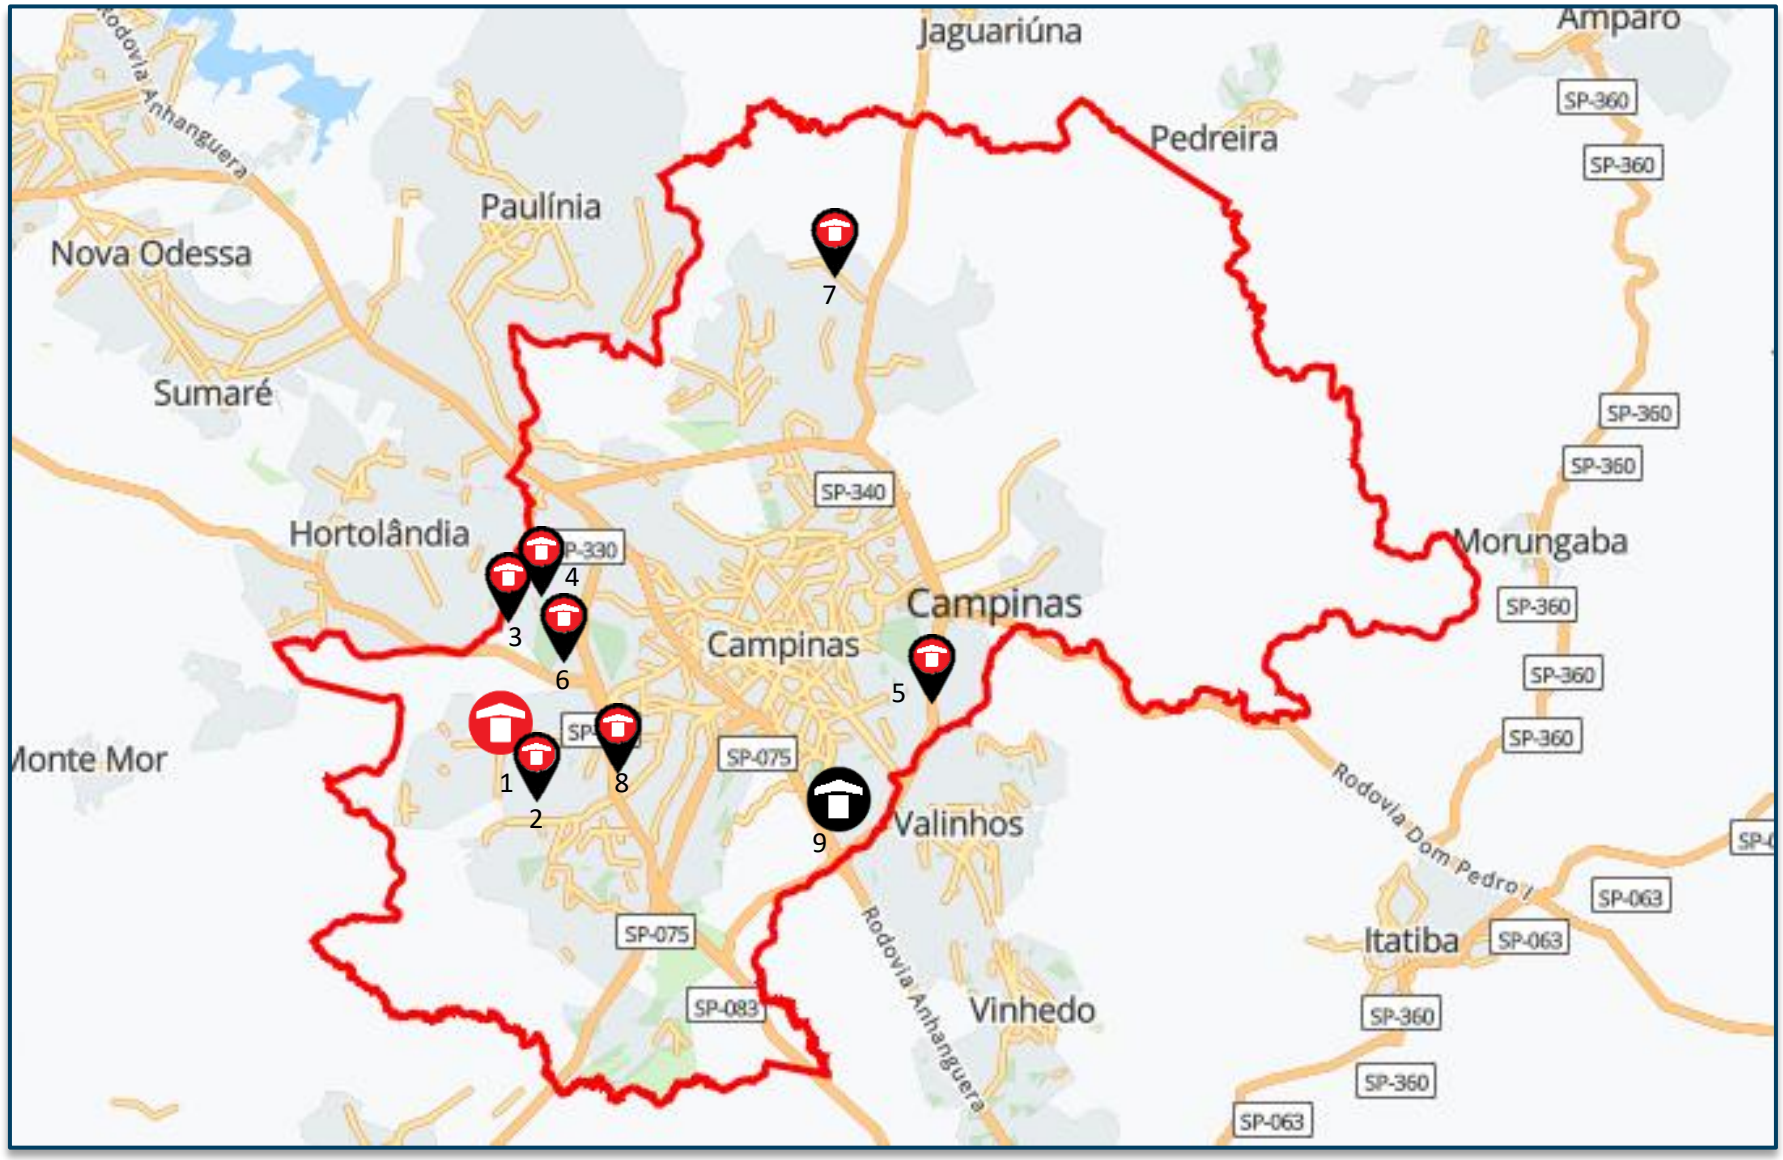

Lançados *LandBank* *Comitê*

Macrolocalização

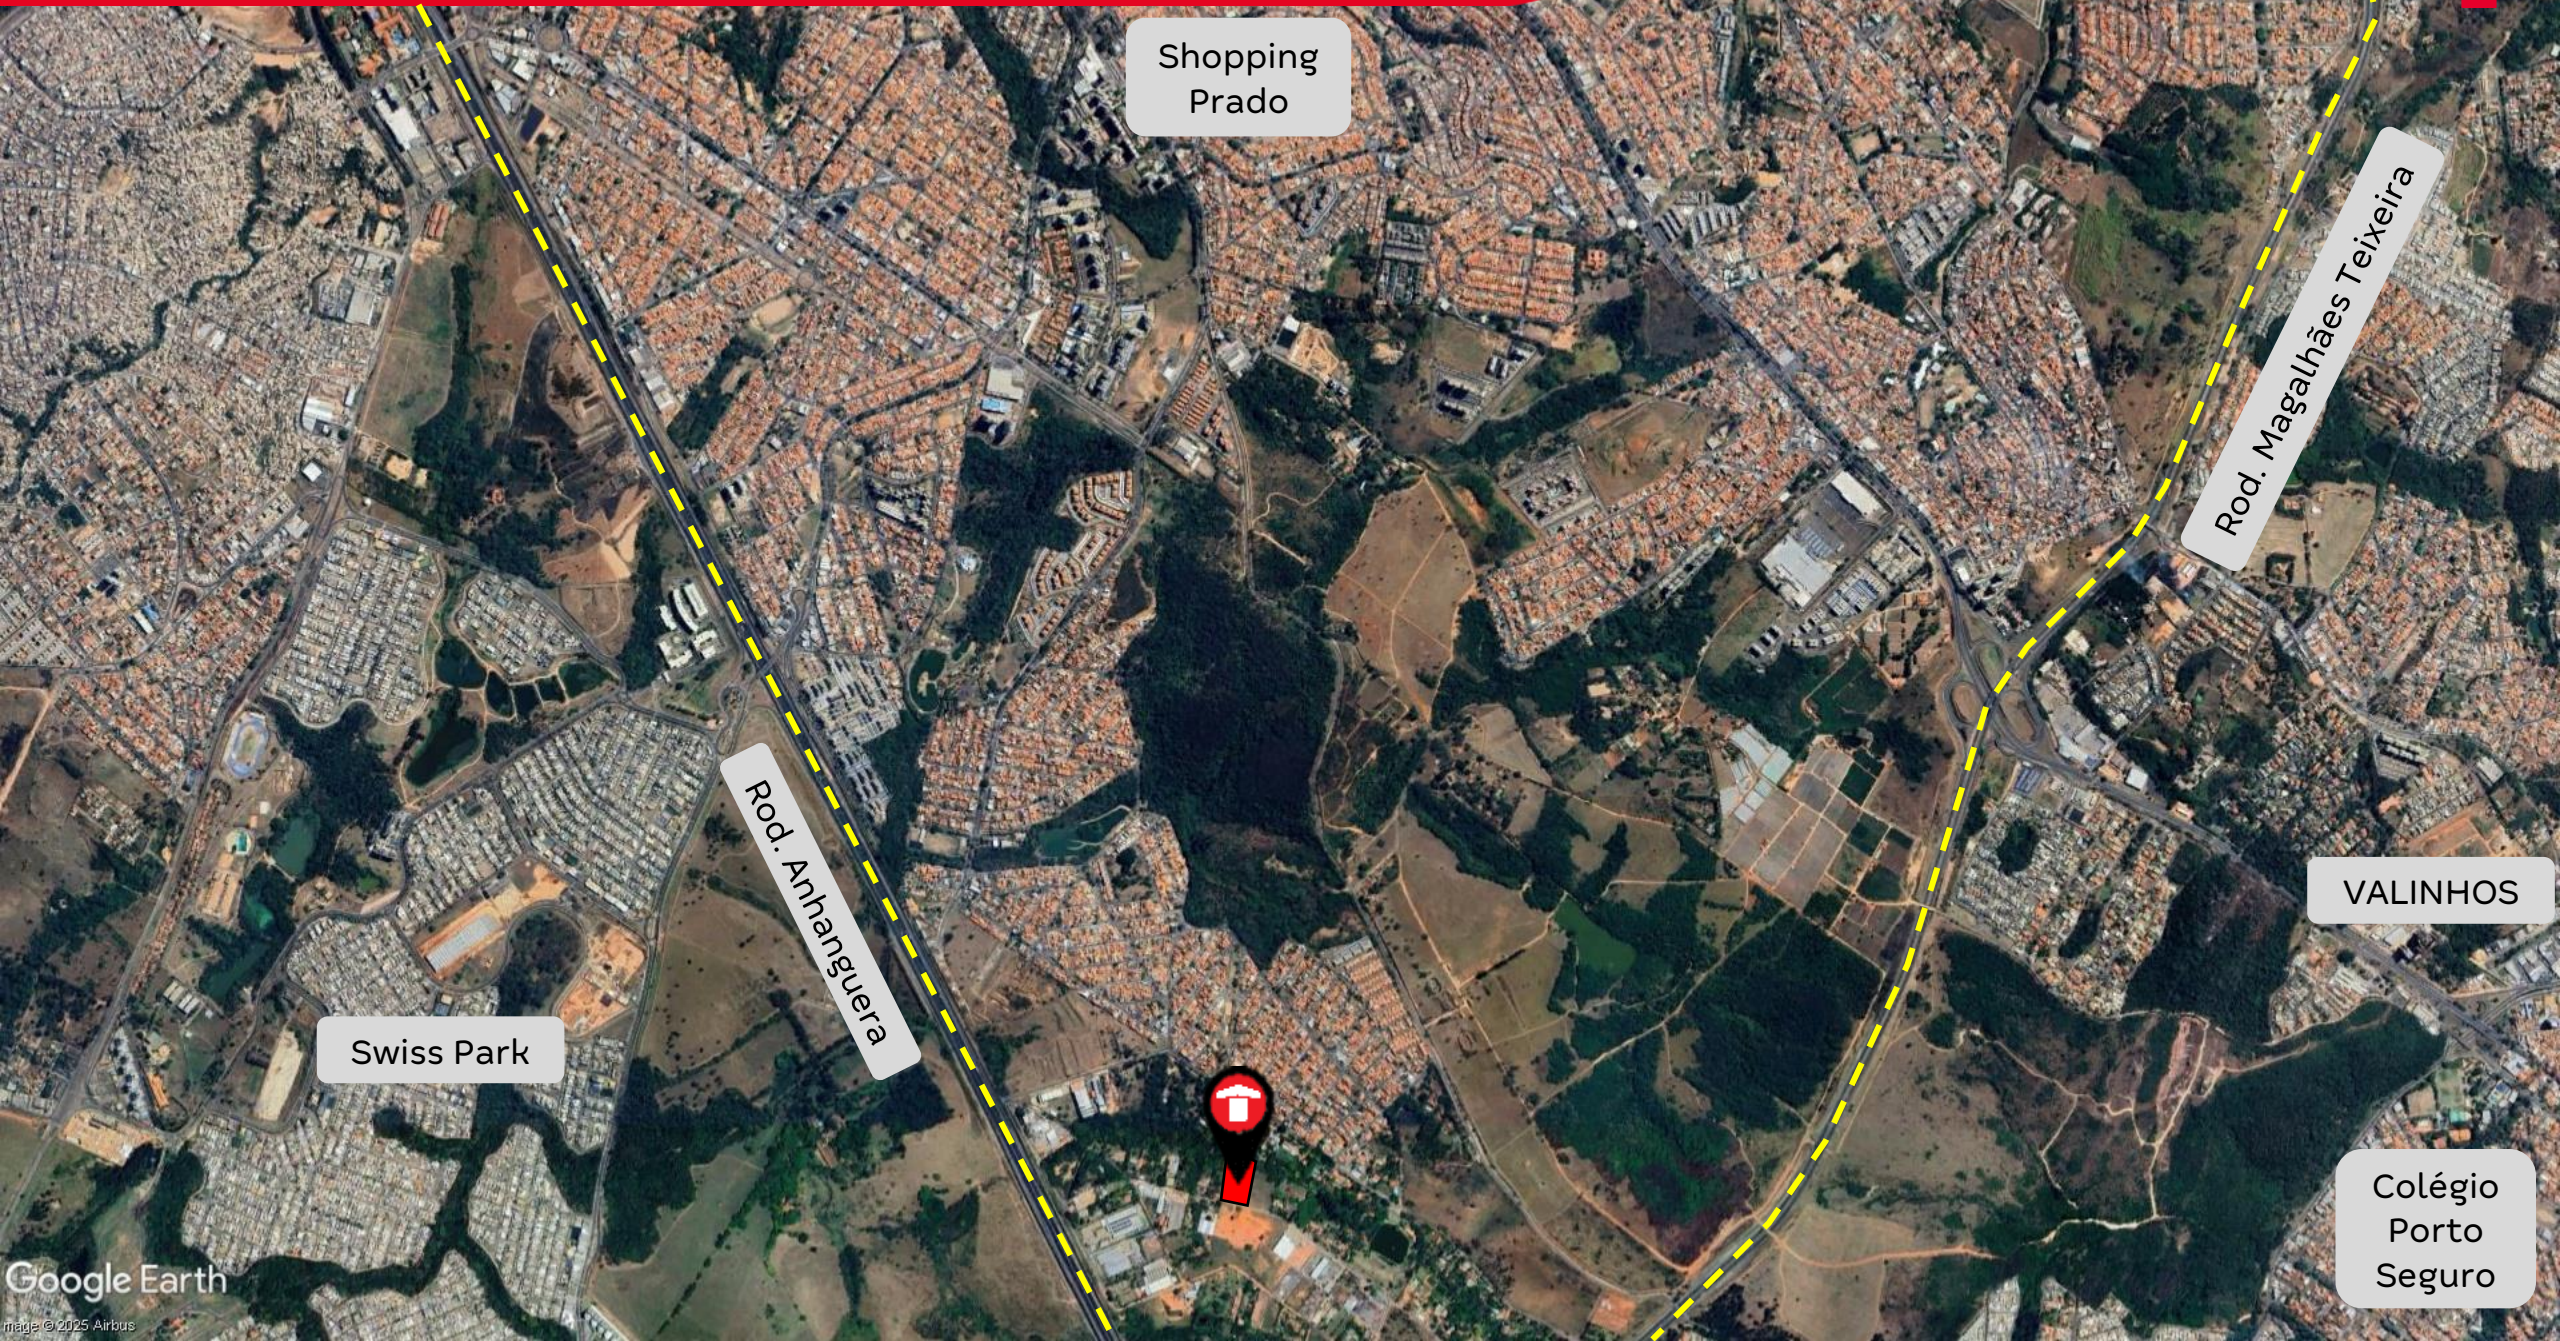

PRODUTO

Empreendimento CPS-SÃO MARTINHO
Investimento

Informações Gerais – Condomínio Único		
Terreno	Área terreno	10.447,21 m²
	Menor poligonal	7.001,41 m²
	App/fna	Sim. 3348,90m²
	Reserva de calçada/ melhoramento viário	Sim. Reserva de calçada. 126,90 m²
	Área liquida	7.001,41m²
	Zoneamento	ZM-2
	Ca máximo	2,2 (1,2 + 1 COHAB)
	Ca projetado	1,2
	Gabarito máximo	T+18
Geral	Total uh	350
	Total de vagas	175 (50%)
Tipologia	Tipologia	CDW. Modular com elevador
	Gabarito	T+15 e T+18
	Lâmina	01 12PP e 01 8 PP
	Área privativa	34,05 m²
Condomínio	Unidade PCD	11 UH
	Unidade lazer | técnica	04 | 02
	Torre	02
	Fase	Fase única
Lazer	Lazer coberto	Salão de festas interno, Churrasqueira gourmet, fitness e brinquedoteca
	Lazer descoberto	Playbaby, Play kids e Piscina

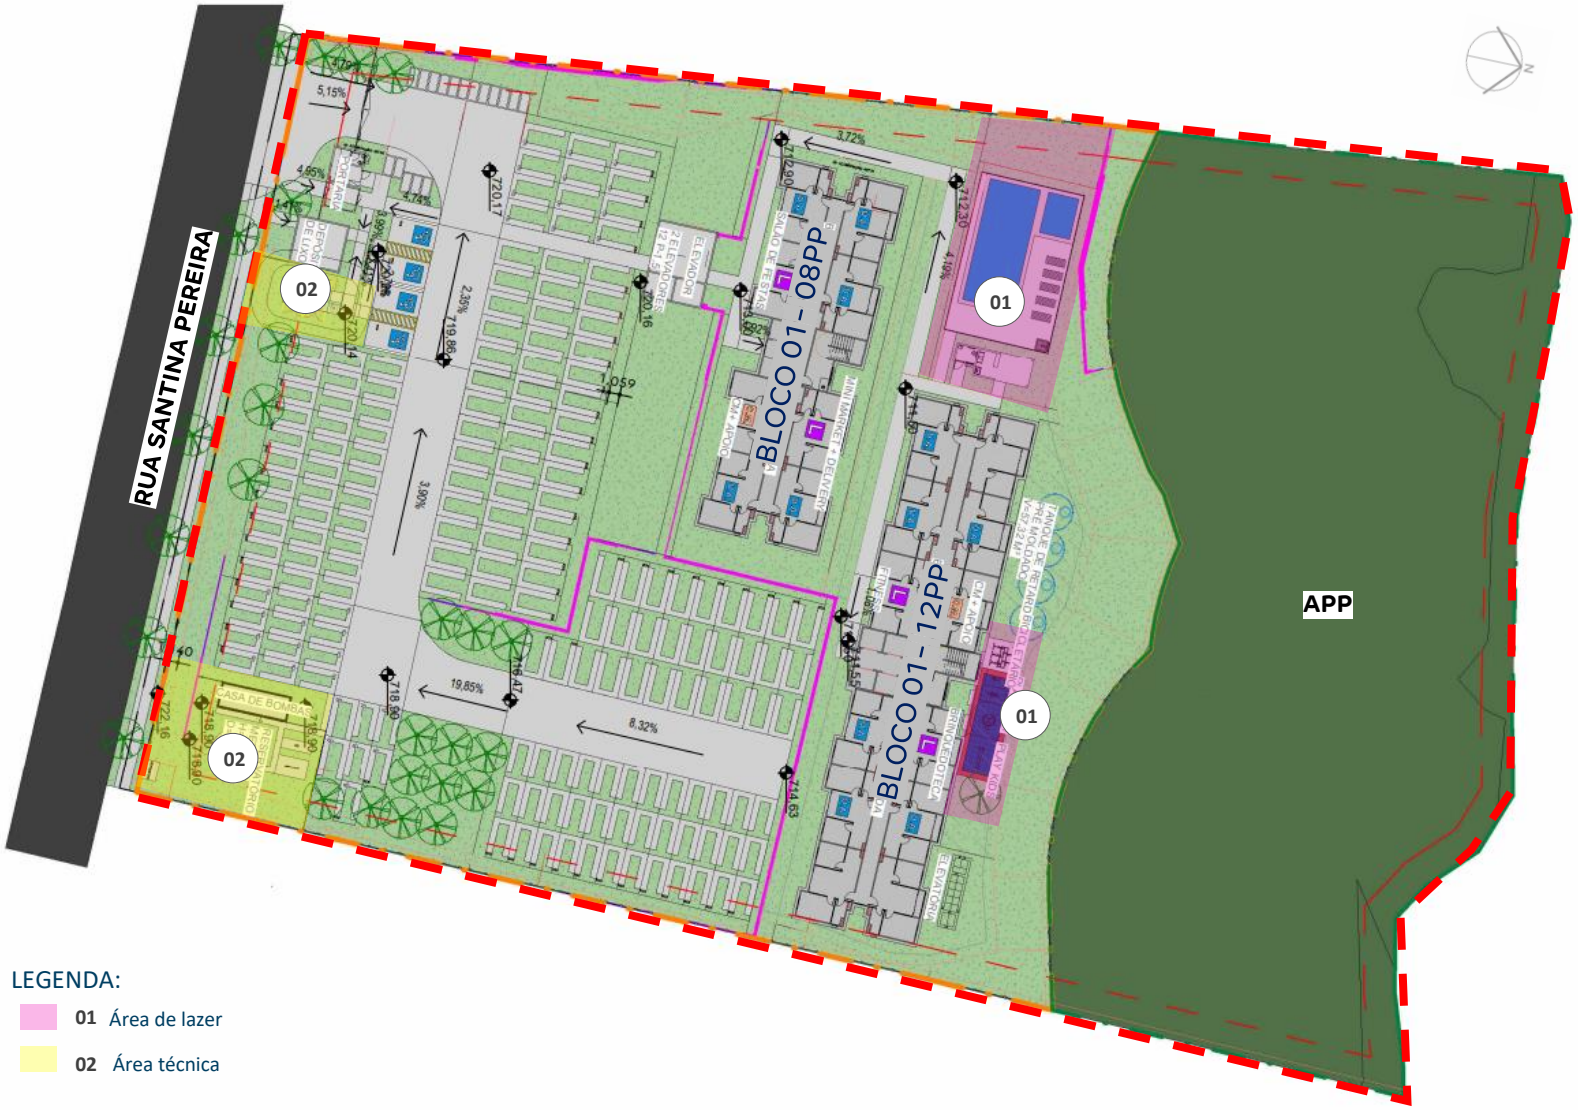

LEGENDA:

- 01 Área de lazer
- 02 Área técnica

*Estudo em desenvolvimento de opções para otimizar o edifício garagem e o adensamento

PRODUTO

Empreendimento CPS - São Martinho
Investimento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	**Limite supercondomínio**		
	Acesso		Elevador
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Atributos Infra**	Sim	Piscina
	Atributos Torre	Sim	50 % varanda
	Edifício Garagem	Não	

Perspectiva

13

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Condições do Negócio

➢ VALOR DO NEGÓCIO

- Valor de contrato: R$ 7.128.000,00, sendo:
  - 27 unidades a serem construídas no local com vaga de garagem avaliadas em R$264.000,00.
  - Na viabilidade o valor contabilizado é de R$8.213.865,52 pois o valor nominal das unidades é superior ao valor de contrato.
  - Além disso na viabilidade constam 7 unidades a serem pagas à COHAB como contrapartida, totalizando o montante de R$1.993.084,93.

➢ INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA

- 6% do valor total da aquisição do terreno, no valor total de R$427.680,00. Pagos a NASCIMENTO E PEREIRA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, sendo:
  - R$35.640,00 em 1 parcela 60 dias após a superação do "Item I" do contrato (6 meses máximos);
  - R$392.040,00 em 4 parcelas, sendo a primeira paga em até 60 dias contados da assinatura da escritura definitiva e as demais sucessivamente.

➢ GARANTIAS

- Para os vendedores – Fidejussória
- Para a Tenda – N/A

➢ CONDIÇÕES RESOLUTIVAS

- I – em até 6 (seis) meses a contar da assinatura do instrumento de compromisso de compra e venda;
- II – em até 18 (dezoito) meses a contar da superação do "Item I"

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Comitê

	SÃO MARTINHO CEN 02 | R01	FURACÃO 2000 CEN06 | R03 CONSOLIDADO	PORTAL MONTE ALTO CEN 03 | R03
Torres	2	3	1
Unidades Construídas	356	538 | 266	288
Unidades Vendidas	350	536 | 264	286
Total Unidades Vendidas	350	800	286
Condomínios (qta.)	1	1	1
Cidade	Campinas - SP	Campinas - SP	Campinas - SP
Produto / Selo	CDW F2E MODULAR	F2E - V0200 CDW	F2E - V0200 CDW
Tipologia	1 Torre | T+15 | 08PP	1 Torre | T+16 | 16PP	1 Torre | T+17 | 16PP
Tipologia	1 Torre | T+18 | 12PP	2 Torres | T+18 | 14PP	-
Atributos	168 Varandas + Piscina	380 Varandas + Piscina	136 Varandas + Piscina
Projeto Infra	AP	AP	AP
Projeto Torre	AP	EM	EM
Mês Base	novembro-25	novembro-25	outubro-25
Incc	1.218,747	1.218,747	1.218,747
LVS	setembro-25	setembro-25	agosto-25
Indiretos	setembro-25	setembro-25	agosto-25
Base de Preço	LPU 95	LPU 95	LPU 95
Takt	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	19	19 | 15	16
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 117.572	R$ / UND R$ 97.451	R$ / UND R$ 107.412
Indireto	R$ 23.847	R$ 19.387	R$ 24.829
Torre	R$ 57.840	R$ 56.222	R$ 56.660
Infra	R$ 20.288	R$ 14.092	R$ 18.171
Fundação	R$ 6.837	R$ 7.321	R$ 6.153
EEE	R$ 648		
ETE			
Contenção	R$ 5.371		R$ 63
Terraplenagem	R$ 2.740	R$ 429	R$ 1.536
CUSTO TOTAL II	R$ 3.664	R$ 2.026	R$ 4.568
Urbanização	R$ 152	R$ 169	R$ 2.667
Drenagem	R$ 72	R$ 70	R$ 210
Extensão de Rede Elétrica	R$ 357	R$ 156	R$ 437
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 3.083	R$ 1.630	R$ 1.254
CUSTO TOTAL III			R$ 137
Incorridos			R$ 137
CUSTO TOTAL IV		R$ 8.930	
Ed. Garagem		R$ 8.930	
CUSTO TOTAL V			
Atualização por INCC			
CUSTO TOTAL I+II	R$ 121.236	R$ 99.477	R$ 111.980
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 121.236	R$ 108.407	R$ 112.117

Custo de Construção

	SÃO MARTINHO CEN 02 | R01	FURACÃO 2000 CEN06 | R03 CONSOLIDADO
Torres	2	3
Unidades Construídas	356	538 | 266
Unidades Vendidas	350	536 | 264
Total Unidades Vendidas	350	800
Condomínios (qta.)	1	1
Cidade	Campinas - SP	Campinas - SP
Produto / Selo	CDW F2E MODULAR	F2E - V0200 CDW
Tipologia	1 Torre | T+15 | 08PP	1 Torre | T+16 | 16PP
Atributos	168 Varandas + Piscina	380 Varandas + Piscina
Projeto Infra	AP	AP
Projeto Torre	AP	EM
Mês Base	novembro-25	novembro-25
Incc	1218,747	1218,747
LVS	setembro-25	setembro-25
Indiretos	setembro-25	setembro-25
Base de Preço	LPU 95	LPU 95
Takt	2x2	2x2
Prazo (mês)	19	19 | 15

CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 117.572	R$ / UND R$ 97.451	DIF R$ 20.121
Indireto	R$ 23.847	R$ 19.387	R$ 4.460
Torre	R$ 57.840	R$ 56.222	R$ 1.617
Infra	R$ 20.288	R$ 14.092	R$ 6.196
Fundação	R$ 6.837	R$ 7.321	-R$ 484
EEE	R$ 648	R$ 0	R$ 648
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 5.371	R$ 0	R$ 5.371
Terraplenagem	R$ 2.740	R$ 429	R$ 2.311
CUSTO TOTAL II	R$ 3.664	R$ 2.026	R$ 1.638
Urbanização	R$ 152	R$ 169	-R$ 17
Drenagem	R$ 72	R$ 70	
Extensão de Rede Elétrica	R$ 357	R$ 156	R$ 201
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 3.083	R$ 1.630	R$ 1.453
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 8.930	-R$ 8.930
Ed. Garagem	R$ 0	R$ 8.930	-R$ 8.930
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL	R$ 121.236	R$ 108.407	R$ 12.829

INDIRETOS
+1.403 | Serviços Técnicos (Diluição)
+465 | Administração (Diluição)
+586 | Implantação de Canteiro (Diluição)
+500 | Equipamentos (Diluição)
+708 | Operação do Canteiro (Diluição)
+619 | Ensaios (Diluição)

TORRE
-191 | Instalações (Simulador/Tipologia)
+292 | Aço (Tipologia + Diluição)
Furacão: 48 kg/m³ | 6,62 R$/kg | 531 kg/UH
S. Martinho: 48 kg/m³ | 6,63 R$/kg | 567 kg/UH
+627 | Concreto (Tipologia + Diluição)
Furacão: 11,06 m³/U.H | 686 R$/m³
S. Martinho: 11,82 m³/U.H | 686 R$/m³
-273 | Esquadrias de Alumínio - **Furacão:** Possui caixilho acústico
+110 | Esquadria de Ferro (Diluição)
+680 | Elevador (Projeto / Diluição)
Furacão: 4.307 R$/U.H – Total 12 elevadores / **S. Martinho:** 4.924 R$/U.H – Total 6 elevadores

INFRA
+438 I Alvenaria de Vedação (Diluição)
+681 | Reservatório Metálico (Diluição)
Furacão: 3 Castelos – 2 Ø 3,80m - 12,25m - 1 Ø 3,80m - 7,00m
S. Martinho: 1 Castelo – Ø 3,80m – 20,54m (2 células)
+279 I Paisagismo (Projeto + Diluição)
Furacão: 4.663,28m²
S. Martinho: 3.624m²
+3.233 I Outras Instalações (Projeto / Diluição)
S. Martinho: 1 Caixa de Elevador
+428 I EEE - **S. Martinho:** Possui Estação Elevatória

FUNDAÇÃO
-484 | Projeto
Furacão: Lajão: H=0,65m - 14 e 16PP – 105 Kg/m³ - R$1.937/m³
EHC Ø 50, 60 E 70cm – 21m - 422 unid. – 8.862m I 360 R$/m
S. Martinho: Lajão: H=0,58 e 0,60m - 08 e 12PP – 105 Kg/m³ - R$1.982/m³
EHC Ø 40, 50 e 60cm – 14m – 242 unid. – 3.594m I 322 R$/m

CONTENÇÃO
+5.371 | Projeto
Furacão: Não possui contenção
S. Martinho: 474,50 m² (De 1,20 até 4m)

TERRAPLENAGEM
+2.311 | Projeto (Volumes de movimentação de terra)
Furacão: Corte: 6.190 m³ e Aterro: 6.038 m³
S. Martinho: Corte: 607 m³ e Aterro: 12.310 m³

Custo de Construção

	SÃO MARTINHO CEN 02 | R01	PORTAL MONTE ALTO CEN 03 | R03	
Torres	2	1	
Unidades Construídas	356	288	
Unidades Vendidas	350	286	
Total Unidades Vendidas	350	286	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Campinas - SP	Campinas - SP	
Produto / Selo	CDW F2E MODULAR	F2E - V0200 CDW	
Tipologia	1 Torre | T+15 | 08PP	1 Torre | T+17 | 16PP	
Tipologia	1 Torre | T+18 | 12PP	-	
Atributos	168 Varandas + Piscina	136 Varandas + Piscina	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	EM	
Mês Base	novembro-25	outubro-25	
Incc	1218,747	1218,747	
LVS	setembro-25	agosto-25	
Indiretos	setembro-25	agosto-25	
Base de Preço	LPU 95	LPU 95	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	19	16	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 117.572	R$ / UND R$ 107.412	DIF R$ 10.159
Indireto	R$ 23.847	R$ 24.829	-R$ 982
Torre	R$ 57.840	R$ 56.660	R$ 1.180
Infra	R$ 20.288	R$ 18.171	R$ 2.117
Fundação	R$ 6.837	R$ 6.153	R$ 684
EEE	R$ 648	R$ 0	R$ 648
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 5.371	R$ 63	R$ 5.308
Terraplenagem	R$ 2.740	R$ 1.536	R$ 1.205
CUSTO TOTAL II	R$ 3.664	R$ 4.568	-R$ 904
Urbanização	R$ 152	R$ 2.667	-R$ 2.515
Drenagem	R$ 72	R$ 210	
Extensão de Rede Elétrica	R$ 357	R$ 437	-R$ 80
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 3.083	R$ 1.254	R$ 1.829
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 137	-R$ 137
Incorridos	R$ 0	R$ 137	-R$ 137
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Ed. Garagem	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL	R$ 121.236	R$ 112.117	R$ 9.119

INDIRETOS - Diluição
-825 | Serviços Técnicos (Diluição)
-169 | Implantação de Canteiro (Diluição)

TORRE
-255 | Instalações (Simulador + Diluição)
+254 | Aço (Tipologia)
Portal: 48 kg/m³ | 6,62 R$/kg | 535 kg/UH
S. Martinho: 48,00 kg/m³ | 6,63 R$/kg | 567 kg/UH
+547 | Concreto (Tipologia)
Portal: 11,15 m³/U.H | 686 R$/m³
S. Martinho: 11,82 m³/U.H | 686 R$/m³
-551 | Gesso Acartonado (Atualização de Preço)
+119 | Esquadria de Ferro (Projeto)
+792 | Elevador (Projeto)
Portal – 4.217 R$/U.H – Total 4 elevadores
16PP T+17: 2+2 elev/torre –1,0 m/s e 1,75 m/s (13 passageiros) – Zoneado
S. Martinho – 4.924 R$/U.H – Total 6 elevadores
08PP T+15: 2 elev/torre – 1,5 m/s (13 passageiros)
12PP T+18: 2+2 elev/torre – 1,0 E 1,75 m/s (08 passageiros) – Zoneado

INFRA
+443 I Esquadria de Ferro (Projeto)
-389 I Reservatório Metálico (Diluição)
Portal: 1 Castelo – Ø 3,80m – 19,60m (2 células)
S. Martinho: 1 Castelo – Ø 3,80m – 20,54m (2 células)
+1.957 I Outras Instalações (Projeto)
S. Martinho: 1 Caixa de Elevador

FUNDAÇÃO
+684 | Projeto
Portal - Lajão: H= 0,67m - 16PP – 120 Kg/m³ - R$2.044/m³
EHC Ø 50, 60 e 70cm – 14m – 128 unid. – 1.792m I 400 R$/m
S. Martinho: Lajão: H= 0,58 e 0,60m - 08 e 12PP – 105 Kg/m³ - R$1.982/m³
EHC Ø 40, 50 e 60cm – 14m – 242 unid. – 3.594m I 322 R$/m

CONTENÇÃO
+ 5.308 | Projeto
Portal: 4 m² (até 1,20m)
S. Martinho: 474,50 m² (De 1,20 até 4m)

TERRAPLENAGEM
+1.205 | Projeto (Volumes de movimentação de terra)
Portal: Corte: 5.179m³ e Aterro: 642m³
S. Martinho: Corte: 607 m³ e Aterro: 12.310 m³

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Existe viabilidade técnica para abastecimento de água.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Necessário a execução de extensão de rede com 1350m, até esquina da rua Manuel Soares Pinto e Henrique Janssen.

SISTEMA DE DRENAGEM
Descarte por gravidade .

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Sem viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado execução do passeio na testada do terreno.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 5
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 07/2025, validade de 6 meses.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 07/2025, validade de 6 meses.

Drenagem:
- Não se aplica.

Elétrica:
- No pedido de ligação definitiva a concessionária pode vir a cobrar reformas necessárias, caso a infraestrutura existente não seja suficiente.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado execução do passeio na testada do terreno.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 03 furos.
- Considerada Estaca Hélice, com diâmetros de 40, 50 e 60cm e profundidade de 14 e 16m.

Logística

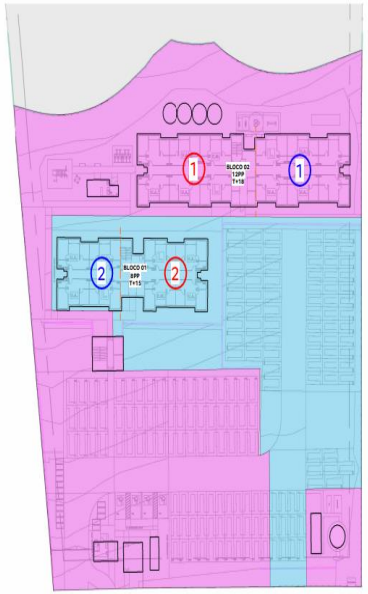

VIVÊNCIA - CONTAINERS								
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.	FASE
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MÓDULO DE CONTAINER	2,41 M X 6,10 M	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	FASE ÚNICA
CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MÓDULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 M	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERÍODO	-	-	FASE ÚNICA
CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	7 MÓDULOS DE CONTAINER EMBAIXO, 7 MÓDULOS EM CIMA	2,41 X 6,10 M	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE ÚNICA

FASE ÚNICA

LOG_LAZER							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
PUMODROMO PEQUENO (LOG)	2	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE ÚNICA
TENDA LAZER	1	-	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE ÚNICA

FASE ÚNICA

TENDAS_PERÍODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	4,00	6,00	-	TODO PERÍODO	-	
GAIOLA DE INFLAMÁVEIS (LOG)	2	3,00	4,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	10,00	8,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
TENDA ARMADOR (LOG)	2	7,00	7,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	
TENDA ARMADOR (LOG)	1	10,00	7,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	10,00	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	10,00	10,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	
TENDA MOLDADOR (LOG)	2	3,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	

LOG_EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE ÚNICA
BOMBA ESTACIONÁRIA PADRÃO (LOG)	1 EQUIPAMENTO	-	-	-	TODO PERÍODO	-	FASE ÚNICA
BOMBA LANÇA (LOG)	1 EQUIPAMENTO	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE ÚNICA
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-	FASE ÚNICA
CREMALHEIRA CABINE DESMONTÁVEL (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB DE CREMALHEIRA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB DE CREMALHEIRA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	FASE ÚNICA
MINIGRUA (LOG)	2 EQUIPAMENTOS	1 MOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	1 DESMOB POR MINIGRUA POR TORRE (TAKT 2X2)	-	TODO PERÍODO	-	FASE ÚNICA
PERFURATRIZ (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR PERÍODO DE ESTACA CONFORME PROJETO	-	-	FASE ÚNICA

FASE ÚNICA

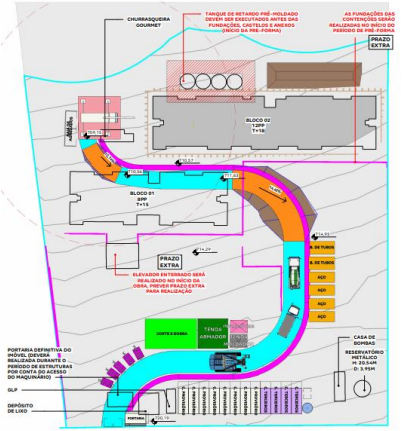

PRÉ-FORMA 1
1 : 500

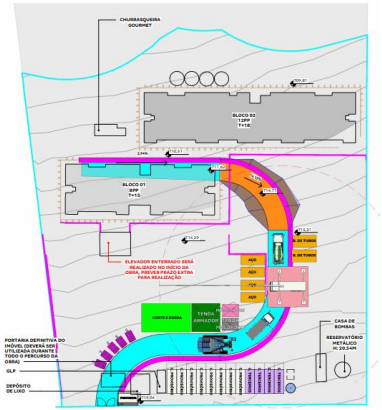

PRÉ-FORMA 2
1 : 500

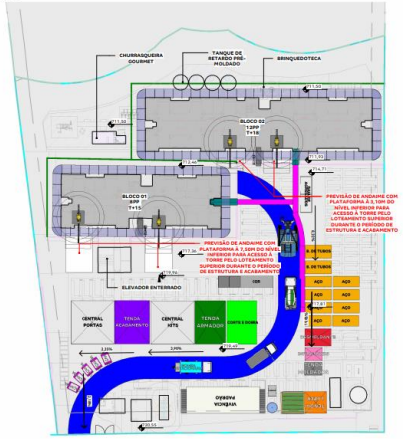
CHURRASQUEIRA GOURMET
TANQUE DE RETARDO PRÉ-MOLDADO
BRINQUEDOTECA
BLOCO 02
12PP
T+16
BLOCO 01
8PP
T+15
PREVISÃO DE ANDAIME COM PLATAFORMA A 2.10M DO NÍVEL INFERIOR PARA ACESSO À TORRE PELO LOTEAMENTO SUPERIOR DURANTE O PERÍODO DE ESTRUTURA E ACABAMENTO
PREVISÃO DE ANDAIME COM PLATAFORMA A 1.10M DO NÍVEL INFERIOR PARA ACESSO À TORRE PELO LOTEAMENTO SUPERIOR DURANTE O PERÍODO DE ESTRUTURA E ACABAMENTO
ELEVADOR ENTERRADO
CENTRAL PORTAS
TENDA ACABAMENTO
CENTRAL KITS
TENDA ARMADOR
CANTO E DOBRA
CASA DE BOMBAS
CASA DE GERADOR
CASA DE GERADOR
CASA DE GERADOR

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lanç + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Campinas	CPS	30%	1.427	119	1.712	143

Faixas MCMV	Empreendimento	Renda	Lançamento	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28	jul/28	ago/28	set/28	out/28	nov/28	dez/28	jan/29	fev/29	mar/29	abr/29	mai/29	jun/29	jul/29	ago/29	set/29
Faixa 2	Gran Vista	3.057	dez-26	27	27	27	27	27	27	27	2														
Faixa 2	Portal Monte Alto III	3.176	abr-27	25	25	25	25	25	1																
Faixa 2	Vale Da Mata	3.513	out-27	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	7
Faixa 2	Chacaras Morumbi	3.469	dez-27		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	9
Faixa 3	**São Martinho**	**5.471**	**dez-27**		**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**8**	
Faixa 1	Vista Ouro Verde I	2.221	jan-28			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Faixa 2	Solar Das Flores I	3.928	jan-29															28	28	28	28	28	28	28	28
Faixa 2	Portal Monte Alto I	3.134	mar-29																	22	22	22	22	22	22
Total de Vendas Lançados				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank				**74**	**122**	**147**	**147**	**147**	**123**	**122**	**97**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**123**	**123**	**145**	**145**	**145**	**145**	**135**	**91**
Total Mancha | Faixa 1				*0%*	*0%*	*17%*	*17%*	*17%*	*20%*	*20%*	*26%*	*26%*	*26%*	*26%*	*26%*	*26%*	*26%*	*20%*	*20%*	*17%*	*17%*	*17%*	*17%*	*19%*	*27%*
Total Mancha | Faixa 2				*100%*	*85%*	*71%*	*71%*	*71%*	*65%*	*65%*	*56%*	*55%*	*55%*	*55%*	*55%*	*55%*	*55%*	*65%*	*65%*	*70%*	*70%*	*70%*	*70%*	*76%*	*73%*
Total Mancha | Faixa 3				*0%*	*15%*	*12%*	*12%*	*12%*	*15%*	*15%*	*19%*	*19%*	*19%*	*19%*	*19%*	*19%*	*19%*	*15%*	*15%*	*12%*	*12%*	*12%*	*12%*	*6%*	*0%*

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está acima do potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

São Martinho | Mapa Concorrência

		São Martinho	Rise Condominio Clube - F1 | F2
		TENDA	Direcional
Distância Tenda (km)			2,6Km
Região 1 Km	População	7.214	14.596
	Dens. Demográfica	2.311	4.676
	Renda (R$)	6.147	7.972
	Classe Social	B2 (de R$ 5.4K a 9.8K)	B2 (de R$ 5.4K a 9.8K)
	PEA Dia	3.306	6.470
Quantitativo	Lançamento	dez/27	10/2024
	Unidades	350	600
	Estoque	350	25
	VSO	18	44
	Stockout	19	1
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	-	4
	Gabarito	Vertical	T+18
	Plantas (m²)	34,83m² | 36,69m²	40,44m² e 43,73m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Não
	Varanda	Sim	Sim
	Vagas	50% Com vaga	90% Com vaga
	Lazer	Piscina, churrasqueira gourmet, play baby, play kids, brinquedoteca, fitness, salão de festas, mini market + delivery.	Bicicletário, Campo de Futebol, Churrasqueria, Cinema, Decorado, Fireplace, Lago, Mercado, Pet Place, Piscina, Piscina Aquecida, Praça, Quadra, Sauna Seca, Vídeo-Porteiro,

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência possui target de preço e renda acima do previsto para o São Martinho.

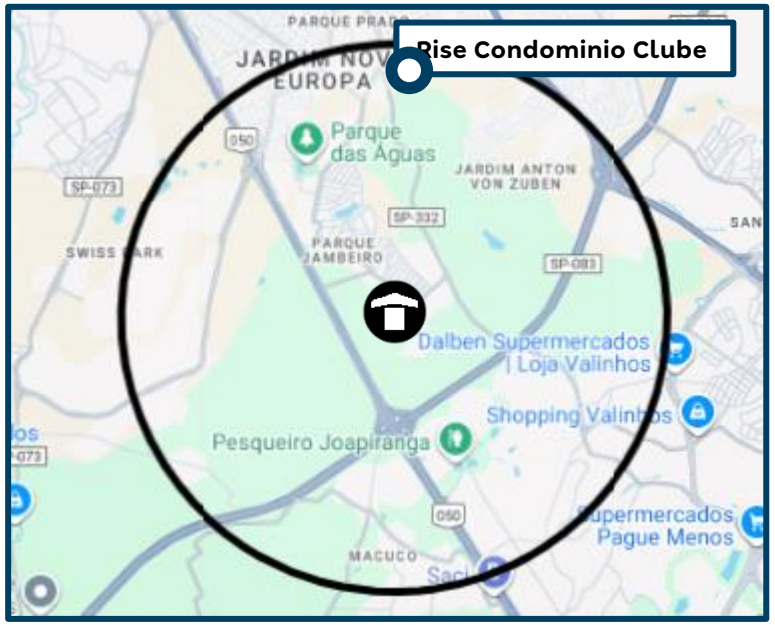

-	São Martinho						Rise Condominio Clube - F1 | F2					
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	Renda Final	% Unidades	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol
Vg Carro | Varanda	312.112	310.187	241.863	5.698	5.898	48%	328.852	349.360	279.488	6.798	100%	●
Vg Carro	298.789	291.268	226.442	5.359	5.559	2%	-	-	-	-	-	-
Uh Tipo	280.342	268.498	209.554	4.858	5.058	50%	-	-	-	-	-	-

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	São Martinho					
Tipo:	**Uh Tipo**		**Vg Carro**		**Vg Carro | Varanda**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	280.342		298.789		312.112	
Renda Inicial (VF)	4.858		5.359		5.698	
Renda Final*	5.058		5.559		5.898	
% RET1	0%		0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,53	2.687	0,56	3.114	0,68	4.057
FGTS	0,49	2.514	0,56	3.132	0,69	4.127
Financiamento	97,35%	207.039	96,78%	223.310	96,70%	237.736
Subsídio	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24	24	24
Pró-Soluto	86,42%	36.610	86,42%	40.385	86,42%	42.940
Preço Raso (RS)	248.850	248.850	269.941	269.941	288.860	288.860
TCD	40,12%	19.648	39,48%	21.327	37,13%	21.327
VSO	9	9	1	1	8	8
Preço de Venda	**256.527**	**256.527**	**278.282**	**278.282**	**296.357**	**296.357**
Elasticidade	4,667%	4,667%	4,667%	4,667%	4,667%	4,667%
Preço de Venda Final	**268.498**	**268.498**	**291.268**	**291.268**	**310.187**	**310.187**
Preço Raso (R$)	**248.850**		**269.941**		**288.860**	
% de Raso	**92,68%**		**92,68%**		**93,12%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	São Martinho
Tipo:	**Faixa 3**
Método	**Vision**
Avaliação	295.961
Renda Inicial (VF)	5.271
Renda Final*	5.471

Tipo:	VF	R$
Ato	0,60	3.353
FGTS	0,59	3.301
Financiamento	97,03%	222.099
Subsídio	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	24	24
Pró-Soluto	86,42%	39.724
Preço Raso (RS)	268.477	268.477
TCD	38,67%	20.487
VSO	18	18
Preço de Venda	**275.479**	**275.479**
Elasticidade	4,667%	4,667%
Preço de Venda Final	**288.964**	**288.964**
Preço Raso (R$)	**268.477**	
% de Raso	**92,91%**	
Raso Todas as Fases	**268.477**	
Nominal Todas as Fases	**288.964**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1. O I.M. está de acordo com o preço Vision, considerando que o projeto está localizado em uma região com bons indicadores sociodemográficos e proximidade com a Rodovia Anhanguera.

   Conforme apresentado no slide "Panorama de Concorrência", o empreendimento do concorrente atua em um target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda, mesmo com valor superior, apresentou um bom desempenho em vendas. Esses fatores reforçam que o preço estimado pelo Vision, considerando o VSO projetado, é o mais adequado para o São Martinho.

   Abaixo segue o escalonamento da Regional:

	Avaliação	Preço Raso	Renda Mediana	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Portal Quaresmeira	241.402	204.425	3.050	28	21	3.233	207.657
São Martinho	295.961	268.477	5.271	18	24	-	268.477

Ciclo Financeiro – Análise Mancha

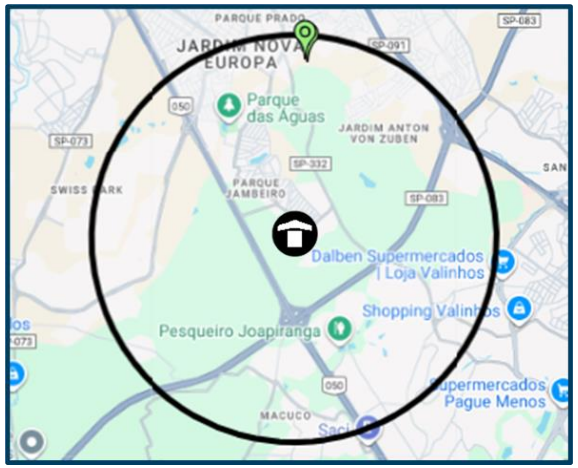

-	São Martinho						Rise Condominio Clube – F1 | F2					
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	Renda Final	% Unidades	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol
Vg Carro | Varanda	312.112	310.187	241.863	5.698	5.898	48%	328.852	349.360	279.488	6.798	100%	●
Vg Carro	298.789	291.268	226.442	5.359	5.559	2%	-	-	-	-	-	-
Uh Tipo	280.342	268.498	209.554	4.858	5.058	50%	-	-	-	-	-	-

Parecer Ciclo

O Ciclo validou o preço e VSO como viáveis. O projeto está estrategicamente localizado em região nobre de Campinas A área apresenta forte potencial de demanda e, mesmo diante da presença do concorrente acima, estamos com preços competitivos.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Viabilidade Financeira – Resumo

São Martinho – CPS – Região Metropolitana > 100mil CPS

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	nov-25							
Com vaga e com varanda		dez-27	jun-28	jan-30	6 meses	19 meses	dez-30	36 meses
Com vaga e sem varanda		dez-27	jun-28	jan-30	6 meses	19 meses	dez-30	36 meses
Sem vaga e sem varanda		dez-27	jun-28	jan-30	6 meses	19 meses	dez-30	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	10,27 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	10.477 m²
Cash:	0,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	0	**Custo de terreno m²:**	979,8
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	10,27 MM (10,15%) - Unidades Permuta 34,00			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,00 MM

Área Líquida do Terreno:	7.001 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	1.466,3
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	10,2% / 52,1%
CA Máx/Proj.	2,2 / 1,2
Incorridos de Incorporação:	0,12 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Com vaga e com varanda	T+18	288.860	168	310.187	312.112	96,7%	86,4%	37,1%
Com vaga e sem varanda	T+18	269.941	7	291.268	298.789	96,8%	86,4%	39,5%
Sem vaga e sem varanda	T+18	248.850	175	268.498	280.342	97,4%	86,4%	40,1%

Unidades Totais:	350	**Preço Médio:**	288.964	**Renda Média:**	5.271	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	5.498
Unidades Tenda:	316	**Avaliação Média:**	295.961	**Ato:**	3.172 (0,6 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	19.050
VSO:	18 Unidades	**VGV Total:**	101.137.489	**FGTS:**	3.113 (0,59 Salários)	**Preço Raso Médio:**	268.477
RET Médio:	4,0%	**VGV Tenda:**	91.312.704	**% em RET 1%:**	0%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit.:	121.236	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	36,50	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**11.715.970**	**LI:**	**20,89%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**10.947.120**	**Margem Bruta Econômica:**	**38,24%**
TIR:	**135,42%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(35.640)**	**Margem Bruta REF:**	**43,06%**
Exposição de Caixa:	**10,10%**	**Δ LI:**	**0,89%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(447.990)**	**Margem Rasa Econômica:**	**33,44%**
Payback Contingente (21 m):	**19 m/ (-2 m)**	**LI Resiliência:**	**14,09%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**27.344.637**	**Margem Rasa REF:**	**38,73%**
Payback Consolidado:	**19 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**27,29%**

DRE (Consolidado)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	São Martinho		Com vaga e com varanda		Com vaga e sem varanda		Sem vaga e sem varanda	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	108.375	100,0%	55.693	100,0%	2.073	100,0%	50.609	100,0%
PIS/COFINS	(2.153)	2,0%	(1.059)	1,9%	(7)	0,3%	(1.087)	2,1%
Custo Total	(65.603)	61,8%	(34.096)	62,4%	(2.930)	141,9%	(28.576)	57,7%
Custo Terreno	(10.266)	9,7%	(7.444)	13,6%	(1.748)	84,6%	(1.074)	2,2%
Custo Relacionados a Terreno	(750)	0,7%	(456)	0,8%	(74)	3,6%	(220)	0,4%
Custos de Incorporação	(2.189)	2,1%	(1.045)	1,9%	(61)	2,9%	(1.084)	2,2%
Custo de Construção	(52.398)	49,3%	(25.151)	46,0%	(1.048)	50,7%	(26.199)	52,9%
Lucro Bruto Econômico	40.619	38,2%	20.538	37,6%	(865)	-41,9%	20.946	42,3%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	40.619	38,2%	20.538	37,6%	(865)	-41,9%	20.946	42,3%
Despesas de Selling	(9.143)	8,6%	(4.477)	8,2%	(29)	1,4%	(4.637)	9,4%
Contingência	(2.493)	2,3%	(1.281)	2,3%	(48)	2,3%	(1.164)	2,4%
Margem de Contribuição	28.984	27,3%	14.780	27,1%	(941)	-45,6%	15.145	30,6%
IR e CSLL	(1.761)	1,6%	(866)	1,6%	(6)	0,3%	(889)	1,8%
Margem Líquida	27.222	25,6%	13.914	25,5%	(947)	-45,9%	14.255	28,8%
Lucro Bruto REF Unit.	140.559	43,1%	148.919	42,5%	(91.574)	-28,4%	141.818	46,7%
Lucro Raso REF Unit.	117.497	38,7%	124.885	38,3%	(113.354)	-37,6%	119.639	42,5%

R$ Mil - VPL - Compra	São Martinho		Com vaga e com varanda		Com vaga e sem varanda		Sem vaga e sem varanda	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	56.071	100,0%	28.935	100,0%	1.198	100,0%	25.939	100,0%
PIS/COFINS	(1.095)	2,0%	(542)	1,9%	(4)	0,3%	(549)	2,1%
Custos e Despesas Totais	(43.261)	77,2%	(22.186)	76,7%	(1.713)	143,0%	(19.362)	74,6%
Custo Terreno	(5.428)	9,7%	(3.868)	13,4%	(1.010)	84,3%	(550)	2,1%
Custo Relacionados a Terreno	(563)	1,0%	(335)	1,2%	(51)	4,2%	(178)	0,7%
Custos de Incorporação	(1.291)	2,3%	(615)	2,1%	(38)	3,2%	(638)	2,5%
Custo de Construção	(28.891)	51,5%	(13.868)	47,9%	(578)	48,2%	(14.446)	55,7%
Despesas de Selling	(5.512)	9,8%	(2.708)	9,4%	(20)	1,6%	(2.784)	10,7%
Contingência	(679)	1,2%	(349)	1,2%	(13)	1,1%	(317)	1,2%
IR e CSLL	(896)	1,6%	(443)	1,5%	(3)	0,3%	(449)	1,7%
Lucro Imobiliário	11.716	20,9%	6.207	21,5%	(519)	-43,3%	6.028	23,2%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

- **DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS:** Matrículas n.ºs 8.430 ("**Lote 39**") e 7.658 ("**Lote 40**"), ambas do 3º RI de Campinas/SP, designados como Lotes 39 e 40 da Quadra F, da Rua Ana Santina Pereira, cadastrados perante a Prefeitura de Campinas sob o código cartográfico n.º 3461.24.32.2190.00000 e 3461.24.32.2330.00000.

- **PROPRIETÁRIOS**: (i) Bruno Martins Lucas, (ii) Roberta Smiderle, (iii) Pedro Rodrigues Alves Martins, (iv) Andrea Lucia Aureliano Martins, (v) Somar Administração e Participações Ltda, (vi) Comercial Cigaxx de Alimentos Ltda, (vii) AFG Participações e Administração de Bens Ltda, (viii) BBCK Participações Ltda, (ix) Talli Holding Empreendimentos Ltda, (x) Laverde Empreendimentos e Incorporação Ltda e (xi) Argo Atlas Participações Ltda.

- **CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS SOBRE O IMÓVEL**: conforme o relatório dos Estudos Jurídicos emitidos pelo Virgílio Horn Advogados, datado de 04 de novembro de 2025, e Estudos Técnicos emitido pela Zenith, em 02/06/2025, informando que a divisa legal não apresenta necessidade de correção, pois entendemos que todos os confrontantes manifestaram concordância no processo de retificação. É possível prosseguir com a Etapa 2 para cadastramento e anexação junto à Prefeitura, importante aguardar análise técnica da municipalidade.; **(b) Loteamento**: a origem dos Imóveis no Loteamento Chácara São Martinho, registrado junto ao 3º Oficial de Registro de Imóveis de Campinas/SP. O loteamento foi realizado sob a vigência do Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937. A Cláusula 8 do Contrato Padrão do Loteamento impõe restrições aos compradores, obrigando-os a não instalar olarias, fábricas de tijolos, telhas ou outras indústrias que utilizem matéria-prima extraída do solo ou subsolo, bem como a não explorar areia, pedregulho ou outros materiais do solo para fins comerciais; e **(c) Regularidade Ambiental:** Não foram localizados autos de infração ou penalidades ambientais relacionadas aos Imóveis, conforme Certidões emitidas em 21.10.2025 pela Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas/SP;

- **DD IMÓVEIS**: conforme relatório de DD emitidos pelo Virgílio Horn Advogados, datado de 04 de novembro de 2025 **(a) Área Construída**: Foram identificadas divergências cadastrais entre as áreas constantes nas Matrículas dos Imóveis e aquelas registradas junto à Prefeitura Municipal. No Lote 39, a área constante na Matrícula é de 5.107,18m², enquanto no Demonstrativo de Lançamento do IPTU consta área de 5.360,00m². Já no Lote 40, a Matrícula indica 5.370,18m², ao passo que no IPTU consta área de 5.120,00m². **(b) Débitos Imobiliários**: R$ 178.177,44 (cento e setenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), sendo R$ 95.215,80 (noventa e cinco mil, duzentos e quinze reais e oitenta centavos) relativos ao Lote 39 e R$ 82.961,64 (oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos) referentes ao Lote 40; **(c) Multas:** Não foram localizados autos de infração ou penalidades ambientais relacionadas aos Imóveis, conforme Certidões emitidas em 21.10.2025 pela Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas/SP; **(d) Ônus e Gravames**: Não possui ônus ou gravames, averbados na matrícula até 14.10.2025; **(e) Ocupação**: ocupado pelos vendedores. **(f) TAC, CONDEPACC, CONDEPHAAT, IPAHN**: De acordo com as Fichas Informativas emitidas pelo CONDEPACC em 14 de outubro de 2025, verifica-se que os Imóveis não possuem restrições impostas por esse órgão. Ou seja, não são tombados, não estão em processo de tombamento e tampouco se localizam em área envoltória de bem tombado. Assim, não há exigência de prévia aprovação de projeto de intervenção pelo órgão municipal. Verifica-se, ainda, que não constam registros de tombamento na planilha disponibilizada no site do IPHAN, tampouco foram identificadas restrições na pesquisa virtual realizada junto ao CONDEPHAAT, por meio do mapa IDE-SP; **(g) Desapropriação/Melhoramentos:** Foi possível verificar a inexistência de atos de desapropriação ou declarações de utilidade pública ou de interesse social incidentes sobre os Imóveis, conforme Certidões do Cadastro Físico do Imóvel emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas/SP; **(j) Função Social da Propriedade**: não há certidão equivalente na cidade de Campinas; e **(k) Contas de consumo**: Pendente de entrega.

- **CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROPRIETÁRIO BRUNO MARTINS LUCAS: (i) Passivo:** R$ 331.323,28; e **(ii) Patrimônio:** Em apuração através da pesquisa de bens junto aos Registros de Imóveis. Deverá efetuar a quitação de eventuais débitos municipais inscritos em dívida ativa previamente à outorga da EVC, em observância ao artigo 185 do CTN (presunção de fraude à execução em razão da existência de débitos regularmente inscritos em dívida ativa).

- **CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPRIETÁRIA ROBERTA SMIDERLE: (i) Passivo:** Sem apontamentos; e **(ii) Patrimônio:** Em apuração através da pesquisa de bens junto aos Registros de Imóveis.

- **CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROPRIETÁRIO PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS: (i) Passivo:** Sem apontamentos; e **(ii) Patrimônio:** Em apuração através da pesquisa de bens junto aos Registros de Imóveis. Deverá efetuar a quitação de eventuais débitos municipais inscritos em dívida ativa previamente à outorga da EVC, em observância ao artigo 185 do CTN (presunção de fraude à execução em razão da existência de débitos regularmente inscritos em dívida ativa).

- **CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPRIETÁRIA ANDREA LUCIA AURELIANO MARTINS: (i) Passivo:** Sem apontamentos; e **(ii) Patrimônio:** Em apuração através da pesquisa de bens junto aos Registros de Imóveis. Deverá efetuar quitação de eventuais débitos municipais inscritos em dívida ativa previamente à outorga da EVC, em observância ao artigo 185 do CTN (presunção de fraude à execução em razão da existência de débitos regularmente inscritos em dívida ativa).

- **CONSIDERAÇÕES SOBRE A EMPRESA PROPRIETÁRIA SOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: (i) Passivo:** Em apuração/segredo de justiça; e **(ii) Patrimônio:** Em apuração através da pesquisa de bens junto aos Registros de Imóveis. Deverá efetuar a quitação de eventuais débitos municipais e federais inscritos em dívida ativa previamente à outorga da EVC, em observância ao artigo 185 do CTN (presunção de fraude à execução em razão da existência de débitos regularmente inscritos em dívida ativa).

- Há uma ação em andamento relativos à Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em trâmite perante a 31ª Vara Cível, do foro Central Cível da Comarca de São Paulo, a qual tramita em segredo de justiça.

- **CONSIDERAÇÕES SOBRE A EMPRESA PROPRIETÁRIA COMERCIAL CIGAAX DE ALIMENTOS LTDA: (i) Passivo:** R$ 2.065.296,74; e **(ii) Patrimônio:** Em apuração através da pesquisa de bens junto aos Registros de Imóveis. A empresa possui ações trabalhistas que totalizam o valor de R$ 2.065.296,74, as quais muitas estão em fase preliminar, portanto não é possível estimar se efetivamente serão desfavoráveis e atingirão o patrimônio da proprietária. Desta forma, será necessário a investigação e apresentação de bens suficientes para suportar os débitos apurados, ou, alternativamente, apresentação dos balanços patrimoniais demonstrando sua capacidade financeira e saúde econômico-financeira, como forma de mitigar eventuais riscos à aquisição dos imóveis.

- **CONSIDERAÇÕES SOBRE A EMPRESA PROPRIETÁRIA AFG PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA: (i) Passivo:** R$ 148.020,84 (processos); e **(ii) Patrimônio:** Em apuração através da pesquisa de bens junto aos Registros de Imóveis. Deverá efetuar a quitação de eventuais débitos municipais inscritos em dívida ativa previamente à outorga da EVC, em observância ao artigo 185 do CTN (presunção de fraude à execução em razão da existência de débitos regularmente inscritos em dívida ativa).

- **CONSIDERAÇÕES SOBRE A EMPRESA PROPRIETÁRIA BBCK PARTICIPAÇÕES LTDA: (i) Passivo:** Sem apontamentos; e **(ii) Patrimônio:** Em apuração através da pesquisa de bens junto aos Registros de Imóveis.

- **CONSIDERAÇÕES SOBRE A EMPRESA PROPRIETÁRIA TALLI HOLDING EMPREENDIMENTOS LTDA: (i) Passivo:** R$ 1.231.529,31; e **(ii) Patrimônio:** Em apuração através da pesquisa de bens junto aos Registros de Imóveis.

- A empresa possui ações trabalhistas que totalizam o valor de R$ 1.231.529,31, as quais ainda não são terminativas, portanto não é possível estimar se efetivamente serão desfavoráveis e atingirão o patrimônio da proprietária. Desta forma, será necessário a investigação e apresentação de bens suficientes para suportar os débitos apurados, ou, alternativamente, apresentação dos balanços patrimoniais demonstrando sua capacidade financeira e saúde econômico-financeira, como forma de mitigar eventuais riscos à aquisição dos imóveis. Quitação de eventuais débitos municipais inscritos em dívida ativa previamente à outorga da EVC, em observância ao artigo 185 do CTN (presunção de fraude à execução em razão da existência de débitos regularmente inscritos em dívida ativa).

- **CONSIDERAÇÕES SOBRE A EMPRESA PROPRIETÁRIA LAVERDE EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA: (i) Passivo:** R$ 52.726,83 (processos); e **(ii) Patrimônio:** Em apuração através da pesquisa de bens junto aos Registros de Imóveis

- **CONSIDERAÇÕES SOBRE A EMPRESA PROPRIETÁRIA ARGO ATLAS PARTICIPAÇÕES LTDA: (i) Passivo:** R$ 56.792,94; e **(ii) Patrimônio:** Em estimativa. Deverá ocorrer a quitação de eventuais débitos municipais e federais inscritos em dívida ativa previamente à outorga da EVC, em observância ao artigo 185 do CTN (presunção de fraude à execução em razão da existência de débitos regularmente inscritos em dívida ativa), os passivos apurados advém de Execuções Fiscais que têm por objeto débitos de IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2022 a 2024, relativos ao Lote 39, e os exercícios de 2022 e 2023, relativos ao Lote 40, sendo ambos os imóveis objeto desta auditoria, os quais serão devidamente quitados antes da outorga da EVC.

- **CONCLUSÃO.:** Os Proprietários apresentam aproximadamente R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em passivos, encontrando-se seus patrimônios em fase de levantamento, com o objetivo de mitigar eventuais riscos à nossa aquisição.

- Ademais, o CVC firmado entre as Partes contempla condições resolutivas que conferem segurança e respaldo à eventual saída da TENDA do negócio, caso necessário. Destaca-se que o formato da operação não implica exposição de caixa, uma vez que se trata exclusivamente de dação em pagamento, por meio da qual cada Proprietário receberá sua respectiva porcentagem em unidades imobiliárias, conforme quadro abaixo

	Percentual dos Imóveis	Percentual x Unidades	Unidades Inteiras	Unidades residuais
BRUNO	7,05%	1,9035	1	0,9035
ROBERTA	8,33%	2,2491	2	0,2491
RODRIGO	8%	2,16	2	0,16
PEDRO	6,66%	1,7982	1	0,7982
SOMAR	19,98%	5,3946	5	0,3946
CIGAAX	6,66%	1,7982	1	0,7982
AFG	10%	2,7	2	0,7
BBCK	16,66%	4,4982	4	0,4982
TALLI	6,66%	1,7982	1	0,7982
LAVERDE	10%	2,7	2	0,7
Total	**100,00%**	**27**	**21**	**6**

- As dívidas de IPTU incidentes sobre os imóveis deverão ser integralmente quitadas até a outorga da EVC, facultando-se à TENDA a possibilidade de efetuar o pagamento e descontar o valor correspondente do preço, ou seja, proporcionalmente das unidades atribuídas na dação em pagamento. Diante dos termos pactuados no compromisso, não se vislumbram óbices à aquisição.

- Importante ressaltar que a baixa do landbank ocorrerá apenas após a conclusão do levantamento e conferência de toda a documentação necessária, sobretudo procuração e documentos que são de caráter personalíssimo.

Obrigado(a)
