Tenda

sua próxima conquista

Book de Lançamento

Regional BA

Projeto: Viver Salvador – Forte São Marcelo

Data Comitê: 17/11/25

One Page Cenário Fundamento – Forte São Marcelo

[1]

Cidade	Salvador	Mancha de demanda	BA - SSAA - Salvador alta
Regional	BA	Cluster MPR	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Aprovação	Tipo de Aprovação	Primeira Fase
Fase Anterior	Farol da Barra		
Tipo de Comitê	Lançamento	Versão da VF	Versão 1.0: Nov

[2]

Unidades (Fases)	476 (1)	CA Máx | Proj	2,0 | 1,0
Unidades com Vaga (%)	192 (40%)	Escritura | Lançamento	ago/24 | dez/25
Unidades com Varandas (%)	188 (39%)	Tipologia	F2 - Concreto

[3]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	3.528 (3,6%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (IPCA)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	3,6% (100,0%)
Valor R$/m²	622	VAR (%VGV)	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	47.382 (47,8%)	Indireto Unit.	17.309
Prazo da Obra (meses)	15	Torre Unit.	48.569
Custo Total Unit. (LPU):	99.541 (95)	Infra Unit.	17.473
Início de Obra	jun-26	Fundação Unit.	7.338

[4]

Preço Nominal Unit.	208.185	VSO	37
Preço Raso Unit.	187.323	Referência	VISION
Avaliação Unit.	204.705	Renda (% em RET 1%)	2.546 (66,6%)



LI (Régua):	22,1% (20,0%)	Margem Bruta Econômica:	40,5%
LI Marginal:	22,6%	Margem Rasa Econômica:	33,3%
Margem Bruta REF:	42,5%	Margem Contribuição Econômica:	27,9%
Margem Rasa REF:	36,1%	Exposição (% VGV):	12.892 (13,0%)
TIR:	178,0%	VGV Total:	99.096
Payback Contingente (21 m) :	17 m/ (-4 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(11.132)
Payback Primeira Fase:	16	Ger. Caixa 24 meses (R$):	20.824

Destaques

[1] O Forte São Marcelo é o 12º projeto do Viver Salvador, com lançamento 8 meses após o último projeto – Farol da Barra (abr/25), restando depois dele somente 1 lançamento, o Parque da Cidade.

[2]
- Este projeto conta com o diferencial da tipologia com varanda em 50% das fachadas e área de lazer com piscina. Além disso, todas as 99 vagas de carro e 62 vagas de moto serão vinculadas, representando 34% das unidades.

[3] O terreno foi comprado em 2011 e carrega incorridos relevantes para realização da infraestrutura do loteamento, o que afeta diretamente os indicadores do projeto.
Para o cenário Fundamento Aprovação, foram considerados os incorridos a partir de mai/24 e pagamento do terreno foi considerado com o proporcional para o Forte São Marcelo e Parque da Cidade, conforme apresentado no comitê de lançamento do Farol da Barra.

[4] Segue o comparativo de preço nominal e de avaliação entre o Forte São Marcelo e o Farol da Barra. Observa-se uma diferença positiva, justificada pelo ganho de avaliação decorrente dos novos atributos incorporados ao produto, especialmente piscina e varanda.

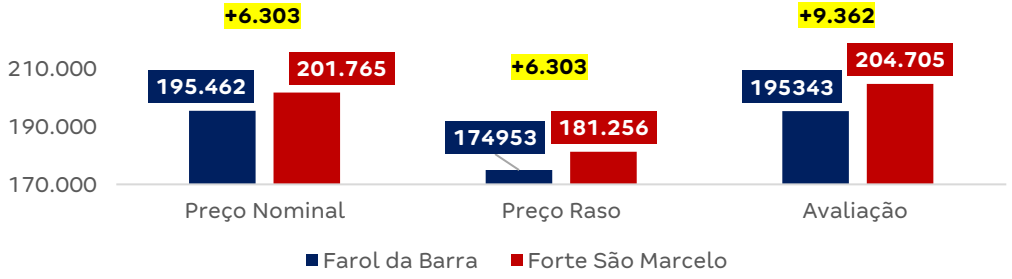

One Page Cenário Real – Forte São Marcelo

Cidade	Salvador	**Mancha de demanda**	BA - SSAA - Salvador alta
Regional	BA	**Cluster MPR**	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Primeira Fase
Fase Anterior	Farol da Barra		
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Nov

Unidades (Fases)	476 (1)	**CA Máx | Proj**	2,0 | 1,0
Unidades com Vaga (%)	192 (40%)	**Escritura | Lançamento**	abr/11 | dez/25
Unidades com Varandas (%)	188 (39%)	**Tipologia**	F2 - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	2.101 (2,2%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	2.101 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	359	**VAR (%VGV)**	2125 (0,7%)

Custo Construção (%VGV)	47.382 (49,3%)	**Indireto Unit.**	17.309
Prazo da Obra (meses)	15	**Torre Unit.**	48.569
Custo Total Unit. (LPU):	99.541 (95)	**Infra Unit.**	17.473
Início de Obra	fev-26	**Fundação Unit.**	7.338

Preço Nominal Unit.	201.765	**VSO**	95
Preço Raso Unit.	181.256	**Referência**	VISION
Avaliação Unit.	204.705	**Renda (% em RET 1%)**	2.546 (66,6%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	182.267
Preço Inf. Médio Unit.	202.810	**Margem Bruta REF (%)**	40,1%
Custo Inf. Médio Unit.	121.554	**Margem Rasa REF (%)**	33,3%



LI (Régua):	**-5,8% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	38,8%
LI Marginal:	24,3%	**Margem Rasa Econômica:**	31,4%
Margem Bruta REF:	40,1%	**Margem Contribuição Econômica:**	26,4%
Margem Rasa REF:	**33,3%**	**Exposição (% VGV):**	17.295 (17,9%)
TIR:	17,3%	**VGV Total:**	**96.040**
Payback Contingente (21 m) :	**14 m/ (-7 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	1.600
Payback Primeira Fase:	11	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	23.126

Destaques

[1] PCP

- No cenário real, foi considerada a previsão de início da obra conforme PCP 170, com a obra programada para começar em fevereiro de 2026.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Farol Pareceres – Forte São Marcelo

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Registro da Escritura de Compra e Venda: 08/11/2011 Previsão do Descaucionamento: 14/11/25 Previsão do Registro da Incorporação: 17/12/2025 Previsão do Registro do Patrimônio de Afetação: 17/12/2025	Ok	
Legalização	Licenças Emitidas para Lançamento: - Dispensa de Licença Ambiental - Emitida em 08/07/2025 - Sem validade; - Autorização de Supressão Vegetal - Emitida em 14/03/2025 - Validade até 14/03/2027; - Autorização COMAER - Emitida em 06/06/2025 - Validade até 06/06/2027; - DOM - Descaucionamento dos Lotes - Emitido em 15/08/2025 - Sem validade. Licenças Pendentes para Lançamento: - Alvará de Construção - Previsão de emissão em 21/11/2025. Licenças para Início de Obra: - Licença de Terraplanagem - Emitida em 08/09/2025 - Validade até 08/09/2027; - Obra de Logradouro Público - Esgoto - Previsão de emissão em 16/02/2026; - Obra de Logradouro Público - Drenagem - Previsão de emissão em 17/01/2026.	Ok com ressalvas	
Produto	Ok. Sem riscos	Ok	
GETEC	Torre realizada com projetos em AP, estimativa de aço e concreto.	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos.	Ok	
Contratação	Laudo de engenharia: Pendente - Protocolo de Análise Definitiva realizado em 13/11/25. Previsão da LAE 15/12/25. Risco: Pendente - Dependente do Laudo de Engenharia. Jurídico: Pendente RI - Previsão de emissão em 19/12. Com base nessa data, a conclusão da análise jurídica está estimada para 29/12/2025.	Ok com ressalvas	
Inteligência de mercado	IM avalia preço referência como factível.	Ok	
Comercial/Ciclo	Ok.	Ok	
Estudos Econômicos	Ok. Ficando a critério da Diretoria a aprovação do preço de terreno no cenário Fundamento.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA
SSA – Salvador

Lançamento

1. Viver Salvador
2. Jardim Armação Prime
3. Vivenda Real (Morada Real)
4. Morada das Estações
5. Encanto Piatã
6. Vale dos Lírios
7. Vila Laura Prime
8. Vale das Tulipas

LandBank

9. Solar de Itapagipe
10. Vale das Orquídeas
11. Mirante Verona (Veneza)
12. Vista Serena
13. Jaguaribe Prime
14. Portal de Salvador
15. Solar Patamares
16. Paralela Sun Prime
17. Privilege Salvador Norte
18. Torres de Pirajá

Cluster MPR – (Comitê)
Cluster 1 - Vermelho
Região
Capital

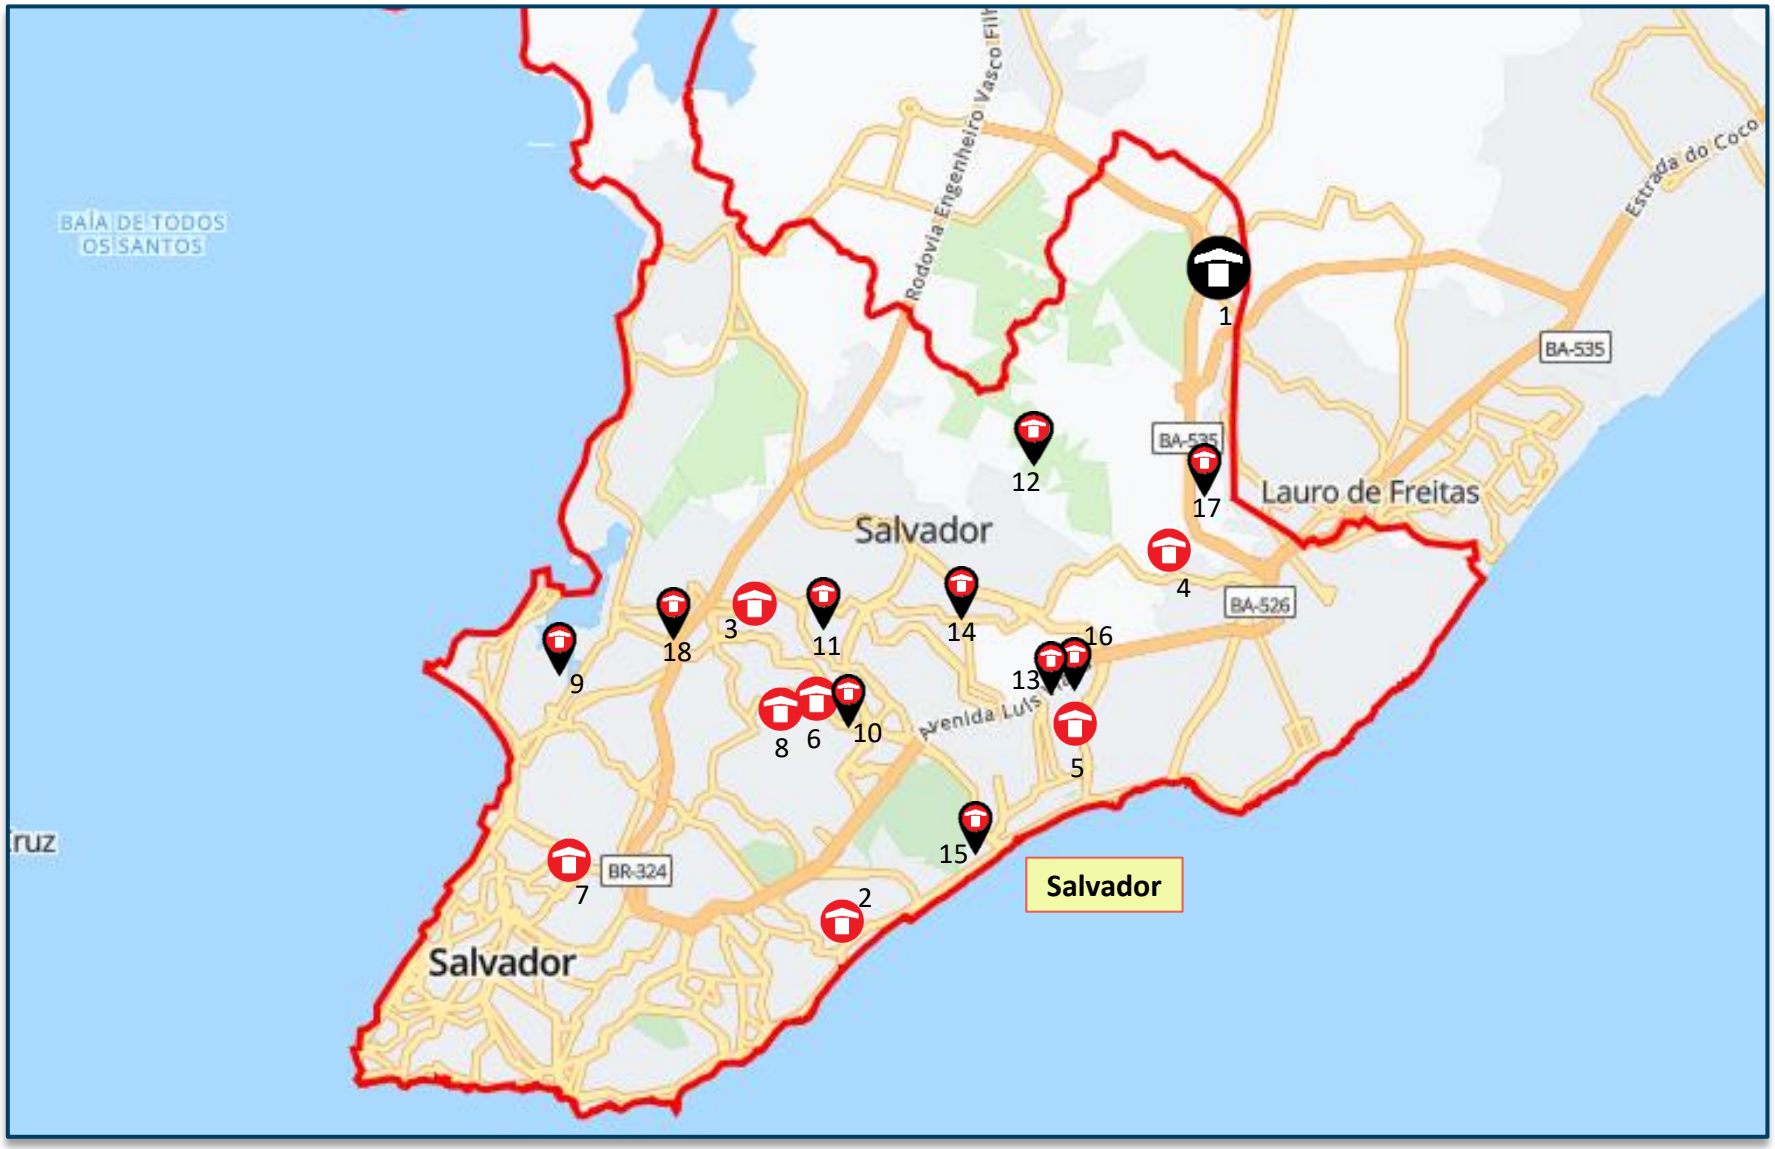

Lançados LandBank Comitê

PRODUTO

Empreendimento Forte São Marcelo
Lançamento

Informações Gerais – Condomínio Único

Terreno	**Área terreno**	17.688,50m²
	Menor poligonal	17.688,50m²
	App/fna	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento viário	Não
	Área liquida	15.691,53m²
Diretrizes Urbanísticas	**Zoneamento**	ZPR-2
	Ca máximo	2,00
	Ca básico	1,00
	Ca liquido	0,98
	Ca projetado	0,87
	Gabarito máximo	N/A
Geral	**Total uh**	476
	Total de vagas exigido	00 (0%)
	Total de vagas projetado	168 (35%)
Tipologia	**Tipologia**	Pct com elevador
	Gabarito	T+04
	Lâmina	01 12pp, 01 14pp, 01 16pp e 03 18pp
	Área privativa	35,44m²
	Varanda	192uh (40%)
Condomínio	**Unidade pcd**	24
	Unidade lazer|técnica	04|00
	Torre	06
	Fase	01
Lazer	**Lazer Interno**	01- Espaço office, 02-Brinquedoteca, 03-Fitness e 04– Salão de festas gourmet
	Lazer Externo	05-Praça de chegada, 06-Play baby, 07-Playpet, 08-Funcional Externo, 09-Fitness Externo, 10- Redário, 11- Praça dos Sabores, 12- Play kids, 13- Quadra gramada, 14- Piscina adulto e infantil, 15- Churrasqueira gourmet, 16- Salão de festas



Área com declividade acentuada

PRODUTO

Empreendimento Forte São Marcelo
Lançamento

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Faixa de renda**	1	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	*Quadra gramada e piscinas.*
	Atributos Torre	Sim	*Varanda em uma face de cada torre (40%)*
	Edifício Garagem	Não	

Quadra gramada (imagem ref.)

Piscinas (imagem ref.)

Varanda (imagem ref.)

PRODUTO

Empreendimento Forte São Marcelo
Lançamento

Fase única: 476uh (sendo 24uh reversíveis) - 168 Vagas (Sendo 06 PCD, 01 vaga de embarque e desembarque e 62 vagas de moto)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	06 Blocos (T+04)	476 Uh (Sendo 24 U.R)	168 Vagas (Sendo 06 PCD, 01 vaga de embarque e desembarque e 62 vagas de moto)	Todos os lazeres estão sendo contemplados nesse módulo

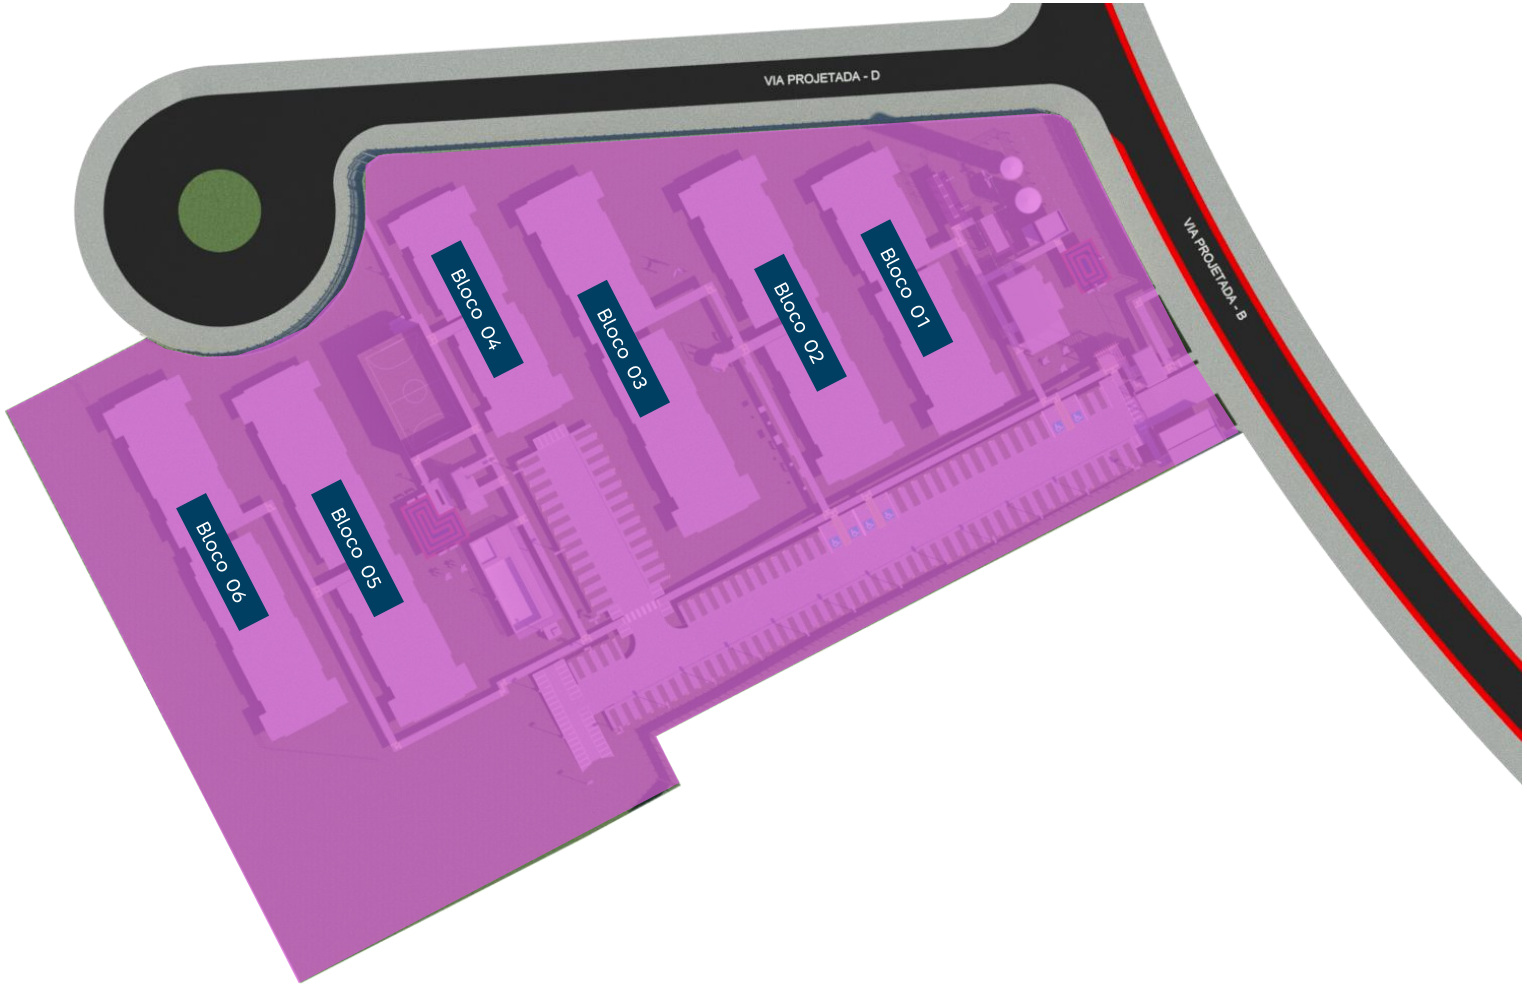

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Implantação | Google Earth

FORTE SÃO MARCELO
Salvador - BA
476 UH A VENDER

Implantação | Google Earth

FORTE SÃO MARCELO
Salvador - BA
476 UH

Custo de Construção

	FORTE SÃO MARCELO REV00	FORTE SÃO MARCELO CEN 3 | REV11	LVS PONTA DE HUMAITA AGO/25
Torres	6	6	24
Unidades Construídas	480	480	480
Unidades Vendidas	476	476	480
Total Unidades Vendidas	476	476	480
Condomínios (qta.)	1	1	1
Cidade	Salvador - BA	Salvador - BA	Salvador - BA
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	F2
Tipologia	1 Torre | T+4 | 12PP | C1A	1 Torre | T+4 | 12PP | C1A	24 Torre | T+4 | 04PP
Tipologia	1 Torre | T+4 | 14PP | C1A	1 Torre | T+4 | 14PP | C1A	-
Tipologia	1 Torre | T+4 | 16PP | C1A	1 Torre | T+4 | 16PP | C1A	-
Tipologia	3 Torre | T+4 | 18PP | C1A	3 Torre | T+4 | 18PP | C1A	-
Projeto Infra	LO		-
Projeto Torre	AP		-
Mês Base	outubro-25	março-25	agosto-25
Incc	1.216,706	1.169,120	
LVS	agosto-25	janeiro-25	
Indiretos	agosto-25	janeiro-25	
Base de Preço	LPU 95	LPU 88	
Takt	2+2	2+2	
Prazo (mês)	15	14	15
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 93.992	R$ / UND R$ 88.814	R$ / UND R$ 87.033
Indireto	R$ 17.309	R$ 15.948	R$ 16.595
Torre	R$ 48.569	R$ 48.147	R$ 43.575
Infra	R$ 17.473	R$ 14.771	R$ 16.749
Fundação	R$ 7.338	R$ 6.925	R$ 8.529
EEE			
ETE			
Contenção		R$ 101	R$ 50
Terraplenagem	R$ 3.302	R$ 2.922	R$ 1.536
CUSTO TOTAL II	R$ 5.410	R$ 5.442	R$ 5.410
Urbanização	R$ 5.345	R$ 5.363	R$ 5.345
Drenagem	R$ 36	R$ 10	R$ 36
Extensão de Rede Elétrica			
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 30	R$ 69	R$ 30
CUSTO TOTAL III			
Incorridos			
CUSTO TOTAL IV			
Aprendizado			
CUSTO TOTAL V		R$ 3.836	
Atualização por INCC		R$ 3.836	
CUSTO TOTAL I+II	R$ 99.401	R$ 94.256	R$ 92.443
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 99.401	R$ 98.092	R$ 92.443

Custo de Construção

	FORTE SÃO MARCELO REV00	FORTE SÃO MARCELO CEN 3 | REV11	
Torres	6	6	
Unidades Construídas	480	480	
Unidades Vendidas	476	476	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Salvador - BA	Salvador - BA	
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	
Tipologia	1 Torre | T+4 | 12PP | C1A	1 Torre | T+4 | 12PP | C1A	
Tipologia	1 Torre | T+4 | 14PP | C1A	1 Torre | T+4 | 14PP | C1A	
Tipologia	1 Torre | T+4 | 16PP | C1A	1 Torre | T+4 | 16PP | C1A	
Tipologia	3 Torre | T+4 | 18PP | C1A	3 Torre | T+4 | 18PP | C1A	
Projeto Infra	LO	0	
Projeto Torre	AP	janeiro-00	
Mês Base	outubro-25	março-25	
Incc	1216,706	1169,120	
LVS	agosto-25	janeiro-25	
Indiretos	agosto-25	janeiro-25	
Base de Preço	LPU 95	LPU 88	
Takt	2+2	2+2	
Prazo (mês)	15	14	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 93.992	R$ / UND R$ 88.814	DIF R$ 5.178
Indireto	R$ 17.309	R$ 15.948	R$ 1.362
Torre	R$ 48.569	R$ 48.147	R$ 421
Infra	R$ 17.473	R$ 14.771	R$ 2.703
Fundação	R$ 7.338	R$ 6.925	R$ 413
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 0	R$ 101	-R$ 101
Terrapplenagem	R$ 3.302	R$ 2.922	R$ 380
CUSTO TOTAL II	R$ 5.410	R$ 5.442	-R$ 32
Urbanização	R$ 5.345	R$ 5.363	-R$ 18
Drenagem	R$ 36	R$ 10	R$ 26
Extensão de Rede Eletrica	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 30	R$ 69	-R$ 39
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 3.836	-R$ 3.836
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 3.836	-R$ 3.836
CUSTO TOTAL	R$ 99.401	R$ 98.092	R$ 1.309

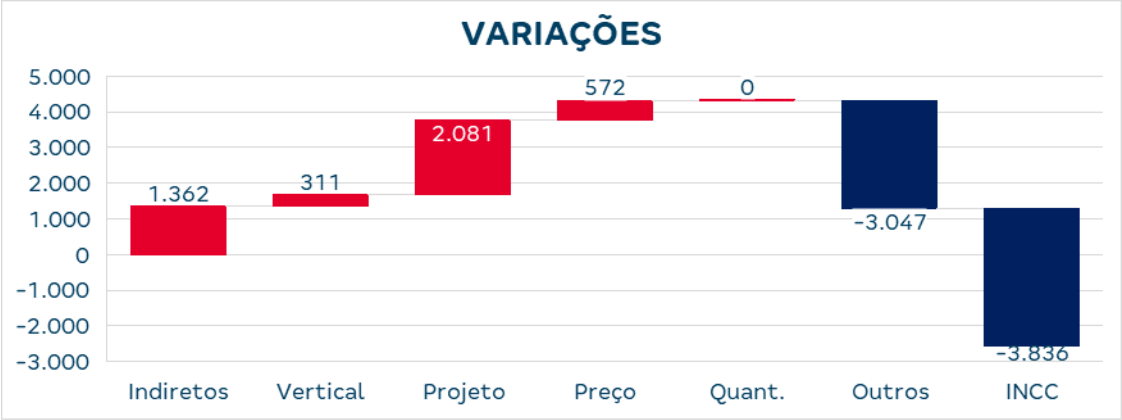

INDIRETOS
+ 817 | G11
+ 566 | Canteiro

VERTICAL
+311 | Retroalimentação

PROJETO
+ 1.554 | Atributos
+380| Terraplenagem
+ 504 | Castelo
- 491| Enterrados

PREÇO
+ 245 | Outras Instalações
+ 225 | Muros

OUTROS
- 374 | Instalações Infra
- 415 | Instalações Torre

INCC
- 3.836 | INCC

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Ligação de água na porta.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ligação de esgoto direto na rede existente no viário.

SISTEMA DE DRENAGEM
Ligação do tanque de retardo na rede existente no viário, escada hidráulica.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Não possui carta de viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Pavimentação já executada Gleba A + pavimentação da Gleba B está em etapas, conforme solicitação da prefeitura.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 2
Esgoto	Nível 2
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 1
Gás	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 12/02/25. Considerado ligação na porta.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 12/02/25 e Projeto aprovado. Considerado ligação em rede existente no viário.

Drenagem:
- Não se aplica. Escada hidráulica localizado no fundo do terreno.

Elétrica:
- Viabilidade emitida em 21/10/2024

Gás:
- Não se aplica. Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Pavimentação já executada Gleba A + pavimentação da Gleba B está em etapas, conforme solicitação da prefeitura.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 52 furos.
- Considerada Radier + Estaca Hélice, com diâmetros de 40cm e profundidade de 18 a 21 m.

Logística

VIVÊNCIA - CONTAINERS							
DESCRIÇAO	QUANTIDADE	TAMANHO MÓDULOS	MOBILIZAÇAO	DESMOBILIZAÇAO	PRÈ FORMA	ESTRUTURA	ACAB.
CONTAINER PORTARIA (LOG)	CONSIDERAR 1 MODULO COM SANITARIO E CATRACA	2,41 X 4,90 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-
CONTAINER PROVISORIO (LOG)	CONSIDERAR 8 MODULOS DE CONTAINER	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	TODO PERIODO	-	-
CONTAINER VIVENCIA PADRAO BA (LOG)	CONSIDERAR 20 MODULOS DE CONTAINERS (SENDO 10 MODULOS NO PAV T E 10 MODULOS NO PAV SUPERIOR)	2,41 X 6,10 m	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO

TENDAS_PERÍODOS						
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÈ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO
GAIOLA DE DESMOLDANTE (LOG)	1	2,00	2,00	-	TODO PERÍODO	-
TENDA ACABAMENTO (LOG)	1	6,00	12,00	AJUSTAR	AJUSTAR	AJUSTAR
TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	7,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-
TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	10,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-
TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	6,00	12,00	AJUSTAR	AJUSTAR	AJUSTAR
TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	6,00	12,00	AJUSTAR	AJUSTAR	AJUSTAR
TENDA EXTRA (LOG)	1	6,00	12,00	AJUSTAR	AJUSTAR	AJUSTAR
TENDA LAZER (LOG)	1	5,97	7,00	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO
TENDA MOLDADOR (LOG)	1	3,00	4,00	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS						
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÈ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO
BETONEIRA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-
BOMBA LANÇA (LOG)	VARIÁVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-
CAMINHÃO MUNCK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-
SKYTRAK (LOG)	1 EQUIPAMENTO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO

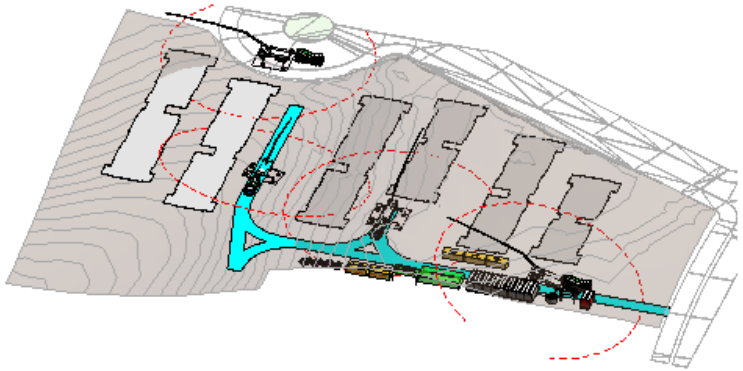

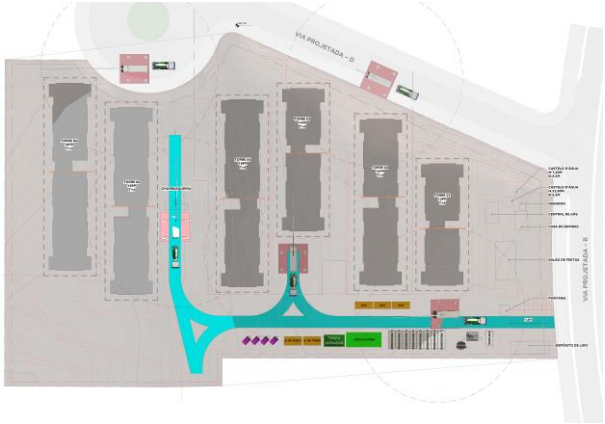

VISTA 3D - PRÉ FORMA

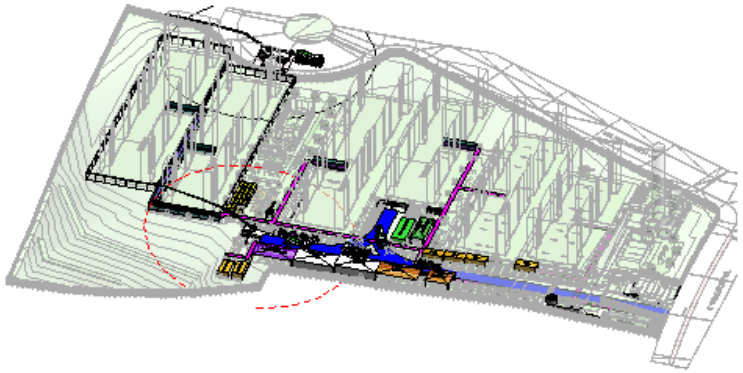

VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO

PCP 170

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI	Folga Inicio
V Salvador - Forte Sao Marcelo	jan/26	500	2	C	19/02/26	22/06/26	06/07/26		28/11/26	12/12/26		ago/27	1,66
Vale das Tulipas	set/25	819	3	B	20/05/26	17/10/26	21/10/26	20/11/26	08/04/27	12/04/27	12/05/27	jan/28	8,25
Morada Real	nov/25	443	2	C	11/07/26	29/11/26	13/12/26		18/04/27	02/05/27		jan/28	7,94
Veneza Prime F1	dez/25	570	3	A	24/06/26	21/12/26	26/12/26	28/12/26	20/04/27	26/04/27	28/04/27	dez/27	6,37
Encanto Piatã - F3	abr/26	379	3	B	10/11/26	09/04/27	13/04/27	13/05/27	28/06/27	02/07/27	01/08/27	mar/28	6,98
V Salvador - Parque Da Cidade	jul/26	963	2	C	16/01/27	19/04/27	03/05/27		19/02/28	04/03/28		jul/28	6,19

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lanç + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Salvador	SSA	54%	4.701	392	5.641	470

Faixas MCMV	Empreendimento	Renda	Lançamento	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27
Faixa 2	Vale Dos Lírios F1	3.788	ago-24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4									
Faixa 1	Morada Das Estações	2.840	dez-24	34	34	34	34	34	14																
Faixa 3	Jardim Armação Prime	9.000	dez-24	7	7	7	5																		
Faixa 2	Vivenda Real Cond I	3.865	jan-25	37	37	17																			
Faixa 2	Vale Dos Lirios F2	3.259	mar-25	38	14																				
Faixa 3	Vila Laura Prime	5.422	abr-25	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	6		
Faixa 1	V Salvador - Farol Da Barra	2.400	mai-25	99	53																				
Faixa 2	Vale das Tulipas	3.546	set-25	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	30						
Faixa 2	Veneza Prime I F1	4.467	nov-25	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	26				
Faixa 2	Vivenda Real Cond II	3.378	nov-25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	4			
Faixa 1	**Forte São Marcelo**	**2.546**	**dez-25**		**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**1**															
Faixa 1	**Parque da Cidade**	**2.546**	**jun-26**								**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**13**				
Faixa 3	Jaguaribe F1	4.739	mar-26					32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	27
Faixa 2	Privilege Salvador Norte	3.023	mai-26							33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Faixa 2	Encanto Piatã F3	4.691	mai-26							21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Faixa 2	Portal Salvador I F1	2.933	jul-26									38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	37
Faixa 2	Torres De Piraja F1	4.146	ago-26										32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Faixa 1	Vista Serena F1	2.030	set-26											42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Faixa 2	Paralela Sun Prime - F1	4.286	out-26												28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Faixa 2	Veneza Prime I F2	4.467	abr-27																		16	16	16	16	16
Faixa 2	Solar De Itapagipe	3.712	jul-27																					44	44
Faixa 2	Jaguaribe F2	4.625	ago-27																						32
Total de Vendas Lançados				**342**	**271**	**184**	**165**	**160**	**140**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**126**	**122**	**122**	**105**	**75**	**69**	**23**	**6**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank				**342**	**366**	**279**	**260**	**287**	**267**	**213**	**307**	**345**	**377**	**419**	**447**	**447**	**443**	**443**	**426**	**396**	**324**	**265**	**248**	**242**	**236**
Total Mancha | Faixa 1				*39%*	*50%*	*46%*	*49%*	*45%*	*41%*	*0%*	*31%*	*27%*	*25%*	*33%*	*31%*	*31%*	*31%*	*31%*	*32%*	*35%*	*17%*	*16%*	*17%*	*17%*	*18%*
Total Mancha | Faixa 2				*53%*	*43%*	*45%*	*41%*	*37%*	*40%*	*75%*	*52%*	*58%*	*61%*	*55%*	*58%*	*58%*	*58%*	*58%*	*56%*	*52%*	*67%*	*65%*	*68%*	*88%*	*103%*
Total Mancha | Faixa 3				*8%*	*7%*	*9%*	*9%*	*18%*	*19%*	*24%*	*17%*	*15%*	*14%*	*12%*	*11%*	*11%*	*12%*	*12%*	*12%*	*13%*	*16%*	*19%*	*15%*	*13%*	*11%*

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Forte São Marcelo | Mapa Concorrência

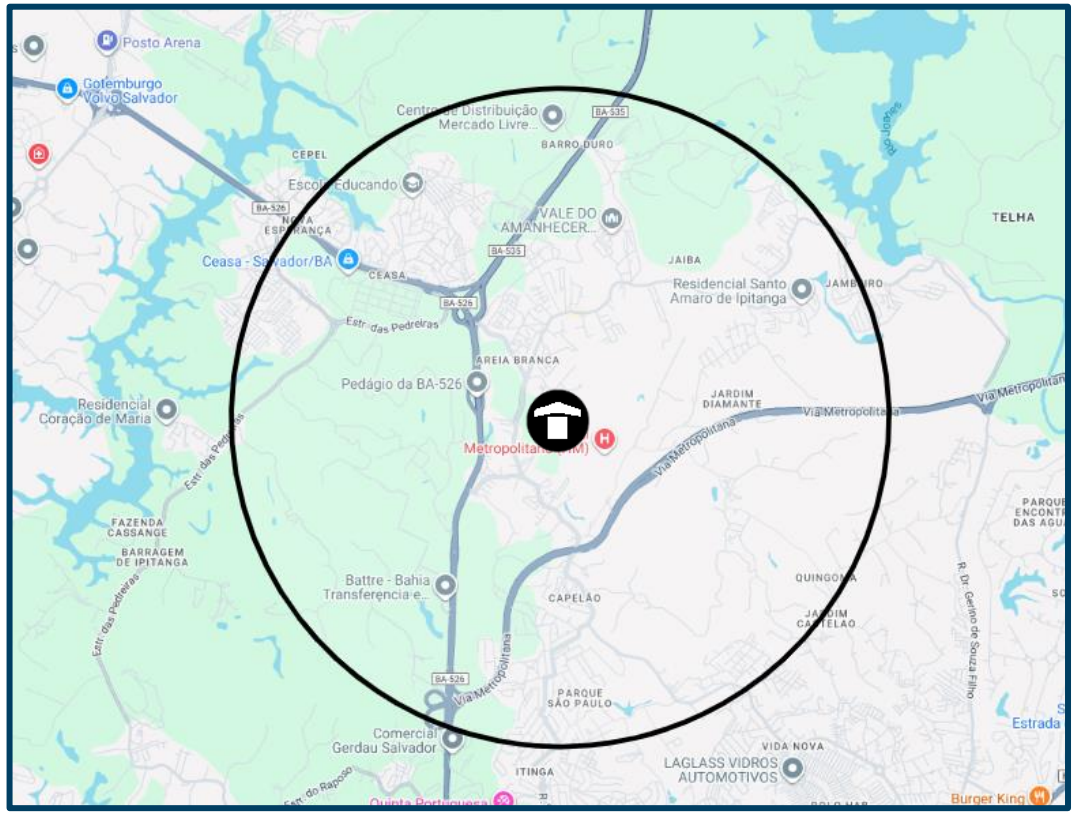

Diagnóstico Concorrência

- Não mapeamos nenhum lançamento da concorrência na região.

Forte São Marcelo		
Região 1 Km	**População**	35.028
	Dens. Demográfica	11.203
	Renda (R$)	5.170
	Classe Social	E (até R$ 1.5K)
	PEA Dia	22.660

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Forte São Marcelo			
Tipo:	**Uh tipo**		**Uh tipo**	
Método	**Ref - Viver Salvador**		**Vision**	
Avaliação	201.547		201.547	
Renda Inicial (VF)	2.387		2.296	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		75%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,50	1.203	0,66	1.532
FGTS	0,39	937	1,02	2.356
Financiamento	93,65%	140.171	94,17%	136.657
Subsídio	106,49%	25.086	93,71%	25.135
Prazo de Pró-soluto	16	16	16	16
Pró-Soluto	74,89%	10.393	78,11%	10.425
Preço Raso (RS)	177.791	177.791	176.106	176.106
TCD	85,67%	20.613	76,50%	17.706
VSO	57	57	57	57
Preço de Venda	**196.702**	**196.702**	**192.150**	**192.150**
Elasticidade	0,865%	0,865%	0,865%	0,865%
Preço de Venda Final	**198.404**	**198.404**	**193.812**	**193.812**
Preço Raso (R$)	**177.791**		**176.106**	
% de Raso	**89,61%**		**90,86%**	
BP25 - Não Inflacionado	**174.612**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**185.742**		**-**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Forte São Marcelo					
Tipo:	**Varanda**		**Varanda + Vg Moto**		**Varanda + Vg Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	201.547		204.619		214.945	
Renda Inicial (VF)	2.552		2.666		2.934	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	75%		50%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,63	1.619	0,97	2.616	0,88	2.616
FGTS	1,06	2.737	1,10	2.961	1,01	2.985
Financiamento	93,72%	146.741	93,24%	150.781	94,95%	159.868
Subsídio	85,27%	15.544	97,32%	14.674	118,50%	10.810
Prazo de Pró-soluto	16	16	16	16	16	16
Pró-Soluto	85,53%	12.689	85,60%	13.266	80,83%	13.787
Preço Raso (RS)	179.330	179.330	184.298	184.298	190.065	190.065
TCD	79,85%	20.541	75,10%	20.183	68,97%	20.398
VSO	6	6	12	12	20	20
Preço de Venda	**198.156**	**198.156**	**202.727**	**202.727**	**208.657**	**208.657**
Elasticidade	0,865%	0,865%	0,865%	0,865%	0,865%	0,865%
Preço de Venda Final	**199.871**	**199.871**	**204.481**	**204.481**	**210.463**	**210.463**
Preço Raso (R$)	**179.330**		**184.298**		**190.065**	
% de Raso	**89,72%**		**90,13%**		**90,31%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Forte São Marcelo
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Ref - Viver Salvador**
Avaliação	204.705
Renda Inicial (VF)	2.546
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,65	1.703
FGTS	0,65	1.728
Financiamento	93,87%	145.995
Subsídio	106,52%	20.229
Prazo de Pró-soluto	16	16
Pró-Soluto	78,14%	11.601
Preço Raso (RS)	181.256	181.256
TCD	80,51%	20.509
VSO	95	95
Preço de Venda	**200.019**	**200.019**
Elasticidade	0,865%	0,865%
Preço de Venda Final	**201.765**	**201.765**
Preço Raso (R$)	**181.256**	
% de Raso	**89,84%**	
Raso Todas as Fases	**186.495**	
Nominal Todas as Fases	**207.035**	

1

Análise de Riscos | Farol IM

IM avalia o Preço Referência como **factível**.

1) I.M está de acordo com o preço referência, visto que, esse preço reflete a performance da fase anterior ajustando o preço apenas conforme os novos parâmetros da fase atual e o incremento da Varanda.

Além disso, conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", não temos concorrentes na região.

Abaixo segue o escalonamento da Regional:

	Preço Real					Preço Normalizado (16m)	
Mancha	Avaliação	Preço Raso	enda Mediar	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Vale Dos Lírios	226.099	206.642	3.300	43	14	2.684	209.326
Morada Das Estações	230.570	213.875	2.840	34	26	-11.434	202.441
Vivenda Real Cond I	238.957	218.452	3.865	37	21	-5.564	212.887
Vila Laura Prime	264.842	240.752	5.422	19	28	-12.872	227.880
V Salvador - Farol Da Barra	193.294	174.971	2.400	99	13	2.009	176.980
Forte São Marcelo	204.705	181.256	2.546	95	16	-	181.256

Percepção Comercial

Parecer: O Parecer do ciclo e favorável, não temos concorrência no local, já é um projeto consolidado no mercado e estamos com preço aderente, frente ao anterior.

Resumo de Preços

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pós	PSOL (m)	RET1
Parque da Cidade	Uh tipo	2.387	0,50	0,39	93,1%	106,5%	74,9%	85,7%	50	204.430	206.547	0,8654%	206.199	185.586	28	75%
Parque da Cidade	Varanda	2.552	0,63	1,06	91,8%	85,3%	85,5%	79,9%	29	207.592	211.547	0,8654%	209.388	188.847	28	75%
Parque da Cidade	Varanda + Vg Carro	2.934	0,88	1,01	91,9%	118,5%	80,8%	69,0%	16	218.909	221.547	0,8654%	220.803	200.405	28	50%

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Forte São Marcelo			
Tipo:	**Uh tipo**		**Uh tipo**	
Método	**Ref - Viver Salvador**		**Vision**	
Avaliação	201.547		201.547	
Renda Inicial (VF)	2.387		2.296	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		75%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,50	1.224	0,66	1.558
FGTS	0,39	953	1,02	2.397
Financiamento	93,39%	142.582	93,90%	139.008
Subsídio	106,49%	25.518	93,71%	25.567
Prazo de Pró-soluto	20	20	20	20
Pró-Soluto	76,18%	13.215	79,45%	13.256
Preço Raso (RS)	183.492	183.492	181.786	181.786
TCD	87,14%	20.967	77,82%	18.010
VSO	22	22	22	22
Preço de Venda	**199.278**	**199.278**	**194.734**	**194.734**
Elasticidade	2,600%	2,600%	2,600%	2,600%
Preço de Venda Final	**204.459**	**204.459**	**199.797**	**199.797**
Preço Raso (R$)	**183.492**		**181.786**	
% de Raso	**89,74%**		**90,99%**	
BP25 - Não Inflacionado	**177.254**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**188.384**		**-**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Forte São Marcelo					
Tipo:	**Varanda**		**Varanda + Vg Moto**		**Varanda + Vg Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	201.547		204.619		214.945	
Renda Inicial (VF)	2.552		2.666		2.934	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	75%		50%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,63	1.647	0,97	2.661	0,88	2.661
FGTS	1,06	2.784	1,10	3.012	1,01	3.036
Financiamento	92,95%	149.265	92,72%	153.374	93,65%	162.617
Subsídio	85,27%	15.811	97,32%	14.926	118,50%	10.996
Prazo de Pró-soluto	20	20	20	20	20	20
Pró-Soluto	87,00%	16.134	87,07%	16.867	82,22%	17.530
Preço Raso (RS)	185.641	185.641	190.841	190.841	196.840	196.840
TCD	81,23%	20.894	76,40%	20.530	70,16%	20.749
VSO	2	2	5	5	8	8
Preço de Venda	**201.302**	**201.302**	**206.015**	**206.015**	**212.075**	**212.075**
Elasticidade	2,600%	2,600%	2,600%	2,600%	2,600%	2,600%
Preço de Venda Final	**206.535**	**206.535**	**211.371**	**211.371**	**217.589**	**217.589**
Preço Raso (R$)	**185.641**		**190.841**		**196.840**	
% de Raso	**89,88%**		**90,29%**		**90,46%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-	

Resumo de Preços

Vision

Nome Fase	Tipologia	Renda	Ato	FGTS	Cond.	Subsídio	PSOL	TCD	VSO	Nom. Pré	Avali.	Elast.	Nom. Pós	Raso Pós	PSOL (m)	RET1
Parque da Cidade	Uh tipo	2.387	0,50	0,39	93,1%	106,5%	77,8%	89,0%	28	204.430	206.547	4,8077%	214.258	192.840	28	75%
Parque da Cidade	Varanda	2.552	0,63	1,06	91,8%	85,3%	88,9%	83,0%	17	207.592	211.547	4,8077%	217.572	196.228	28	50%
Parque da Cidade	Varanda + Vg Carro	2.934	0,88	1,01	91,9%	118,5%	84,0%	71,7%	9	218.909	221.547	4,8077%	229.433	208.238	28	25%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Informações Gerais – Consolidado (Cenário Aprovação)

Forte São Marcelo - BA - Salvador Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	mai-24							
Ft S Marcelo - uh tipo		dez-25	jun-26	set-27	6 meses	15 meses	dez-28	36 meses
Ft S Marcelo - Uh varanda		dez-25	jun-26	set-27	6 meses	15 meses	dez-28	36 meses
Ft S Marcelo - Uh Var + moto		dez-25	jun-26	set-27	6 meses	15 meses	dez-28	36 meses
Ft S Marcelo - Uh var + carro		dez-25	jun-26	set-27	6 meses	15 meses	dez-28	36 meses
Pq da Cidade - Uh tipo		jan-27	jul-27	jun-29	6 meses	23 meses	jan-30	36 meses
Pq da Cidade - Uh varanda		jan-27	jul-27	jun-29	6 meses	23 meses	jan-30	36 meses
Pq da Cidade - Uh var + carro		jan-27	jul-27	jun-29	6 meses	23 meses	jan-30	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	11,00 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	17.687 m²	**Área Líquida do Terreno:**	17.687 m²
Cash:	0,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	0	**Custo de terreno m²:**	621,7	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	621,7
Permuta Financeira:	11,00 MM (3,56%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):**	3,6% / 49,8%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.**	2,0 / 1,0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,69 MM	**Incorridos de Incorporação:**	0,33 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Ft S Marcelo - uh tipo	T+4	183.492	288	204.459	201.547	93,4%	76,2%	87,1%
Ft S Marcelo - Uh varanda	T+4	185.641	28	206.535	201.547	93,0%	87,0%	81,2%
Ft S Marcelo - Uh Var + moto	T+4	190.841	62	211.371	204.619	92,7%	87,1%	76,4%
Ft S Marcelo - Uh var + carro	T+4	196.840	98	217.589	214.945	93,7%	82,2%	70,2%
Pq da Cidade - Uh tipo	T+4	192.840	504	214.258	206.547	93,1%	77,8%	89,0%
Pq da Cidade - Uh varanda	T+4	196.228	297	217.572	211.547	91,8%	88,9%	83,0%
Pq da Cidade - Uh var + carro	T+4	208.238	162	229.433	221.547	91,9%	84,0%	71,7%

Unidades Totais:	1.439	**Preço Médio:**	214.642	**Renda Média:**	2.535	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	7.239
Unidades Tenda:	1.439	**Avaliação Média:**	208.658	**Ato:**	1.569 (0,62 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	12.690
VSO:	45,5 Unidades	**VGV Total:**	308.869.159	**FGTS:**	1.734 (0,68 Salários)	**Preço Raso Médio:**	193.448
RET Médio:	2,2%	**VGV Tenda:**	308.869.159	**% em RET 1%:**	61%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit.:	99.308	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	35,44	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**46.917.842**	**LI:**	**23,13%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**16.652.198**	**Margem Bruta Econômica:**	**43,07%**
TIR:	**123,10%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(13.414.881)**	**Margem Bruta REF:**	**45,19%**
Exposição de Caixa:	**5,19%**	**Δ LI:**	**3,13%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(3.560.311)**	**Margem Rasa Econômica:**	**36,10%**
Payback Contingente (21 m):	**17 m/ (-4 m)**	**LI Marginal:**	**23,66%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**95.195.830**	**Margem Rasa REF:**	**39,20%**
Payback Consolidado:	**29 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,67%**

DRE (Cenário Aprovação)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Forte São Marcelo		Ft S Marcelo - uh tipo		Ft S Marcelo - Uh varanda		Ft S Marcelo - Uh Var + moto		Ft S Marcelo - Uh Var + carro		Pq da Cidade - Uh tipo		Pq da Cidade - Uh varanda		Pq da Cidade - Uh Var + carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	321.042	100,0%	58.939	100,0%	5.758	100,0%	13.060	100,0%	21.251	100,0%	114.624	100,0%	68.244	100,0%	39.166	100,0%
PIS/COFINS	(3.822)	1,2%	(565)	1,0%	(55)	1,0%	(179)	1,4%	(291)	1,4%	(1.099)	1,0%	(935)	1,4%	(698)	1,8%
Custo Total	(180.607)	56,9%	(35.209)	60,3%	(3.435)	60,2%	(7.593)	58,9%	(12.017)	57,3%	(64.024)	56,4%	(37.699)	56,0%	(20.629)	53,6%
Custo Terreno	(10.996)	3,5%	(2.691)	4,6%	(264)	4,6%	(599)	4,7%	(976)	4,7%	(3.317)	2,9%	(2.007)	3,0%	(1.141)	3,0%
Custo Relacionados a Terreno	(365)	0,1%	(73)	0,1%	(7)	0,1%	(16)	0,1%	(25)	0,1%	(128)	0,1%	(75)	0,1%	(41)	0,1%
Custos de Incorporação	(6.067)	1,9%	(1.143)	2,0%	(121)	2,1%	(239)	1,9%	(364)	1,7%	(2.254)	2,0%	(1.246)	1,9%	(700)	1,8%
Custo de Construção	(163.179)	51,4%	(31.302)	53,6%	(3.043)	53,4%	(6.739)	52,3%	(10.652)	50,8%	(58.325)	51,4%	(34.370)	51,1%	(18.747)	48,7%
Lucro Bruto Econômico	136.613	43,1%	23.164	39,7%	2.268	39,8%	5.288	41,1%	8.943	42,7%	49.500	43,6%	29.610	44,0%	17.839	46,4%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	136.613	43,1%	23.164	39,7%	2.268	39,8%	5.288	41,1%	8.943	42,7%	49.500	43,6%	29.610	44,0%	17.839	46,4%
Despesas de Selling	(31.928)	10,1%	(5.984)	10,3%	(587)	10,3%	(1.325)	10,3%	(2.148)	10,2%	(11.291)	9,9%	(6.741)	10,0%	(3.852)	10,0%
Contingência	(7.384)	2,3%	(1.356)	2,3%	(132)	2,3%	(300)	2,3%	(489)	2,3%	(2.636)	2,3%	(1.570)	2,3%	(901)	2,3%
Margem de Contribuição	97.301	30,7%	15.825	27,1%	1.548	27,1%	3.663	28,4%	6.307	30,1%	35.573	31,3%	21.300	31,6%	13.086	34,0%
IR e CSLL	(3.127)	1,0%	(462)	0,8%	(45)	0,8%	(146)	1,1%	(238)	1,1%	(899)	0,8%	(765)	1,1%	(571)	1,5%
Margem Líquida	94.174	29,7%	15.362	26,3%	1.503	26,4%	3.516	27,3%	6.068	29,0%	34.673	30,5%	20.535	30,5%	12.516	32,5%
Lucro Bruto REF Unit.	102.685	45,2%	86.080	41,5%	88.385	42,2%	92.722	43,3%	98.647	44,8%	105.444	45,6%	108.704	46,3%	121.318	48,9%
Lucro Raso REF Unit.	80.280	39,2%	64.853	34,9%	67.215	35,7%	71.951	37,2%	77.670	39,0%	82.329	39,5%	85.685	40,4%	98.445	43,8%

R$ Mil - VPL - Compra	Forte São Marcelo		Ft S Marcelo - uh tipo		Ft S Marcelo - Uh varanda		Ft S Marcelo - Uh Var + moto		Ft S Marcelo - Uh Var + carro		Pq da Cidade - Uh tipo		Pq da Cidade - Uh varanda		Pq da Cidade - Uh Var + carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	202.852	100,0%	44.161	100,0%	4.286	100,0%	9.824	100,0%	16.025	100,0%	66.266	100,0%	39.546	100,0%	22.744	100,0%
PIS/COFINS	(2.365)	1,2%	(417)	0,9%	(40)	0,9%	(133)	1,3%	(216)	1,3%	(626)	0,9%	(534)	1,3%	(399)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(153.569)	75,7%	(34.358)	77,8%	(3.351)	78,2%	(7.479)	76,1%	(11.893)	74,2%	(50.213)	75,8%	(29.776)	75,3%	(16.500)	72,5%
Custo Terreno	(7.106)	3,5%	(1.891)	4,3%	(184)	4,3%	(422)	4,3%	(688)	4,3%	(2.011)	3,0%	(1.217)	3,1%	(692)	3,0%
Custo Relacionados a Terreno	(381)	0,2%	(76)	0,2%	(7)	0,2%	(16)	0,2%	(26)	0,2%	(134)	0,2%	(79)	0,2%	(43)	0,2%
Custos de Incorporação	(4.795)	2,4%	(1.025)	2,3%	(110)	2,6%	(215)	2,2%	(326)	2,0%	(1.674)	2,5%	(924)	2,3%	(521)	2,3%
Custo de Construção	(112.530)	55,5%	(25.185)	57,0%	(2.449)	57,1%	(5.422)	55,2%	(8.570)	53,5%	(37.109)	56,0%	(21.868)	55,3%	(11.928)	52,4%
Despesas de Selling	(24.349)	12,0%	(5.283)	12,0%	(514)	12,0%	(1.172)	11,9%	(1.906)	11,9%	(7.977)	12,0%	(4.778)	12,1%	(2.718)	12,0%
Contingência	(2.473)	1,2%	(555)	1,3%	(54)	1,3%	(123)	1,3%	(200)	1,2%	(795)	1,2%	(473)	1,2%	(272)	1,2%
IR e CSLL	(1.935)	1,0%	(341)	0,8%	(33)	0,8%	(108)	1,1%	(177)	1,1%	(512)	0,8%	(437)	1,1%	(326)	1,4%
Lucro Imobiliário	46.918	23,1%	9.386	21,3%	894	20,9%	2.212	22,5%	3.916	24,4%	15.427	23,3%	9.236	23,4%	5.845	25,7%

Comparativo – Última Aprovação (Farol da Barra)

Comparativo dos Estudos - Primeira Fase	Anterior	Atual	Atual vs Anterior	Δ%
Data Estudo:	março-25	novembro-25	8 Meses	N/A
Lançamento:	maio-26	dezembro-25	-5 Meses	N/A
Uhs:	476	476	-	0,0%
Preço Nominal:	205.905	208.185	2.280	1,1%
Preço Raso:	183.622	187.323	3.702	2,0%
Preço Nominal Inflacionado:	224.030	210.971	(13.059)	-5,8%
Preço Raso Inflacionado:	199.814	189.858	(9.956)	-5,0%
Renda Média:	2.282	2.546	264	11,6%
RET Médio:	1,8%	2,0%	2,2 p.p.	14,4%
% em RET 1%:	75,0%	66,6%	61,4 p.p.	-11,2%
Ato:	0,5	0,6	0,1	19,9%
FGTS:	0,4	0,6	0,3	81,3%
VSO:	37	37	-	0,0%
VSO2:	37	37	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	7.185	8.221	1.036	14,4%
Avaliação:	196.000	204.705	8.705	4,4%
Cond. Financiamento:	91,7%	93,3%	1,6 p.p.	1,8%
Subsídio Utilizado:	110,1%	106,5%	-3,5 p.p.	-3,2%
Percentual Pró-Soluto:	86,6%	79,5%	-7,1 p.p.	-8,2%
Percentual utilização TCD:	96,9%	81,9%	-15,0 p.p.	-15,5%
Prazo construção F1:	14	15	1	7,1%
Prazo de Pró-Soluto F1:	19	20	20	5,3%
Custo Total Inf (Unit):	134.416	122.383	-12.033	-9,0%
Custo Construção (Unit):	94.557	99.541	4.984	5,3%
Custo Construção Corrigido:	94.557	99.541	4.984	5,3%
Fração de construção:	45,9%	47,8%	189%	4,1%
INCC Folha Rosto:	1.169,12	1.218,75	49,63	4,2%
Custo Terreno Inf:	6.306.887	4.530.518	-1.776.369	-28,2%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	23	253	230	991,9%
Fração do Terreno[1]:	6,00%	3,56%	-243,64%	-40,6%
Custo de Incorp. por uh:	11.806	3.923	-7.883	-66,8%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	3.419.870	3.913.000	493.130	14,4%
Custo do Ciclo (Unit):	12.106	12.690	584	4,8%
Lucro Imobiliário:	23,9%	22,1%	-1,8 p.p.	-7,5%
LI Marginal:	25,7%	22,6%	-3,1 p.p.	-12,2%
Exposição de caixa:	18,4%	13,0%	-5,4 p.p.	-29,4%
TIR:	128,2%	178,0%	49,8 p.p.	38,8%
Margem Bruta REF:	44,0%	42,5%	-1,5 p.p.	-3,4%
Margem Bruta Econômica:	38,6%	40,5%	1,9 p.p.	5,0%
Margem Rasa REF:	37,2%	36,1%	-1,1 p.p.	-3,0%
Margem Rasa Econômica:	30,5%	33,3%	2,8 p.p.	9,2%
Margem Contribuição Econômica:	30,0%	27,9%	-2,1 p.p.	-7,0%
Payback Contingente (Régua 20 m):	N/A	17 m/ (-4 m)	N/A	
Payback Consolidado:	15 Meses	16 Meses	1 Meses	6,7%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Informações Gerais – Consolidado (Cenário Real)

Forte São Marcelo - BA - Salvador Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	jan-11							
Ft S Marcelo - uh tipo		dez-25	fev-26	mai-27	2 meses	15 meses	dez-28	36 meses
Ft S Marcelo - Uh varanda		dez-25	fev-26	mai-27	2 meses	15 meses	dez-28	36 meses
Ft S Marcelo - Uh Var + moto		dez-25	fev-26	mai-27	2 meses	15 meses	dez-28	36 meses
Ft S Marcelo - Uh var + carro		dez-25	fev-26	mai-27	2 meses	15 meses	dez-28	36 meses
Pq da Cidade - Uh tipo		jan-27	jul-27	jun-29	6 meses	23 meses	jan-30	36 meses
Pq da Cidade - Uh varanda		jan-27	jul-27	jun-29	6 meses	23 meses	jan-30	36 meses
Pq da Cidade - Uh var + carro		jan-27	jul-27	jun-29	6 meses	23 meses	jan-30	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	6,35 MM	**Incorrido Terreno:**	6,35 MM	**Área do Terreno (100%):**	17.687 m²
Cash:	6,35 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	10	**Custo de terreno m²:**	359,1
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	2.125
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	2.125
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,78 MM

Área Líquida do Terreno:	17.687 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	359,1
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	2,1% / 50,1%
CA Máx/Proj.	2,0 / 1,0
Incorridos de Incorporação:	0,36 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Ft S Marcelo - uh tipo	T+4	177.791	288	198.404	201.547	93,7%	74,9%	85,7%
Ft S Marcelo - Uh varanda	T+4	179.330	28	199.871	201.547	93,7%	85,5%	79,9%
Ft S Marcelo - Uh Var + moto	T+4	184.298	62	204.481	204.619	93,2%	85,6%	75,1%
Ft S Marcelo - Uh var + carro	T+4	190.065	98	210.463	214.945	94,9%	80,8%	69,0%
Pq da Cidade - Uh tipo	T+4	185.586	504	206.199	206.547	93,1%	74,9%	85,7%
Pq da Cidade - Uh varanda	T+4	188.847	297	209.388	211.547	91,8%	85,5%	79,9%
Pq da Cidade - Uh var + carro	T+4	200.405	162	220.803	221.547	91,9%	80,8%	69,0%

Unidades Totais:	1.439	**Preço Médio:**	207.035	**Renda Média:**	2.535	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	6.983
Unidades Tenda:	1.439	**Avaliação Média:**	208.658	**Ato:**	1.569 (0,62 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	12.242
VSO:	95 Unidades	**VGV Total:**	297.922.709	**FGTS:**	1.734 (0,68 Salários)	**Preço Raso Médio:**	186.495
RET Médio:	1,9%	**VGV Tenda:**	297.922.709	**% em RET 1%:**	69%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit.:	99.308	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	35,44	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**-22.320.040**	**LI:**	**-10,96%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**23.632.203**	**Margem Bruta Econômica:**	**39,71%**
TIR:	**16,27%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(2.503.453)**	**Margem Bruta REF:**	**40,99%**
Exposição de Caixa:	**7,58%**	**Δ LI:**	**-30,96%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(3.881.214)**	**Margem Rasa Econômica:**	**32,35%**
Payback Contingente (21 m):	**14 m/ (-7 m)**	**LI Marginal:**	**23,41%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**89.448.830**	**Margem Rasa REF:**	**34,51%**
Payback Consolidado:	**26 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**27,43%**

DRE (Cenário Real)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Forte São Marcelo		Ft S Marcelo - uh tipo		Ft S Marcelo - Uh varanda		Ft S Marcelo - Uh var + moto		Ft S Marcelo - Uh var + carro		Pq da Cidade - Uh tipo		Pq da Cidade - Uh varanda		Pq da Cidade - Uh var + carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	311.814	100,0%	57.455	100,0%	5.621	100,0%	12.721	100,0%	20.698	100,0%	111.032	100,0%	66.229	100,0%	38.057	100,0%
PIS/COFINS	(3.284)	1,1%	(551)	1,0%	(54)	1,0%	(174)	1,4%	(284)	1,4%	(1.065)	1,0%	(635)	1,0%	(521)	1,4%
Custo Total	(186.007)	60,3%	(35.297)	62,0%	(3.443)	61,8%	(7.605)	60,6%	(12.028)	58,9%	(66.789)	60,7%	(39.312)	59,9%	(21.532)	57,4%
Custo Terreno	(17.348)	5,6%	(3.298)	5,8%	(322)	5,8%	(723)	5,8%	(1.164)	5,7%	(6.132)	5,6%	(3.649)	5,6%	(2.060)	5,5%
Custo Relacionados a Terreno	(377)	0,1%	(75)	0,1%	(7)	0,1%	(16)	0,1%	(26)	0,1%	(132)	0,1%	(78)	0,1%	(43)	0,1%
Custos de Incorporação	(6.033)	2,0%	(1.123)	2,0%	(119)	2,1%	(235)	1,9%	(357)	1,7%	(2.254)	2,0%	(1.246)	1,9%	(700)	1,9%
Custo de Construção	(162.248)	52,6%	(30.802)	54,1%	(2.995)	53,8%	(6.631)	52,8%	(10.481)	51,3%	(58.271)	53,0%	(34.338)	52,4%	(18.730)	49,9%
Lucro Bruto Econômico	122.523	39,7%	21.607	38,0%	2.124	38,2%	4.942	39,4%	8.386	41,1%	43.178	39,3%	26.282	40,1%	16.003	42,6%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	122.523	39,7%	21.607	38,0%	2.124	38,2%	4.942	39,4%	8.386	41,1%	43.178	39,3%	26.282	40,1%	16.003	42,6%
Despesas de Selling	(30.708)	10,0%	(5.705)	10,0%	(558)	10,0%	(1.283)	10,2%	(2.078)	10,2%	(10.878)	9,9%	(6.496)	9,9%	(3.709)	9,9%
Contingência	(7.172)	2,3%	(1.321)	2,3%	(129)	2,3%	(293)	2,3%	(476)	2,3%	(2.554)	2,3%	(1.523)	2,3%	(875)	2,3%
Margem de Contribuição	84.644	27,4%	14.581	25,6%	1.437	25,8%	3.367	26,8%	5.832	28,6%	29.746	27,0%	18.263	27,8%	11.419	30,4%
IR e CSLL	(2.687)	0,9%	(451)	0,8%	(44)	0,8%	(143)	1,1%	(232)	1,1%	(871)	0,8%	(520)	0,8%	(427)	1,1%
Margem Líquida	81.956	26,6%	14.130	24,8%	1.393	25,0%	3.224	25,7%	5.600	27,4%	28.875	26,3%	17.743	27,0%	10.992	29,3%
Lucro Bruto REF Unit.	89.106	41,0%	77.980	39,1%	79.384	39,5%	83.963	40,8%	89.707	42,4%	89.437	40,5%	92.751	41,3%	104.461	44,2%
Lucro Raso REF Unit.	67.599	34,5%	57.323	32,1%	58.830	32,6%	63.752	34,4%	69.294	36,3%	67.389	33,9%	70.780	35,0%	82.653	38,5%

R$ Mil - VPL - Compra	Forte São Marcelo		Ft S Marcelo - uh tipo		Ft S Marcelo - Uh varanda		Ft S Marcelo - Uh var + moto		Ft S Marcelo - Uh var + carro		Pq da Cidade - Uh tipo		Pq da Cidade - Uh varanda		Pq da Cidade - Uh var + carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	203.655	100,0%	45.774	100,0%	4.480	100,0%	10.166	100,0%	16.567	100,0%	65.226	100,0%	38.958	100,0%	22.484	100,0%
PIS/COFINS	(2.123)	1,0%	(432)	0,9%	(42)	0,9%	(137)	1,3%	(224)	1,3%	(616)	0,9%	(368)	0,9%	(303)	1,3%
Custos e Despesas Totais	(223.852)	109,9%	(48.584)	106,1%	(4.739)	105,8%	(10.550)	103,8%	(16.736)	101,0%	(74.801)	114,7%	(44.105)	113,2%	(24.338)	108,2%
Custo Terreno	(75.115)	36,9%	(14.932)	32,6%	(1.453)	32,4%	(3.222)	31,7%	(5.105)	30,8%	(26.341)	40,4%	(15.543)	39,9%	(8.519)	37,9%
Custo Relacionados a Terreno	(429)	0,2%	(86)	0,2%	(8)	0,2%	(18)	0,2%	(29)	0,2%	(150)	0,2%	(89)	0,2%	(48)	0,2%
Custos de Incorporação	(4.816)	2,4%	(1.038)	2,3%	(111)	2,5%	(218)	2,1%	(330)	2,0%	(1.674)	2,6%	(924)	2,4%	(521)	2,3%
Custo de Construção	(114.599)	56,3%	(26.276)	57,4%	(2.555)	57,0%	(5.657)	55,6%	(8.941)	54,0%	(37.248)	57,1%	(21.950)	56,3%	(11.973)	53,3%
Despesas de Selling	(24.698)	12,1%	(5.325)	11,6%	(522)	11,6%	(1.195)	11,8%	(1.941)	11,7%	(8.113)	12,4%	(4.838)	12,4%	(2.765)	12,3%
Contingência	(2.457)	1,2%	(574)	1,3%	(56)	1,3%	(127)	1,2%	(207)	1,2%	(770)	1,2%	(459)	1,2%	(264)	1,2%
IR e CSLL	(1.737)	0,9%	(354)	0,8%	(35)	0,8%	(112)	1,1%	(183)	1,1%	(504)	0,8%	(301)	0,8%	(248)	1,1%
Lucro Imobiliário	(22.320)	-11,0%	(3.243)	-7,1%	(302)	-6,7%	(521)	-5,1%	(392)	-2,4%	(10.191)	-15,6%	(5.514)	-14,2%	(2.158)	-9,6%

Obrigado
