Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento

Regional: PE

Projeto: Viva Casa Amarela 2

Data Comitê: 01/12/2025

One Page – Viva Casa Amarela II

[1]

Cidade	Recife	**Mancha de demanda**	PE - REC - Recife + Camaragibe
Regional	PE	**Cluster MPR**	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	NA		
Tipo de Comitê	Investimento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Nov

[2]

Unidades (Fases)	213 (1)	**CA Máx | Proj**	4,0 | 3,7
Unidades com Vaga (%)	1 (0%)	**Escritura | Lançamento**	mar/27 | abr/27
Unidades com Varandas (%)	85 (40%)	**Tipologia**	F2E - Concreto

[3]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	4.224 (7,7%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	4.224 (IPCA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	2.114	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[4]

Custo Construção (%VGV)	24.039 (43,8%)	**Indireto Unit.**	26.607
Prazo da Obra (meses)	16	**Torre Unit.**	59.516
Custo Total Unit. (LPU):	112.860 (96)	**Infra Unit.**	14.948
Início de Obra	out-27	**Fundação Unit.**	8.146

Preço Nominal Unit.	257.543	**VSO**	12
Preço Raso Unit.	237.036	**Referência**	Preencher
Avaliação Unit.	257.981	**Renda (% em RET 1%)**	3.738 (30,0%)



[5]

LI (Régua):	**20,2% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	38,0%
LI Resiliência:	7,8% (N/A)	**Margem Rasa Econômica:**	32,0%
Margem Bruta REF:	41,8%	**Margem Contribuição Econômica:**	26,4%
Margem Rasa REF:	**36,8%**	**Exposição (% VGV):**	6.586 (11,5%)
TIR:	142,8%	**VGV Total:**	**54.857**
Payback Contingente (21 m) :	**17 m/ (-4 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(62)
Payback Consolidado:	17	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	(3.200)

Destaques

[1]
O empreendimento está localizado no bairro de Casa Amarela, Recife, na rua Luiz Cesário de Melo a poucos metros da Avenida Norte, principal avenida da região. A área possui posição estratégica por estar em um bairro que conhecemos bem devido aos empreendimentos Jardim Casa Amarela e Viva Casa Amarela, ambos sucesso de vendas. Além disso, encontra-se próximo à diversos serviços como creche, SESI, Academias, bancos, parques, escolas, maternidade, terminal de ônibus, mercado público e supermercados. Produto totalmente inserido na malha urbana de Recife.

[2]
O projeto contempla 213 unidades habitacionais em uma torre "L" T+17 com 12 unidades por pavimento. A escolha dessa tipologia garante maior eficiência para o terreno pequeno com 2.100 m² chegando ao coeficiente de adensamento de 3,67, próximo ao limite máximo de 4,0. Com diferenciais de produto relevantes em relação ao Viva Casa Amarela I, piscina e varanda, sucesso de venda apesar não contar com esses atributos.
Esse terreno é estratégico para a Regional Pernambuco, pois abre uma nova frente de oportunidades para o desenvolvimento de negócios em áreas menores. A implantação deste projeto servirá como um importante teste e aprendizado para futuras iniciativas em terrenos compactos. Com 2.100 m², o terreno permitiu a implantação de 213 unidades.

[3]
O valor total da operação é de **R$ 4.200.000,00** pagos em 12 parcelas com a primeira em até 30 dias da outorga da escritura, que tem o prazo de 18 meses a partir da assinatura (que ocorreu em agosto/25). Essa estrutura corresponde a uma participação de 7,7% do valor total do negócio.

- O projeto tem como garantia ao vendedor a contratação de **seguro garantia**
- Contrato assinado em agosto/25 com limite para escritura fevereiro/27.
- **A PVC possui todas as resolutivas padrão, podendo sair do negócio a qualquer momento**.
- **Não há nenhum pagamento do terreno antes da escritura.**
- O projeto contempla piscina e varanda

[4] Custo
R$ 109.963 UH / Infra externa: R$ 2.897 UH / Custo total: R$ 112.860 UH
VSO conforme regra de ouro

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Viva Casa Amarela II

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	**a) Due Diligence dos Imóveis - Em andamento, previsão de conclusão em dezembro/25: i)** Negócio é constituído de 7 imóveis do 3º Registro Geral de Imóveis do Recife/PE os quais precisarão ser remembrados; **b) Due Diligence dos pesquisados - Em andamento, previsão de conclusão em dezembro/25: i)** O levantamento da liquidez jurídica dos vendedores e seus sócios/empresas está em andamento; **(ii)** Não foram verificados, até o presente momento, processos que tenham por objeto o Imóvel pretendido pela Tenda, bem como processos que envolvam pedido ou reconhecimento de grupo econômico ou de desconsideração da personalidade jurídica, que venham a trazer risco ao negócio jurídico almejado; **iii)** Há certidões fiscais dos vendedores pendentes, as quais são necessárias para a escritura, devendo ser apresentadas pelos vendedores antes da escritura para a TENDA, conforme PVC; **iv)** PVC assinada em 15/08/2025.	Ok com ressalvas	
Legalização	Conforme o levantamento planialtimétrico, a área da poligonal corresponde a 2.123,10 m². Entretanto, o somatório das 7 matrículas resulta em 2.100,00 m². Como essa diferença representa aproximadamente 1% e decorre do acúmulo de pequenas variações em centímetros nas medidas perimetrais das matrículas, considera-se que não é significativa. Assim, de acordo com o entendimento da prefeitura, não há necessidade de retificação de área, devendo-se apenas proceder ao remembramento. No que se refere aos aspectos ambientais, foi identificada contaminação do solo e apesar da prefeitura não ter um procedimento pré-estabelecido para indícios de contaminação, diante desta constatação, foi elaborado um Plano de Remediação com previsão de remoção de 23m³ do solo contaminado, com destinação adequada em aterro sanitário para resíduos perigosos. Após a conclusão dessa etapa, será elaborado uma nova análise do solo para comprovação de que o solo foi descontaminado. Essa antecipação está sendo mapeada visando mitigar questionamento na Contratação e risco para a escritura.	Ok com ressalvas	
Produto	Sem Riscos	Ok	
GETEC	Sem Riscos	Ok	
Logística	Sem Riscos	Ok	
Contratação	NA	Ok	
Inteligência de mercado	Preço vision como factivel	Ok	
Comercial/Ciclo	Ciclo está de acordo com o preço e VSO citados, visto que, trata-se de uma área sem concorrência dentro do MCMV, com adensamento populacional e em região que se destaca por ser um grande polo comercial, próximo a diversos pontos de interesse e lazer, como mercados, escolas, parques, shopping, SESI, entre outros. Além disso, já tivemos o projeto Viva Casa Amarela que superou as expectativas, tanto em volume, quanto em preço.	Ok	
Estudos Econômicos	Sem Riscos	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- REC – Recife

Lançamento

1. Alameda dos Pássaros
2. Vista do Golf
3. Morada Capibaribe
4. Viva Casa Amarela | Luiz Cesário
5. Mirante Belvedere

LandBank

6. Morada Beberibe
7. Aurora Prime
8. Boa Viagem Prime
9. Bosque Recife | Jardins Recife
10. Araça Prime
11. Parque Recife II
12. Vila Recife
13. Viva Casa Amarela 2

Cluster MPR – (Comitê)

- Cluster 1 - Vermelho

Região

Capital

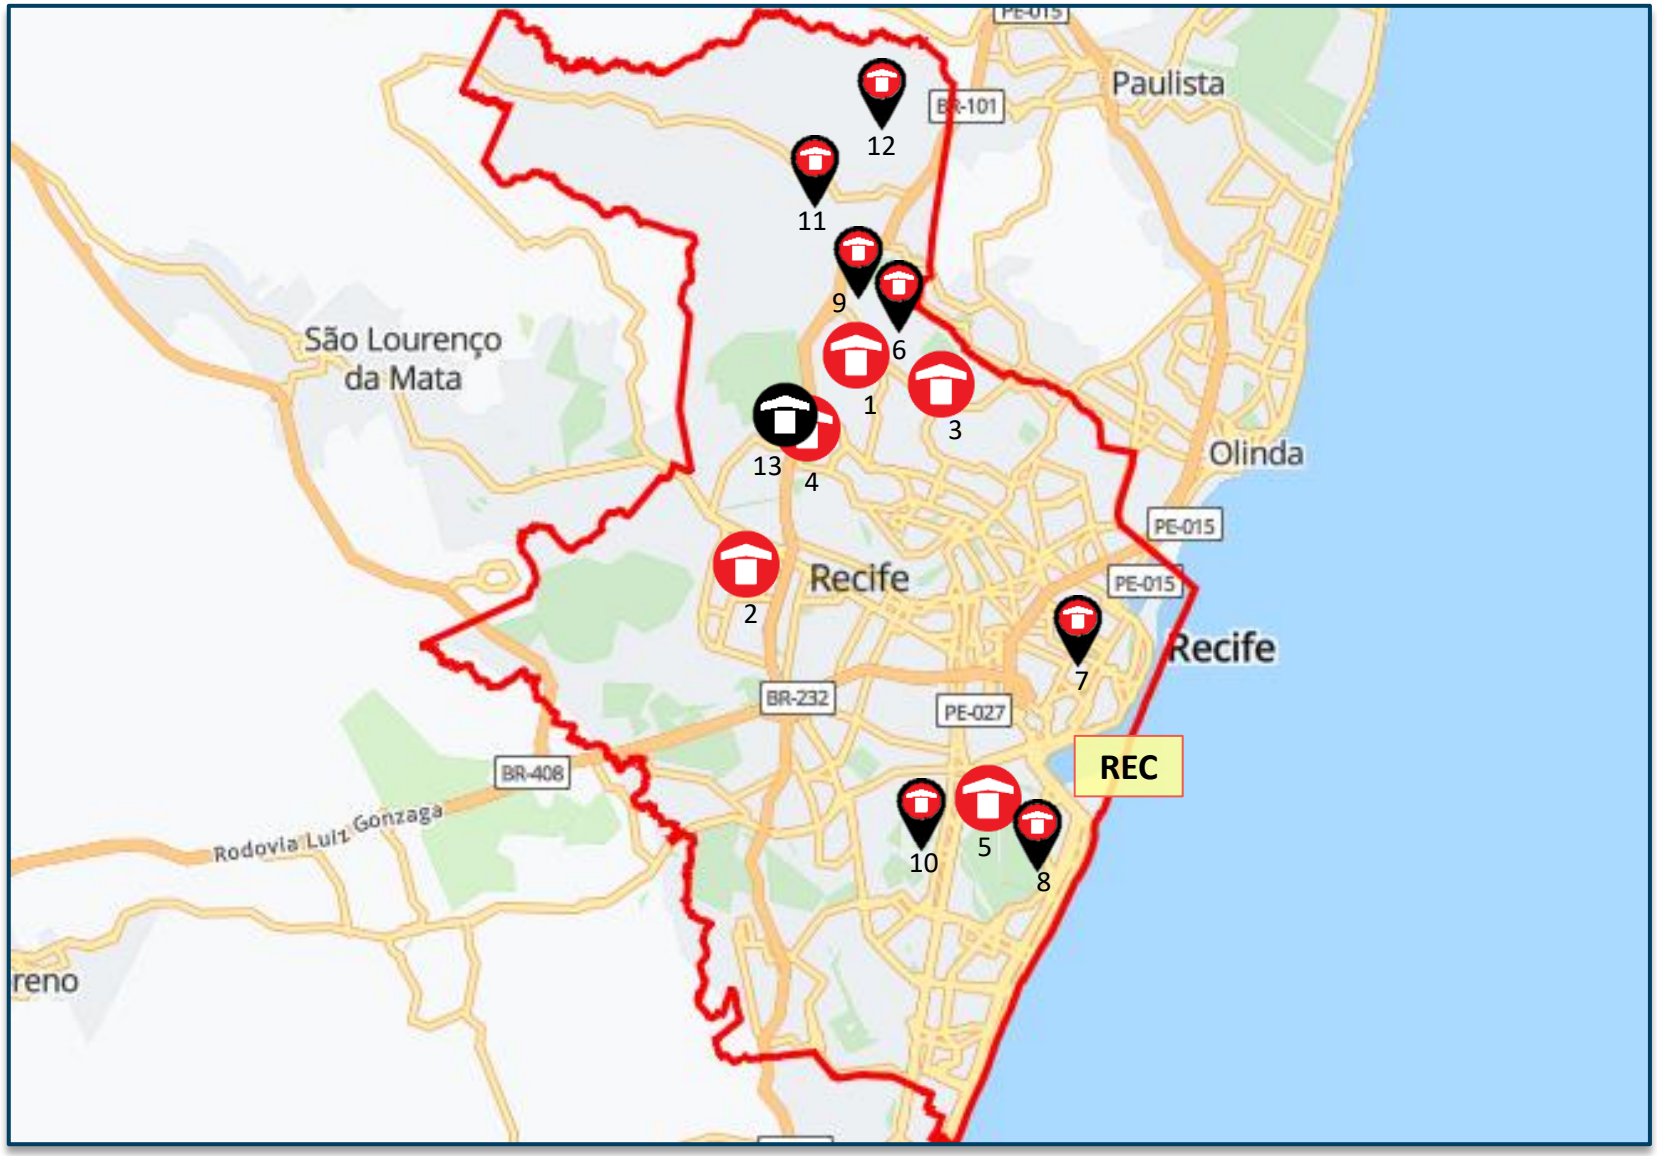

Lançados *LandBank* *Comitê*

Empreendimento Viva Casa Amarela II
Investimento

Legenda:

01 **Viva Casa Amarela II**

02 Viva Casa Amarela I

03 Creche Municipal Mardônio Coelho (700m)

04 SESI Vasco - Centro de Atividade Presidente Dutra (40m)

05 Policlínica e Maternidade Professor Barros Lima (350m)

06 Deskontão Atacado (450m)

07 Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar (230m)

08 Mercado Público de Casa Amarela (1km)

TERRENO

Rua Luiz Cesário de Melo

LOCALIZAÇÃO

PRODUTO

Empreendimento Viva Casa Amarela II
Investimento

Informações Gerais – Condomínio Único		
Terreno	**Área terreno**	2.123,27m²
	Menor poligonal	1.997,90m²
	App/fna	Não/não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim/não – 125,37m²
	Área liquida	1.631,06m²
Diretrizes Urbanísticas	**Zoneamento**	ZAC Planície 2
	Ca máximo + Incentivo	4,00 + 1,78
	Ca máximo Total	5,78
	Ca básico	1,00
	Ca projetado	3,67
	Ca liquido	4,78
	Gabarito máximo	T+21
Geral	**Total uh**	213
	Total de vagas exigido	0 (0%)
	Total de vagas projetado	0 (0%)
Tipologia	**Tipologia**	Modular com elevador
	Gabarito	T+17
	Lâmina	01 12PP (em L)
	Área privativa	36,58m²
	Varanda	50%
Condomínio	**Unidade pcd**	07 (U.A.)
	Unidade lazer|técnica	02|01
	Torre	01
	Fase	Única
Lazer	**Lazer Interno**	01-Salão de festa Gourmet, 02-Espaço Office com centro de medição, 03-Brinquedoteca
	Lazer Externo	04-PlayBaby, 05-PlayKids, 06-PlayPet, 07-Múltipla Estação, 08-Praça dos Jogos, 09-Churrasqueira Gourmet, 10-Praça de Chegada, 11-Piscina Adulto, 12-Piscina Infantil

N

Varanda

Faixa de Amenização

Obs.: Primeiro projeto com a nova LUOS Lei Municipal Nº 19.426, de 03 de Outubro de 2025 que prevê acréscimo de CA (CA de incentivo sobre a área comum não utilizada)

PRODUTO

Empreendimento Viva Casa Amarela II
Investimento

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	**Acesso Empreendimento**		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Faixa de renda**	02	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	Piscina adulto e infantil
	Atributos Torre	Sim	Varanda em uma face
	Edifício Garagem	Não	

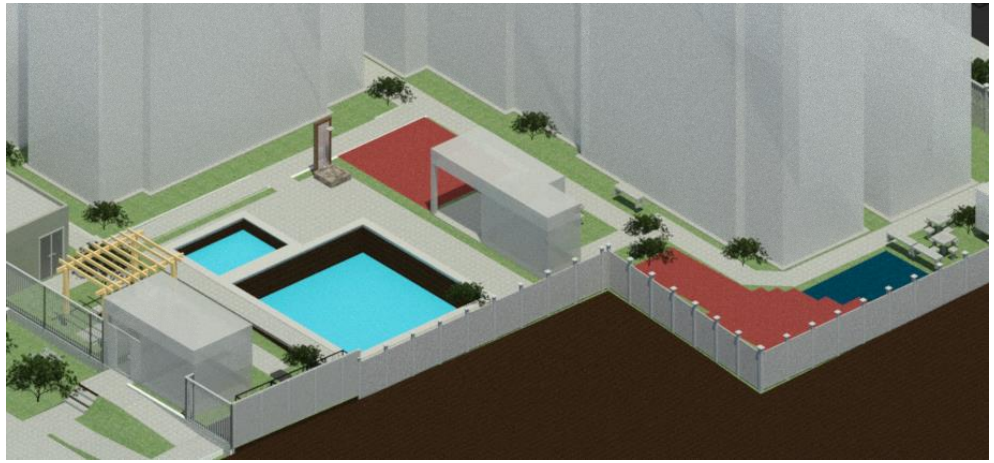

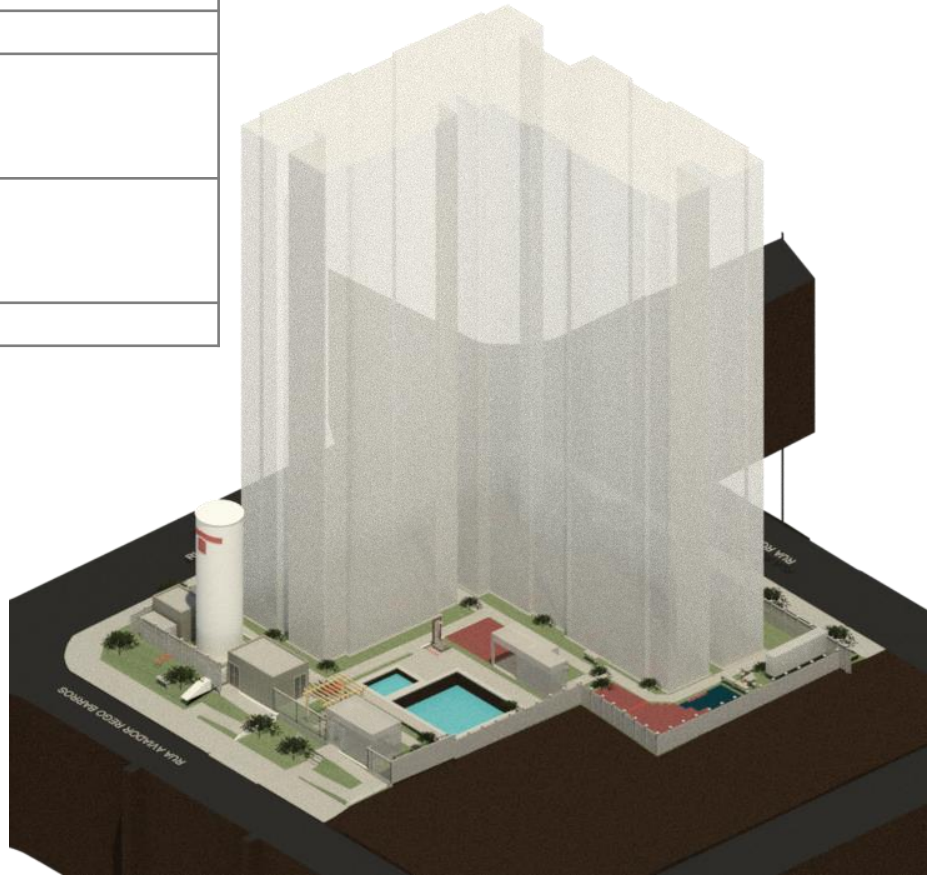

Empreendimento Viva casa amarela 2

77% vendido em 8 meses

Empreendimento Viva casa amarela 2

77% vendido
em 8 meses

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Condições do Negócio

➢ **VALOR DO NEGÓCIO**

- Valor do negócio**: R$ 4.200.000,00**
- Esse valor representa 7,7% de fração sobre a receita.

➢ **CONDIÇÃO**

- 12 parcelas de R$ 350.000,00 com a primeira em até 30 dias da outorga da escritura

➢ **PRAZOS CONTRATUAIS**

- Escritura: 18 meses
- Todas as clausulas resolutivas de saídas estão presentes no contrato.
- Suspensão dos prazos limitada a 180d: A suspensão dos prazos contratuais por atraso dos vendedores na entrega de será limitada a 180d, findo o qual voltará a correr normalmente (2.5). Esta regra não se aplica às hipóteses do 2.5.1. (entrega de processos judiciais que dependam de pedido de desarquivamento), 3.4. (fato juridicamente válido ...) e resolutivas “a” e “l” da 3.6 (registro do formal de partilha e baixa de apontamentos na CEF, caso existam). Não há suspensão da correção monetária ou multa aplicável aos vendedores.

➢ **GARANTIAS**

- Seguro fiança (0,4%)

Condições do Negócio

➢ **CORREÇÃO MONETÁRIA**

- Todos os valores mencionados serão ajustados conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) n-2 a partir da assinatura do contrato PVC.

➢ **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA**

- À empresa MMC CONSULTORIA E GESTÃO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, IMÓVEIS E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA representada por MICHEL MACEDO CAVALCANTI será pago o valor fixo e irreajustável de R$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais) o que corresponde a 5,0% do valor do negócio. O pagamento será feito em até 30 dias após a data da outorga da escritura e será de obrigação da Tenda.

➢ **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Contrato assinado 08/25
- Previsão de assinatura de Escritura: 02/2027;
- Previsão de Lançamento: 03/2027.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Comitê

	VIVA CASA AMARELA II CEN01 | R00 FASE 01	TORRES MARINA CEN03 | R03 CONSOLIDADO	CAMINHO DO MAR CEN3 | R03 CONSOLIDADO	AVENIDA SUL II CEN02 | R00 CONSOLIDADO	ARAÇÁ PRIME CEN01 | REV01	VIVA CASA AMARELA I CEN01 | R00 FASE 01
Torres	1	3	3	3	2	2
Unidades Construídas	216	534	612	518	432	340
Unidades Vendidas	213	528	603	513	428	336
Total Unidades Vendidas	213	528	603	513	428	336
Condomínios (qta.)	1	1	1	1	1	1
Cidade	Recife - PE	Paulista - PE	Paulista - PE	Recife - PE	Recife - PE	Recife - PE
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR	F2E MODULAR
Tipologia	1 Torre em L | T+17 | 12PP | CDW	1 Torre | T+14 | 10PP | C1A	1 Torre | T+17 | 10PP | CE3A	2 Torres | T+13 | 12PP | C1A	1 Torres | T+17 | 14PP	1 Torre | T+16 | 8PP | C1A
Tipologia	-	2 Torre | T+15 | 12PP | C2A	2 Torres | T+17 | 12PP | CE3A	1 Torre | T+12 | 14PP | C1A	1 Torres | T+17 | 10PP	1 Torre | T+16 | 12PP | C2A
Atributos de Projeto	Piscina | Varanda	Piscina | Varanda	Varanda	Piscina | Varanda	Piscina | Varanda	-
Projeto Infra	AP	AP	AP	AP	AP	AP
Projeto Torre	AP	EP	AP	EP	AP	AP | LO
Mês Base	novembro-25	novembro-25	setembro-25	setembro-25	junho-25	abril-24
Incc	1.222,356	1.222,356	R$ 1.216,71	R$ 1.216,71	1.184,462	1.092,685
LVS	setembro-25	setembro-25	julho-25	julho-25	maio-25	fevereiro-24
Indiretos	setembro-25	setembro-25	julho-25	julho-25	maio-25	fevereiro-24
Base de Preço	LPU 96	LPU 96	LPU 94	LPU 94	LPU 91	LPU 76
Takt	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	16	20	21	28	18	16
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 109.963	R$ / UND R$ 97.999	R$ / UND R$ 103.371	R$ / UND R$ 109.267	R$ / UND R$ 108.243	R$ / UND R$ 90.155
Indireto	R$ 26.607	R$ 19.335	R$ 17.603	R$ 22.017	R$ 19.988	R$ 19.000
Torre	R$ 59.516	R$ 55.429	R$ 59.419	R$ 54.920	R$ 58.536	R$ 52.869
Infra	R$ 14.948	R$ 14.258	R$ 12.036	R$ 13.222	R$ 13.586	R$ 12.536
Fundação	R$ 8.146	R$ 7.212	R$ 12.305	R$ 12.626	R$ 15.573	R$ 5.037
EEE	R$ 0	R$ 516	R$ 56	R$ 66	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 1.056	R$ 1.129	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 300	R$ 39	R$ 18	R$ 8	R$ 46	R$ 0
Terraplenagem	R$ 446	R$ 1.211	R$ 878	R$ 5.278	R$ 514	R$ 713
CUSTO TOTAL II	R$ 2.897	R$ 2.587	R$ 3.347	R$ 2.669	R$ 1.004	R$ 805
Urbanização	R$ 700	R$ 998	R$ 162	R$ 670	R$ 633	R$ 178
Drenagem	R$ 278	R$ 111	R$ 0	R$ 123	R$ 45	R$ 16
Extensão de Rede Elétrica	R$ 463	R$ 284	R$ 163	R$ 193	R$ 117	R$ 298
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.457	R$ 1.194	R$ 3.021	R$ 1.683	R$ 209	R$ 313
ETE + EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 1.096	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 1.096	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 0	R$ 496	R$ 520	R$ 3.495	R$ 10.794
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 0	R$ 496	R$ 520	R$ 3.495	R$ 10.794
CUSTO TOTAL I+II	R$ 112.861	R$ 100.587	R$ 106.718	R$ 111.936	R$ 109.247	R$ 90.960
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 112.861	R$ 101.683	R$ 107.214	R$ 112.456	R$ 112.742	R$ 101.755

Custo de Construção

	VIVA CASA AMARELA II CEN01 | R00 FASE 01	TORRES MARINA CEN03 | R04 CONSOLIDADO	
Torres	1	3	
Unidades Construídas	216	534	
Unidades Vendidas	213	528	
Total Unidades Vendidas	213	528	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Recife - PE	Paulista - PE	
Produto / Selo	F2E MODULAR	F2E MODULAR	
Tipologia	1 Torre em L | T+17 | 12PP | CDW	1 Torre | T+14 | 10PP | C1A	
Tipologia	-	2 Torre | T+15 | 12PP | C2A	
Atributos de Projeto	Piscina | Varanda	Piscina | Varanda	
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	EP	
Mês Base	novembro-25	novembro-25	
Incc	1.222,356	1.222,356	
LVS	setembro-25	setembro-25	
Indiretos	setembro-25	setembro-25	
Base de Preço	LPU 96	LPU 96	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	16	20	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 109.963	R$ / UND R$ 97.999	DIF R$ 11.964
Indireto	R$ 26.607	R$ 19.335	**R$ 7.272**
Torre	R$ 59.516	R$ 55.429	**R$ 4.088**
Infra	R$ 14.948	R$ 14.258	**R$ 689**
Fundação	R$ 8.146	R$ 7.212	**R$ 935**
EEE	R$ 0	R$ 516	-R$ 516
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 300	R$ 39	R$ 261
Terraplenagem	R$ 446	R$ 1.211	-R$ 765
CUSTO TOTAL II	R$ 2.897	R$ 2.587	R$ 310
Urbanização	R$ 700	R$ 998	-R$ 299
Drenagem	R$ 278	R$ 111	R$ 167
Extensão de Rede Eletrica	R$ 463	R$ 284	R$ 179
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.457	R$ 1.194	R$ 263
ETE + EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 1.096	-R$ 1.096
Incorridos	R$ 0	R$ 1.096	-R$ 1.096
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL	R$ 112.861	R$ 101.683	R$ 11.178

INDIRETOS

+703 | G11 – Serviços Técnicos (Diluição)
+1.975 | G14 – Administração (Diluição)
+842 | G15 – Canteiro (Container Verticalizado T+2/Diluição)
+1.224 | G16 – SSO (Diluição)
+1.528 | G17 – Operação do Canteiro (Diluição)
+795 | G18 – Ensaios (Ensaio de Estacas)

TORRE

+174 | Vertical (LVS estimado Torre em CDW)
+1.237 | Aço (Consumo/Taxa de Aço)
  VIVA CASA AMARELA II: 631,80 kg/uh – R$ 7,86 - **60kg/m³**
  TORRES: 483,64 kg/uh – R$ 7,86 - **38kg/m³**
-1.636 | Concreto (Consumo)
  VIVA CASA AMARELA II: 10,53 m³/uh – R$ 664,96 m³
  TORRES: 12,73 m³/uh – R$ 686,47 m³
+1.974 | Gesso Acartonado (Torre em CDW/Forro no Hall)
-153 | Revestimento Cerâmico (Projeto/Municipalidade)
+600 | Esquadrias de Madeira (Mudança de Premissa – Porta Shaft)
+269 | Esquadrias de Alumínio (Projeto)
+1.422 | Elevadores (Diluição/Preço Elevador)
  VIVA CASA AMARELA II: R$ 5,425/uh
  4 Elev. 1,5m/s 18 paradas – R$ 281.000,00 cada
  TORRES: R$ 4.282/uh
  2 Elev. 1,0m/s 15 paradas – R$ 264.000,00 cada
  6 Elev. 1,0m/s 16 paradas – R$ 269.700,00 cada

INFRA

+261 | Contenções (Projeto – maior m² de contenção/mureta)
  VIVA CASA AMARELA II: 64,78m
  TORRES: 18,69m
-871 | Outros Revestimentos de Piso (Projeto – nº de vagas)
  VIVA CASA AMARELA II: 2 vagas
  TORRES: 240 vagas
-231 | Paisagismo (Projeto – m² jardim)
  VIVA CASA AMARELA II: 780,82 m²
  TORRES: 2.254,97 m²
+1.393 | Anexos (Diluição)

FUNDAÇÃO

+1.216 | Preço
Lajão:
  VIVA CASA AMARELA II: Espessura: 0,70m e Taxa 98 kg/m³ - R$ 2.216/m³
  TORRES MARINA: Espessura: 0,75m e Taxa 120 kg/m³ - R$ 2.323/m³
Estaca Hélice com Ponteira Especial:
  VIVA CASA AMARELA II: 149 unidades R$ 3.663,00 por uh – R$ 339,10/m
Coluna de Areia e Brita:
  TORRES MARINA: 2.736 unidades R$ 1.685,00 por uh

TERRAPLENAGEM

-765 | Projeto
  VIVA CASA AMARELA II: Aterro com Importe – 701,45m³
  TORRES: Aterro com Importe – 7.060,50m³

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Considerado ligação na porta, conforme viabilidade.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Considerado ligação em rede já existente localizado na Rua Padre Lemos, com extensão de aproximadamente 290m, conforme viabilidade.

SISTEMA DE DRENAGEM
Descarte em PV existe em frente ao terreno.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado passeio em todas as testadas do terreno.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 3
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 08/2025, com validade em 08/2027.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 08/2025, com validade em 08/2027.

Drenagem:
- Não se aplica.

Elétrica:
- Viabilidade emitida em 08/2025. No pedido de ligação definitiva a concessionária pode vir a cobrar reformas necessárias, caso a infraestrutura existente não seja suficiente.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Realização de passeio em todas as testadas do terreno.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 05 furos.
- Considerada Estaca Hélice, com diâmetros de 40, 50 e 60cm e profundidade de 13, 16 e 17 m.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lanç + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Recife	REC	49%	1.939	162	2.327	194

Faixas MCMV	Empreendimento	Renda	Lançamento	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28	jul/28	ago/28	set/28	out/28	nov/28	dez/28
Faixa 1	Morada Beberibe F1	2.654	dez-25	43																					
Faixa 1	Bosque Recife	2.500	abr-26	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	4									
Faixa 3	Araçá Prime	5.211	jul-26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20											
Faixa 2	Boa Viagem Prime	4.279	out-26	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	8							
Faixa 1	Vila Recife I	2.520	fev-27	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	4								
Faixa 3	**Viva Casa Amarela 2**	**4.988**	**mar-27**		**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**9**			
Faixa 1	Jardins Recife - F1	2.506	jun-27					21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Faixa 1	Parque Recife - II - F1	1.992	out-27									24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Faixa 1	Vila Recife II	2.520	mar-28														48	48	48	48	48	48	48	48	48
Total de Vendas Lançados				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank				**167**	**136**	**136**	**136**	**157**	**157**	**157**	**157**	**181**	**181**	**177**	**157**	**141**	**142**	**113**	**105**	**105**	**105**	**102**	**93**	**93**	**93**
Total Mancha | Faixa 1				*66%*	*49%*	*49%*	*49%*	*56%*	*56%*	*56%*	*56%*	*62%*	*62%*	*63%*	*71%*	*68%*	*68%*	*82%*	*89%*	*89%*	*89%*	*91%*	*100%*	*100%*	*100%*
Total Mancha | Faixa 2				*20%*	*24%*	*24%*	*24%*	*21%*	*21%*	*21%*	*21%*	*18%*	*18%*	*19%*	*21%*	*23%*	*23%*	*7%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*
Total Mancha | Faixa 3				*14%*	*26%*	*26%*	*26%*	*23%*	*23%*	*23%*	*23%*	*20%*	*20%*	*18%*	*8%*	*9%*	*8%*	*11%*	*11%*	*11%*	*11%*	*9%*	*0%*	*0%*	*0%*

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Viva Casa Amarela 2 | Mapa Concorrência

		Viva Casa Amarela 2	Varandas De Casa Forte
		TENDA	Humaytá
	Distância Tenda (km)		1,43
Região 1 Km	População	55.637	41.659
	Dens. Demográfica	17.824	13.346
	Renda (R$)	3.359	12.591
	Classe Social	C1 (de R$ 3.1K a 5.4K)	B1 (de R$ 9.8K a 19.7K)
	PEA Dia	26.009	54.316
Quantitativo	Lançamento	mar/27	jan/25
	Unidades	213	111
	Estoque	213	85
	VSO	12	4
	Stockout	18	20
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	1	1
	Gabarito	-	T+22
	Plantas (m²)	36,86m²	26,76m² e 46,31m² e 49m²
	Tipologia	2 Dorms	1 e 2 Dorms
	Opções	Não	Garden
	Varanda	Sim	Não
	Vagas	Sem vaga	Sim
	Lazer	Piscina, Churasqueira gourmet	Piscina, Academia, Fitness Externo, Coworking, Salão de Festas, Bicicletário

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- Não possui concorrência enquadrado no MCMV na região.

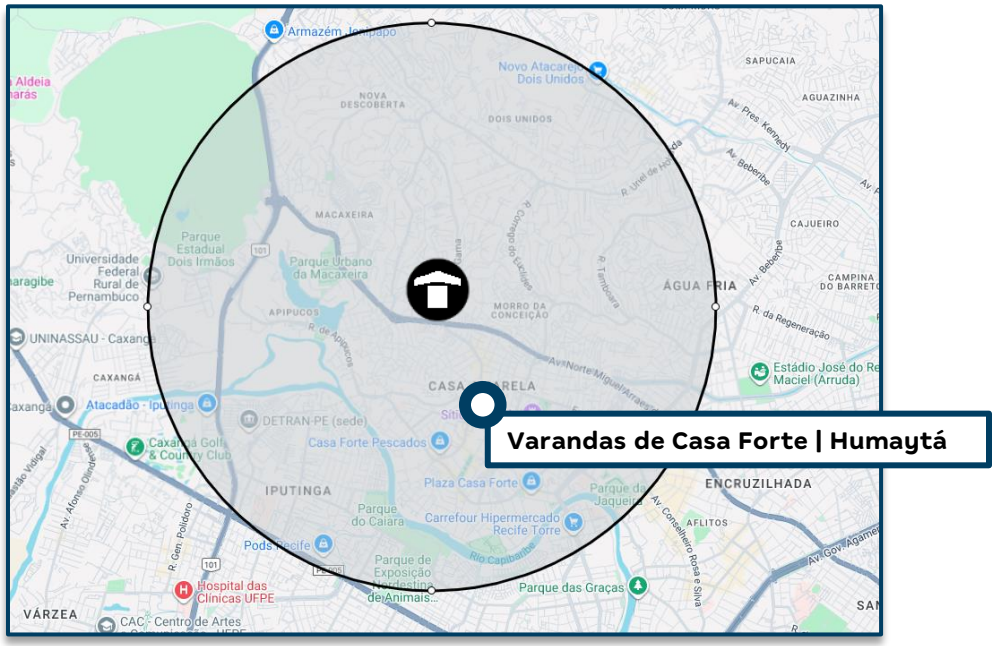

-	Viva Casa Amarela 2					Varandas De Casa Forte			
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Preço Nominal	CEF	Renda	Farol
Varanda	270.000	270.694	213.717	5.802	40%				
Uh Tipo	250.000	248.810	194.860	4.448	60%	-	-	-	-
1 Dorm						290.000	232.000	5.786	-
Varanda | Vg Carro						520.000	416.000	11.782	-
Garden | Vg Carro						500.000	400.000	13.032	-

Informações Viabilidade

Projeto:	Viva Casa Amarela 2			
Tipo:	**Uh Tipo**		**Uh Tipo**	
Método	**Ref - Viva Casa Amarela I**		**Vision**	
Avaliação	250.000		250.000	
Renda Inicial (VF)	2.805		3.198	
Renda Final*	4.255		4.448	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	2,35	6.982	2,18	7.415
FGTS	1,75	5.199	1,52	5.174
Financiamento	94,44%	167.902	95,46%	183.521
Subsídio	111,16%	13.688	114,25%	6.165
Prazo de Pró-soluto	21	21	21	21
Pró-Soluto	124,04%	26.547	108,83%	26.556
Preço Raso (RS)	220.316	220.316	228.832	228.832
TCD	20,54%	5.808	61,98%	19.979
VSO	7	7	7	7
Preço de Venda	**213.042**	**213.042**	**234.416**	**234.416**
Elasticidade	6,140%	6,140%	6,140%	6,140%
Preço de Venda Final	**226.124**	**226.124**	**248.810**	**248.810**
Preço Raso (R$)	**220.316**		**228.832**	
% de Raso	**97,43%**		**91,97%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Viva Casa Amarela 2	
Tipo:	**Varanda**	**Varanda**
Método	**Ref - Viva Casa Amarela I**	**Vision**
Avaliação	270.000	270.000
Renda Inicial (VF)	0	4.552
Renda Final*	-	5.802
% RET1	100%	0%

Tipo:	VF	R$	VF	R$
Ato	O projeto **Viva Casa Amarela I** não teve vendas de unidades com varanda		1,79	8.657
FGTS			1,45	7.013
Financiamento			96,03%	206.704
Subsídio			0,00%	0
Prazo de Pró-soluto			21	21
Pró-Soluto			77,79%	27.017
Preço Raso (RS)			249.391	249.391
TCD			46,43%	21.303
VSO			5	5
Preço de Venda			**255.034**	**255.034**
Elasticidade			6,140%	6,140%
Preço de Venda Final			**270.694**	**270.694**
Preço Raso (R$)			**249.391**	
% de Raso			**92,13%**	
BP25 - Não Inflacionado			**-**	
BP25 - Inflacionado			**-**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Viva Casa Amarela 2
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	257.981
Renda Inicial (VF)	3.738
Renda Final*	4.988

Tipo:	VF	R$
Ato	2,03	7.911
FGTS	1,50	5.908
Financiamento	95,69%	192.772
Subsídio	68,66%	3.705
Prazo de Pró-soluto	21	21
Pró-Soluto	96,44%	26.740
Preço Raso (RS)	237.036	237.036
TCD	55,77%	20.507
VSO	12	12
Preço de Venda	**241.729**	**241.729**
Elasticidade	6,140%	6,140%
Preço de Venda Final	**257.543**	**257.543**

Preço Raso (R$)	**237.036**
% de Raso	**92,04%**
Raso Todas as Fases	**237.036**
Nominal Todas as Fases	**257.543**

1

Análise de Riscos | Farol IM

IM avalia o Preço Vision como **factível**.

1) O projeto está inserido em uma região com excelentes indicadores sociodemográficos, destacando-se pela bom PEA/dia. A localização é valorizada pela proximidade a importantes pontos de interesse, como hospital, escolas e demais serviços essenciais.

Além disso, o Viva Casa Amarela I possui bons indicadores, reforça o potencial da região. Com uma avaliação superior, o Casa Amarela II apresenta um projeto ainda mais atrativo, com melhores atributos de produto e o diferencial da varanda.

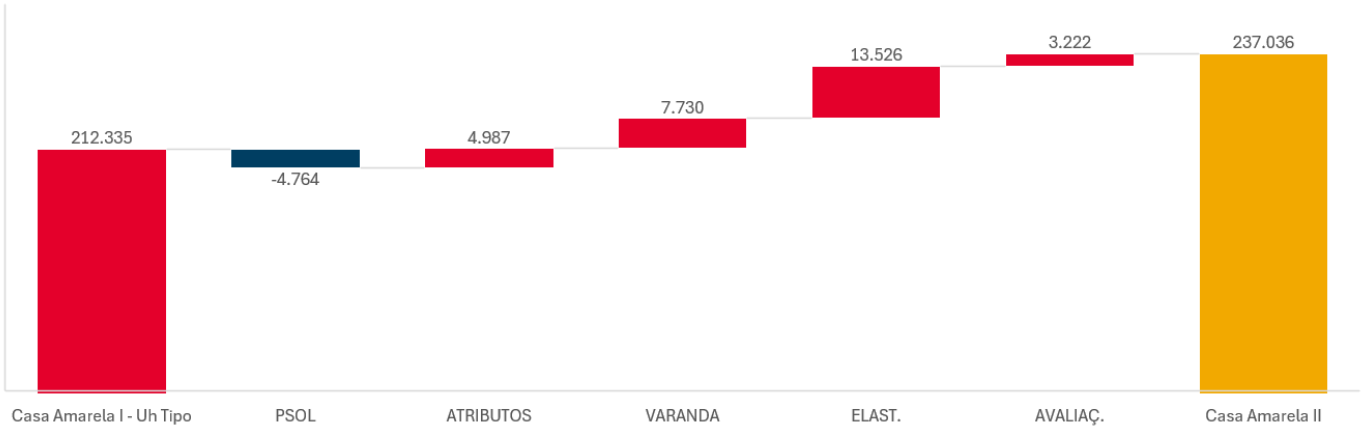

	Preço Real					Preço Normalizado (21m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Mediana	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Vista Do Golf	201.413	176.934	3.029	17	19	1.454	178.388
Viva Casa Amarela	234.023	210.398	2.836	19	25	-4.764	205.634
Mirante Belvedere	232.148	210.970	2.600	37	30	-9.960	201.010
Viva Casa Amarela 2	257.981	237.036	3.738	12	21	-	237.036

Entorno

Distâncias POI Mobilidade

- Ponto de ônibus – 30m
- Avenida Norte – 140m
- Terminal Integrado da Macaxeira – 2,5km

Raio 1 Km

- Policlínica e Maternidade Barros Lima – 200m
- EREM Clotilde de Oliveira – 400 m
- Deskontão Atacado – 500m
- Mercado de Casa Amarela – 1km
- USF Prof. Mário Ramos – 1km

Viva Casa Amarela II

Parecer: Ciclo está de acordo com o preço e VSO citados, visto que, trata-se de uma área sem concorrência dentro do MCMV, com adensamento populacional e em região que se destaca por ser um grande polo comercial, próximo a diversos pontos de interesse e lazer, como mercados, escolas, parques, shopping, SESI, entre outros. Além disso, já tivemos o projeto Viva Casa Amarela que superou as expectativas, tanto em volume, quanto em preço.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Informações Gerais – Consolidado

Viva Casa Amarela 2 – PE – Recife Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	set-25							
Com varanda		abr-27	out-27	fev-29	6 meses	16 meses	abr-30	36 meses
Sem Varanda		abr-27	out-27	fev-29	6 meses	16 meses	abr-30	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	4,22 MM	Incorrido Terreno:	0,00 MM	Área do Terreno (100%):	2.123 m²	Área Líquida do Terreno:	1.998 m²
Cash:	4,22 MM	Nº de Parcelas Cash :	12	Custo de terreno m²:	1.989,4	Custo de terreno m² Área Líquida:	2.114,2
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			VaR 25 (R$ mil):	0	Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	7,7% / 51,5%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			VaR 26 (R$ mil):	0	CA Máx/Proj.	4,0 / 3,7
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			Incorrido de Construção:	0,00 MM	Incorridos de Incorporação:	0,08 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Com varanda	T+17	249.391	85	270.694	270.000	96,0%	77,8%	46,4%
Sem Varanda	T+17	228.832	128	248.810	250.000	95,5%	108,8%	62,0%

Unidades Totais:	213	Preço Médio:	257.543	Renda Média:	3.738	ITBI+Emol. Unit. Médio:	9.209
Unidades Tenda:	213	Avaliação Média:	257.981	Ato:	7.581 (2,03 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	14.461
VSO:	12 Unidades	VGV Total:	54.856.723	FGTS:	5.589 (1,5 Salários)	Preço Raso Médio:	237.036
RET Médio:	3,1%	VGV Tenda:	54.856.723	% em RET 1%:	30%	Adc. Tx. de Aceleração Médio:	750

Construção

Custo Total Unit.:	112.860	Eventuais:	4,00%	Área priv (m²):	36,86	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	6.967.012	LI:	20,20%	Exposição de Caixa (R$):	6.586.303	Margem Bruta Econômica:	38,00%
TIR:	142,81%	LI Aprovação:	20,00%	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(62.275)	Margem Bruta REF:	41,80%
Exposição de Caixa:	11,46%	Δ LI:	0,20%	Ger. Caixa 24 meses (R$):	(3.199.830)	Margem Rasa Econômica:	32,05%
Payback Contingente (21 m):	17 m/ (-4 m)	LI Resiliência:	7,81%	Ger. Caixa Marginal (R$):	14.202.653	Margem Rasa REF:	36,77%
Payback Consolidado:	17 meses					Margem de Contribuição Econômica:	26,44%

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Viva Casa Amarela 2		Com varanda		Sem Varanda	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	57.447	100,0%	24.163	100,0%	33.284	100,0%
PIS/COFINS	(986)	1,7%	(530)	2,2%	(456)	1,4%
Custo Total	(35.004)	62,0%	(13.970)	59,1%	(21.033)	64,1%
Custo Terreno	(4.940)	8,7%	(1.971)	8,3%	(2.969)	9,0%
Custo Relacionados a Terreno	(362)	0,6%	(145)	0,6%	(218)	0,7%
Custos de Incorporação	(1.334)	2,4%	(534)	2,3%	(800)	2,4%
Custo de Construção	(28.367)	50,2%	(11.320)	47,9%	(17.047)	51,9%
Lucro Bruto Econômico	21.458	38,0%	9.663	40,9%	11.795	35,9%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	21.458	38,0%	9.663	40,9%	11.795	35,9%
Despesas de Selling	(5.209)	9,2%	(2.353)	10,0%	(2.856)	8,7%
Contingência	(1.321)	2,3%	(556)	2,4%	(766)	2,3%
Margem de Contribuição	14.928	26,4%	6.754	28,6%	8.173	24,9%
IR e CSLL	(806)	1,4%	(433)	1,8%	(373)	1,1%
Margem Líquida	14.121	25,0%	6.321	26,7%	7.800	23,8%
Lucro Bruto REF Unit.	117.021	41,8%	131.195	44,6%	107.608	39,8%
Lucro Raso REF Unit.	94.759	36,8%	108.085	39,9%	85.909	34,5%

R$ Mil - VPL - Compra	Viva Casa Amarela 2		Com varanda		Sem Varanda	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	34.487	100,0%	14.549	100,0%	19.938	100,0%
PIS/COFINS	(583)	1,7%	(314)	2,2%	(269)	1,3%
Custos e Despesas Totais	(26.937)	78,1%	(11.018)	75,7%	(15.919)	79,8%
Custo Terreno	(2.822)	8,2%	(1.126)	7,7%	(1.696)	8,5%
Custo Relacionados a Terreno	(313)	0,9%	(125)	0,9%	(188)	0,9%
Custos de Incorporação	(987)	2,9%	(394)	2,7%	(593)	3,0%
Custo de Construção	(18.330)	53,1%	(7.315)	50,3%	(11.015)	55,2%
Despesas de Selling	(3.579)	10,4%	(1.620)	11,1%	(1.959)	9,8%
Contingência	(429)	1,2%	(180)	1,2%	(248)	1,2%
IR e CSLL	(477)	1,4%	(257)	1,8%	(220)	1,1%
Lucro Imobiliário	6.967	20,2%	3.218	22,1%	3.749	18,8%

Obrigado
