Tenda

sua próxima conquista

Book de Escritura e Lançamento

Regional: CE

Projeto: Laguna Ville

Data Comitê: 08/12/2025

One Page – Laguna Ville- Aprovação

Cidade	Fortaleza	Mancha de demanda	CE - FOR - Fortaleza Centro-Sul
Regional	CE	Cluster MPR	2 - Amarelo
Cenário de Aprovação	Aprovação	Tipo de Aprovação	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura e Lançamento	Versão da VF	Versão 1.0: Dez

[2]

Unidades (Fases)	532 (1)	CA Máx | Proj	1,5 | 1,3
Unidades com Vaga (%)	219 (41%)	Escritura | Lançamento	jan/26 | fev/26
Unidades com Varandas (%)	0 (0%)	Tipologia	F2 - Concreto

[1]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	11.216 (9,9%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
Cash (Correção)	11.216 (IPCA)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	697	VAR (%VGV)	847 (0,7%)

[3]

Custo Construção (%VGV)	49.407 (43,6%)	Indireto Unit.	15.080
Prazo da Obra (meses)	16	Torre Unit.	47.438
Custo Total Unit. (LPU):	92.871 (97)	Infra Unit.	15.299
Início de Obra	ago-26	Fundação Unit.	7.110

Preço Nominal Unit.	213.044	VSO	41
Preço Raso Unit.	193.042	Referência	VISION
Avaliação Unit.	219.601	Renda (% em RET 1%)	2.769 (60,8%)

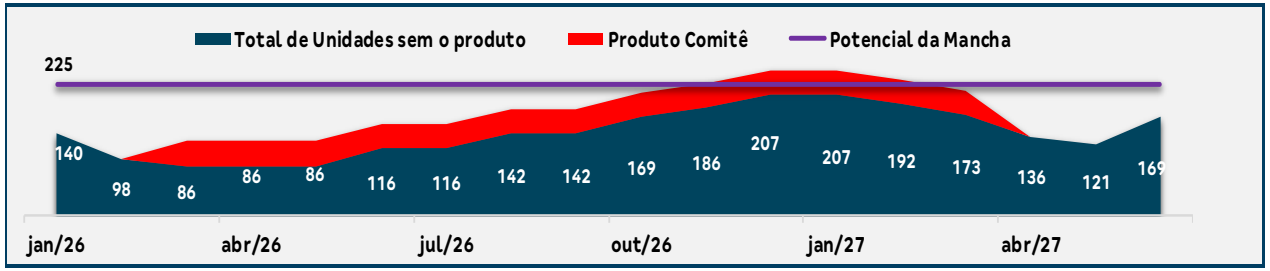

LI (Régua):	20,2% (20,0%)	Margem Bruta Econômica:	38,4%
LI Marginal:	22,8%	Margem Rasa Econômica:	31,4%
Margem Bruta REF:	40,7%	Margem Contribuição Econômica:	26,8%
Margem Rasa REF:	34,6%	Exposição (% VGV):	15.619 (13,8%)
TIR:	100,3%	VGV Total:	113.339
Payback Contingente (21 m) :	16 m/ (-5 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(11.469)
Payback Consolidado:	16	Ger. Caixa 24 meses (R$):	24.061

Destaques

[1] Negócio: Sinal + Cash 36x;
Valor do negócio: R$ 10.383.750,00

Fluxo de Pagamento: **Sinal de R$ 650.000,00** (Seiscentos e cinquenta mil reais) pago em Junho/24 e, o saldo restante de **R$ 9.733.750,00** (nove milhões, setecentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais) será pago em 36 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no valor de **R$ 270.382,10** (duzentos e setenta mil, trezentos e oitenta e dois reais e dez centavos), na data da outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel em favor da Tenda. As demais 35 parcelas no valor de **R$ 270.381,94** (duzentos e setenta mil, trezentos e oitenta e um mil reais e noventa e quatro centavos), terão vencimento no mesmo dia dos meses subsequentes ao vencimento da primeira parcela acima citada.

Nota¹: Comissão de Corretagem
- Comissão de R$ 519.187,50 a ser pago 30 dias após a ECV (valor fixo e irreajustável).

Nota²: Correção pagamento de terreno.
- ***Valor do negócio corrigido R$ 11.215.569,08.***

[2] Projeto

O projeto **Laguna Ville,** possui de atributos de piscina e uma localização privilegiada. O escopo aprovado contempla:

- Piscina infantil e adulta;
- Quadra gramada;
- Churrasqueira Gourmet com banheiro;
- Playground baby e kids com piso emborrachado;
- Salão de Festa Gourmet;
- Salão de Festa com churrasqueira;
- Vaga de carro compartilhado;
- Localização Privilegiada;
- Minimarket

[3] Precificação

LAGUNA VILLE					
LAGUNA VILLE		UH	Avaliação	Cenário Aprovação	Cenário Real (Sem Cheque Moradia CE)
PREÇO NOMINAL	Sem vaga	322	R$ 216.506,00	R$ 209.577,15	R$ 208.725,72
	Com vaga carro	92	R$ 228.139,00	R$ 225.865,88	R$ 224.961,66
	Com vaga moto	118	R$ 221.388,00	R$ 212.505,94	R$ 211.637,58
PREÇO RASO	Sem vaga	322	R$ 216.506,00	R$ 189.778,00	R$ 188.926,56
	Com vaga carro	92	R$ 228.139,00	R$ 205.107,73	R$ 204.203,51
	Com vaga moto	118	R$ 221.388,00	R$ 192.543,47	R$ 191.675,10

Cenário Aprovação com 06 meses de folga de início.

One Page – Laguna Ville- Real

Cidade	Fortaleza	Mancha de demanda	CE - FOR - Fortaleza Centro-Sul
Regional	CE	Cluster MPR	2 - Amarelo
Cenário de Aprovação	Real	Tipo de Aprovação	Consolidado
Fase Anterior	N/A		
Tipo de Comitê	Escritura e Lançamento	Versão da VF	Versão 1.0: Dez

[2] Unidades (Fases)	532 (1)	CA Máx | Proj	1,5 | 1,3
Unidades com Vaga (%)	219 (41%)	Escritura | Lançamento	jan/26 | fev/26
Unidades com Varandas (%)	0 (0%)	Tipologia	F2 - Concreto

[1] Valor Líquido do Terreno (% VGV)	11.216 (9,9%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
Cash (Correção)	11.216 (IPCA)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	697	VAR (%VGV)	847 (0,8%)

[3] Custo Construção (%VGV)	49.407 (43,8%)	Indireto Unit.	15.080
Prazo da Obra (meses)	16	Torre Unit.	47.438
Custo Total Unit. (LPU):	92.871 (97)	Infra Unit.	15.299
Início de Obra	jul-26	Fundação Unit.	7.110

Preço Nominal Unit.	212.179	VSO	41
Preço Raso Unit.	192.178	Referência	VISION
Avaliação Unit.	219.601	Renda (% em RET 1%)	2.769 (60,8%)

Fase de Lançamento - Margens Novas Vendas		Preço Raso Inf. Médio Unit.	194.813
Preço Inf. Médio Unit.	215.054	Margem Bruta REF (%)	40,7%
Custo Inf. Médio Unit.	127.611	Margem Rasa REF (%)	34,5%



LI (Régua):	20,0% (20,0%)	Margem Bruta Econômica:	38,3%
LI Marginal:	22,6%	Margem Rasa Econômica:	31,3%
Margem Bruta REF:	40,7%	Margem Contribuição Econômica:	26,7%
Margem Rasa REF:	34,5%	Exposição (% VGV):	16.671 (14,8%)
TIR:	99,2%	VGV Total:	112.879
Payback Contingente (21 m) :	15 m/ (-6 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(12.821)
Payback Consolidado:	15	Ger. Caixa 24 meses (R$):	26.962

Destaques

[1] Negócio: Sinal + Cash 36x;
Valor do negócio: R$ 10.383.750,00

Fluxo de Pagamento: **Sinal de R$ 650.000,00** (Seiscentos e cinquenta mil reais) pago em Junho/24 e, o saldo restante de **R$ 9.733.750,00** (nove milhões, setecentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais) será pago em 36 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no valor de **R$ 270.382,10** (duzentos e setenta mil, trezentos e oitenta e dois reais e dez centavos), na data da outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel em favor da Tenda. As demais 35 parcelas no valor de **R$ 270.381,94** (duzentos e setenta mil, trezentos e oitenta e um mil reais e noventa e quatro centavos), terão vencimento no mesmo dia dos meses subsequentes ao vencimento da primeira parcela acima citada.

Nota¹: Comissão de Corretagem
- Comissão de R$ 519.187,50 a ser pago 30 dias após a ECV (valor fixo e irreajustável).

Nota²: Correção pagamento de terreno.
- ***Valor do negócio corrigido R$ 11.215.569,08.***

[2] Projeto

O projeto **Laguna Ville,** possui de atributos de piscina e uma localização privilegiada. O escopo aprovado contempla:
- Piscina infantil e adulta;
- Quadra gramada;
- Churrasqueira Gourmet com banheiro;
- Playground baby e kids com piso emborrachado;
- Salão de Festa Gourmet;
- Salão de Festa com churrasqueira;
- Vaga de carro compartilhado;
- Localização Privilegiada;
- Minimarket

[3] Precificação

LAGUNA VILLE					
LAGUNA VILLE		UH	Avaliação	Cenário Aprovação	Cenário Real (Sem Cheque Moradia CE)
PREÇO NOMINAL	Sem vaga	322	R$ 216.506,00	R$ 209.577,15	R$ 208.725,72
	Com vaga carro	92	R$ 228.139,00	R$ 225.865,88	R$ 224.961,66
	Com vaga moto	118	R$ 221.388,00	R$ 212.505,94	R$ 211.637,58
PREÇO RASO	Sem vaga	322	R$ 216.506,00	R$ 189.778,00	R$ 188.926,56
	Com vaga carro	92	R$ 228.139,00	R$ 205.107,73	R$ 204.203,51
	Com vaga moto	118	R$ 221.388,00	R$ 192.543,47	R$ 191.675,10

Cenário Real com 05 meses de folga de início.

Macrolocalização

Macrolocalização

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Pareceres

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Renovação Due Diligence: em andamento. Previsão de conclusão em dezembro/2025; Levantamento passivo x ativo em andamento com previsão de conclusão em dezembro/2025; Pendentes certidão de tombamento federal e SPU; Escritura de Compra e Venda e Escritura de Novação e Confissão de Dívida: lavratura prevista para janeiro/2026. Aquisição será realizada pela Tenda através de alvará judicial emitido em 2017, em processo de inventário. Registro de incorporação: previsto para fevereiro/2026.	Ok com ressalvas	
Legalização	Alvará de Construção: Projeto Legal ainda em aprovação. Previsão de emissão: 16/12/25 ASV: Autorização para supressão vegetal passível de COMAM. Reuniões estavam suspensas mas já foram retomadas indicando possível normalização. Previsão de emissão da ASV: 09/01/26.	Ok com ressalvas	
Produto	Sem riscos associados.	OK	
GETEC	Torre CDW em desenvolvimento, adotado estimativa de AP.	Ok	
Logística	Sem riscos.	Ok	
Contratação	Laudo de engenharia: Ainda não há Laudo de engenharia. Empreendimento com avaliação, entraremos com o processo de análise definitiva na CEF em 05/12. Risco: Pendente - Dependente do Laudo de Engenharia. Jurídico: Pendente RI - Previsão de emissão em 20/01/26. Com base nessa data, a conclusão da análise jurídica está estimada para 30/01/2026.	Ok com ressalvas	
Inteligência de mercado	Preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Projeto localizado em um bairro atrativo de fortaleza, dando sequência ao Residencial Vida Botânica. T+4 com adicional de piscina, igualando aos atributos principais da concorrência na tipologia sem elevador em Fortaleza. Projeto bastante relevante com a finalização do estoque do Messejana II, olhando para a volumetria de FX1. Acredita-se ser possível o atingimento do cenário proposto.	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos associados.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

PRODUTO

Empreendimento Laguna Ville
Escritura

Informações Gerais – Único		
Terreno	Área terreno	24.085,00m²
	Menor poligonal	16.093,95m²
	Doação área verde / Doação Área institucional	3.427, 09/1.141,67
	App/fna	Sim/não - 1.331,36m²
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim- 28,96/sim -2.061,97
	Área liquida	16.093,95m²
Diretrizes Urbanísticas	Zoneamento	ZRU 2 | ZPA
	Fração	30% (536uh)
	Ca máximo Total	1,50
	Ca básico	1,50
	Ca projetado	1,29
	Gabarito máximo	T+15
Geral	Total uh	532
	Total de vagas exigido	Carro 90 (17%) | moto 69 (13%)
	Total de vagas projetado	Carro 101 (19%) | moto 118 (22%)
Tipologia	Tipologia	Modular sem elevador
	Gabarito	T+4
	Lâmina	06 16pp e 01 12pp
	Área privativa	39,30m²
Condomínio	Unidade pcd	16
	Unidade lazer|técnica	08 | 00
	Torre	07
	Fase	Única
Lazer	Lazer Interno	01-Salão de festa Gourmet, 02-Espaço oficina, 03-brinquedoteca, 04-Fitness, 05-Espaço Saúde, 06-Espaço teen, 07-Sport bar, 08-Espaço officie
	Lazer Externo	09-Praça de chegada, 10-PlayPet, 11-Multipla estação, 12-Quadra gramada, 13-Espaço cultivo, 14-Salão de festa com churrasqueira, 15-Praça de jogos, 16-PlayBaby, 17-PlayKids, 18-Churrasqueira gourmet, 19-Praça dos sabores, 20-Piscina adulto, 21-Piscina infantil, 22-Redario

Obs: O Projeto urbanístico na área de Doação será entregue pela Tenda, a vegetação existente precisou ser preservada devido à solicitações da prefeitura.
-Primeira Torre CDW de CE

PRODUTO

Empreendimento Laguna Ville
Escritura

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	Acesso Empreendimento		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	Faixa de renda	1 e 2	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	Piscina adulto e infantil
	Atributos Torre	Não	
	Edifício Garagem	Não	

Empreendimento Laguna Ville
Escritura

Fase Única: 532uh – 219 vagas (Sendo 101 de carro e 118 de moto)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	o6 Blocos (T+4)	453 Uh	75 vagas de carro e 04 vagas de moto	Todos os lazeres estão contemplados no módulo 01
Módulo 02	01 Bloco (T+4)	79 UH	26 vagas de carro e 114 vagas de moto	-

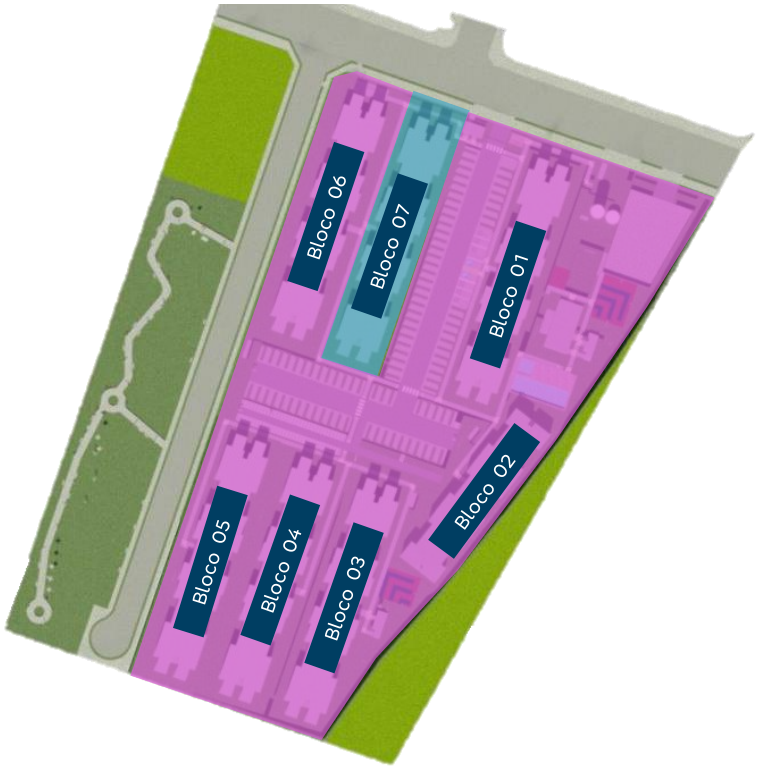

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres

Anexos

Condição do Negócio

- **PAGAMENTO DO TERRENO:**

- **Forma de pagamento**: **Sinal + Cash 36x;**

- **Valor do Negócio**: **R$ 10.383.750,00** (Dez milhões, trezentos e oitenta e três mil e setecentos e cinquenta reais) conforme PVC assinada.

- **Fluxo de Pagamento**: **Sinal de R$ 650.000,00** (Seiscentos e cinquenta mil reais) pago em Junho/24 e, o saldo restante de **R$ 9.733.750,00** (nove milhões, setecentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais) será pago em 36 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no valor de **R$ 270.382,10** (duzentos e setenta mil, trezentos e oitenta e dois reais e dez centavos), na data da outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel em favor da Tenda. As demais 35 parcelas no valor de **R$ 270.381,94** (duzentos e setenta mil, trezentos e oitenta e um mil reais e noventa e quatro centavos), terão vencimento no mesmo dia dos meses subsequentes ao vencimento da primeira parcela acima citada.

- **Correção/ajuste**: As 36 parcelas que serão pagas após ECV, serão corrigidas com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE, tomando-se como índice base para apuração do valor, o índice divulgado 02 meses antes da data base, que é a assinatura deste CONTRATO e como índice-reajuste o divulgado até o segundo mês anterior ao do efetivo pagamento de cada uma das parcelas.

- **ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS:**

- A Tenda arca com os débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel a partir da data da assinatura do contrato (**15/12/2023**), sem que tais pagamentos impliquem em assunção da posse do imóvel, cabendo aos vendedores o pagamento dos débitos vencidos anteriormente à referida data;

- Caso seja verificada, a qualquer tempo, até a integral quitação do preço de aquisição do imóvel, a existência de débitos que o onere e que sejam relativos a períodos anteriores à imissão da Tenda em sua posse, a Tenda notificará a vendedora, para que, no prazo de 10 dias, apresentem os comprovantes de pagamento dos débitos em cobrança. Caso a vendedora não o faça e ainda haja saldo a ser quitado, fica a Tenda autorizada a pagar tais débitos a quem de direito, descontando os valores comprovadamente despendidos do saldo a pagar;

- Caso a Tenda deseje que as providências ali referidas sejam feitas em prazo menor, poderá esta contribuir para a realização das medidas necessárias à conclusão daqueles procedimentos, inclusive, pagamento de débitos, arcando com as despesas necessárias para dita regularização e deduzindo todos os custos e despesas em que incorrer do Preço acordado, sendo certo que o valor de tais despesas deverá ser acordado previamente com a vendedora;

Condição do Negócio

- **ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS:**

- Os valores pagos pela Tenda nos termos do item acima serão descontados das primeiras parcelas do Preço indicada, sobre tantas parcelas quantas forem suficientes para promover a integral devolução, sendo certo que para promover o desconto em comento, os valores desembolsados serão atualizados mensalmente, pro rata die, com base na variação acumulada IPCA, divulgado pelo IBGE, tomando se como índice base para apuração do valor, o índice divulgado 02 meses antes da data do pagamento pela Tenda, e como índice-reajuste o divulgado 02 meses antes da data do efetivo reembolso à Tenda;

- A Tenda realizará o pagamento antecipado do IPTU incidente sobre o Imóvel, no prazo a ser definido a seu critério, relativo a tantas quantas parcelas forem necessárias, de forma a viabilizar os atos de legalização do empreendimento, da regularização do imóvel perante o cartório de imóveis competente, ou seja, a prática de todo e qualquer ato necessário ao lançamento temporâneo do EMPREENDIMENTO, o que fica autorizado desde já, dispensada nova anuência da Tenda, devendo os valores desembolsados serem descontados, corrigidos monetariamente nos termos citados no item anterior, das primeiras parcelas do Preço a ser paga à Tenda.

- **GARANTIAS:**

- Para a Vendedora: Os pagamentos das parcelas do preço do imóvel serão garantidos por apólice de Seguro Fiança. Em viabilidade estamos considerando uma taxa de 0,40% a.a. conforme consulta realizada ao setor de Operações Estruturadas;

- Para a Tenda: Alienação Fiduciária, tendo por objeto o imóvel, correspondente ao valor da parcela paga em Junho/24, a qual será baixada próxima a data da escritura em favor da Tenda.

- **INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA:**

- O valor fixo e irreajustável de **R$ 519.187,50** (Quinhentos e dezenove mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos);

- Será pago em parcela única em até 30 dias da Lavratura e Outorga das Escrituras de Compra e Venda em favor da Tenda à empresa **ANDRÉ ROMCY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA;**

- **PRAZOS CONTRATUAIS:**

- **Prazo para ECV:** 24 meses contados da conclusão da due dilligence com análise positiva da documentação prevista em contrato concluindo pela viabilidade da aquisição imobiliária entabulada também em contrato (Prazo máximo: **28/01/2026**);

** Em caso de inviabilidade de contratação de financiamento pela instituição financeira para construção do empreendimento por se fazer necessária a apresentação da documentação de todos os herdeiros do Espólio de Raimundo Girão e Maria Brasil Girão para permitir a contratação, as Partes convencionam que a outorga das escrituras indicadas poderá ser, a critério da Tenda, antecipada, desde que o pagamento das parcelas indicadas, inicie no prazo de 24 meses indicado no item 5.1 e desde que sejam mantidas em vigor também pelo período de 24 meses indicado no item 5.1 as condições resolutivas previstas no item 6.2.*

Condição do Negócio

- **CONDIÇÕES RESOLUTIVAS:**

- Cláusula master de saída: O não aperfeiçoamento de uma ou mais das condições resolutivas abaixo:
  - Análise positiva da viabilidade técnica e/ou financeira do empreendimento;
  - Análise positiva da viabilidade comercial do empreendimento;
  - Não apuração de condições técnica e eventualmente impeditivas do imóvel;
  - Análise jurídica positiva da documentação elencada no Anexo I do contrato.

- **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

- Além disso, conta como cláusulas resolutivas o seguinte item: Não peticionar nos autos do Processo de Inventário nº. 001403292.2005.8.06.0001, da 2ª Vara de Sucessões de Fortaleza/CE informando o juízo acerca da utilização do alvará judicial expedido em 05/10/2017 e assinado em 10/10/2017 (fls. 363 dos autos) para a celebração do presente instrumento;

- Na hipótese do contrato vir a ser resolvido, a exclusivo critério da Tenda, por ocorrência da não implementação de alguma das condições resolutivas previstas nos subitens I, II, III, IV, V, VI, “d” (Análise jurídica positiva da documentação elencada no anexo I do contrato), VII, VIII, IX, XI, XIV, XVI e XVII do item 6.2 ou no item 3.4 ou no item 3.8.2 ou, ainda, em caso de distrato do presente instrumento, o valor desembolsado pela Tenda , nos termos do item 2.1, alínea a), pago a título de princípio de pagamento, deverá ser a ela devolvido pelos vendedores, bem como todos os valores eventualmente desembolsados pela Tenda até então a título de antecipação de despesas ou pagamentos de débitos atrelados ao imóvel, em decorrência do presente instrumento, excetuando-se os custos para realização dos estudos indicados no instrumento Particular de Opção, firmado em 09 de outubro de 2023 entre as Partes, devendo tais valores a serem reembolsados à Tenda serem corrigidos nos termos citados anteriormente, e o referido reembolso realizado no prazo de até 30 dias contados do recebimento de comunicação neste sentido ou mediante a assinatura do instrumento que distratar este contrato, servindo o presente instrumento como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, CPC, podendo a Tenda, em caso de inadimplência da vendedora, executar a garantia de alienação fiduciária indicada no item 2.1.6. Na hipótese deste instrumento vir a ser resolvido por ocorrência da não implementação das condições resolutivas previstas nos subitens VI, alíneas "a", "b", e "c", XI, XII ou XIII, os valores desembolsados pela Tenda, indicados no item 2.1, "a", não serão a ela devolvido pelos vendedores.

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres

Anexos

Custo de Construção

	R01 LAGUNA VILLE	R00 LAGUNA VILLE	BP26 LAGUNA VILLE	LVS MESSEJANA I
Torres	7	7	7	7
Unidades Construídas	540	540	540	670
Unidades Vendidas	532	532	532	660
Condomínios (qta.)	1	1	1	1
Cidade	Fortaleza, CE	Fortaleza, CE	Fortaleza, CE	Fortaleza, CE
Produto / Selo	CE-GRA-F2-CDW	CE-GRA-F2-PCT	CE-GRA-F2-PCT	CE-GRA-F2-PCT
Tipologia	1 Torre | T+04 | 12PP | C1A CDW	1 Torre | T+04 | 12PP | C1A PCT	1 Torre | T+04 | 12PP | C1A PCT	1 Torre | T+04 | 08PP | C1A PCT
Tipologia	6 Torres | T+04 | 16PP | C1B CDW	6 Torres | T+04 | 16PP | C1B PCT	6 Torres | T+04 | 16PP | C1B PCT	1 Torre | T+04 | 14PP | C1A PCT
Tipologia				7 Torres | T+04 | 16PP | C1B PCT
Projeto Infra	EP	EP	EP	
Projeto Torre	AP	EP	EP	
Mês Base	novembro-25	setembro-25	setembro-25	
Incc	1.222,356	1.216,706	1.216,706	
LVS	outubro-25	agosto-25	agosto-25	setembro-25
Indiretos	outubro-25	agosto-25	agosto-25	
Base de Preço	LPU 97	LPU 95	LPU 95	
Takt	2x2	2x2	2x2	
Prazo (mês)	16	16	16	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 89.354	R$ / UND R$ 90.112	R$ / UND R$ 90.872	R$ / UND R$ 89.655
Indireto	R$ 15.080	R$ 15.259	R$ 16.121	R$ 15.977
Torre	R$ 47.438	R$ 46.321	R$ 46.976	R$ 45.419
Infra	R$ 15.299	R$ 17.248	R$ 16.474	R$ 14.602
Fundação	R$ 7.110	R$ 6.604	R$ 6.415	R$ 7.349
EEE	R$ 503	R$ 478		R$ 326
ETE	R$ 1.981	R$ 1.486	R$ 1.758	R$ 2.054
Contenção	R$ 360	R$ 204	R$ 217	R$ 33
Terraplenagem	R$ 1.583	R$ 2.513	R$ 2.911	R$ 3.895
CUSTO TOTAL II	R$ 3.517	R$ 3.911	R$ 2.546	R$ 5.385
Urbanização	R$ 1.362	R$ 1.397	R$ 1.296	R$ 2.671
Drenagem	R$ 1.201	R$ 1.521		
Extensão de Rede Elétrica	R$ 188	R$ 188		
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 766	R$ 805	R$ 1.250	R$ 2.714
CUSTO TOTAL III				
Incorridos				
CUSTO TOTAL IV				
Aprendizado				
CUSTO TOTAL V		R$ 437	R$ 434	
Atualização por INCC		R$ 437	R$ 434	
CUSTO TOTAL I+II	R$ 92.871	R$ 94.023	R$ 93.418	R$ 95.039
CUSTO TOTAL I AO V	R$ 92.871	R$ 94.460	R$ 93.852	R$ 95.039
ATRIBUTOS	R$ 1.311	R$ 1.217	R$ 1.217	

Custo de Construção

	R01 LAGUNA VILLE	R00 LAGUNA VILLE	
Torres	7	7	
Unidades Construídas	540	540	
Unidades Vendidas	532	532	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Fortaleza, CE	Fortaleza, CE	
Produto / Selo	CE-GRA-F2-CDW	CE-GRA-F2-PCT	
Tipologia	1 Torre | T+04 | 12PP | C1A CDW	1 Torre | T+04 | 12PP | C1A PCT	
Tipologia	6 Torres | T+04 | 16PP | C1B CDW	6 Torres | T+04 | 16PP | C1B PCT	
Projeto Infra	EP	EP	
Projeto Torre	AP	EP	
Mês Base	novembro-25	setembro-25	
Incc	1222,356	1216,706	
LVS	outubro-25	agosto-25	
Indiretos	outubro-25	agosto-25	
Base de Preço	LPU 97	LPU 95	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	16	16	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 89.354	R$ / UND R$ 90.112	DIF -R$ 758
Indireto	R$ 15.080	R$ 15.259	-R$ 179
Torre	R$ 47.438	R$ 46.321	R$ 1.118
Infra	R$ 15.299	R$ 17.248	-R$ 1.948
Fundação	R$ 7.110	R$ 6.604	R$ 506
EEE	R$ 503	R$ 478	R$ 25
ETE	R$ 1.981	R$ 1.486	R$ 495
Contenção	R$ 360	R$ 204	R$ 156
Terrapplenagem	R$ 1.583	R$ 2.513	-R$ 930
CUSTO TOTAL II	R$ 3.517	R$ 3.911	-R$ 394
Urbanização	R$ 1.362	R$ 1.397	-R$ 34
Drenagem	R$ 1.201	R$ 1.521	-R$ 320
Extensão de Rede Eletrica	R$ 188	R$ 188	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 766	R$ 805	-R$ 39
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 437	-R$ 437
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 437	-R$ 437
CUSTO TOTAL	R$ 92.871	R$ 94.460	-R$ 1.588

VARIAÇÕES

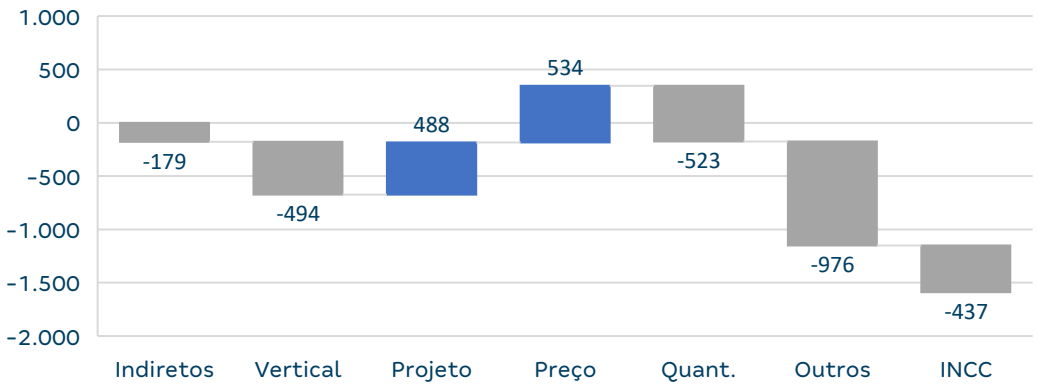

INDIRETOS
-223 | Operação de Canteiro

VERTICAL
-494 | Retroalimentação

PROJETO
+1.036 | Torre CDW x PCT
+198 | Piscina
+158 | Contenção
+177 | Fundação Torre
-407 | Terraplenagem
-396 | Reservatório Metálico
-208 | Paisagismo

PREÇO
+495 | ETE
+329 | Fundação Torre
+120 | Armação Torre
-356 | Reservatório Metálico
-320 | Extensão de Drenagem

QUANTIDADE
-523 | Terraplenagem

OUTROS
-992 | Instalações Infra

Custo de Construção

	R01 LAGUNA VILLE	BP26 LAGUNA VILLE	
Torres	7	7	
Unidades Construídas	540	540	
Unidades Vendidas	532	532	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Fortaleza, CE	Fortaleza, CE	
Produto / Selo	CE-GRA-F2-CDW	CE-GRA-F2-PCT	
Tipologia	1 Torre | T+04 | 12PP | C1A CDW	1 Torre | T+04 | 12PP | C1A PCT	
Tipologia	6 Torres | T+04 | 16PP | C1B CDW	6 Torres | T+04 | 16PP | C1B PCT	
Projeto Infra	EP	EP	
Projeto Torre	AP	EP	
Mês Base	novembro-25	setembro-25	
Incc	1222,356	1216,706	
LVS	outubro-25	agosto-25	
Indiretos	outubro-25	agosto-25	
Base de Preço	LPU 97	LPU 95	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	16	16	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 89.354	R$ / UND R$ 90.872	DIF -R$ 1.518
Indireto	R$ 15.080	R$ 16.121	-R$ 1.041
Torre	R$ 47.438	R$ 46.976	R$ 462
Infra	R$ 15.299	R$ 16.474	-R$ 1.175
Fundação	R$ 7.110	R$ 6.415	R$ 695
EEE	R$ 503	R$ 0	R$ 503
ETE	R$ 1.981	R$ 1.758	R$ 223
Contenção	R$ 360	R$ 217	R$ 143
Terrapplenagem	R$ 1.583	R$ 2.911	-R$ 1.328
CUSTO TOTAL II	R$ 3.517	R$ 2.546	R$ 971
Urbanização	R$ 1.362	R$ 1.296	R$ 66
Drenagem	R$ 1.201	R$ 0	R$ 1.201
Extensão de Rede Eletrica	R$ 188	R$ 0	R$ 188
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 766	R$ 1.250	-R$ 484
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 434	-R$ 434
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 434	-R$ 434
CUSTO TOTAL	R$ 92.871	R$ 93.852	-R$ 981

VARIAÇÕES

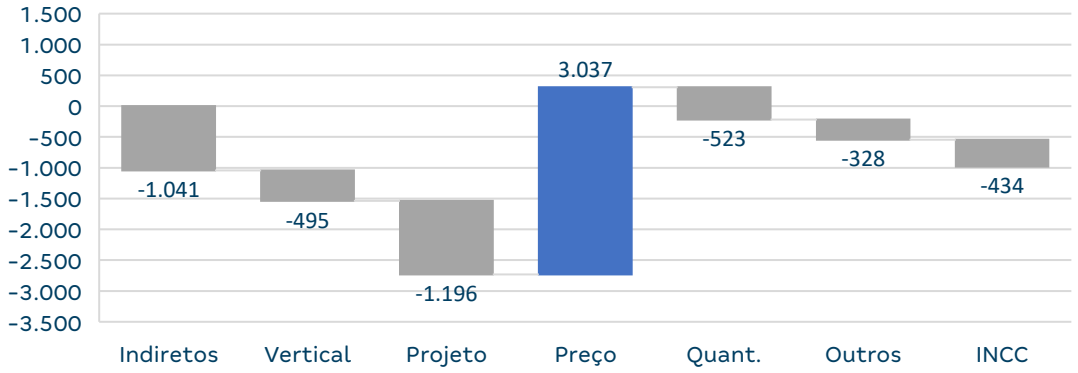

INDIRETOS
-799 | Operação de Canteiro
-320 | Ensaio

VERTICAL
-495 | Retroalimentação

PROJETO
+752 | Torre CDW x PCT
+198 | Piscina
+143 | Contenção
+177 | Fundação Torre
-805 | Terraplenagem

PREÇO
+905 | Extensões de Rede
+223 | ETE
+518 | Fundação Torre

QUANTIDADE
-523 | Terraplenagem

OUTROS
-231 | Estrutura Forma

PCP (Versão 171)

CE					1 JOGO =	46	Aptos/mês						
Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI	Folga Inicio
Laguna Ville	fev/26	532	3	A	08/07/26	24/02/27	25/02/27	26/03/27	22/06/27	23/06/27	20/07/27	dez/27	4,8
Mirante Messejana	mai/26	535	2	B	25/10/26	23/04/27	04/05/27		17/10/27	28/10/27		mar/28	5,5
Essence Maracanaú I	jun/26	227	3	A	23/02/27	23/06/27	24/06/27	21/07/27	12/08/27	13/08/27	09/09/27	jun/28	8,4
Essence Maracanaú II	jun/26	205	3	A	15/04/27	13/08/27	14/08/27	10/09/27	28/09/27	29/09/27	24/10/27	jul/28	10,2
Vila Lisboa	jul/26	324	3	A	01/06/27	29/09/27	30/09/27	25/10/27	09/12/27	10/12/27	05/01/28	jun/28	10,7
Una Sonata	set/26	345	2	B	20/06/27	18/10/27	29/10/27		10/02/28	21/02/28		nov/28	9,3
Vista Di Luna	nov/26	363	3	A	12/07/27	10/12/27	11/12/27	06/01/28	28/02/28	29/02/28	26/03/28	dez/28	8,0
Viver Fortaleza I	mai/27	622	2	B	14/10/27	11/02/28	22/02/28		03/09/28	14/09/28		jun/29	5,1

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA
FOR – Fortaleza

Lançamento

1. Portal da Barra
2. Farol de Mucuripe
3. Viva Praia do Futuro
4. Reserva das Garças
5. Messejana Pq. Da Lagoa
6. Vista Del Sol
7. Vista Di Mari

LandBank

8. Vila Lisboa
9. Laguna Ville
10. Solar dos Ventos
11. Residencial Ecoville
12. Green Village
13. Vista Di Luna
14. Reserva Dos Bem-Te-Vis
15. Viver Fortaleza
16. Mirante Messejana
17. Una Sonata

Cluster MPR – (Comitê)

Cluster 2 - Amarelo

Lançados *LandBank* *Comitê*

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lanç + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Fortaleza	FOR	31%	2.703	225	3.243	270

Faixas MCMV	Empreendimento	Renda	Lançamento	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27
Faixa 2	Resid. Farol Do Mucuripe	4.000	mar-25	12																					
Faixa 3	Vista Di Mari	4.959	set-25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	22								
Faixa 2	Vista Del Sol	4.038	set-25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	11									
Faixa 2	Solar Dos Ventos	3.502	dez-25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15							
Faixa 1	**Laguna Ville**	**2.769**	**fev-26**		**41**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**	**40**								
Faixa 2	Mirante Messejana	3.927	mai-26					30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	25
Faixa 1	Vila Lisboa	2.506	jul-26							26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	22			
Faixa 2	Una Sonata	3.368	set-26									27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	21	
Faixa 2	Lumiê	4.496	out-26										17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	5
Faixa 2	Vista Di Luna	3.627	nov-26											21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Faixa 1	Viver Fortaleza I	2.137	mai-27																	48	48	48	48	48	48
Faixa 1	Reserva Dos Bem Te Vis	2.199	out-27																						27
Faixa 1	Green Village I	2.262	out-27																						28
Total de Vendas Lançados				**68**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**	**41**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank				**98**	**127**	**127**	**127**	**157**	**157**	**183**	**183**	**210**	**227**	**248**	**248**	**233**	**213**	**136**	**121**	**169**	**169**	**165**	**143**	**137**	**154**
Total Mancha | Faixa 1				*0%*	*32%*	*32%*	*32%*	*26%*	*26%*	*37%*	*37%*	*32%*	*30%*	*27%*	*27%*	*29%*	*31%*	*19%*	*21%*	*44%*	*44%*	*42%*	*34%*	*35%*	*67%*
Total Mancha | Faixa 2				*69%*	*44%*	*44%*	*44%*	*55%*	*55%*	*47%*	*47%*	*54%*	*57%*	*61%*	*61%*	*58%*	*59%*	*81%*	*79%*	*56%*	*56%*	*58%*	*66%*	*65%*	*33%*
Total Mancha | Faixa 3				*31%*	*24%*	*24%*	*24%*	*19%*	*19%*	*16%*	*16%*	*14%*	*13%*	*12%*	*12%*	*13%*	*10%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Laguna Ville | Mapa Concorrência

		Laguna Ville	Nature Arbo	Reserva Da Lagoa - Bloco 1
		TENDA	Direcional	MRV
	Distância Tenda (km)		2,1km	800m
Região 1 Km	População	22.339	26.676	25.969
	Dens. Demográfica	7.157	8.546	8.320
	Renda (R$)	5.860	3.655	4.660
	Classe Social	C1 (de R$ 3.1K a 5.4K)	C1 (de R$ 3.1K a 5.4K)	C1 (de R$ 3.1K a 5.4K)
	PEA Dia	14.117	15.050	14.710
Quantitativo	Lançamento	jan/26	10/2025	10/2024
	Unidades	532	420	360
	Estoque	532	410	176
	VSO	41	10	14
	Stockout	13	41	12
Qualitativo	Condomínios	1	1	1
	Torres	7	5	1
	Gabarito	T+4	T+6	T+14
	Plantas (m²)	38,61m²	44 a 57,1 m²	38,4 a 46,6 m²
	Tipologia	2 Dorms	1 e 2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Garden | Suíte	Garden
	Varanda	Não	Não	Sim
	Vagas	39% de vagas	100% de vagas	80% de vagas
	Lazer	Mini Mkt, Áreas de lazer Internas, Churrasqueira Goumet, Carro Compartilhado e Piscina.	Tem Suítes, Tem Garden, Academia ao ar livre, Bicicletário, Churrasqueria, Espaço Gourmet, Pet Place, Piscina, Piscina infantil, Playground, Quadra, Quadra Poliesportiva, Quiosque,	Tem Garden, Brinquedoteca, Campo de Futebol, Fitness Center, Pet Place, Piscina, Pista caminhada, Salão de Festas, Varanda Gourmet,

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência na região atua em um target de preço e renda acima do estimado para o Laguna Ville.

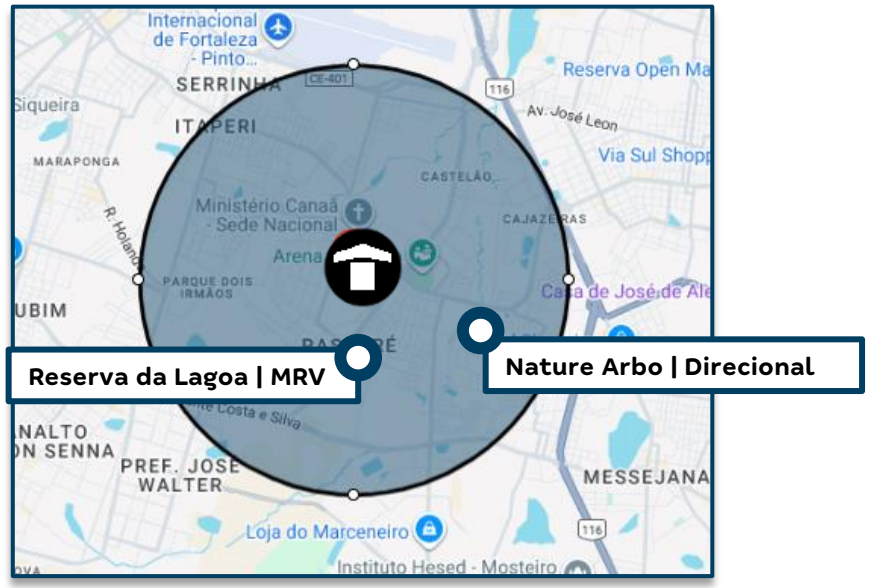

-	Laguna Ville					Nature Arbo					Reserva da Lagoa				
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Preço Nominal	CEF	Renda	Dif	Farol	Preço Nominal	CEF	Renda	Dif	Farol
Uh Tipo	216.506	208.726	170.243	2.592	61%										
Vaga Moto	221.388	211.638	172.526	2.773	22%										
Vaga Carro	228.139	224.962	183.260	3.384	17%	247.000	197.600	3.900	516	●	254.990	203.992	4.500	1.116	●
Varanda + Vaga Carro											273.990	219.192	5.400	-	●
Garden + Vaga Carro						276.656	221.325	5.500	-	●					

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Laguna Ville			
Tipo:	Uh Tipo		Uh Tipo	
Método	Ref - Vida Botânica		Vision	
Avaliação	216.506		216.506	
Renda Inicial (VF)	2.694		2.592	
Renda Final*	-		-	
% RET1	50%		75%	
Tipo:	VF	R$	VF	R$
Ato	0,81	2.182	0,64	1.655
FGTS	0,64	1.723	0,61	1.566
Financiamento	93,18%	152.352	96,25%	153.895
Subsídio	114,78%	15.761	90,45%	14.781
Prazo de Pró-soluto	20	20	20	20
Pró-Soluto	89,72%	17.567	90,41%	17.029
Preço Raso (RS)	189.585	189.585	188.927	188.927
TCD	75,35%	20.464	75,78%	19.799
VSO	25	25	25	25
Preço de Venda	**210.928**	**210.928**	**209.599**	**209.599**
Elasticidade	-0,417%	-0,417%	-0,417%	-0,417%
Preço de Venda Final	**210.049**	**210.049**	**208.726**	**208.726**
Preço Raso (R$)	**189.585**		**188.927**	
% de Raso	**90,26%**		**90,51%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Laguna Ville	
Tipo:	**Vaga Moto**	**Vaga Moto**
Método	**Ref - Vida Botânica**	**Vision**
Avaliação	221.388	221.388
Renda Inicial (VF)	0	2.773
Renda Final*	-	-
% RET1	100%	50%

Tipo:		VF	R$
Ato	O projeto **Res. Vida Botânica** não teve vendas de unidades com Vaga Moto.	0,65	1.782
FGTS		0,60	1.646
Financiamento		95,67%	158.498
Subsídio		103,76%	12.383
Prazo de Pró-soluto		20	20
Pró-Soluto		86,19%	17.367
Preço Raso (RS)		191.675	191.675
TCD		71,42%	19.962
VSO		9	9
Preço de Venda		**212.523**	**212.523**
Elasticidade		-0,417%	-0,417%
Preço de Venda Final		**211.638**	**211.638**
Preço Raso (R$)		**191.675**	
% de Raso		**90,57%**	
BP25 - Não Inflacionado		**-**	
BP25 - Inflacionado		**-**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Laguna Ville			
Tipo:	**Vaga Carro**		**Vaga Carro**	
Método	**Ref - Vida Botânica**		**Vision**	
Avaliação	228.139		228.139	
Renda Inicial (VF)	3.664		3.384	
Renda Final*	-		-	
% RET1	25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,35	1.260	0,85	2.859
FGTS	1,19	4.355	0,89	3.005
Financiamento	98,09%	177.305	97,86%	176.110
Subsídio	166,47%	3.440	129,16%	4.145
Prazo de Pró-soluto	20	20	20	20
Pró-Soluto	68,45%	18.224	73,54%	18.084
Preço Raso (RS)	204.583	204.583	204.204	204.204
TCD	57,85%	21.363	60,86%	20.758
VSO	7	7	7	7
Preço de Venda	**226.891**	**226.891**	**225.903**	**225.903**
Elasticidade	-0,417%	-0,417%	-0,417%	-0,417%
Preço de Venda Final	**225.946**	**225.946**	**224.962**	**224.962**
Preço Raso (R$)	**204.583**		**204.204**	
% de Raso	**90,55%**		**90,77%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Laguna Ville
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	219.601
Renda Inicial (VF)	2.769
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,68	1.891
FGTS	0,65	1.833
Financiamento	96,40%	158.757
Subsídio	100,10%	12.410
Prazo de Pró-soluto	20	20
Pró-Soluto	86,56%	17.286
Preço Raso (RS)	192.178	192.178
TCD	72,23%	20.001
VSO	41	41
Preço de Venda	**213.063**	**213.063**
Elasticidade	-0,417%	-0,417%
Preço de Venda Final	**212.179**	**212.179**
Preço Raso (R$)	**192.178**	
% de Raso	**90,57%**	
Raso Todas as Fases	**192.178**	
Nominal Todas as Fases	**212.179**	

1

Análise de Riscos | Farol IM

IM avalia o Preço Vision como **factível**.

1) O preço estimado pelo Vision está em linha com o performado pelo Residencial Vida Botânica, projeto que é a referência da região desde 2023. Apesar de não ser vertical, o Laguna Ville conta com a inclusão de atributos como a piscina em seu projeto e também está em uma microlocalização superior ao do Botânica.

Além disso, conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes da região atuam em um target de preço e renda superior ao estimado pelo Vision.

	Preço Real					Preço Normalizado (20m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Mediana	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Msj. Parque da Lagoa	206.666	179.120	2.380	83	21	-674	178.446
Reserva Das Garças 2	210.845	181.255	2.513	18	17	1.959	183.215
Laguna Ville	219.601	192.178	2.769	41	21	-	192.178
Portal Da Barra	233.743	200.560	3.075	24	16	3.598	204.158
Resid. Farol Do Mucuripe	245.642	217.141	4.000	24	23	-3.614	213.527
Vista Del Sol	249.643	224.495	4.287	19	25	-4.632	219.863
Vista Di Mari	263.850	250.599	9.766	6	23	-3.848	246.751

Percepção Comercial

Entorno

Distâncias POI Mobilidade

- Av Dr. Silas Munguba – 1,6km
- Avenida Prudente Brasil – 0,29km

Raio 3 Km

- Banco do nordeste – Em frente
- Farmácia Drogasil – 0,4km
- Supermercado – 0,45km
- Academia Greenlife – 0,5km
- Posto Passaré – 1,6km
- Hospital Sarah Kubitschek – 2,3km

Concorrência

Reserva da Lagoa - MRV

- Preço Cheio: 292.250k
- Preço CEF: 233.807k
- Renda: R$ 4.600
- Estoque: 162
- Tipologias: PNE e 2 quartos (com elevador), Garden.

Fluxo de Comercialização:

- Ato: mínimo de: 1,5%
- PSOL + TCD: 18%
- CEF: 80%

- Ato parcelado (4x no cartão);
- Prazo mensais em até 55x;
- ITBI/Emol. cobrado a parte;
- Correção monetária do valor financiado.

Percepção Comercial

Concorrência

Nature Arbo - Direcional

- Preço Cheio: 259.900k
- Preço CEF: 207.920k
- Renda: R$ 3.500
- Estoque: 401
- Tipologias: PNE e 2 quartos (com elevador), Garden.

Fluxo de Comercialização:

- Ato: mínimo de: R$ 1.000,00
- PSOL + TCD: 20%
- CEF: 80%

- Ato parcelado;
- Prazo mensais em até 66x;
- ITBI/Emol. cobrado a parte;
- Correção monetária do valor financiado.

Parecer: Projeto localizado em um bairro atrativo de fortaleza, dando sequência ao Residencial Vida Botânica. T+4 com adicional de piscina, igualando aos atributos principais da concorrência na tipologia sem elevador em Fortaleza. Projeto bastante relevante com a finalização do estoque do Messejana II, olhando para a volumetria de FX1. Acredita-se ser possível o atingimento do cenário proposto.

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Laguna Ville			
Tipo:	**Uh Tipo**		**Uh Tipo**	
Método	**Ref - Vida Botânica**		**Vision**	
Avaliação	216.506		216.506	
Renda Inicial (VF)	2.694		2.592	
Renda Final*	-		-	
% RET1	50%		75%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,81	2.182	0,64	1.655
FGTS	0,64	1.723	0,61	1.566
Financiamento	93,10%	152.352	96,09%	153.895
Subsídio	114,78%	15.761	90,45%	14.781
Prazo de Pró-soluto	21	21	21	21
Pró-Soluto	89,72%	18.445	90,41%	17.880
Preço Raso (RS)	190.463	190.463	189.778	189.778
TCD	75,35%	20.464	75,78%	19.799
VSO	25	25	25	25
Preço de Venda	**211.810**	**211.810**	**210.454**	**210.454**
Elasticidade	-0,417%	-0,417%	-0,417%	-0,417%
Preço de Venda Final	**210.927**	**210.927**	**209.577**	**209.577**
Preço Raso (R$)	**190.463**		**189.778**	
% de Raso	**90,30%**		**90,55%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**-**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Laguna Ville	
Tipo:	**Vaga Moto**	**Vaga Moto**
Método	**Ref - Vida Botânica**	**Vision**
Avaliação	221.388	221.388
Renda Inicial (VF)	0	2.773
Renda Final*	-	-
% RET1	100%	50%

Tipo:		VF	R$
Ato	O projeto **Res. Vida Botânica** não teve vendas de unidades com Vaga Moto.	0,65	1.782
FGTS		0,60	1.646
Financiamento		95,59%	158.498
Subsídio		103,76%	12.383
Prazo de Pró-soluto		21	21
Pró-Soluto		86,19%	18.236
Preço Raso (RS)		192.543	192.543
TCD		71,42%	19.962
VSO		9	9
Preço de Venda		**213.395**	**213.395**
Elasticidade		-0,417%	-0,417%
Preço de Venda Final		**212.506**	**212.506**
Preço Raso (R$)		**192.543**	
% de Raso		**90,61%**	
BP25 - Não Inflacionado		**-**	
BP25 - Inflacionado		**-**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Laguna Ville			
Tipo:	**Vaga Carro**		**Vaga Carro**	
Método	**Ref - Vida Botânica**		**Vision**	
Avaliação	228.139		228.139	
Renda Inicial (VF)	3.664		3.384	
Renda Final*	-		-	
% RET1	25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,35	1.260	0,85	2.859
FGTS	1,19	4.355	0,89	3.005
Financiamento	97,70%	177.305	97,46%	176.110
Subsídio	166,47%	3.440	129,16%	4.145
Prazo de Pró-soluto	21	21	21	21
Pró-Soluto	68,45%	19.135	73,54%	18.989
Preço Raso (RS)	205.494	205.494	205.108	205.108
TCD	57,85%	21.363	60,86%	20.758
VSO	7	7	7	7
Preço de Venda	**227.806**	**227.806**	**226.811**	**226.811**
Elasticidade	-0,417%	-0,417%	-0,417%	-0,417%
Preço de Venda Final	**226.857**	**226.857**	**225.866**	**225.866**
Preço Raso (R$)	**205.494**		**205.108**	
% de Raso	**90,58%**		**90,81%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**-**	

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres

Anexos

Resumo – Cenário Aprovação

Laguna Ville - CE - Fortaleza Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	dez-23							
Laguna Ville s/vaga		fev-26	ago-26	dez-27	6 meses	16 meses	fev-29	36 meses
Laguna Ville c/vaga moto		fev-26	ago-26	dez-27	6 meses	16 meses	fev-29	36 meses
Laguna Ville c/vaga carro		fev-26	ago-26	dez-27	6 meses	16 meses	fev-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	11,22 MM	**Incorrido Terreno:**	0,65 MM	**Área do Terreno (100%):**	24.085 m²
Cash:	11,22 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	37	**Custo de terreno m²:**	465,7
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	847
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,65 MM / 0,6%			**Incorrido de Construção:**	0,54 MM

Área Líquida do Terreno:	16.094 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	696,9
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	9,9% / 53,5%
CA Máx/Proj.	1,5 / 1,3
Incorridos de Incorporação:	0,63 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Laguna Ville s/vaga	T+4	189.778	322	209.577	216.506	96,1%	90,4%	75,8%
Laguna Ville c/vaga moto	T+4	192.543	118	212.506	221.388	95,6%	86,2%	71,4%
Laguna Ville c/vaga carro	T+4	205.108	92	225.866	228.139	97,5%	73,5%	60,9%

Unidades Totais:	532	**Preço Médio:**	213.044	**Renda Média:**	2.769	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	5.728
Unidades Tenda:	532	**Avaliação Média:**	219.601	**Ato:**	1.877 (0,68 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	12.269
VSO:	41 Unidades	**VGV Total:**	113.339.205	**FGTS:**	1.810 (0,65 Salários)	**Preço Raso Médio:**	193.042
RET Médio:	2,2%	**VGV Tenda:**	113.339.205	**% em RET 1%:**	61%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	700

Construção

Custo Total Unit.:	92.871	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	38,61

Gape / Mês Unit.: 11,08

Resultado

LI (R$):	**16.965.802**	**LI:**	**20,16%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**15.619.342**	**Margem Bruta Econômica:**	**38,39%**
TIR:	**100,31%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(11.469.107)**	**Margem Bruta REF:**	**40,70%**
Exposição de Caixa:	**13,84%**	**Δ LI:**	**0,16%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**24.060.866**	**Margem Rasa Econômica:**	**31,37%**
Payback Contingente (21 m):	**16 m/ (-5 m)**	**LI Marginal:**	**22,78%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**30.631.525**	**Margem Rasa REF:**	**34,56%**
Payback Consolidado:	**16 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**26,83%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Laguna Ville		Laguna Ville s/vaga		Laguna Ville c/vaga moto		Laguna Ville c/vaga carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	112.860	100,0%	67.210	100,0%	24.960	100,0%	20.690	100,0%
PIS/COFINS	(1.356)	1,2%	(645)	1,0%	(342)	1,4%	(369)	1,8%
Custo Total	(68.701)	61,6%	(41.630)	62,5%	(15.208)	61,8%	(11.862)	58,4%
Custo Terreno	(12.012)	10,8%	(7.271)	10,9%	(2.664)	10,8%	(2.077)	10,2%
Custo Relacionados a Terreno	(1.108)	1,0%	(671)	1,0%	(246)	1,0%	(192)	0,9%
Custos de Incorporação	(1.546)	1,4%	(984)	1,5%	(313)	1,3%	(249)	1,2%
Custo de Construção	(54.033)	48,5%	(32.704)	49,1%	(11.985)	48,7%	(9.344)	46,0%
Lucro Bruto Econômico	42.803	38,4%	24.935	37,5%	9.410	38,2%	8.459	41,6%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	42.803	38,4%	24.935	37,5%	9.410	38,2%	8.459	41,6%
Despesas de Selling	(10.291)	9,2%	(6.138)	9,2%	(2.278)	9,3%	(1.875)	9,2%
Contingência	(2.596)	2,3%	(1.546)	2,3%	(574)	2,3%	(476)	2,3%
Margem de Contribuição	29.917	26,8%	17.251	25,9%	6.558	26,6%	6.108	30,1%
IR e CSLL	(1.110)	1,0%	(528)	0,8%	(280)	1,1%	(302)	1,5%
Margem Líquida	28.807	25,8%	16.723	25,1%	6.278	25,5%	5.806	28,6%
Lucro Bruto REF Unit.	87.880	40,7%	84.313	39,7%	87.410	40,6%	100.968	44,1%
Lucro Raso REF Unit.	67.639	34,6%	64.280	33,4%	67.203	34,4%	79.953	38,4%

R$ Mil - VPL - Compra	Laguna Ville		Laguna Ville s/vaga		Laguna Ville c/vaga moto		Laguna Ville c/vaga carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	84.140	100,0%	50.155	100,0%	18.579	100,0%	15.406	100,0%
PIS/COFINS	(996)	1,2%	(474)	0,9%	(251)	1,4%	(271)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(66.178)	78,7%	(39.909)	79,6%	(14.669)	79,0%	(11.600)	75,3%
Custo Terreno	(9.674)	11,5%	(5.856)	11,7%	(2.146)	11,5%	(1.673)	10,9%
Custo Relacionados a Terreno	(1.131)	1,3%	(685)	1,4%	(251)	1,4%	(196)	1,3%
Custos de Incorporação	(1.483)	1,8%	(940)	1,9%	(302)	1,6%	(241)	1,6%
Custo de Construção	(43.075)	51,2%	(26.072)	52,0%	(9.554)	51,4%	(7.449)	48,4%
Despesas de Selling	(8.967)	10,7%	(5.354)	10,7%	(1.982)	10,7%	(1.631)	10,6%
Contingência	(1.032)	1,2%	(615)	1,2%	(228)	1,2%	(189)	1,2%
IR e CSLL	(815)	1,0%	(388)	0,8%	(205)	1,1%	(221)	1,4%
Lucro Imobiliário	16.966	20,2%	9.772	19,5%	3.659	19,7%	3.535	22,9%

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	BP - 2025	Atual	Atual vs BP - 2025	Δ%
Data Estudo:	setembro-24	dezembro-25	15 Meses	N/A
Lançamento:	maio-26	fevereiro-26	-3 Meses	N/A
Uhs:	532	532	-	0,0%
Preço Nominal:	211.440	213.044	1.604	0,8%
Preço Raso:	188.733	193.042	4.309	2,3%
Preço Nominal Inflacionado:	242.201	215.930	(26.270)	-10,8%
Preço Raso Inflacionado:	216.253	195.689	(20.564)	-9,5%
Renda Média:	2.592	2.769	177	6,8%
RET Médio:	2,08%	2,18%	0,1 p.p.	4,4%
% em RET 1%:	63,86%	60,81%	-3,1 p.p.	-4,8%
VSO:	21	41	21	100,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	4.901	6.481	1.580	32,2%
Avaliação:	195.000	219.601	24.601	12,6%
Prazo construção F1:	11	16	5	45,5%
Prazo de Pró-Soluto F1:	16	21	5	31,3%
Custo Total Inf (Unit):	140.884	129.136	(11.748)	-8,3%
Custo Construção (Unit):	94.064	92.871	(1.193)	-1,3%
Fração de construção:	44,2%	43,6%	-0,6 p.p.	-1,3%
INCC Folha Rosto:	1.161,58	1.222,36	61	5,2%
Custo Terreno Inf:	12.205.786	12.012.244	(193.543)	-1,6%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	1.374	2.083	710	51,6%
Fração do Terreno[1]:	10,9% / 55,3%	9,9% / 53,5%	-1,0 p.p.	-9,2%
Custo de Incorp. por uh:	1.572	2.907	1.335	84,9%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	2.607.361	3.447.662	840.300	32,2%
Custo do Ciclo (Unit):	12.177	12.269	92	0,8%
Lucro Imobiliário:	19,2%	20,2%	1,0 p.p.	5,1%
LI Marginal:	20,6%	22,8%	2,2 p.p.	10,5%
Exposição de caixa:	16,2%	13,8%	-2,4 p.p.	-14,6%
TIR:	64,4%	100,3%	35,9 p.p.	55,7%
Margem Bruta REF:	42,4%	40,7%	-1,7 p.p.	-3,9%
Margem Bruta Econômica:	40,0%	38,4%	-1,7 p.p.	-4,2%
Margem Rasa REF:	35,4%	34,6%	-0,9 p.p.	-2,5%
Margem Rasa Econômica:	32,3%	31,4%	-0,9 p.p.	-2,8%
Margem Contribuição Econômica:	29,2%	26,8%	-2,4 p.p.	-8,2%
Payback Contingente (Régua 21 m):	17 m/ (-4 m)	16 m/ (-5 m)	-1	
Payback Consolidado:	17 Meses	16 Meses	-1 Meses	-5,9%

Resumo – Consolidado Cenário Real

Laguna Ville - CE - Fortaleza Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	dez-23							
Laguna Ville s/vaga		fev-26	jul-26	nov-27	5 meses	16 meses	fev-29	36 meses
Laguna Ville c/vaga moto		fev-26	jul-26	nov-27	5 meses	16 meses	fev-29	36 meses
Laguna Ville c/vaga carro		fev-26	jul-26	nov-27	5 meses	16 meses	fev-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	11,22 MM	**Incorrido Terreno:**	0,65 MM	**Área do Terreno (100%):**	24.085 m²
Cash:	11,22 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	37	**Custo de terreno m²:**	465,7
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	847
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,65 MM / 0,6%			**Incorrido de Construção:**	0,54 MM

Área Líquida do Terreno:	16.094 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	696,9
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	9,9% / 53,7%
CA Máx/Proj.	1,5 / 1,3
Incorridos de Incorporação:	0,63 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Laguna Ville s/vaga	T+4	188.927	322	208.726	216.506	96,3%	90,4%	75,8%
Laguna Ville c/vaga moto	T+4	191.675	118	211.638	221.388	95,7%	86,2%	71,4%
Laguna Ville c/vaga carro	T+4	204.204	92	224.962	228.139	97,9%	73,5%	60,9%

Unidades Totais:	532	**Preço Médio:**	212.179	**Renda Média:**	2.769	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	5.728
Unidades Tenda:	532	**Avaliação Média:**	219.601	**Ato:**	1.877 (0,68 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	12.220
VSO:	41 Unidades	**VGV Total:**	112.879.387	**FGTS:**	1.810 (0,65 Salários)	**Preço Raso Médio:**	192.178
RET Médio:	2,2%	**VGV Tenda:**	112.879.387	**% em RET 1%:**	61%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	700

Construção

Custo Total Unit.:	92.871	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	38,61	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**16.908.419**	**LI:**	**20,01%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**16.670.640**	**Margem Bruta Econômica:**	**38,32%**
TIR:	**99,18%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(12.821.365)**	**Margem Bruta REF:**	**40,66%**
Exposição de Caixa:	**14,84%**	**Δ LI:**	**0,01%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**26.961.685**	**Margem Rasa Econômica:**	**31,28%**
Payback Contingente (21 m):	**15 m/ (-6 m)**	**LI Marginal:**	**22,61%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**30.402.543**	**Margem Rasa REF:**	**34,50%**
Payback Consolidado:	**15 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**26,74%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Laguna Ville		Laguna Ville s/vaga		Laguna Ville c/vaga moto		Laguna Ville c/vaga carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	112.347	100,0%	66.904	100,0%	24.846	100,0%	20.597	100,0%
PIS/COFINS	(1.350)	1,2%	(642)	1,0%	(341)	1,4%	(367)	1,8%
Custo Total	(68.467)	61,7%	(41.489)	62,6%	(15.156)	61,8%	(11.822)	58,4%
Custo Terreno	(12.012)	10,8%	(7.271)	11,0%	(2.664)	10,9%	(2.077)	10,3%
Custo Relacionados a Terreno	(1.092)	1,0%	(661)	1,0%	(242)	1,0%	(189)	0,9%
Custos de Incorporação	(1.545)	1,4%	(983)	1,5%	(313)	1,3%	(249)	1,2%
Custo de Construção	(53.818)	48,5%	(32.574)	49,2%	(11.937)	48,7%	(9.307)	46,0%
Lucro Bruto Econômico	42.530	38,3%	24.773	37,4%	9.349	38,2%	8.408	41,6%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	42.530	38,3%	24.773	37,4%	9.349	38,2%	8.408	41,6%
Despesas de Selling	(10.263)	9,2%	(6.121)	9,2%	(2.272)	9,3%	(1.870)	9,2%
Contingência	(2.584)	2,3%	(1.539)	2,3%	(571)	2,3%	(474)	2,3%
Margem de Contribuição	29.683	26,7%	17.112	25,8%	6.506	26,5%	6.064	30,0%
IR e CSLL	(1.105)	1,0%	(525)	0,8%	(279)	1,1%	(300)	1,5%
Margem Líquida	28.578	25,7%	16.587	25,0%	6.227	25,4%	5.764	28,5%
Lucro Bruto REF Unit.	87.443	40,7%	83.889	39,7%	86.969	40,5%	100.490	44,1%
Lucro Raso REF Unit.	67.202	34,5%	63.856	33,3%	66.762	34,4%	79.475	38,4%

R$ Mil - VPL - Compra	Laguna Ville		Laguna Ville s/vaga		Laguna Ville c/vaga moto		Laguna Ville c/vaga carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	84.517	100,0%	50.389	100,0%	18.657	100,0%	15.471	100,0%
PIS/COFINS	(1.000)	1,2%	(476)	0,9%	(252)	1,4%	(272)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(66.608)	78,8%	(40.169)	79,7%	(14.764)	79,1%	(11.675)	75,5%
Custo Terreno	(9.674)	11,4%	(5.856)	11,6%	(2.146)	11,5%	(1.673)	10,8%
Custo Relacionados a Terreno	(1.119)	1,3%	(677)	1,3%	(248)	1,3%	(194)	1,3%
Custos de Incorporação	(1.486)	1,8%	(942)	1,9%	(303)	1,6%	(241)	1,6%
Custo de Construção	(43.524)	51,5%	(26.343)	52,3%	(9.654)	51,7%	(7.527)	48,7%
Despesas de Selling	(8.944)	10,6%	(5.340)	10,6%	(1.977)	10,6%	(1.627)	10,5%
Contingência	(1.043)	1,2%	(621)	1,2%	(231)	1,2%	(191)	1,2%
IR e CSLL	(818)	1,0%	(390)	0,8%	(206)	1,1%	(222)	1,4%
Lucro Imobiliário	16.908	20,0%	9.743	19,3%	3.641	19,5%	3.524	22,8%

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Pareceres

Anexos

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conforme indicado na viabilidade, considerado ligação de aproximadamente 300 m em rede existente na Avenida Palestina.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Considerado ETE dentro do empreendimento conforme viabilidade. Extensão de 320 m até ponto de lançamento em rede de drenagem projetada na Avenida Palestina.

SISTEMA DE DRENAGEM
Considerado rede de reforço de 445 m nos cruzamento da Avenida Palestina até a Avenida Prudente Brasil conforme projeto aprovado.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade.

URBANIZAÇÃO
Considerado trecho de pavimentação e passeio na testada do empreendimento.

TERRENO

ÁREA DE DOAÇÃO

ÁREA DE APP

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 2
Drenagem	Nível 2
Elétrica	Nível 1
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 04/24.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 09/24.

Drenagem:
- Projeto elaborado em 10/24.

Elétrica:
- Viabilidade emitida em 07/2024.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado trecho de pavimentação na testada do empreendimento. .

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 3
Esgoto	Nível 2
Drenagem	Nível 2
Elétrica	Nível 1
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Viabilidade emitida em 04/24.

Esgoto:
- Viabilidade emitida em 09/24.

Drenagem:
- Projeto elaborado em 10/24.

Elétrica:
- Viabilidade emitida em 07/2024.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado trecho de pavimentação na testada do empreendimento. .

Logística

CAMINHO VEÍCULOS E CAMINHO SEGURO				
DESCRIÇÃO	ÁREA	LARGURA	COMPRIMENTO	FASE
_TENDA_ACESSO PROVISÓRIO (LOG)	276 m²	4,000	68,955	FASE 01 E 02
_TENDA_CAMINHO SEGURO (LOG)	571 m²	1,200	475,748	FASE 01 E 02
_TENDA_CAMINHO VEICULO (LOG)	1343 m²	4,000	335,854	FASE 01 E 02

C000 - TELA FACHADEIRA/SLQA					
DESCRIÇÃO	ÁREA	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_TELA FACHADEIRA (LOG)	1070,57 m²		-	TODO PERIODO	FASE 02

TENDAS_PERÍODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	COMPRIMENTO	LARGURA	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_CENTRAL DE KIT MENOR (LOG)	1			-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE 1 E 2
_TENDA_CENTRAL DE PORTAS MENOR (LOG)	1			-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE 1 E 2
_TENDA_DESMOLDANTE (LOG)	1	6,000	2,450	-	TODO PERIODO	-	FASE 1 E 2
_TENDA_INFLAMÁVEIS (LOG)	1	4,000	4,000	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE 1 E 2
_TENDA_TENDA ARMADOR (LOG)	1	6,000	2,450	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	FASE 1 E 2
_TENDA_TENDA LAZER (LOG)	1	20,000	3,500	TODO PERIODO	TODO PERIODO	TODO PERIODO	FASE 1 E 2
_TENDA_TENDA MOLDADOR (LOG)	1	5,000	3,230	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	FASE 1 E 2

VIVÊNCIA - CONTAINERS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE CONTAINERS	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_CONTAINER PORTARIA (LOG)	1 MÓDULO COM SANITÁRIO	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	CONSIDERAR TODO PERIODO	CONSIDERAR TODO PERIODO	CONSIDERAR TODO PERIODO	FASE 2
_TENDA_CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO CE (LOG)	10 MÓDULOS DE CONTAINERS EMBAIXO E 10 MÓDULOS DE CONTAINERS EM CIMA	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR TODO PERIODO	CONSIDERAR TODO PERIODO	FASE 2

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTITATIVO	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_BETONEIRA OP 2 (LOG)	VARIAVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 1 E 2
_TENDA_BOMBA LANÇA (LOG)	VARIAVEL	-	-	TODO PERÍODO	TODO PERÍODO	-	FASE 1 E 2
_TENDA_CAMINHÃO MUNK (LOG)1	CONSIDERAR 1 EQUIPAMENTO POR FASE	1 MOBILIZAÇÃO POR FASE	1 DESMOBILIZAÇÃO POR FASE	-	CONSIDERAR MEIO PERÍODO DE ESTRUTURA	-	FASE 1 E 2
_TENDA_SKYTRAK (LOG)	CONSIDERAR 1 EQUIPAMENTO POR FASE	1 MOBILIZAÇÃO POR FASE	1 DESMOBILIZAÇÃO POR FASE	-	TODO PERÍODO	CONSIDERAR 15 DIAS NO PERIODO DE ACABAMENTO	FASE 1 E 2

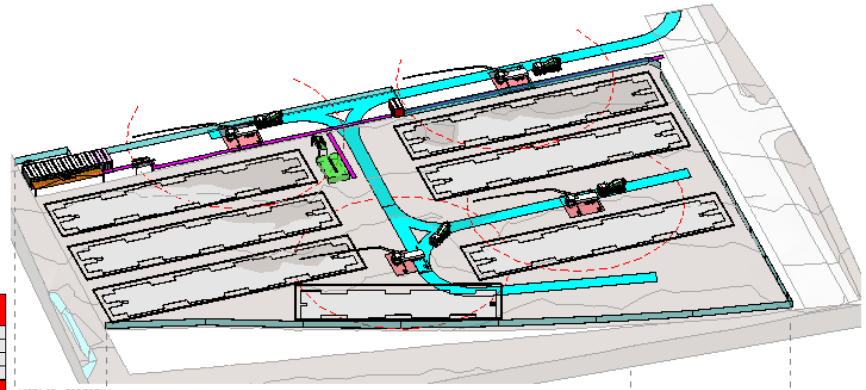

VISTA 3D - PRE FORMA

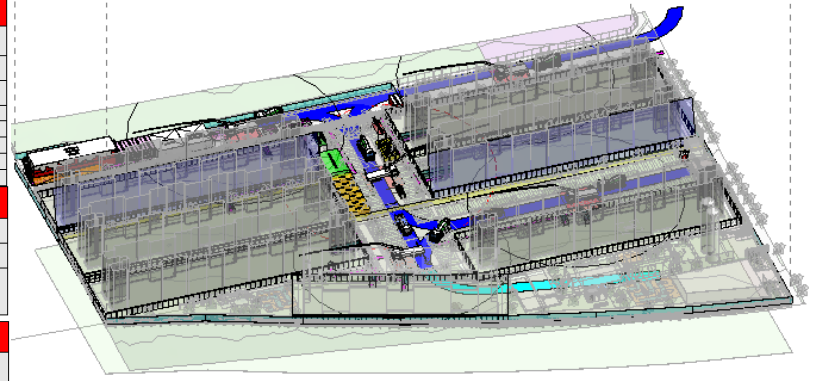

VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO

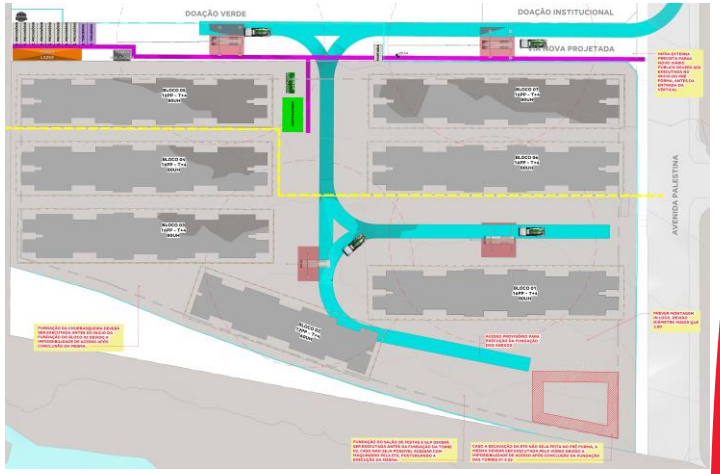

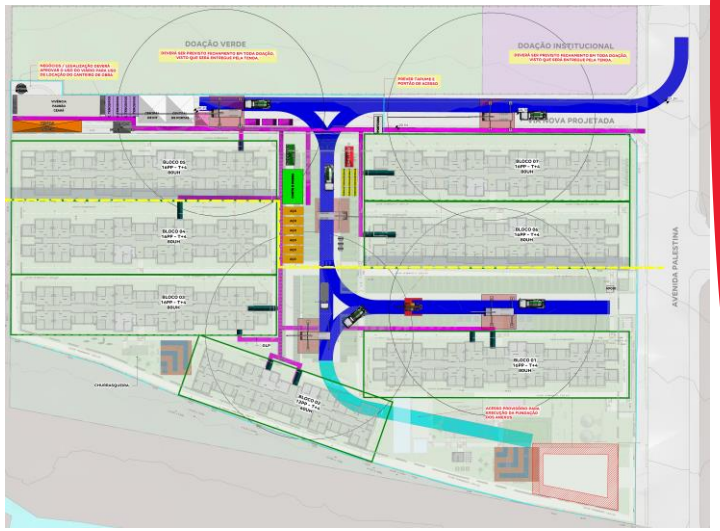

Obrigado(a)!
