Tenda

sua próxima conquista

Book de Lançamento

Regional: SP

Projeto: Life Jaguaré Fase 2

Data Comitê: 20/02/2026

Questionamentos – Comitê Digital 09.02.2026

Nome	Life Jaguaré F2 - Lançamento	Observação - Life Jaguaré F2
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	Ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Rodrigo Osmo	Discutir em comitê	(1)Quando dizemos que "A participação da Tenda no consórcio foi rateada entre as duas fases por unidades", consideramos no fluxo de caixa da Fase 1 somente 50% da rede de água? Isso não teria melhorado o payback do projeto como um todo (ao tirar da Fase 1 parte do desembolso pela execução da obra)?; (2) Estamos assumindo que a Sabesp irá nos ressarcir 40% do custo das redes; qual nosso nível de conforto de que isso acontecerá?; (3) O que poderia ser feito para buscarmos a LI alvo de 24,2%?
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok

Rodrigo Osmo

Pergunta 1: Quando dizemos que "A participação da Tenda no consórcio foi rateada entre as duas fases por unidades", consideramos no fluxo de caixa da Fase 1 somente 50% da rede de água? Isso não teria melhorado o payback do projeto como um todo (ao tirar da Fase 1 parte do desembolso pela execução da obra?

R: Sim, foi considerado na viabilidade de lançamento da F1 o rateio da participação da Tenda no consórcio pelo número de unidades (47,8% F1 e 52,2% F2). Na viabilidade atual, o mesmo rateio está sendo aplicado para este custo. Adicionalmente, na viabilidade atual, está sendo considerado o valor de reembolso Sabesp, que também ocorre de forma rateada (reembolso não estava previsto no lançamento da F1) . O impacto deste reembolso é sim positivo para o payback do projeto, no entanto, entre as versões apresentadas no "Comparativo", há o efeito de outros fatores que ocasionam a piora do indicador em um mês, sendo eles: atualização de premissas como o Selling (entre versões dos modelos 2024 x 2026), aumento de prazo de obra e piora de custos relacionados a terreno (que ocorrem de forma antecipada).

Pergunta 2: Estamos assumindo que a SABESP irá nos ressarcir 40% do custo das redes; qual nosso nível de conforto de que isso acontecerá?

R: O valor refere-se a 40% do custo total orçado na folha rosto pela Tenda para a construção das redes de infra para o empreendimento conforme projeto já aprovado pela SABESP; o % de reembolso considerado baseia-se na tabela de "Custos Sabesp" da concessionária pois já temos informação de que o reembolso seguirá conforme esta referência; A modalidade de reembolso faz parte do ctr de privatização da SABESP, e estipula que, a mesma restituirá os custos de execução das redes executadas pelo incorporador para todas as obras executadas a partir de julho/2024 e que ainda não foram doadas a SABESP ; A determinação da forma de reembolso está aguardando a validação oficial pela ARSESP e em outubro de 2025 foi circulada uma minuta inicial que poderá ser ajustada após conclusão do processo da Consulta Pública Arsesp n° 07/2025 e deliberação publicada. Porém de forma conservadora, estamos considerando que a restituição ocorra 6 meses após habite-se da 2ª fase.
Na folha rosto temos um custo total (fase 1 e 2) para a execução da rede de água e esgoto de R$2.8M, onde os valores respectivamente são R$1.2M (consórcio Cury Rede de Água) e R$1.6M (Rede de Esgoto). Aplicando o % de rateio da fase 2 de 52,21%, os valores para a fase são R$1.5M para a construção de ambas as redes.
Reiteramos que, no fluxo de caixa foi considerado o reembolso de 40% do valor total da fase, correspondendo à R$602k em out/28.

Rodrigo Osmo

Pergunta 3: O que poderia ser feito para buscarmos a LI alvo de 24,2%?

R: Para atingirmos a LI alvo de 24,2%, fizemos as seguintes simulações:

1. Através de preço, para alcançarmos a LI alvo, seria necessário elevar o preço raso em R$ 20.240 no consolidado ponderado, conforme a tabela. Como o Life Jaguaré F2 tem a referência direta à fase anterior, Life Jaguaré F1, o valor estimado pelo Vision está alinhado. Nesse contexto, IM entende como desafiador o ganho a ser incorporado no preço para atingimento de LI.

TIPOLOGIA	Raso LI 24,2%	Raso Comitê	Dif
HMP	226.825	208.670	18.155
HMP C/ VAGA CARRO	272.587	244.614	27.973
HMP C/ VAGA MOTO	233.928	215.087	18.841
PONDERADO	**237.399**	**217.159**	**20.240**

Ciclo avalia Preço e VSO como desafio. Para atingimento de 24% LI, o cenário do preço se tornaria bastante desafiador, mesmo se considerarmos a inclusão de cheque nas análises para esse projeto. Olhando nosso histórico no Jaguaré F1, não temos indicações de que poderíamos aumentar os preços nessa ordem de grandeza. Comparando também com a concorrência da Cury (Cidade Villa Lobos), e fazendo as devidas adaptações, ficaríamos com uma precificação ainda inferior na unidade com vaga, porém superior na tipologia sem atributo. 🔴

TIPOLOGIA	Nominal LI 24,2%	Cury - Cidade Villa Lobos	Dif
HMP	250.306	240.195	-10.111
HMP C/ VAGA CARRO	300.078	330.851	30.773
HMP C/ VAGA MOTO	258.125	282.824	24.699

2. Através da redução de custo de R$ 3.170/UH. Cabe destacar que, por se tratar de uma fase subsequente, a referência de custos já é conhecida. Além disso, o custo de obra atual de R$93.577/UH incorpora os ganhos de prazo no pré-forma decorrentes da sinergia entre as fases, bem como os benefícios obtidos pelo fato da terraplanagem ter sido executada em conjunto com a Fase 1.

One Page – Life Jaguaré F2 Aprovação

[1]

Cidade	São Paulo	**Mancha de demanda**	SP - SZO1 - São Paulo Oeste 1
Regional	SP	**Cluster MPR**	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Life Jaguaré F1	**Aprovação Fase Anterior**	Consolidado
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Fev

[2]

Unidades (Fases)	685 (1)	**CA Máx | Proj**	2,0 | 2,3
Unidades com Vaga (%)	285 (42%)	**Escritura | Lançamento**	set/24 | fev/26
Unidades com Varandas (%)	0 (0%)	**Tipologia**	F2E - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	22.128 (13,2%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	13,2% (100,0%)
Valor R$/m²	1.302	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[3]

Custo Construção (%VGV)	64.100 (38,1%)	**Indireto Unit.**	16.731
Prazo da Obra (meses)	20	**Torre Unit.**	55.529
Custo Total Unit. (LPU):	93.577 (99)	**Infra Unit.**	11.251
Início de Obra	ago-26	**Fundação Unit.**	7.528

[4]

Preço Nominal Unit.	245.651	**VSO**	38
Preço Raso Unit.	217.159	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	273.738	**Renda (% em RET 1%)**	4.133 (14,6%)



[5]

LI (Régua):	**22,6% (24,2%*)**	**Margem Bruta Econômica:**	42,0%
LI Marginal:	27,3%	**Margem Rasa Econômica:**	33,2%
Margem Bruta REF:	44,8%	**Margem Contribuição Econômica:**	31,1%
Margem Rasa REF:	**37,5%**	**Exposição (% VGV):**	13.327 (7,9%)
TIR:	77,7%	**VGV Total:**	**168.271**
Payback Contingente (21 m) :	**18 m/ (-3 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(8.642)
Payback Consolidado:	18	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	30.965

[5] Resultado:

5.1 Estamos considerando um ganho no raso da unidade sem vaga de R$2,2K comparado a performance dos últimos 3 meses da fase 1 de ~205,5K (excluindo cheque) e capturando um delta de R$35k na vaga carro e R$6k na vaga moto;

5.2 O preço referência da fase 1 (~205,5K) coincide com o preço da VF do lançto em set/24, logo não conseguimos capturar inflação no período. (slide 39)

5.3 O preço médio raso da fase 2 é R$217k e inflacionado de R$ 221K, inferior ao preço médio raso inflacionado de R$234k que foi considerado na VF do lançamento anterior para esta fase 2 (slide 34).

5.4 Neste cenário, a fase 2 atinge 22,6% de LI com MRasa Ref de 37,4%. Por tratar-se de abertura de fase de um mesmo condomínio e terreno escriturado sem possibilidade de reversão, recomendamos o lançamento. *Vide anexos

Destaques

[1] Projeto:

1.1 Terreno de 18.750m², localizado na Zona Oeste, na Avenida Alexandre Mackenzie, 755. O projeto é composto por um condomínio único com 8 blocos T+9, totalizando 1.312 UHs, dividido em duas fases comerciais e de obra. A fase 1 foi lançada em set/2024 com 627 UHs, e a fase 2 tratada neste book será lançada com 685 UHs.

1.2 Objetivo do book é aprovarmos o lançamento da fase 2.

1.3 Nesta fase 2 temos um mix diferente de produto em comparação à fase 1, enquanto no lançamento anterior tínhamos 95% de unidades sem vaga, na fase 2 representa 58% da fase, sendo 400UH sem vaga (58%), 135UH (20%) com vaga de carro e 150UH (22%) com vaga de moto.

[2] Condição Comercial (100% permuta financeira)

O terreno foi escriturado em ago/24, com a seguinte condição de negócio: 13,15% da receita bruta no formato de permuta financeira e PMG de 38MM (irreajustável). Sendo que do valor total do PMG, R$19.839.800,00 correspondem aos recebíveis da Fase 2, à ser aferido 2 meses após o Habite-se da Fase 2, vide jun/2028, caso não seja atingido, o credor poderá:

(a) receber em uma única parcela o pagamento da diferença em até 60 (sessenta) dias contados da expedição do habite-se do Empreendimento ou

(b) continuar a receber a Participação em conformidade com fluxo de pagamento dos recebíveis.

Sendo que, na viabilidade o PMG está sendo quitado em parcela única em jun/2028.

- Garantia: confissão de dívida Tenda

[3] Custo de construção:

3.1 Foi considerado início de obra conforme regra de ouro, 6 meses após o lançamento, a um custo total de **R$93.577/UH.** Em comparação ao custo de ago/2024, utilizado no comitê de lançamento da fase 1, tivemos uma redução de 1,34% já considerando variação do INCC.

3.2 A fase 1 foi iniciada em jan/2025 a um custo de construção de R$97.823/UH e com AGI programada para ago/2026 (PCP 173).

3.3 Foi firmado um consórcio com a Cury (projeto vizinho) para execução partilhada da extensão de rede de água, no qual a participação da Tenda representou ~R$1,2M. Esses valores foram quitados em julho/2025 e a rede encontra-se já totalmente executada para fases 1 e 2.

A participação da Tenda no consórcio foi rateada entre as duas fases por unidades, portanto, na fase 2, estão sendo considerados nos incorridos os valores proporcionais. Considerado na viabilidade o reembolso da SABESP referente à 40% do custo proporcional a Tenda para extensão de redes (~R$880/UH), após 6m do término da obra, vide out/2028.

[4] Preço de venda:

4.1. Adotando regra ouro, 18 meses de venda e VSO de 38 unidades, PSOL de 25 meses, aplicado a elasticidade sobre o preço do cenário real

One Page – Life Jaguaré F2 Real

[1]

Cidade	São Paulo	**Mancha de demanda**	SP - SZO1 - São Paulo Oeste 1
Regional	SP	**Cluster MPR**	4 - Azul
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Life Jaguaré F1	**Aprovação Fase Anterior**	Consolidado
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Fev

Unidades (Fases)	685 (1)	**CA Máx | Proj**	2,0 | 2,3
Unidades com Vaga (%)	285 (42%)	**Escritura | Lançamento**	set/24 | fev/26
Unidades com Varandas (%)	0 (0%)	**Tipologia**	F2E - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	22.045 (13,2%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	13,2% (100,0%)
Valor R$/m²	1.298	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	64.100 (38,2%)	**Indireto Unit.**	16.731
Prazo da Obra (meses)	20	**Torre Unit.**	55.529
Custo Total Unit. (LPU):	93.577 (99)	**Infra Unit.**	11.251
Início de Obra	jul-26	**Fundação Unit.**	7.528

[2]

Preço Nominal Unit.	244.731	**VSO**	38
Preço Raso Unit.	216.098	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	273.738	**Renda (% em RET 1%)**	4.133 (14,6%)

Fase de Lançamento - Margens Novas Vendas		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	220.183
Preço Inf. Médio Unit.	249.323	**Margem Bruta REF (%)**	44,7%
Custo Inf. Médio Unit.	137.854	**Margem Rasa REF (%)**	37,4%



LI (Régua):	**22,4% (24,2%)**	**Margem Bruta Econômica:**	41,9%
LI Marginal:	27,0%	**Margem Rasa Econômica:**	33,0%
Margem Bruta REF:	44,7%	**Margem Contribuição Econômica:**	31,0%
Margem Rasa REF:	**37,4%**	**Exposição (% VGV):**	14.625 (8,8%)
TIR:	76,5%	**VGV Total:**	**167.641**
Payback Contingente (21 m) :	**18 m/ (-3 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(9.809)
Payback Consolidado:	18	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	32.881

Destaques

[1] Geral: Todas as observações do slide anterior do cenário aprovação, são aplicáveis para este slide do cenário real. A única diferença entre os cenários, é a folga de início da regra de ouro (aprovação) X cenário do PCP 173 (real), impactando o prazo de PSOL e por consequência no Preço de venda.

[2] Preço de venda:
Adotando o PCP 173, gerando um PSOL de 24 meses; 18 meses de venda com VSO de 38.
Em jan/2026, efetivamos 50 vendas, resultando no estoque de abertura de fevereiro com 84 unidades, sendo 100% da tipologia sem vaga. Considerando a projeção para fev/2026 de 45 vendas, encerraremos o mês com aproximadamente 39 unidades, cenário que atende à regra de estoque inferior a 2 meses do VSO praticado.
Diante disso, estamos dentro da premissa de liberação da fase 2 em fevereiro, e com o diferencial e oportunidade de colocarmos na prateleira unidades com o atributo de vaga.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Farol Pareceres

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	sem ressalvas	Ok	
Legalização	sem ressalvas	Ok	
Produto	sem riscos	Ok	
GETEC	sem riscos	Ok	
Logística	sem riscos	Ok	
Contratação	Módulo 5 contratado em 27/01/2026 e Módulo 6 contratado em 06/02/2026 Risco: Viável em 16/01/2026. Jurídico: Viável em 13/01/2026.	Ok	
Inteligência de mercado	Preço Vision como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Ciclo avaliou Preço e VSO como factíveis. Para a tipologia com vaga, o Life Jaguaré F2 tem como premissa 8 vendas mensais. O preço sugerido por IM está alinhado à performance de projetos da regional, como o Viva Parque do Carmo, que apresentam volume e delta de preço equivalentes. Além disso, nosso principal concorrente , Cidade Villa Lobos, da Cury, pratica valores com vaga superiores aos estimados para o Life Jaguaré.	Ok	
Estudos Econômicos	LI abaixo da régua de aprovação.	Com Ressalvas	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Localização

Distâncias mais próximas	Life Jaguaré
Estação de Trem – Villa Lobos- Jaguaré	3900m
Estação de Trem - Ceasa	5700m
Estação de Trem – Presidente Altino	2100m
AMA/UBS Vila Nova Jaguaré	2200m
Parque	5200m

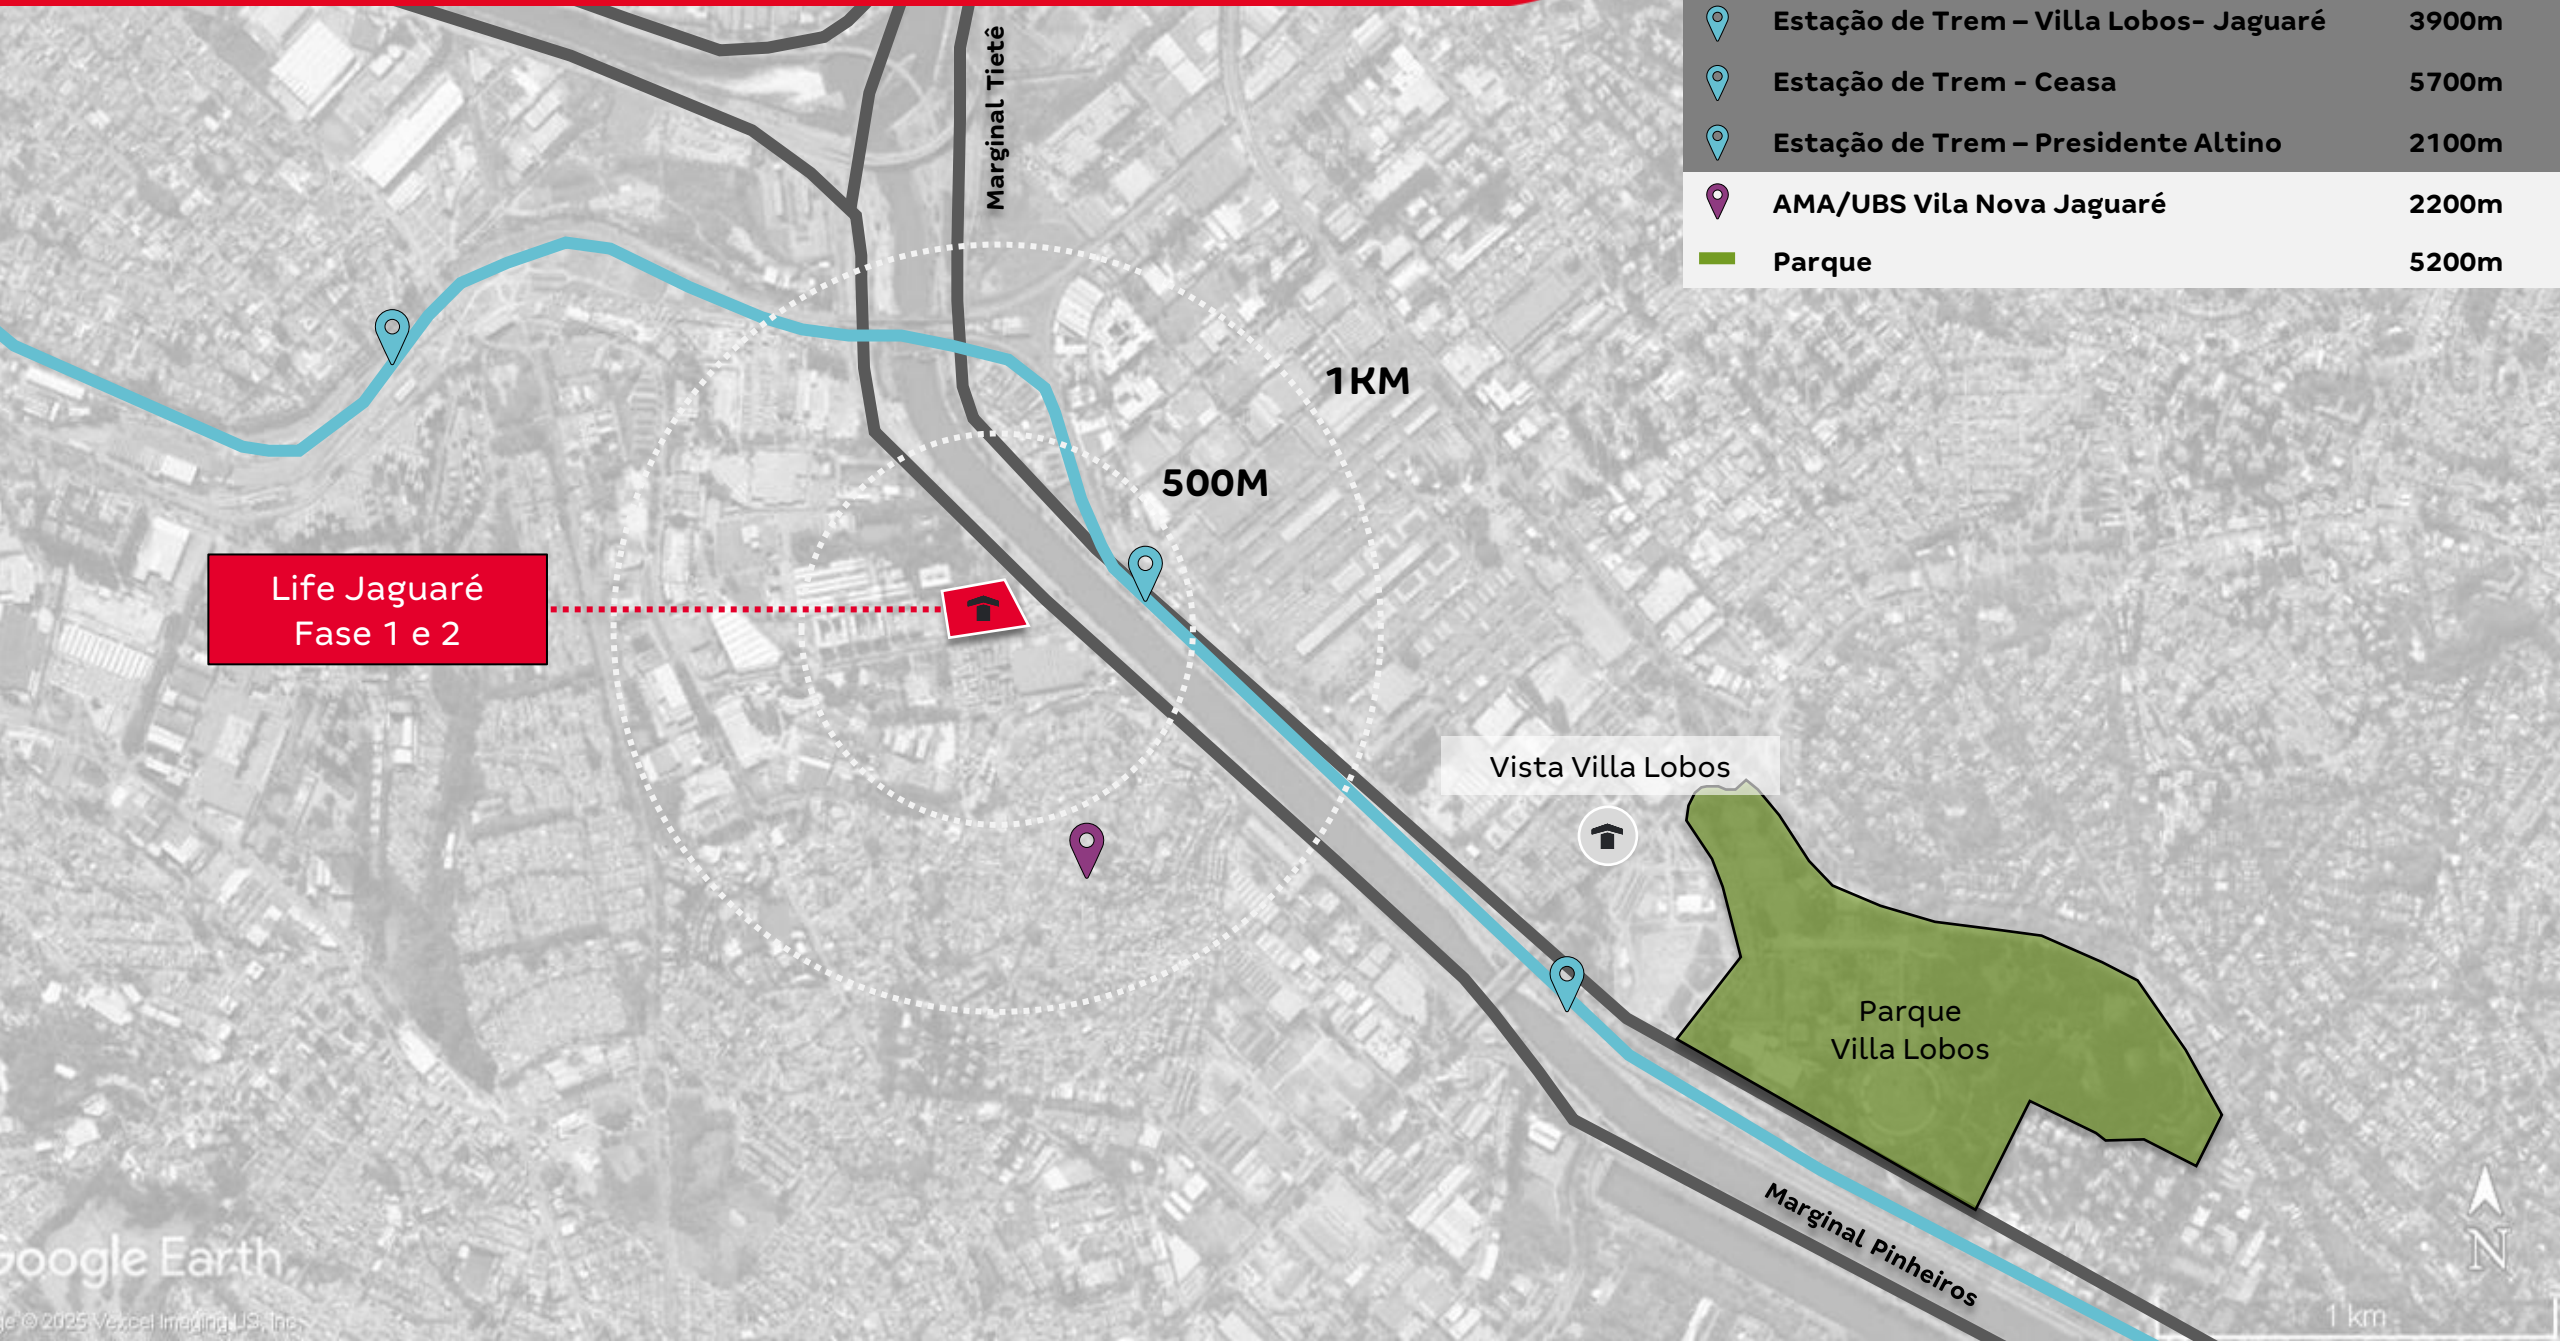

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

• SZO– São Paulo Oeste

Lançamento

1. Life Jaguaré
2. Max Vila Sônia

LandBank

3. Villa Butantã
4. Essence Butantã (Eiras Garcia)
5. Bosque | Paços Das Artes
6. Terrazo Butantã

Cluster MPR – (Comitê)

● Cluster 4 – Azul

Região

Capital

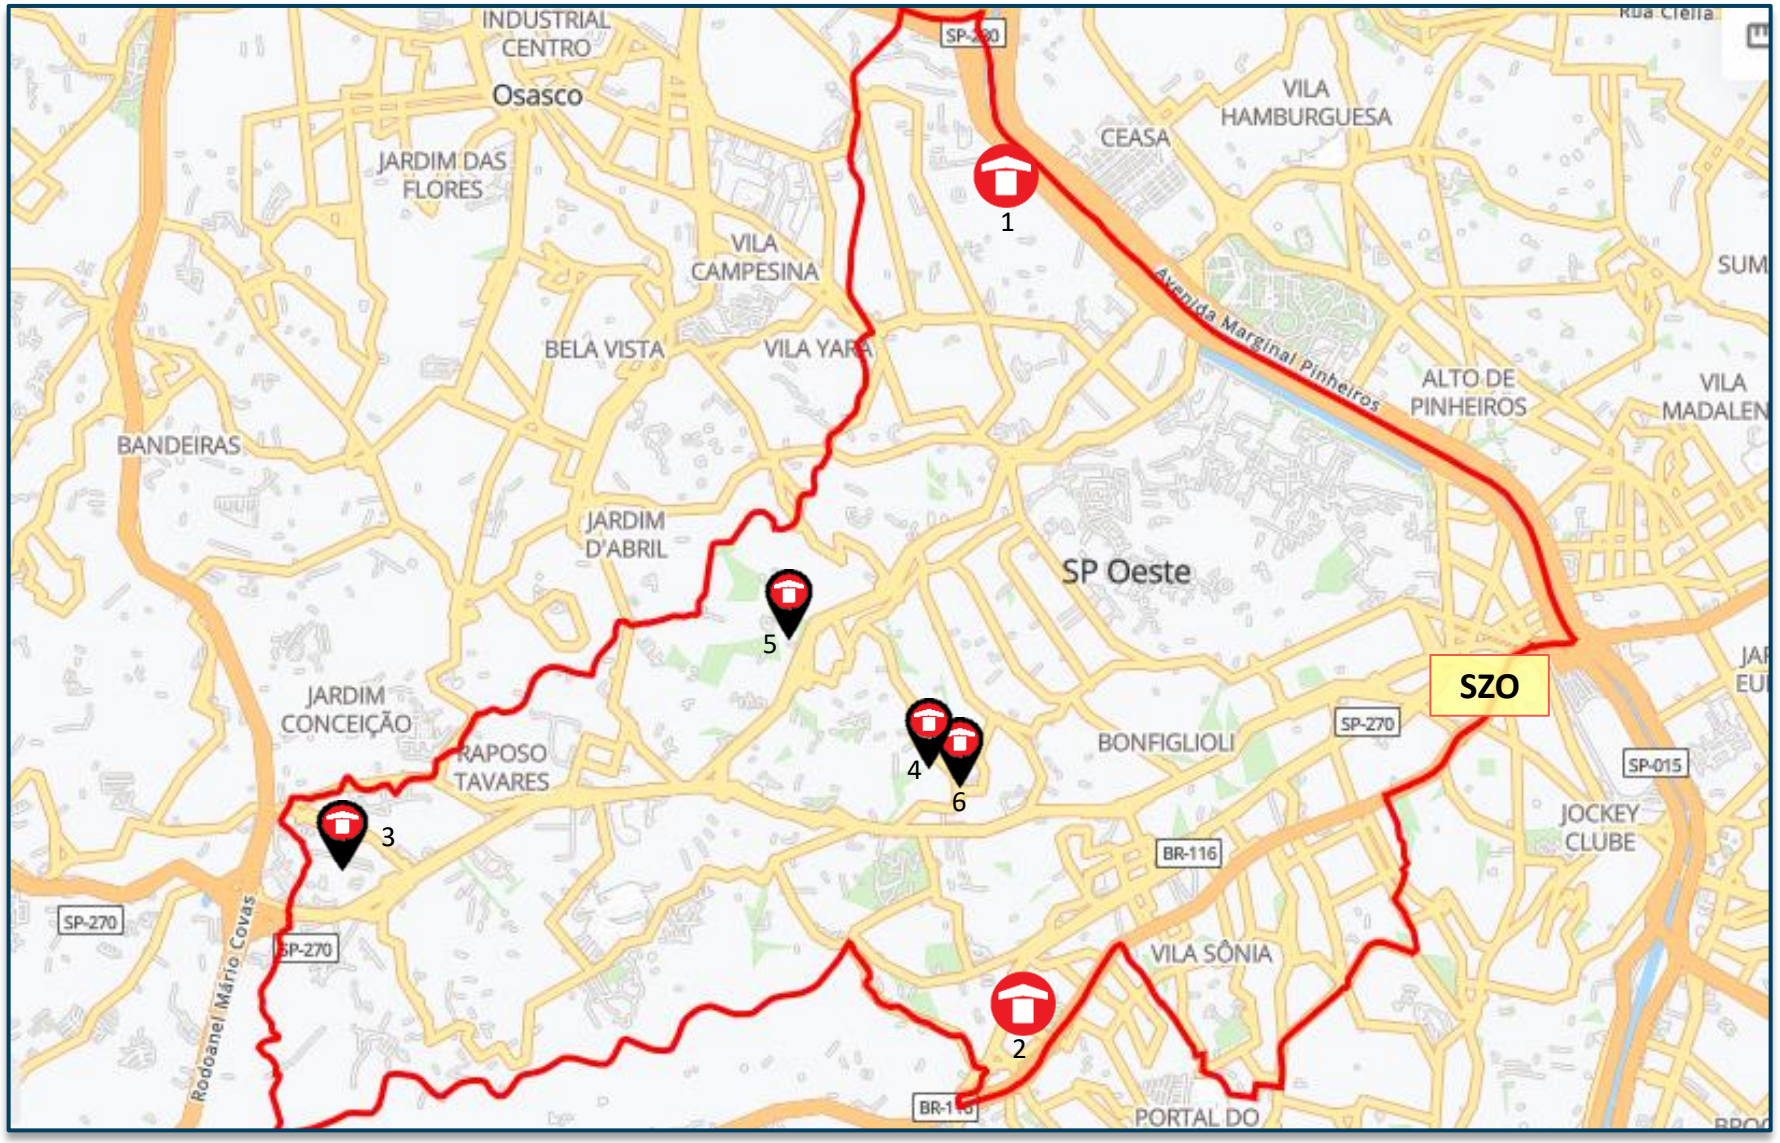

Lançados LandBank Comitê

Implantação

Informações Gerais		
Terreno	Área terreno	18.750,00m²
	Número de Condomínio	01 | 02 fases
Diretrizes Urbanísticas	Zoneamento	ZPI-1
	CA básico / máximo	2,25
	CA projetado	2,22
	Gabarito máximo	T+9
Geral	Total uh	1.312 (sendo 40 PCD)
	Total de vagas exigido	-
	Total de vagas projetado	318 vagas (sendo 02 PCD, 01 idoso, 01 C/D, 151 carro e 163 moto)
Tipologia	Tipologia	SP-GRB-F02E-PCT-C1B-16PP + 18PP
	Gabarito	T+9
	Área privativa	31,43m²
Condomínio	Unidade pcd	40 (3%)
	Torre	08
	Fase	02
Lazer	Lazer Interno	Espaço office, sports bar, brinquedoteca, Salão de festas gourmet, espaço office, sports bar, espaço saúde, brinquedoteca
	Lazer Externo	PlayKids, Funcional externo, Salão de festas com churrasqueira, praça dos sabores

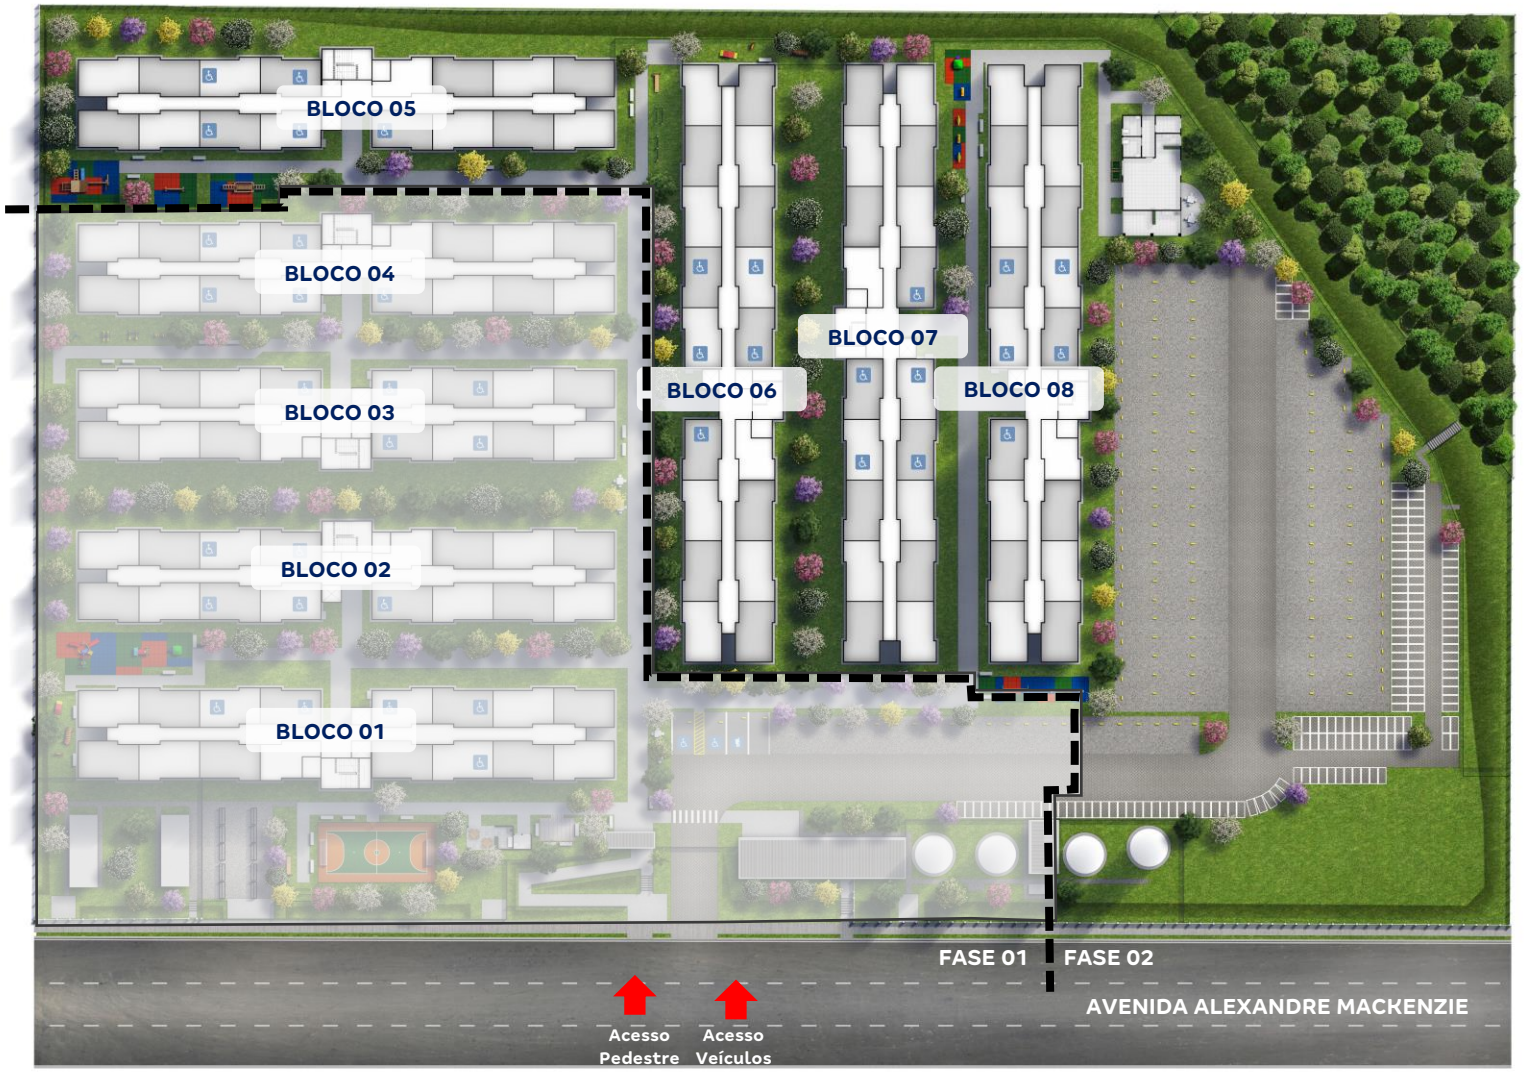

N

Implantação

Condomínio: 1.312uh – 135 vagas e 150 vagas de moto				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 05	02 Blocos (T+9)	333Uh	-	PLayKids, fitness e funcional externo, Salão de festas gourmet, espaço office, sports bar, espaço saúde, brinquedoteca
Módulo 06	02 Blocos (T+9)	352 UH	135 vagas +150 vagas de motos (vagas PCD, idoso e embarque/desembarque foram consideradas na fase 1)	PLayKids, Funcional externo, Salão de festas com churrasqueira, praça dos sabores, espaço office, sports bar, brinquedoteca

N

Implantação

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	Acesso Empreendimento		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	Faixa de renda	2	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Sim	
	Atributos Infra	Sim	*Quadra recreativa.*
	Atributos Torre	Não	
	Edifício Garagem	Não	

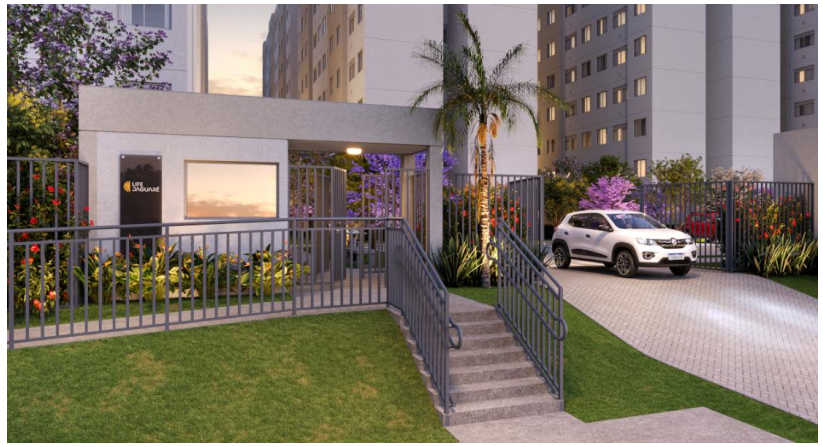

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Implantação | Google Earth

LIFE JAGUARÉ
FASE II
SP

Custo de Construção

	LIFE JAGUARÉ - F2 R09	LIFE JAGUARÉ - F2 R08	LIFE JAGUARÉ - F2 R07	LIFE JAGUARÉ - F2 R06	LIFE JAGUARÉ - F2 R05	LIFE JAGUARÉ - F1 LVS
Torres	4	4	4	4	4	4
Unidades Construídas	700	700	700	700	700	640
Unidades Vendidas	685	685	685	685	685	627
Cidade	São Paulo - SP	São Paulo - SP	São Paulo - SP	São Paulo - SP	São Paulo - SP	São Paulo - SP
Produto / Selo	F2E Modular	F2E Modular	F2E Modular	F2E Modular	F2E Modular	F2E Modular
Tipologia	1 Torre | T+09 | 16PP	1 Torre | T+09 | 16PP	1 Torre | T+09 | 16PP	1 Torre | T+09 | 16PP	1 Torre | T+09 | 16PP	4 Torres | T+09 | 16PP
Tipologia	3 Torres | T+09 | 18PP	3 Torres | T+09 | 18PP	3 Torres | T+09 | 18PP	3 Torres | T+09 | 18PP	3 Torres | T+09 | 18PP	
Atributos						
Projeto Infra	LO	LO	LO	LO	PE	
Projeto Torre	LO	LO	LO	LO	PE	
Mês Base	janeiro-26	janeiro-26	janeiro-26	setembro-25	agosto-24	novembro-25
Incc	1.228,161	1.228,161	1.228,161	1.216,706	1.118,827	
LVS	novembro-25	novembro-25	novembro-25	agosto-25	junho-24	
Indiretos	novembro-25	novembro-25	novembro-25	agosto-25	junho-24	
Base de Preço	LPU 99	LPU 99	LPU 99	LPU 94	LPU 81	
Takt	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	
Prazo (mês)	20	20	21	20	19	23
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 91.185	R$ / UND R$ 91.526	R$ / UND R$ 91.655	R$ / UND R$ 90.235	R$ / UND R$ 84.888	R$ / UND R$ 97.428
Indireto	R$ 16.731	R$ 16.731	R$ 16.860	R$ 16.342	R$ 14.287	R$ 18.061
Torre	R$ 55.529	R$ 55.529	R$ 55.529	R$ 54.881	R$ 51.441	R$ 53.373
Infra	R$ 11.251	R$ 11.251	R$ 11.251	R$ 10.820	R$ 12.058	R$ 14.619
Fundação	R$ 7.528	R$ 7.528	R$ 7.528	R$ 7.706	R$ 6.633	R$ 8.967
EEE						
ETE						
Contenção						R$ 135
Terraplenagem	R$ 146	R$ 486	R$ 486	R$ 486	R$ 469	R$ 2.273
CUSTO TOTAL II	R$ 2.392	R$ 2.392	R$ 2.392	R$ 2.250	R$ 1.525	R$ 2.392
Urbanização	R$ 15	R$ 15	R$ 15			R$ 15
Drenagem	R$ 176	R$ 176	R$ 176	R$ 176	R$ 89	R$ 176
Extensão de Rede Elétrica					R$ 91	
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 2.201	R$ 2.201	R$ 2.201	R$ 2.074	R$ 1.344	R$ 2.201
CUSTO TOTAL III						
Incorridos						
CUSTO TOTAL IV						
Aprendizado						
CUSTO TOTAL IV				R$ 871	R$ 8.444	
Atualização por INCC				R$ 871	R$ 8.444	
CUSTO TOTAL I+II	R$ 93.577	R$ 93.918	R$ 94.047	R$ 92.485	R$ 86.413	R$ 99.820
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 93.577	R$ 93.918	R$ 94.047	R$ 93.356	R$ 94.857	R$ 99.820

Custo de Construção

	LIFE JAGUARÉ - F2 R09	LIFE JAGUARÉ - F2 R06	
Torres	4	4	
Unidades Construídas	700	700	
Unidades Vendidas	685	685	
Cidade	São Paulo - SP	São Paulo - SP	
Produto / Selo	F2E Modular	F2E Modular	
Tipologia	1 Torre | T+09 | 16PP	1 Torre | T+09 | 16PP	
Tipologia	3 Torres | T+09 | 18PP	3 Torres | T+09 | 18PP	
Atributos			
Projeto Infra	LO	LO	
Projeto Torre	LO	LO	
Mês Base	janeiro-26	setembro-25	
Incc	1228,161	1216,706	
LVS	novembro-25	agosto-25	
Indiretos	novembro-25	agosto-25	
Base de Preço	LPU 99	LPU 94	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	20	20	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 91.185	R$ / UND R$ 90.235	DIF R$ 950
Indireto	R$ 16.731	R$ 16.342	R$ 388
Torre	R$ 55.529	R$ 54.881	R$ 649
Infra	R$ 11.251	R$ 10.820	R$ 431
Fundação	R$ 7.528	R$ 7.706	-R$ 178
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Terraplenagem	R$ 146	R$ 486	-R$ 340
CUSTO TOTAL II	R$ 2.392	R$ 2.250	R$ 142
Urbanização	R$ 15	R$ 0	R$ 15
Drenagem	R$ 176	R$ 176	R$ 0
Extensão de Rede Elétrica	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 2.201	R$ 2.074	R$ 127
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	
Ed. Garagem	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 871	
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 871	-R$ 871
CUSTO TOTAL	R$ 93.577	R$ 93.356	R$ 221

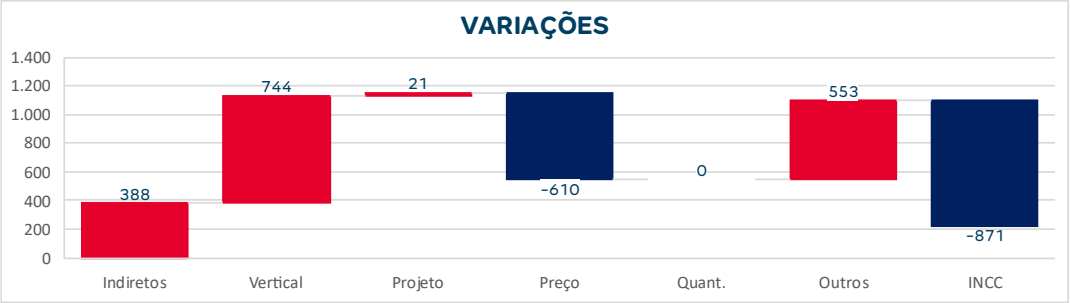

INDIRETOS
+810 | G13 – Pessoal Permanente
- 99 | Caçambas
- 126 | Redução do pré - forma

VERTICAL
+ 744 | Retroalimentação (Tarefa vertical)

PREÇO
- 652 | Aço

OUTROS
+ 444| Inst. Infra
+ 308 | Inst. Torre
+ 142 | Retroalimentação Infra Externa
- 340 | Terraplenagem

INCC
-871 | Atualização INCC

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA **– EXTENSÃO EXECUTADA, PENDENTE LIGAÇÃO NA PORTA**
Considerado ligação de água de 1,649m na Av. Presidente Altino.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – AGUARDANDO LICENÇA (TPOV)
Considerado ligação na rede existente na Av. Eng. Billings, aproximadamente 110m.

SISTEMA DE DRENAGEM – AGUARDANDO LICENÇA (TPOV)
Considerado ligação com lançamento no canal em frente ao empreendimento, aproximadamente 24,60m.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento feito através de GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO – PENDENTE LIGAÇÃO
Considera ligação na porta.

TERRENO

URBANIZAÇÃO – N/A

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 2
Esgoto	Nível 2
Drenagem	Nível 3
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Projeto aprovado em 04/2024, com validade de 2 anos. A extensão de rede de água foi executada em consórcio com a Cury, está pendente ligação na porta, licença em andamento.

Esgoto:
- Projeto aprovado em 04/2024, com validade de 2 anos. Aguardando licença (TPOV) para execução, necessária intervenção na marginal Pinheiros.

Drenagem:
- Considerado lançamento por gravidade. Aguardando licença (TPOV) para execução.

Elétrica:
- Viabilidade aprovada – Sem projeto aprovado. A extensão da rede elétrica foi executada, pendente ligação do empreendimento.

Gás:
- Abastecimento feito através de GLP.

Logística

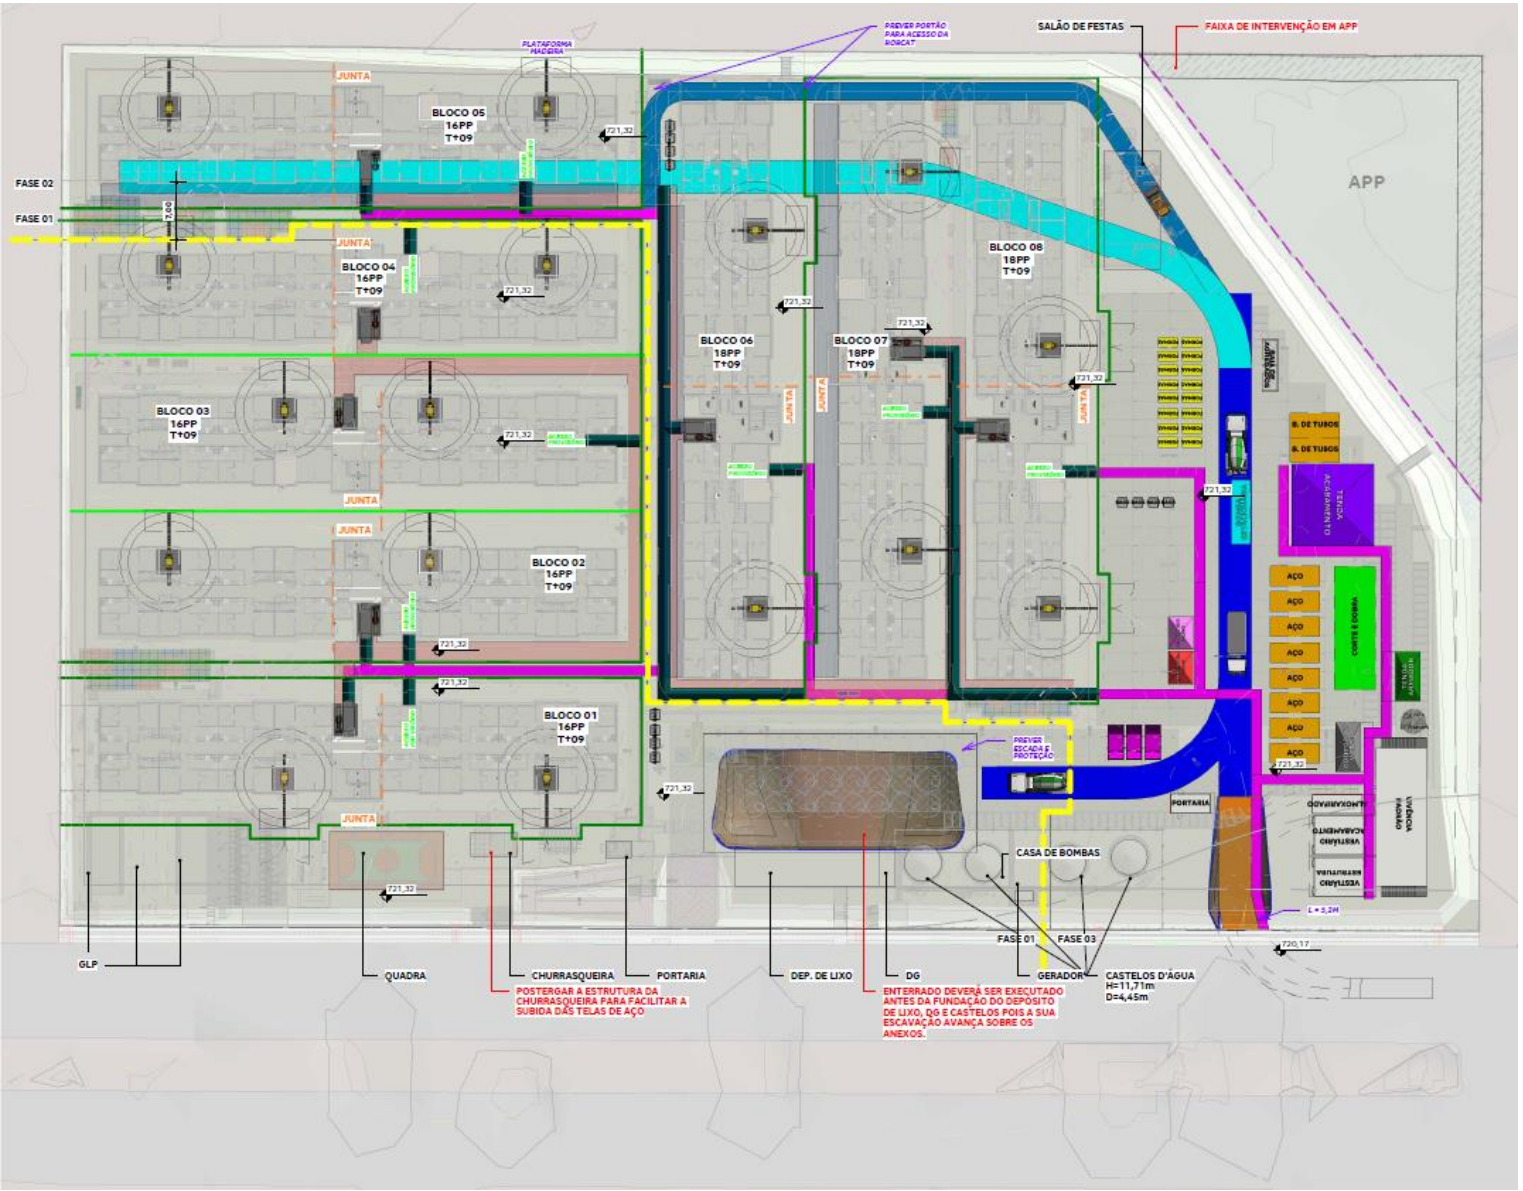
PREVER PORTÃO PARA ACESSO DA BOBCAT
SALÃO DE FESTAS
FAIXA DE INTERVENÇÃO EM APP
PLATAFORMA MADEIRA
JUNTA
BLOCO 05
16PP
T+09
FASE 02
FASE 01
BLOCO 04
16PP
T+09
BLOCO 03
16PP
T+09
BLOCO 02
16PP
T+09
BLOCO 01
16PP
T+09
BLOCO 06
18PP
T+09
BLOCO 07
18PP
T+09
BLOCO 08
18PP
T+09
APP
721,32
PREVER ESCADA E PROTEÇÃO
PORTARIA
CASA DE BOMBAS
FASE 01
FASE 03
GLP
QUADRA
CHURRASQUEIRA
PORTARIA
DEP. DE LIXO
DG
GERADOR
CASTELOS D'ÁGUA
H=11,71m
D=4,45m
POSTERGAR A ESTRUTURA DA CHURRASQUEIRA PARA FACILITAR A SUBIDA DAS TELAS DE AÇO
ENTERRADO DEVERÁ SER EXECUTADO ANTES DA FUNDAÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO, DG E CASTELOS POIS A SUA ESCAVAÇÃO AVANÇA SOBRE OS ANEXOS.

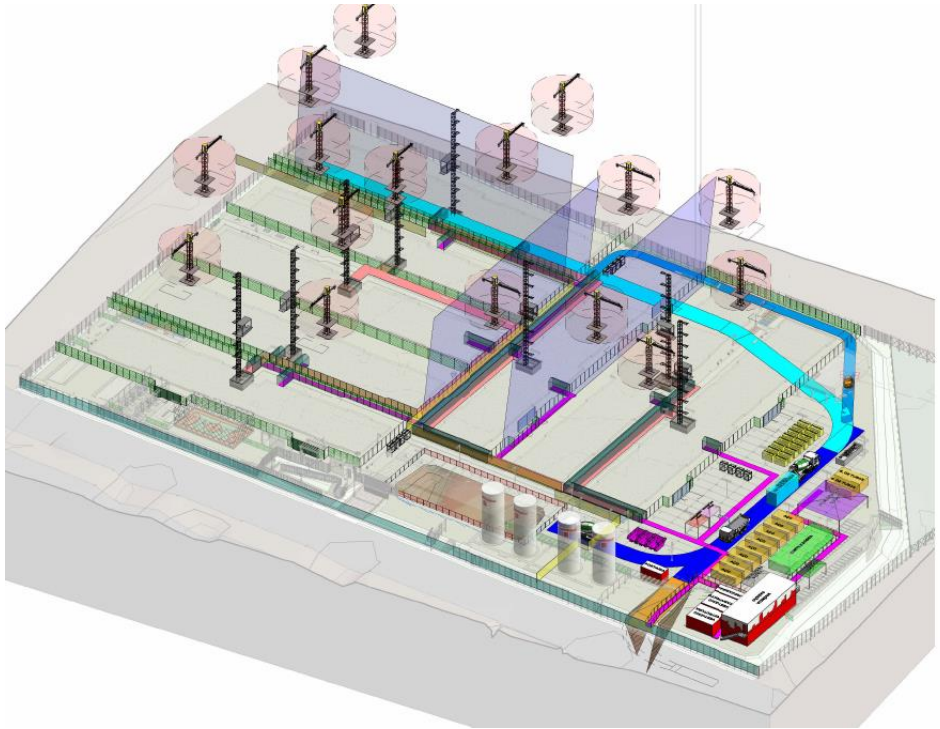

CONDIÇÕES DETERMINANTES:

- **OBRA / LEGALIZAÇÃO**: PREVISTO FAIXA DE TRABALHO DE 3M, CONFORME INDICADO NO PARECER, PARA EXECUÇÃO DO FECHAMENTO DO CONDOMÍNIO NA APP. LEGALIZAÇÃO DEVERÁ PREVER O LICENCIAMENTO.
- **TERRAPLENAGEM / OBRA / CUSTOS / PLANEJAMENTO**: PREVER CUSTO E PRAZO PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS PROVISÓRIAS, CONFORME INDICADAS NA IMPLANTAÇÃO, PARA VIABILIZAR ACESSO INTERNO AO TERRENO, GARANTINDO ASSIM A EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM. AS RAMPAS DEVERÃO SER ABSORVIDAS NO PROJETO DE TERRAPLENAGEM PROVISÓRIA, CONSIDERANDO O REFORÇO DE BASE PARA A PISTA PROVISÓRIA (CAMADA DE SACRIFÍCIO).
- **LEGALIZAÇÃO:** DEVIDO À QUANTIDADE DE ÁRVORES DE COMPENSAÇÃO PREVISTA NESTA IMPLANTAÇÃO, DEVERÁ SER PREVISTO PRAZO ADICIONAL CONFORME AVALIAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO E PÓS-LEG PARA NÍVEL DE CRITICIDADE 2 (ITENS DE LOGÍSTICA SOBREPONDO ÁRVORES E ÁREA PERMEÁVEL).***ATENÇÃO EM RELAÇÃO AS ÁRVORES EXISTENTES QUE DEVERÃO SER PRESERVADAS***

SOLUÇÕES TÉCNICAS:

- **CUSTOS / OBRA:** PREVER CUSTO PARA PERDA DE CONCRETO DURANTE O PERÍODO DE ESTRUTURA COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA ESTACIONÁRIA PARA A CONCRETAGEM DE TODOS OS BLOCOS, NECESSÁRIO DEVIDO AO GABARITO (T+09).
- **CUSTOS / OBRA:** PREVER CUSTO ADICIONAL DE 6K/BLOCO PARA TODOS OS BLOCOS (TOTAL DE 48K) PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE REMOÇÃO PARA MOB. E DESM. MANUAL DA CREMALHEIRA, POIS NÃO HÁ ABRANGÊNCIA DO RAIO DE PATOLA DO GUINDASTE. DESMOBILIZAÇÃO MANUAL ATÉ RAIO DE ALCANCE DO PONTO DE PATOLA PREVISTA COM EQUIPE DE REMOÇÃO (TRAJETO ATÉ PONTO DE ALCANCE DE PATOLA PROJ. COM LARGURA LIVRE DE 2,40 M).
- **CUSTOS / OBRA** DEVERÁ SER PRIORIZADA A INSTALAÇÃO DOS CASTELOS D'ÁGUA ANTES DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, DEVIDO À CARGA DO GUINDASTE DE IÇAMENTO. (CASO A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO SEJÁ ADIANTADA, ELA DEVERÁ SER PROJETADA PARA SUPORTAR CARGA DE NO MÍNIMO 35 TON (BETONEIRA CARREGADA E GUINDASTE).OU FAZER O IÇAMENTO DOS MESMOS PELO VIÁRIO PÚBLICO, LEMBRANDO QUE NESSE EMPREENDIMENTO EM ESPECIFICO TEMOS FIAÇÕES ELÉTRICAS BAIXAS PASSANDO NA TESTADA.

PONTO DE ATENÇÃO:

- **OBRA**: ATENÇÃO EM RELAÇÃO À REDE ELÉTRICA PASSANDO NA TESTADA DO EMPREENDIMENTO.

CONDIÇÕES DETERMINANTES: DETERMINAM A VIABILIDADE DE EXECUÇÃO DA OBRA ,TÉCNICA E FINANCEIRA. SEM O CUMPRIMENTO DELAS, A OBRA NÃO CONSEGUE SER EXECUTADA.
SOLUÇÕES TÉCNICAS: INDICAM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU PROCESSOS PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL.
PONTO DE ATENÇÃO: DEMONSTRA POSSÍVEIS RISCOS À OPERAÇÃO.

PCP 173

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI	Folga Inicio	Folga Aptidão	Folga Cliente	Carência CEF
Viva City Jaraguá - F1 + F2	nov/23	800	3	A	20/05/24	15/11/24	21/11/24	22/02/25	23/06/25	25/06/25	09/05/25	fev/26	6,2	6,2	9,2	OK
Viva São Miguel	jun/24	374	3	D	16/09/24	19/03/25	06/04/25	06/06/25	04/07/25	07/07/25	09/07/25	dez/25	3,1	1,1	18,2	OK
Farol Cantareira	jun/24	408	2	G	02/12/24	05/06/25	28/06/25		10/10/25	21/10/25		jul/26	5,7	5,7	11,1	OK
Life Jaguaré - F1	set/24	640	3	D	22/01/25	05/07/25	08/07/25	10/07/25	13/11/25	16/11/25	27/10/25	ago/26	4,3	4,3	13,2	OK
Jd Bonsucesso	mar/24	612	3	G	28/05/25	11/10/25	22/10/25	28/10/25	24/02/26	02/03/26	05/03/26	dez/26	14,6	17,1	3,0	Problema
Viva Parque do Carmo	set/24	714	2	D	20/06/25	14/11/25	17/11/25		25/06/26	22/06/26		mar/27	9,3	0,3	6,1	OK
Reserva das Andorinhas	set/24	544	2	A	28/04/25	03/12/25	06/12/25		26/05/26	28/05/26		fev/27	7,5	3,2	7,1	OK
Luis Stamatis - F1 + F2 (Melodia Jaçanã)	mar/25	782	2	G	28/08/25	25/02/26	03/03/26		30/10/26	05/11/26		ago/27	5,5	-0,5	7,1	OK
Palermo	dez/24	442	2	A	15/09/25	27/05/26	29/05/26		14/10/26	16/10/26		jul/27	9,1	-0,8	5,1	OK
Tucumã	set/25	540	2	D	08/11/25	23/06/26	26/06/26		11/12/26	14/12/26		set/27	1,8	0,3	12,2	NC
Life Jaguaré - F2	mar/26	685	2	D	24/07/26	12/12/26	15/12/26		17/07/27	20/07/27		mai/28	4,4	16,9	10,1	NC
Residencial Quioto	jul/26	700	2	D	25/01/27	18/07/27	21/07/27		25/02/28	28/02/28		dez/28	6,9	0,5	7,1	NC

O LANÇAMENTO DO LIFE JAGUARÉ F2 OCORRERÁ EM FEV/2026, O PCP 174 CONTEMPLARÁ ESSA ANTECIPAÇÃO.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lanç + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
São Paulo Oeste	SZO	36%	520	43	624	52

Faixas MCMV	Empreendimento	Renda	Lançamento	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27
Faixa 2	Life Jaguaré F1	3.506	set-24	43	18																				
Faixa 2	Villa Butantã	3.241	fev-26		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	4		
Faixa 2	**Life Jaguaré F2**	**4.133**	**fev-26**		**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**1**		
Faixa 2	Essence Butantã	4.224	jun-26						23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Faixa 2	Villagio Università - Paço Das Artes F1	4.584	fev-27														33	33	33	33	33	33	33	33	33
Faixa 3	Terrazo Butantã	4.989	mar-27															19	19	19	19	19	19	19	19
Total de Vendas Lançados				**43**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank				**43**	**100**	**82**	**82**	**82**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**	**138**	**157**	**157**	**157**	**157**	**157**	**80**	**75**	**75**
Total Mancha | Faixa 1				*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*
Total Mancha | Faixa 2				*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*88%*	*88%*	*88%*	*88%*	*88%*	*76%*	*75%*	*75%*
Total Mancha | Faixa 3				*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*12%*	*12%*	*12%*	*12%*	*12%*	*24%*	*25%*	*25%*

Apesar de o total de unidades previsto para a mancha ser maior que o potencial de demanda calculado por I.M, não devemos ter problemas com VSO, pois os projetos Villa Butantã e Life Jaguaré estão na divisa com outras manchas e devem capturar vendas dessas regiões.

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Life Jaguaré F2 | Mapa Concorrência

		Life Jaguaré F2	Cidade Villa Lobos - Sonata
		TENDA	Cury
	Distância Tenda (km)		1,58
Região 1 Km	População	24.544	22.105
	Dens. Demográfica	7.862	7.081
	Renda (R$)	10.476	8.403
	Classe Social	B1 (de R$ 9.8K a 19.7K)	B2 (de R$ 5.4K a 9.8K)
	PEA Dia	31.462	41.211
Quantitativo	Lançamento	fev/26	dez/24
	Unidades	685	318
	Estoque	685	22
	VSO	38	25
	Stockout	18	1
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	4	2
	Gabarito	T+9	T+9
	Plantas (m²)	32m²	36,52m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Não
	Varanda	Não	Não
	Vagas	20%	19
	Lazer	quadra	Academia, Churrasqueira, Coworking, Sala de Jogos, Pet Place, Playground, Praça, Quadra

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência possui target de preço e renda acima ao previsto para o Life Jaguaré.
- O Life Jaguaré precisa fazer 8 vendas mês na tipologia vagas carro com um delta de 32,4k. Entendemos que o preço estimado pelo Vision está em linha com o praticado pela região, uma vez que a Cury faz 5 de VSO nessa tipologia com um delta de 90,7k.

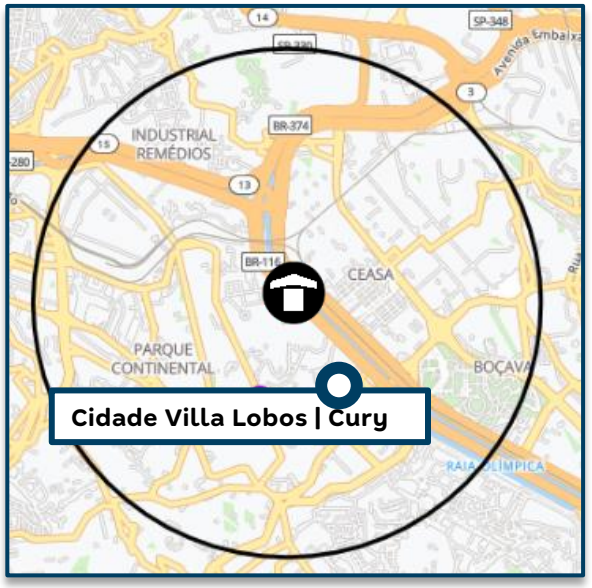

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

-	Life Jaguaré F2					Cidade Villa Lobos - Sonata						
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Dif	Farol
HMP	267.993	235.201	181.694	3.690	58%	315.000	240.195	192.156	4.071	79%	381	●
HMP VG CARRO	290.007	275.547	208.006	5.417	20%	335.000	330.851	264.681	6.471	19%	1.054	●
HMP VG MOTO	274.417	242.409	186.736	4.158	22%	323.000	282.824	226.259	5.621	2%	1.463	●

Informações Viabilidade

Projeto:	Life Jaguaré F2			
Tipo:	HMP		HMP	
Método	Ref - Life Jaguaré F1		Vision	
Avaliação	267.993		267.993	
Renda Inicial (VF)	3.800		3.690	
Renda Final*	-		-	
% RET1	0%		25%	
Tipo:	VF	R$	VF	R$
Ato	0,78	2.877	0,65	2.316
FGTS	0,71	2.637	0,57	2.038
Financiamento	97,36%	170.595	94,21%	176.203
Subsídio	226,65%	4.799	154,15%	3.454
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24
Pró-Soluto	74,06%	24.541	73,57%	23.673
Preço Raso (RS)	205.450	205.450	207.683	207.683
TCD	35,44%	13.575	73,98%	27.518
VSO	22	22	22	22
Preço de Venda	**225.382**	**225.382**	**242.028**	**242.028**
Elasticidade	-2,821%	-2,821%	-2,821%	-2,821%
Preço de Venda Final	**219.025**	**219.025**	**235.201**	**235.201**
Preço Raso (R$)	**205.450**		**207.683**	
% de Raso	**93,80%**		**88,30%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Life Jaguaré F2			
Tipo:	HMP VG CARRO		HMP VG CARRO	
Método	**Ref - Life Jaguaré F1**		**Vision**	
Avaliação	290.007		290.007	
Renda Inicial (VF)	5.210		5.417	
Renda Final*	-		-	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	VF	R$	VF	R$
Ato	0,98	4.956	0,76	3.980
FGTS	0,00	0	0,52	2.748
Financiamento	88,43%	181.028	94,34%	205.258
Subsídio	0,00%	0	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24
Pró-Soluto	95,44%	43.360	66,31%	31.323
Preço Raso (RS)	229.345	229.345	243.309	243.309
TCD	51,67%	27.137	59,04%	32.238
VSO	8	8	8	8
Preço de Venda	**263.925**	**263.925**	**283.545**	**283.545**
Elasticidade	-2,821%	-2,821%	-2,821%	-2,821%
Preço de Venda Final	**256.481**	**256.481**	**275.547**	**275.547**
Preço Raso (R$)	**229.345**		**243.309**	
% de Raso	**89,42%**		**88,30%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**-**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Life Jaguaré F2			
Tipo:	HMP VG MOTO		HMP VG MOTO	
Método	**Ref - Life Jaguaré F1**		**Vision**	
Avaliação	274.417		274.417	
Renda Inicial (VF)	4.114		4.158	
Renda Final*	-		-	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,86	3.455	0,59	2.380
FGTS	1,12	4.474	0,65	2.623
Financiamento	94,03%	176.335	95,34%	182.321
Subsídio	17,14%	360	85,72%	1.792
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24
Pró-Soluto	73,53%	26.378	68,76%	24.932
Preço Raso (RS)	211.002	211.002	214.048	214.048
TCD	61,37%	25.449	67,67%	28.361
VSO	8	8	8	8
Preço de Venda	**243.313**	**243.313**	**249.445**	**249.445**
Elasticidade	-2,821%	-2,821%	-2,821%	-2,821%
Preço de Venda Final	**236.450**	**236.450**	**242.409**	**242.409**
Preço Raso (R$)	**211.002**		**214.048**	
% de Raso	**89,24%**		**88,30%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**-**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Life Jaguaré F2
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	273.738
Renda Inicial (VF)	4.133
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,66	2.658
FGTS	0,58	2.306
Financiamento	94,48%	183.269
Subsídio	108,79%	2.409
Prazo de Pró-soluto	24	24
Pró-Soluto	71,09%	25.456
Preço Raso (RS)	216.098	216.098
TCD	69,66%	28.633
VSO	38	38
Preço de Venda	**251.634**	**251.634**
Elasticidade	-2,821%	-2,821%
Preço de Venda Final	**244.731**	**244.731**
Preço Raso (R$)	**216.098**	
% de Raso	**88,30%**	
Raso Todas as Fases	**216.098**	
Nominal Todas as Fases	**244.731**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que empreendimento está inserido em uma região de renda média alta, com proximidade a áreas consolidadas e excelente oferta de infraestrutura. Além disso, conta com fácil acesso à estação de trem e está próximo a importantes polos de trabalho e serviços.

O Life Jaguaré F2 traz uma referência direta à fase anterior, o Life Jaguaré F1. Nesse cenário, o preço estimado pelo Vision se mostra coerente, posiciona as unidades HMP ligeiramente acima da fase anterior e recalibra as unidades com vaga para um delta compatível com a nova composição do F2, que concentra um volume maior nessa tipologia.

Adicionalmente, o projeto mantém um posicionamento de preço acessível, sendo o mais competitivo frente aos concorrentes diretos da região.

	Preço Real					Preço Normalizado (24m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Mediana	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Life Jaguaré F1	233.958	202.324	3.852	31	15	9.570	211.894
Life Jaguaré F2	273.738	216.098	4.133	38	24	-	216.098

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Life Jaguaré F2					
Tipo:	**HMP**		**HMP VG CARRO**		**HMP VG MOTO**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	267.993		290.007		274.417	
Renda Inicial (VF)	3.690		5.417		4.158	
Renda Final*	-		-		-	
% RET1	25%		0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,65	2.316	0,76	3.980	0,59	2.380
FGTS	0,57	2.038	0,52	2.748	0,65	2.623
Financiamento	94,04%	176.203	94,18%	205.258	95,16%	182.321
Subsídio	154,15%	3.454	0,00%	0	85,72%	1.792
Prazo de Pró-soluto	25	25	25	25	25	25
Pró-Soluto	73,57%	24.659	66,31%	32.628	68,76%	25.971
Preço Raso (RS)	208.670	208.670	244.614	244.614	215.087	215.087
TCD	73,63%	27.387	58,72%	32.065	67,34%	28.224
VSO	22	22	8	8	8	8
Preço de Venda	**242.908**	**242.908**	**284.710**	**284.710**	**250.372**	**250.372**
Elasticidade	-2,821%	-2,821%	-2,821%	-2,821%	-2,821%	-2,821%
Preço de Venda Final	**236.057**	**236.057**	**276.679**	**276.679**	**243.311**	**243.311**
Preço Raso (R$)	**208.670**		**244.614**		**215.087**	
% de Raso	**88,40%**		**88,41%**		**88,40%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**0**		**0**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**0**		**0**	

Ciclo Financeiro – Análise Mancha

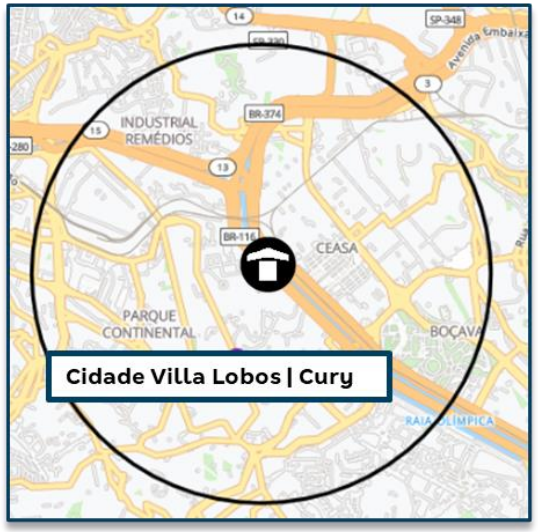

-	Life Jaguaré F2					Cidade Villa Lobos - Sonata						
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Dif	Farol
HMP	267.993	230.263	181.694	3.690	58%	315.000	240.195	192.156	4.071	79%	381	●
HMP VG CARRO	290.007	269.676	208.006	5.417	20%	335.000	330.851	264.681	6.471	19%	1.054	●
HMP VG MOTO	274.417	237.377	186.736	4.158	22%	323.000	282.824	226.259	5.621	2%	1.463	●

Parecer Ciclo

Ciclo avaliou Preço e VSO como factíveis. Para a tipologia com vaga, o Life Jaguaré F2 tem como premissa 8 vendas mensais. O preço sugerido por IM está alinhado à performance de projetos da regional, como o Viva Parque do Carmo, que apresentam volume e delta de preço equivalentes. Além disso, nosso principal concorrente , Cidade Villa Lobos, da Cury, pratica valores com vaga superiores aos estimados para o Life Jaguaré.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Resumo – Aprovação

Life Jaguré – SP – São Paulo Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	set-21							
F2 S/ VAGA		fev-26	ago-26	abr-28	6 meses	20 meses	fev-29	36 meses
F2 C/ VG CARRO		fev-26	ago-26	abr-28	6 meses	20 meses	fev-29	36 meses
F2 C/ VG MOTO		fev-26	ago-26	abr-28	6 meses	20 meses	fev-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	22,13 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	18.750 m²
Cash:	0,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	0	**Custo de terreno m²:**	1.180,1
Permuta Financeira:	22,13 MM (13,15%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 27 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	1,25 MM

Área Líquida do Terreno:	16.990 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	1.302,4
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	13,2% / 51,2%
CA Máx/Proj.	2,0 / 2,3
Incorridos de Incorporação:	3,04 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
F2 S/ VAGA	T+9	208.670	400	236.057	267.993	94,0%	73,6%	73,6%
F2 C/ VG CARRO	T+9	244.614	135	276.679	290.007	94,2%	66,3%	58,7%
F2 C/ VG MOTO	T+9	215.087	150	243.311	274.417	95,2%	68,8%	67,3%

Unidades Totais:	685	**Preço Médio:**	245.651	**Renda Média:**	4.133	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.785
Unidades Tenda:	685	**Avaliação Média:**	273.738	**Ato:**	2.707 (0,66 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	16.183
VSO:	38 Unidades	**VGV Total:**	168.271.043	**FGTS:**	2.384 (0,58 Salários)	**Preço Raso Médio:**	217.159
RET Médio:	3,6%	**VGV Tenda:**	168.271.043	**% em RET 1%:**	15%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit.:	93.577	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	32,00	**Gape / Mês Unit.:**	9,42

Resultado

LI (R$):	**28.357.525**	**LI:**	**22,64%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**13.326.781**	**Margem Bruta Econômica:**	**42,03%**
TIR:	**77,72%**	**LI Aprovação:**	**24,20%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(8.642.037)**	**Margem Bruta REF:**	**44,76%**
Exposição de Caixa:	**7,95%**	**Δ LI:**	**-1,56%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**30.964.879**	**Margem Rasa Econômica:**	**33,18%**
Payback Contingente (21 m):	**18 m/ (-3 m)**	**LI Marginal:**	**27,30%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**53.185.538**	**Margem Rasa REF:**	**37,52%**
Payback Consolidado:	**18 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**31,14%**

DRE – Aprovação

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Life Jaguré		F2 S/ VAGA		F2 C/ VG CARRO		F2 C/ VG MOTO	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	167.701	100,0%	94.185	100,0%	37.170	100,0%	36.346	100,0%
PIS/COFINS	(3.292)	2,0%	(1.679)	1,8%	(816)	2,2%	(798)	2,2%
Custo Total	(95.313)	58,0%	(55.218)	59,7%	(19.307)	53,1%	(20.788)	58,5%
Custo Terreno	(19.840)	12,1%	(11.154)	12,1%	(4.403)	12,1%	(4.283)	12,0%
Custo Relacionados a Terreno	(694)	0,4%	(405)	0,4%	(137)	0,4%	(152)	0,4%
Custos de Incorporação	(3.930)	2,4%	(2.287)	2,5%	(804)	2,2%	(839)	2,4%
Custo de Construção	(70.849)	43,1%	(41.372)	44,7%	(13.963)	38,4%	(15.514)	43,6%
Lucro Bruto Econômico	69.096	42,0%	37.288	40,3%	17.047	46,9%	14.760	41,5%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	69.096	42,0%	37.288	40,3%	17.047	46,9%	14.760	41,5%
Despesas de Selling	(15.059)	9,2%	(8.004)	8,7%	(3.937)	10,8%	(3.118)	8,8%
Contingência	(2.842)	1,7%	(1.596)	1,7%	(630)	1,7%	(616)	1,7%
Margem de Contribuição	51.195	31,1%	27.688	29,9%	12.481	34,3%	11.026	31,0%
IR e CSLL	(2.694)	1,6%	(1.374)	1,5%	(667)	1,8%	(653)	1,8%
Margem Líquida	48.501	29,5%	26.314	28,4%	11.813	32,5%	10.374	29,2%
Lucro Bruto REF Unit.	112.010	44,8%	103.393	43,0%	139.577	49,6%	110.177	44,4%
Lucro Raso REF Unit.	83.012	37,5%	75.514	35,5%	106.987	43,0%	81.429	37,1%

R$ Mil - VPL - Compra	Life Jaguré		F2 S/ VAGA		F2 C/ VG CARRO		F2 C/ VG MOTO	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	125.260	100,0%	70.338	100,0%	27.858	100,0%	27.064	100,0%
PIS/COFINS	(2.426)	1,9%	(1.237)	1,8%	(603)	2,2%	(586)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(94.476)	75,4%	(53.958)	76,7%	(20.033)	71,9%	(20.486)	75,7%
Custo Terreno	(15.080)	12,0%	(8.475)	12,0%	(3.358)	12,1%	(3.246)	12,0%
Custo Relacionados a Terreno	(898)	0,7%	(524)	0,7%	(177)	0,6%	(197)	0,7%
Custos de Incorporação	(3.968)	3,2%	(2.310)	3,3%	(808)	2,9%	(850)	3,1%
Custo de Construção	(58.040)	46,3%	(33.892)	48,2%	(11.439)	41,1%	(12.710)	47,0%
Despesas de Selling	(13.300)	10,6%	(7.067)	10,0%	(3.490)	12,5%	(2.743)	10,1%
Contingência	(1.206)	1,0%	(677)	1,0%	(267)	1,0%	(261)	1,0%
IR e CSLL	(1.985)	1,6%	(1.012)	1,4%	(493)	1,8%	(479)	1,8%
Lucro Imobiliário	28.358	22,6%	15.143	21,5%	7.222	25,9%	5.992	22,1%

Comparativo – Aprovação

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Anterior	Atual	Atual vs Anterior	Δ%
Data Estudo:	agosto-24	fevereiro-26	18 Meses	N/A
Lançamento:	março-26	fevereiro-26	-1 Meses	N/A
Uhs:	685	685	-	0,0%
Preço Nominal:	235.639	245.651	10.012	4,2%
Preço Raso:	211.855	217.159	5.304	2,5%
Preço Nominal Inflacionado:	261.364	250.261	(11.104)	-4,2%
Preço Raso Inflacionado:	234.995	221.263	(13.731)	-5,8%
Renda Média:	3.817	4.133	316	8,3%
VSO:	38	38	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	4.630	4.535	(95)	-2,0%
Avaliação:	238.018	273.738	35.720	15,0%
Prazo construção F1:	19	20	1	5,3%
Prazo de Pró-Soluto F1:	24	25	1	4,2%
Custo Total Inf (Unit):	150.304	139.143	(11.161)	-7,4%
Custo Construção (Unit):	85.473	93.577	8.104	9,5%
Fração de construção:	36,3%	38,1%	1,8 p.p.	5,0%
INCC Folha Rosto:	1.118,83	1.228,16	109	9,8%
Custo Terreno Inf:	22.715.254	19.839.800	(2.875.454)	-12,7%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	518	1.013	495	95,5%
Fração do Terreno[1]:	13,15%	13,2% / 51,2%	0,1 p.p.	0,8%
Custo de Incorp. por uh:	7.880	5.738	(2.142)	-27,2%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	3.171.536	3.106.531	(65.005)	-2,0%
Custo do Ciclo (Unit):	14.966	16.183	1.218	8,1%
Lucro Imobiliário:	22,2%	22,6%	0,4 p.p.	1,8%
LI Régua:	20,0%	22,0%	2,0 p.p.	10,0%
Exposição de caixa:	17,5%	7,9%	-9,5 p.p.	-54,5%
TIR:	77,8%	77,7%	-0,1 p.p.	-0,1%
Margem Bruta REF:	44,3%	44,8%	0,5 p.p.	1,0%
Margem Bruta Econômica:	39,1%	42,0%	3,0 p.p.	7,6%
Margem Rasa REF:	37,9%	37,5%	-0,4 p.p.	-1,0%
Margem Rasa Econômica:	31,7%	33,2%	1,5 p.p.	4,7%
Margem Contribuição Econômica:	29,9%	31,1%	1,2 p.p.	4,0%
Payback Contingente (Régua 21 m):	20 m	18 m/ (-3 m)	-2	
Payback Consolidado:	17 meses	18 Meses	N/A	

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Resumo – Real

Life Jaguré – SP – São Paulo Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	set-21							
F2 S/ VAGA		fev-26	jul-26	mar-28	5 meses	20 meses	fev-29	36 meses
F2 C/ VG CARRO		fev-26	jul-26	mar-28	5 meses	20 meses	fev-29	36 meses
F2 C/ VG MOTO		fev-26	jul-26	mar-28	5 meses	20 meses	fev-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	22,04 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	18.750 m²	**Área Líquida do Terreno:**	16.990 m²
Cash:	0,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	0	**Custo de terreno m²:**	1.175,7	**Custo de terreno m² Área Líquida:**	1.297,5
Permuta Financeira:	22,04 MM (13,15%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):**	13,2% / 51,4%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 27 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.**	2,0 / 2,3
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	1,25 MM	**Incorridos de Incorporação:**	3,04 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
F2 S/ VAGA	T+9	207.683	400	235.201	267.993	94,2%	73,6%	74,0%
F2 C/ VG CARRO	T+9	243.309	135	275.547	290.007	94,3%	66,3%	59,0%
F2 C/ VG MOTO	T+9	214.048	150	242.409	274.417	95,3%	68,8%	67,7%

Unidades Totais:	685	**Preço Médio:**	244.731	**Renda Média:**	4.133	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	3.778
Unidades Tenda:	685	**Avaliação Média:**	273.738	**Ato:**	2.707 (0,66 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	16.123
VSO:	38 Unidades	**VGV Total:**	167.640.746	**FGTS:**	2.384 (0,58 Salários)	**Preço Raso Médio:**	216.098
RET Médio:	3,6%	**VGV Tenda:**	167.640.746	**% em RET 1%:**	15%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	750

Construção

Custo Total Unit.:	93.577	**Eventuais:**	4,00%	**Área priv (m²):**	32,00	**Gape / Mês Unit.:**	9,42

Resultado

LI (R$):	**28.112.576**	**LI:**	**22,38%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**14.625.154**	**Margem Bruta Econômica:**	**41,94%**
TIR:	**76,53%**	**LI Aprovação:**	**24,20%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(9.809.231)**	**Margem Bruta REF:**	**44,71%**
Exposição de Caixa:	**8,76%**	**Δ LI:**	**-1,82%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**32.881.069**	**Margem Rasa Econômica:**	**33,02%**
Payback Contingente (21 m):	**18 m/ (-3 m)**	**LI Marginal:**	**27,03%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**52.808.213**	**Margem Rasa REF:**	**37,39%**
Payback Consolidado:	**18 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**31,04%**

DRE – Real

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Life Jaguré		F2 S/ VAGA		F2 C/ VG CARRO		F2 C/ VG MOTO	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	166.963	100,0%	93.783	100,0%	36.992	100,0%	36.188	100,0%
PIS/COFINS	(3.278)	2,0%	(1.672)	1,8%	(812)	2,2%	(794)	2,2%
Custo Total	(95.041)	58,1%	(55.065)	59,8%	(19.261)	53,2%	(20.715)	58,5%
Custo Terreno	(19.840)	12,1%	(11.160)	12,1%	(4.410)	12,2%	(4.269)	12,1%
Custo Relacionados a Terreno	(694)	0,4%	(405)	0,4%	(137)	0,4%	(152)	0,4%
Custos de Incorporação	(3.942)	2,4%	(2.294)	2,5%	(806)	2,2%	(842)	2,4%
Custo de Construção	(70.566)	43,1%	(41.206)	44,7%	(13.907)	38,4%	(15.452)	43,7%
Lucro Bruto Econômico	68.645	41,9%	37.046	40,2%	16.920	46,8%	14.679	41,5%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	68.645	41,9%	37.046	40,2%	16.920	46,8%	14.679	41,5%
Despesas de Selling	(15.010)	9,2%	(7.980)	8,7%	(3.921)	10,8%	(3.108)	8,8%
Contingência	(2.830)	1,7%	(1.589)	1,7%	(627)	1,7%	(613)	1,7%
Margem de Contribuição	50.805	31,0%	27.476	29,8%	12.372	34,2%	10.958	31,0%
IR e CSLL	(2.682)	1,6%	(1.368)	1,5%	(664)	1,8%	(650)	1,8%
Margem Líquida	48.123	29,4%	26.108	28,3%	11.708	32,4%	10.308	29,1%
Lucro Bruto REF Unit.	111.469	44,7%	102.902	42,9%	138.765	49,5%	109.750	44,4%
Lucro Raso REF Unit.	82.329	37,4%	74.890	35,4%	105.999	42,8%	80.862	37,0%

R$ Mil - VPL - Compra	Life Jaguré		F2 S/ VAGA		F2 C/ VG CARRO		F2 C/ VG MOTO	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	125.631	100,0%	70.558	100,0%	27.933	100,0%	27.140	100,0%
PIS/COFINS	(2.433)	1,9%	(1.241)	1,8%	(605)	2,2%	(588)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(95.085)	75,7%	(54.320)	77,0%	(20.156)	72,2%	(20.609)	75,9%
Custo Terreno	(15.186)	12,1%	(8.540)	12,1%	(3.388)	12,1%	(3.259)	12,0%
Custo Relacionados a Terreno	(898)	0,7%	(524)	0,7%	(177)	0,6%	(197)	0,7%
Custos de Incorporação	(3.987)	3,2%	(2.321)	3,3%	(812)	2,9%	(854)	3,1%
Custo de Construção	(58.549)	46,6%	(34.189)	48,5%	(11.539)	41,3%	(12.821)	47,2%
Despesas de Selling	(13.258)	10,6%	(7.047)	10,0%	(3.476)	12,4%	(2.735)	10,1%
Contingência	(1.216)	1,0%	(683)	1,0%	(269)	1,0%	(264)	1,0%
IR e CSLL	(1.991)	1,6%	(1.015)	1,4%	(495)	1,8%	(481)	1,8%
Lucro Imobiliário	28.113	22,4%	14.997	21,3%	7.172	25,7%	5.943	21,9%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Comparativo entre réguas

Detalhamento da régua, conforme regra para fases futuras.

Laçto Ago/2024	Consolidado	Life Jaguaré F2
LI da Fase	20,0%	22,20%
folga consolidada	0,0%	0,0%
LI (tirando a folga)		22,2%
Régua da época	20,0%	20,0%
Distância régua anterior:		2,18%
Lançamento Atual:		
LI atual:		22,64%
Régua atual:		22,00%
Distância régua atual:		0,64%
Distância Entre Réguas		-1,54%

*O quadro acima é os dados da ultima aprovação, conceitualmente todo projeto que é aprovado como consolidado, terá esse comparativo, dito isso, a ultima aprovação do Life Jaguaré F1, foi no consolidado com o LI de 20% e a régua da época era 20%.
Quando analisamos a Fase 2 lá em Set/24, estava com o LI de 22,2%, ou seja, essa fase estava melhor que a F1, logo, a nova régua para essa fase não seria mais 20% e sim a LI da fase – folga do consolidado, que daria 22,2% além disso temos que aplicar a nova régua mínima vigente 22%, totalizando 24,2 de LI mínima para aprovação da F2.

Simulação de Preço – Parecer IM Fase 1

Informações Viabilidade

Projeto:	Life Jaguaré		Life Jaguaré	
Tipo:	**HMP**		**HMP**	
Método	Vision		BP24 - Inflacionado	
Avaliação	231.000		231.000	
Renda Inicial	3.463		3.963	
Renda Final*	-		-	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,52	1.818	0,96	3.801
FGTS	1,10	3.825	0,00	0
Financiamento	96,69%	171.310	104,53%	192.422
Subsídio	178,29%	5.652		0
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24
Pró-Soluto	77,16%	23.304	74,32%	25.685
Preço Raso (RS)	205.909	205.909	221.909	221.909
TCD	53,63%	18.724	61,88%	24.724
VSO	33	33	33	33
Preço de Venda	**224.633**	**224.633**	**246.633**	**246.633**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**224.633**	**224.633**	**246.633**	**246.633**
Preço Raso (R$)	**205.909**		**221.909**	
% de Raso	**91,66%**		**89,98%**	

O preço partida do BP não inflacionado HMP é de 207.679.

*Não considerar a linha de "Renda Final – pós elasticidade" para viabilidade.

Simulação de Preço – Parecer IM Fase 1

Informações Viabilidade

Projeto:	Life Jaguaré		Life Jaguaré	
Tipo:	**HMP - Com Vaga**		**HMP - Com Vaga**	
Método	Vision		BP24 - Inflacionado	
Avaliação	255.500		255.500	
Renda Inicial	4.899		5.299	
Renda Final*	-		-	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,58	2.853	0,84	4.426
FGTS	0,93	4.541	0,00	0
Financiamento	98,90%	202.159	109,61%	224.051
Subsídio	0,00%	0	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24
Pró-Soluto	76,85%	32.832	64,72%	29.907
Preço Raso (RS)	242.384	242.384	258.384	258.384
TCD	57,40%	28.347	64,30%	34.347
VSO	1	1	1	1
Preço de Venda	**270.732**	**270.732**	**292.732**	**292.732**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**270.732**	**270.732**	**292.732**	**292.732**
Preço Raso (R$)	**242.384**		**258.384**	
% de Raso	**89,53%**		**88,27%**	

O preço partida do BP não inflacionado Com Vaga é de 241.815.

*Não considerar a linha de "Renda Final – pós elasticidade" para viabilidade.

Simulação de Preço – Parecer IM Fase 1

Informações Viabilidade

Projeto:	Life Jaguaré		Life Jaguaré	
Tipo:	**HMP - Moto**		**HMP - Moto**	
Método	Vision		BP24 - Inflacionado	
Avaliação	241.000		241.000	
Renda Inicial	3.785		4.185	
Renda Final*	-		-	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,50	1.878	0,94	3.944
FGTS	1,03	3.891	0,00	0
Financiamento	95,27%	179.458	104,27%	199.659
Subsídio	165,43%	3.684	0,00%	0
Prazo de Pró-soluto	24	24	24	24
Pró-Soluto	76,79%	25.344	73,03%	26.651
Preço Raso (RS)	214.255	214.255	230.255	230.255
TCD	68,31%	26.063	78,37%	33.063
VSO	1	1	1	1
Preço de Venda	**240.318**	**240.318**	**263.318**	**263.318**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**240.318**	**240.318**	**263.318**	**263.318**
Preço Raso (R$)	**214.255**		**230.255**	
% de Raso	**89,15%**		**87,44%**	

O preço partida do BP não inflacionado Moto é de 215.489.

*Não considerar a linha de "Renda Final – pós elasticidade" para viabilidade.

Análise de Preço – Parecer IM Fase 1

Informações Viabilidade

Projeto:	Life Jaguaré
Tipo:	**Faixa 2**
Método	Vision
Avaliação	231.986
Renda Inicial	3.514
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,53	1.849
FGTS	1,09	3.847
Financiamento	96,27%	172.424
Subsídio	187,84%	5.435
Prazo de Pró-soluto	24	24
Pró-Soluto	77,14%	23.635
Preço Raso (RS)	207.189	207.189
TCD	54,23%	19.209
VSO	35	35
Preço de Venda	**226.398**	**226.398**
Elasticidade	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**226.398**	**226.398**
Preço Raso (R$)	**207.189**	
% de Raso	**91,52%**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço Vision, tendo em vista que, o projeto está em uma região com bons indicadores sociodemográficos, como renda e PEA/Dia, o mesmo também se encontra próximo de pontos de interesses como hospital, escola e etc.

Conforme consta no slide “Panorama de Concorrência”, os concorrentes da região vendem em um target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda.

Obrigado
