Tenda

sua próxima conquista

Book de Investimento

Regional: GO

Projeto: Videira

Data Comitê: 26/05/2025

Questionamentos Comitê de Investimento 26/05/2025

Nome	Videira - Investimento	Observação - Videira
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	Ok
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	Ok
Rodrigo Osmo	Aprovado	N/A
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	Ok
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Discutir em Comitê	qual a razão principal do proprietário figurar em tantas ações de débitos fiscais e de improbidade? Podem ter mais ações como essa ainda não transitadas em julgado?

Questionamento Luiz Maurício
Qual a razão principal do proprietário figurar em tantas ações de débitos fiscais e de improbidade? Podem ter mais ações como essa ainda não transitadas em julgado?

R: Na verdade, são apenas duas execuções fiscais e uma ação de improbidade administrativa. As execuções decorrem de débitos junto ao fisco: uma referente ao não pagamento de multa aplicada pelo TCU em processo administrativo e outra relacionada à inadimplência de valor apurado pelo mesmo Tribunal, em razão de irregularidades na prestação de contas de empresa da qual o Sr. Wolney era sócio (ICBC).

A ação de improbidade foi proposta pelo Ministério Público em razão de suposta contratação direta e emergencial, sem licitação, realizada pelo DETRAN/GO com a empresa Engenho & Arte, também ligada ao Sr. Wolney.

Neste momento, fora as três ações identificadas, não foram identificadas outras ações em nome do proprietário, e para as ações acima indicadas em cópia, foi apresentado solução para mitigação dos riscos no parecer jurídico. Contudo, como em qualquer outra aquisição, existe a possibilidade de surgimento de novos processos até a lavratura da escritura pública de venda e compra, o que será visto e analisado quando da renovação da Due e discutido no comitê de escritura, se for o caso.

Aprovação Luiz Maurício via e-mail:

RES: Comitê Investimento - GO | Videira

Lucas Rodrigues Garcia
Para Luiz Mauricio de Garcia Paula
Cc Alexandre Millen Grzegorzewski; Natacha Amorim Castor; Luiza Cavazza Aranha; Igor Coimbra Alves Cavalcanti Calixto; Estudos Economicos

Responder | Responder a Todos | Encaminhar
sex 30/05/2025 10:24

Confidencial

Oi Luiz, bom dia.
Obrigado pela aprovação.

Sobre a Due Diligence das empresas, sim, é necessária e já faz parte do nosso processo, abrangendo-as também.

Abs.

"Acreditamos que todas as pessoas merecem ter o seu lugar no mundo" Tenda

Lucas Garcia
Regional GO
Cel.: (21) 97941-7069
Rua João de Abreu, Nº 116 - SL 101/102-B
Ed. Euro Working, Setor Oeste, Goiânia - GO

De: Luiz Mauricio de Garcia Paula <luiz.garcia@tenda.com>
Enviada em: quinta-feira, 29 de maio de 2025 19:35
Para: Lucas Rodrigues Garcia <lgarcia@tenda.com>
Cc: Alexandre Millen Grzegorzewski <amillen@tenda.com>; Natacha Amorim Castor <ncastor@tenda.com>; Luiza Cavazza Aranha <lcsilva@tenda.com>; Igor Coimbra Alves Cavalcanti Calixto <icalixto@tenda.com>; Estudos Economicos <estudoseconomicos@tenda.com>
Assunto: RES: Comitê Investimento - GO | Videira

Ok, seria legal ter um DD sobre as empresas dele tb.
abs

One Page - Videira

[1]

Cidade	Goiânia	**Mancha de demanda**	GO - GOS - Goiânia Sul + Aparecida de Goiânia
Regional	GO	**Cluster MPR**	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	NA		
Tipo de Comitê	Investimento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Mai

Unidades (% Vagas)	294 (41%)	**CA Máx | Proj**	2,0 | 0,8
Tipologia	F2 - Concreto	**Escritura**	out-26
Fases	1 fases	**Lçto | Duração (m)**	dez/26 | 18

[2]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	3.539 (5,6%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	3.539 (SIM)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	202	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[3]

Custo Construção (%VGV)	27.108 (43,1%)	**Indireto Unit.**	20.661
Prazo da Obra (meses)	12	**Torre Unit.**	39.059
Custo Total Unit. | Corrigido (LPU):	92.205 | 91.732 (LPU 90)	**Infra Unit.**	20.063
Início de Obra	jun-27	**Fundação Unit.**	7.359

Preço Nominal Unit.	213.984	**VSO**	23
Preço Raso Unit.	185.778	**Referência**	Vision
Avaliação Unit.	209.765	**Renda (% em RET 1%)**	2.424 (67,5%)

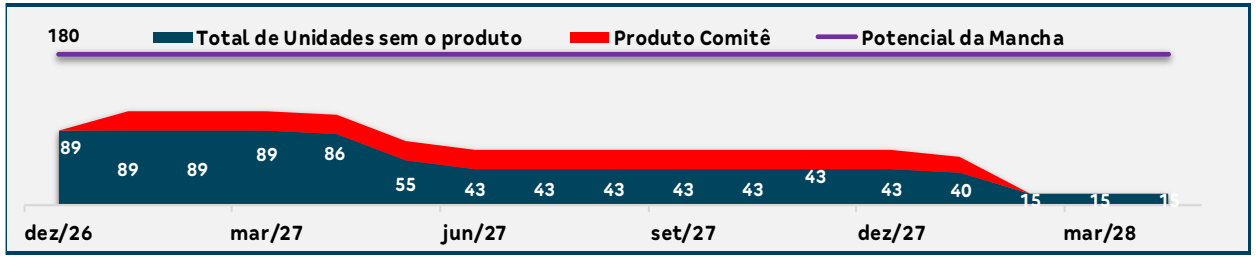

[4]

LI (Régua):	**21,4% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	42,2%
LI Resiliência:	16,1% (N/A)	**Margem Rasa Econômica:**	32,7%
Margem Bruta REF:	44,5%	**Margem Contribuição Econômica:**	28,9%
Margem Rasa REF:	**36,1%**	**Exposição (% VGV):**	12.142 (17,8%)
TIR:	116,8%	**VGV Total:**	62.911
Payback Contingente (21 m) :	**15 m/ (-6 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	-
Payback Consolidado:	15	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	(5.131)

Destaques

[1] Apresentação em Comitê de Investimento do projeto **VIDEIRA**, na Mancha Sul (Capital). Projeto composto por 1 condomínio de fase única.

Este projeto é sucessor do empreendimento Estância Dourados II, que tem 451 uh, com previsão de finalizar seu estoque no segundo tri de 2026.

O Jardim Itaipu é um bairro da região sudoeste de Goiânia. O seu desenvolvimento teve início no final da década de 80, com melhorias significativas em infraestrutura ocorrendo a partir de 2005, incluindo asfaltamento, iluminação pública e abastecimento de rede de água.

A principal via do bairro é a Avenida Vieira Santos, que recebe um fluxo considerável de veículos e transporte público, além de abrigar um comércio em expansão. O Jardim Itaipu é abastecido de estabelecimentos comerciais, UBS e Escola Pública.

[2] Negócio em fluxo de cash em 48x com fração liquida de 5,6%. Garantia do vendedor através do aval Tenda.

[3] Custo de construção consolidado de ~ 92,2 K/UH em tipologia modular.

[4] Indicadores financeiros do projeto consolidado VIDEIRA de MB = 42% e LI = 21%.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Pareceres – VIDEIRA

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Due diligence concluída em 05/25 com os seguintes pontos de atenção: (i) Pendente envio de extrato de débitos federais, estaduais e municipais dos vendedores e empresas que são sócios para apurar o passivo completo dos vendedores; (ii) Consta na matrícula averbação de indisponibilidade de bens, gravada em 09/10/2023, oriunda de um processo judicial, movido pela União em face do proprietário Wolney Alfredo, contudo foi previsto em PCV que o gravame deverá ser baixado/cancelado no prazo de 180 dias da assinatura da mesma (prerrogativa de baixa, entendimento de como vai ocorrer essa indisponibilidade); (iii) O proprietário Wolney é réu em duas execuções fiscais da União Federal, sendo uma a que originou o gravame na matrícula (na qual o proprietário celebrou acordo e encontra-se em dia com o pagamento) e outra que já se encontra em fase final de execução com pedido de bloqueio de bens, no valor de R$ 430mil, sendo certo que não foram constatados ativos suficientes para garantir o pagamento do débito, uma vez que os imóveis que o Wolney possuí, estão gravados por indisponibilidade; (iv) Ainda, o proprietário Wolney é réu em uma ação de improbidade de administrativa em que o MP pretende a aplicação de penalidades aos réus, entre eles o Sr. Wolney, pela prática de atos de improbidade que causaram dano material ao erário no valor de R$ 1.061.303,00 (atualizado em 2020). Diante do passivo judicial identificado, é necessário que o Sr. Wolney outorgue poderes à Tenda para que esta possa atuar em seu nome, se necessário, com vistas ao pagamento dos débitos, mediante abatimento proporcional no preço da compra, e a viabilidade comporte a antecipação desse pagamento na data da escritura;(prerrogativa de baixa) (v) Pendente emissão das certidões de desapropriação e tombamento , contudo como mitigadores não foram constatadas ações envolvendo os imóveis. Resolutivas: O contrato possui cláusula resolutiva master de saída (viabilidade técnica, financeira, comercial e jurídica).	Ok com ressalvas	
Legalização	Sem ressalvas.	Ok	
Produto	Ok	Ok	
GETEC	Atualmente não há diretriz de água e esgoto. Conforme indicado pelo projetista estamso considerando o ponto provável de interligação para a extensão de rede de águ. Para a rede de esgoto, estamos com o cenário mais desfavorável, que envolve a execução de uma ET. O custo deverá ser revisado após emissão da AVTO.	Ok com ressalvas	
Logística	Sem riscos	Ok	
Contratação	NA	Ok	
Inteligência de mercado	IM avalia o Preço Vision como factivel.	Ok	
Comercial/Ciclo	Ciclo Financeiro avalia o Preço como factível.	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA
Goiânia Sul + Aparecida

Lançamento

1. Estancia Dourados

LandBank

2. Faiçalville
3. Santa Rita
4. COPAG
5. Videira

Cluster MPR – (Comitê)

- Cluster 1 – Vermelho

Região

Capital

Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Videira Investimento

Informações Gerais – Condomínio Único		
Terreno	**Área terreno**	20.128,02m²
	Menor poligonal	17.557,63m²
	App/fna	Sim (APP: 3.120,17m²)
	Reserva de calçada	Sim
	Área liquida	17.557,63m²
	Zoneamento	AAB (fração 45) + AOS (fração 180)
	CA máximo	2
	CA projetado	0,77
	Gabarito máximo	T+4
Geral	**Total uh fração x projetado**	Fração 294 UH x Projetado 294 UH
	Total de vagas	122 (41,50%)
Tipologia	**Tipologia**	Modular sem elevador
	Gabarito	T+ 4 ABB e T+3 AOS
	Lâmina	04 12PP e 01 14PP
	Área privativa	31,99m²
Condomínio	**Unidade pcd**	09
	Unidade lazer | técnica	04
	Torre	05
	Fase	01
Lazer	**Lazer coberto**	Salão de festas c/ churrasqueira, churrasqueira gourmet
	Lazer descoberto	Pet place, play kids, play baby, Quadra gramada e multifuncional

ÁREAS DE LAZER

PRODUTO

Empreendimento Frutas
Investimento

	Descrição	Criticidade	Parecer
Usabilidade	**Limite supercondomínio**		
	Acesso		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	**Atributos Infra**	Sim	Previsão Mini mercado no Salão de Festas e Quadra Descoberta
	Atributos Torre	Não	
	Edifício Garagem	Não	

Perspectiva

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

➢ CONDIÇÕES DO NEGÓCIO

- Trata-se de Compra e Venda que corresponde ao preço certo e previamente ajustado de **R$ 3.539.435,00** que será pago em 48 parcelas mensais, iguais e consecutivas, no valor de R$ 73.738,23 vencendo-se a primeira na data da outorga da ECV, as demais parcelas terão vencimento no mesmo dia dos meses subsequentes ao vencimento da primeira parcela. As parcelas indicadas serão atualizadas mensalmente, pro rata die, desde a data da assinatura do contrato até o efetivo pagamento, com base na variação acumulada do **IPCA**.

- O negócio é em Fluxo de cash com **fração líquida de 5,6%** (PCV assinada em **abril/25**).

- Se o contrato for rescindido após a celebração desmembramento/remembramento e doação, a Tenda deverá restituir o imóvel no estado atual (ou seja, imóvel remembrado) no prazo de **120 dias.** Será necessário pilotar a aprovação do parcelamento/desmembramento de modo a só processarmos o mesmo com a certeza da escritura, ou pós escritura.

- Conforme matrícula o imóvel possui área de 20.128,02m² sendo certo que, após os estudos técnicos iniciais a serem realizados pela COMPRADORA, seja constatada variação de metragem da área em até **3% (três por cento),** não haverá qualquer alteração no valor do negócio. **Estes estudos já foram realizados e não há variação dessa metragem.**

- Caso o imóvel esteja contaminado e a Tenda opte por não rescindir o contrato, o custo da remediação será de nossa responsabilidade. **Foi realizado laudo ambiental que não indica contaminação no terreno.**

- No caso de falecimento de algum dos VENDEDORES, as Partes deverão aguardar o procedimento judicial/extrajudicial de partilha do IMÓVEL para o prosseguimento do presente instrumento, sendo certo que não incidirá aos VENDEDORES qualquer multa ou penalidade.

Condições do Negócio

- O Imóvel encontra-se gravado com uma indisponibilidade oriunda do processo nº 202310.0912.02974502-IA-150 da 10ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária de Goiás que deverá ser baixada/cancelada no prazo de 180 dias da assinatura da minuta;

- O prazo do contrato é de **12 + 6** meses para realizar a ECV;

- A multa aos vendedores por rescisão em razão do descumprimento de obrigações foi limitada a 5% do valor do negócio. A multa por atraso da outorga ou cumprimento de obrigações pelos vendedores foi limitada a 1% do valor do negócio.

- Neste contrato, os vendedores não ser responsabilizam por apontamentos/documentos relacionados aos antecessores do imóvel;

- Foi considerado o valor de R$430K para efetivação da [illegible] referente a uma dívida do proprietário Wolney com a Receita Federal. Este valor está sendo considerado como segurança p[illegible]gócio seja feito sem atrasos.

➢ **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS:**

- ECV: o empreendimento deverá ser Escriturado em até 12 meses a partir da assinatura da PCV, prorrogável automaticamente por mais 6 meses;

➢ GARANTIAS

- Para os Vendedores:
  - Aval Tenda;

➢ INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA

- Contrato de intermediação assinado.

- Pagamento será feito após a escritura pública de transferência para a Tenda, em 03 parcelas atualizadas mensalmente pelo IPCA.. Sendo a primeira em 30, e as demais em 60 e 90 dias.

- A intermediação será no total de 4% do valor do Terreno, hoje estimado em R$ 141.577,40 para RH SHIMANA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS, inscrita no CRECI PJ n° 023050-J.

- Pareceres
- Análise da Mancha e Implantação
- Prospecção
- Operações
- Inteligência de Mercado
- Financeiro

Custo de Construção

	VIDEIRA CEN01 | REV01	VIDEIRA CEN01 | REV00	FRUTAS CEN01 | REV00
Torres	5	5	3
Unidades Construídas	298	298	320
Unidades Vendidas	294	294	320
Total Unidades Vendidas	294	294	320
Condomínios (qta.)	1	1	1
Cidade	Goiânia - GO	Goiânia - GO	Goiânia - GO
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	F2 MODULAR
Tipologia	3 Torres | T+4 | 12PP | CS1A	3 Torres | T+4 | 12PP | CS1A	2 Torres | T+4 | 22PP | CS1B
Tipologia	1 Torre | T+3 | 12PP | CS1A	1 Torre | T+3 | 12PP | CS1A	1 Torre | T+4 | 20PP | LS1B
Tipologia	1 Torre | T+4 | 14PP | CS1A	1 Torre | T+4 | 14PP | CS1A	-
Atributos de Projeto	-	-	Garden
Projeto Infra	AP	AP	AP
Projeto Torre	AP	AP	AP
Mês Base	abril-25	abril-25	março-25
Incc	1.184,462	1.173,775	1.173,775
LVS	março-25	fevereiro-25	janeiro-25
Indiretos	março-25	fevereiro-25	janeiro-25
Base de Preço	LPU 90	LPU 88	LPU 87
Takt	2x2	2x2	2x2
Prazo (mês)	12	12	13
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 90.375	R$ / UND R$ 90.308	R$ / UND R$ 80.615
Indireto	R$ 20.661	R$ 20.674	R$ 18.020
Torre	R$ 39.059	R$ 38.979	R$ 36.518
Infra	R$ 20.063	R$ 20.063	R$ 19.593
Fundação	R$ 7.359	R$ 7.359	R$ 3.901
EEE			
ETE	R$ 2.343	R$ 2.343	R$ 2.152
Contenção	R$ 268	R$ 268	
Terraplenagem	R$ 622	R$ 622	R$ 432
CUSTO TOTAL II	R$ 1.830	R$ 1.818	R$ 2.890
Urbanização			
Drenagem	R$ 501	R$ 497	R$ 457
Extensão de Rede Elétrica	R$ 172	R$ 172	R$ 66
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.158	R$ 1.149	R$ 2.367
CUSTO TOTAL III			
Incorridos			
CUSTO TOTAL IV			
Aprendizado			
CUSTO TOTAL V		R$ 839	R$ 760
Atualização por INCC		R$ 839	R$ 760
CUSTO TOTAL I+II	R$ 92.206	R$ 92.126	R$ 83.505
CUSTO TOTAL I AO V	R$ 92.206	R$ 92.965	R$ 84.265

Custo de Construção

	VIDEIRA CEN01 | REV01	VIDEIRA CEN01 | REV00	
Torres	5	5	
Unidades Construídas	298	298	
Unidades Vendidas	294	294	
Condomínios (qta.)	294	294	
Cidade	1	1	
Produto / Selo	Goiânia - GO	Goiânia - GO	
Tipologia	F2 MODULAR	F2 MODULAR	
Tipologia	3 Torres | T+4 | 12PP | CS1A	3 Torres | T+4 | 12PP | CS1A	
Tipologia	1 Torre | T+3 | 12PP | CS1A	1 Torre | T+3 | 12PP | CS1A	
Atributos de Projeto	1 Torre | T+4 | 14PP | CS1A	1 Torre | T+4 | 14PP | CS1A	
Projeto Infra	-	-	
Projeto Torre	AP	AP	
Atributos de Projeto	AP	AP	
Mês Base	abril-25	abril-25	
Incc	1.184,462	1.173,775	
LVS	março-25	fevereiro-25	
Indiretos	março-25	fevereiro-25	
Base de Preço	LPU 90	LPU 88	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	12	12	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 90.375	R$ / UND R$ 90.308	DIF R$ 67
Indireto	R$ 20.661	R$ 20.674	-R$ 13
Torre	R$ 39.059	R$ 38.979	R$ 80
Infra	R$ 20.063	R$ 20.063	R$ 0
Fundação	R$ 7.359	R$ 7.359	R$ 0
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 2.343	R$ 2.343	R$ 0
Contenção	R$ 268	R$ 268	R$ 0
Terrapplenagem	R$ 622	R$ 622	R$ 0
CUSTO TOTAL II	R$ 1.830	R$ 1.818	R$ 12
Urbanização	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Drenagem	R$ 501	R$ 497	R$ 3
Extensão de Rede Eletrica	R$ 172	R$ 172	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.158	R$ 1.149	R$ 9
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 839	-R$ 839
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 839	-R$ 839
CUSTO TOTAL	R$ 92.206	R$ 92.965	-R$ 759

INDIRETOS

+148 | G13 – Pessoal permanente (Preço/Dissídio)
-135 | G14 – Administração (Atualização de QC's)

TORRE

+316| Vertical (LVS 03/25 Linear x LVS 02/25)
-235 | Instalações (LVS 03/25 x LVS 02/25)

Custo de Construção

	VIDEIRA CEN01 | REV01	FRUTAS CEN01 | REV00	
Torres	5	3	
Unidades Construídas	298	320	
Unidades Vendidas	294	320	
Condomínios (qta.)	294	320	
Cidade	1	1	
Produto / Selo	Goiânia - GO	Goiânia - GO	
Tipologia	F2 MODULAR	F2 MODULAR	
Tipologia	3 Torres | T+4 | 12PP | CS1A	2 Torres | T+4 | 22PP | CS1B	
Tipologia	1 Torre | T+3 | 12PP | CS1A	1 Torre | T+4 | 20PP | LS1B	
Atributos de Projeto	1 Torre | T+4 | 14PP | CS1A	-	
Projeto Infra	-	Garden	
Projeto Torre	AP	AP	
Atributos de Projeto	AP	AP	
Mês Base	abril-25	março-25	
Incc	1.184,462	1.173,775	
LVS	março-25	janeiro-25	
Indiretos	março-25	janeiro-25	
Base de Preço	LPU 90	LPU 87	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	12	13	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 90.375	R$ / UND R$ 80.615	DIF R$ 9.761
Indireto	R$ 20.661	R$ 18.020	R$ 2.641
Torre	R$ 39.059	R$ 36.518	R$ 2.541
Infra	R$ 20.063	R$ 19.593	R$ 471
Fundação	R$ 7.359	R$ 3.901	R$ 3.458
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 2.343	R$ 2.152	R$ 190
Contenção	R$ 268	R$ 0	R$ 268
Terrapplenagem	R$ 622	R$ 432	R$ 191
CUSTO TOTAL II	R$ 1.830	R$ 2.890	-R$ 1.060
Urbanização	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Drenagem	R$ 501	R$ 457	R$ 44
Extensão de Rede Eletrica	R$ 172	R$ 66	R$ 106
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 1.158	R$ 2.367	-R$ 1.209
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 760	-R$ 760
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 760	-R$ 760
CUSTO TOTAL	R$ 92.206	R$ 84.265	R$ 7.940

INDIRETOS

+217 | G13 – Pessoal permanente (Preço/Dissídio)
+152 | G14 – Administração (Preço/Diluição)
+421 | G15 – Implantação do Canteiro (Preço/Diluição)
+455 | G16 – Equipamentos (Atualização de QC's/Projeto)
+356 | G17 – Operação do Canteiro (Escavadeira para hélice)
+808 | G18 – Ensaios (Ensaio fundação)

TORRE

+466 | Vertical (LVS 03/25 Linear x LVS 01/25 Linear e L)
+131 | Formas (Indiretos 02/25 x Indiretos 01/25)
+133 | Concreto (Projeto)
Videira: 12PP 10,51 m³/uh | 14PP 10,48 m³/uh
Frutas: 20PP 10,64 m³/uh | 22PP 10,35 m³/uh
+197 | Esquadrias de Ferro (Diluição)
+1.415 | Instalações (LVS 03/25 x LVS 01/25)

INFRA

+463 | Alv. de Vedação (Projeto)

FUNDAÇÃO

+3.458 | Projeto
Videira: Estaca Hélice Ø 30cm - 13m de profundidade
Frutas: Radier com recompactação de 2m

TERRAPLENAGEM

+191| Projeto
Videira: Corte – 3.944 m³ | Aterro – 4.466 m³
Frutas: Corte – 2.321 m³ | Aterro – 1.782 m³

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conforme alinhamento entre a regional e o projetista, foi prevista a extensão de rede de 740 metros.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Conforme alinhamento entre a regional e o projetista, o condomínio contará com uma ETE e seu emissário será destinado para o córrego, com extensão de 85m metros.

SISTEMA DE DRENAGEM
Descarte no sentido do córrego, no fundo do terreno.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado execução da calçada em frente ao empreendimento.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 5
Esgoto	Nível 5
Drenagem	NA
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Conforme alinhamento entre a regional e o projetista, foi prevista a extensão de rede de 740m

Esgoto:
- Conforme alinhamento entre a regional e o projetista, o condomínio contará com uma ETE e seu emissário será destinado para o córrego, com extensão de 85m.

Drenagem:
- O projeto considera o descarte no sentido do córrego, no fundo do terreno.

Elétrica:
- Viabilidade emitida em 03/2025.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Para o projeto foi considerado execução da calçada em frente ao empreendimento.

Fundação:
- Realizada campanha de sondagem contemplando 10 furos.
- Considerada Estaca hélice, com diâmetros de 30cm e profundidade de 13m.

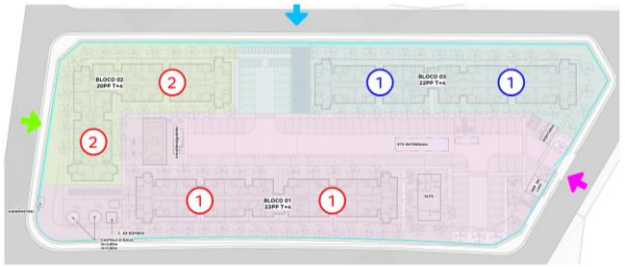

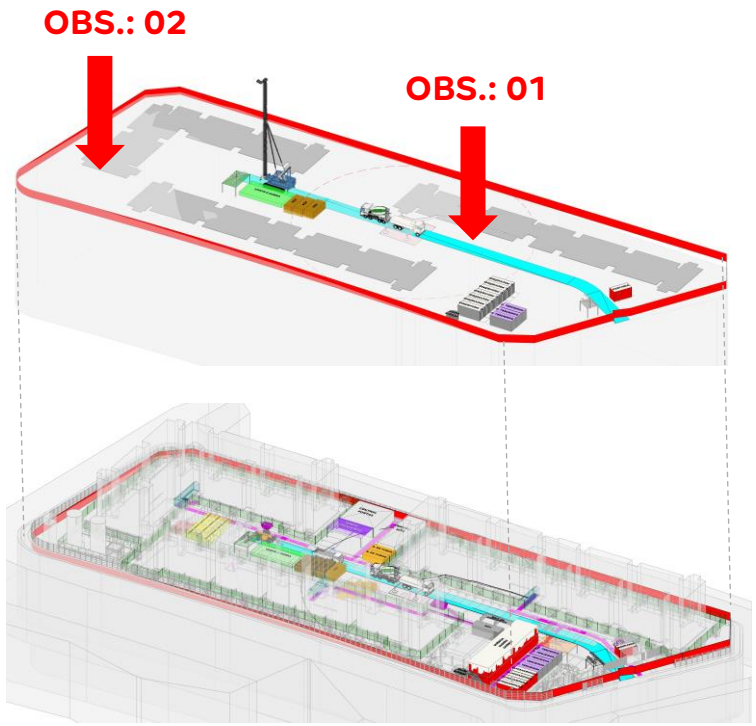

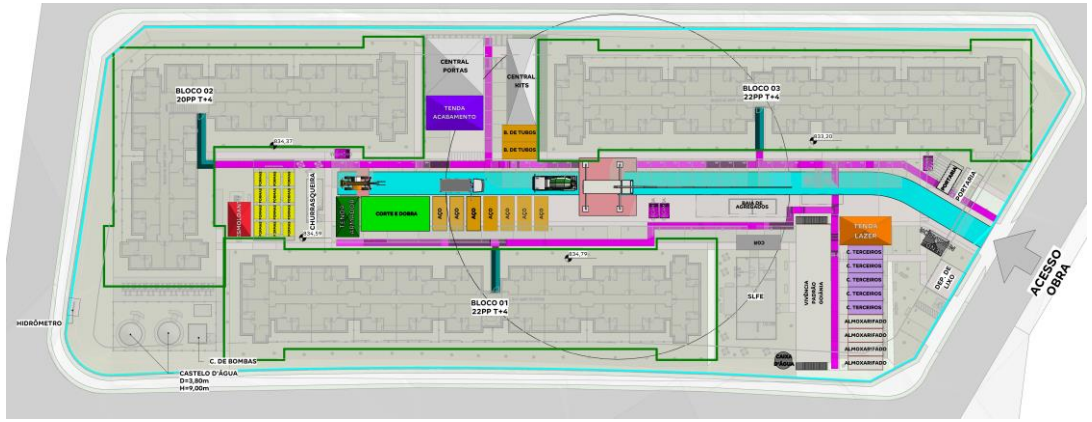

➢ **OBS. 01**	PREVER PRAZO NO INÍCIO DO PRÉ-FORMA PARA EXECUÇÃO DO ENTERRADO, PARA QUE POSSA VIABILIZAR O ACESSO DE VEÍCULOS.
➢ **OBS. 02**	OS CASTELOS DEVERÃO SER INSTALADOS NOÍNÍCIO DO PRÉ-FORMA, ANTES DA EXECUÇÃO DOS BLOCOS 02 E 03.

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **CUSTOS / OBRA**	OS ENTERRADOS (CONFORME INDICADO EM PROJETO) LOCADOS SOB A VIA DE VEÍCULOS DEVERÃO SUPORTAR CARGA DE NO MÍNIMO 54 TONELADAS (CARRETA CARREGADA DAS PLACAS PRÉ FABRICADAS)
➢ **PRAZO DE OBRA**	DEVIDO À COMPLEXIDADE DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO (ENTERRADO CRÍTICOS), O PERÍODO DE PRÉ-FORMA POSSÍVELMENTE TERÁ UM PRAZO MAIS LONGO QUE O PADRÃO.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Goiânia Sul + Aparecida	GOS	36%	1.805	150	2.165	180

Empreendimento	Renda	Lançamento	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28	jul/28	ago/28	set/28
Estância Dourados II	2.550	mar-26	35	35	35	35	35	12																
COPAG - F1	2.508	abr-26	26	26	26	26	23																	
FaiçalVille	3.464	jul-26	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	25								
Videira	**2.579**	**dez-26**		**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**18**								
COPAG - F2	2.477	abr-27						15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
Total de Vendas Lançados			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**89**	**112**	**112**	**112**	**109**	**78**	**66**	**66**	**66**	**66**	**66**	**66**	**66**	**58**	**15**	**15**	**15**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lanç + Landbank)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Videira | Mapa Concorrência

		Videira	Gran Essence
		TENDA	MRV
	Distância Tenda (km)		4,66 Km
Região 1 Km	População	7.111	13.239
	Dens. Demográfica	2.278	4.241
	Renda (R$)	3.579	3.500
	Classe Social	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 - (De 2.7k até 4.6k)
	PEA Dia	2.495	4.990
Quantitativo	Lançamento	dez/26	jun/24
	Unidades	294	304
	Estoque	294	73
	VSO	23	21
	Stockout	13	3
Qualitativo	Condomínios	1	
	Torres	5	
	Gabarito	T+4	
	Plantas (m²)	31,99m²	41,3
	Tipologia	2 Dorms	
	Opções	Não	
	Varanda	Não	
	Suite	Não	
	Dif. Entrega	Não	
	Vagas	40% de Vagas	100
	Lazer	Salão de festas c/ churrasqueira, churrasqueira goumert, pet place, play kids, play bay, quadra gramada e multifuncional. Interno = brinquedoteca e espaço office.	Playground, Churrasqueira, Garrafão De Basquete, Gazebo, Redário, Bicicletário E Praça De Convivência.

Tipologias	Empreendimento	Videira			Gran Essence		
	Tipologia	Sem vaga	Vaga moto	Vaga Carro	Vaga carro	Garden	Varanda
	Preço Nominal	209.936	213.699	222.005	235.759	239.686	243.184
	CEF	165.394	168.502	172.685	183.584	187.580	191.128
	Renda	2.398	2.558	2.942	3.552	3.630	3.698
	% Unidades	59%	12%	30%	19%	34%	46%
	Dif Renda				610	-	-
	Farol de Factibilidade				●	-	-

Farol Renda
● Acima de 300
● Entre 0 e 300
● Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- O projeto Gran Essence está localizado em uma região metropolitana e apresenta um preço acima do estimado para o Videira. Além disso, o projeto conta com a opção do Emcash.
- Embora o empreendimento da MRV ofereça a opção de Emcash, o Estância Dourado I (Tenda) lançado em Março 2025, alcançou um VSO de 54 vendas líquidas, com um ticket médio de R$ 210 mil (vide slide Analise de preço).

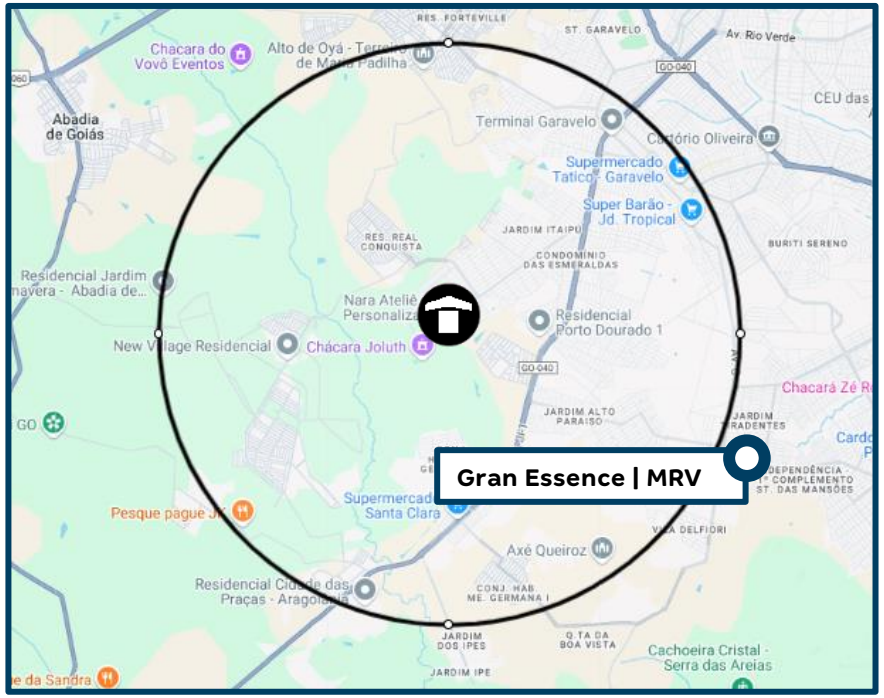

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Videira					
Tipo:	**Sem vaga**		**Vaga Moto**		**Vaga Carro**	
Método	**Vision**		**Vision**		**Vision**	
Avaliação	206.600		208.600		216.400	
Renda Inicial (VF)	2.248		2.358		2.792	
Renda Final*	2.398		2.558		2.942	
% RET1	75%		75%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,64	1.497	0,61	1.497	0,55	1.601
FGTS	0,22	503	0,21	503	0,32	919
Financiamento	94,00%	132.714	93,88%	139.158	96,08%	156.762
Subsídio	103,88%	32.177	108,73%	28.841	114,42%	15.004
Prazo de Pró-soluto	17	17	17	17	17	17
Pró-Soluto	109,26%	15.171	108,65%	15.825	108,65%	18.738
Preço Raso (RS)	182.062	182.062	185.825	185.825	193.024	193.024
TCD	123,01%	27.874	117,27%	27.874	102,98%	28.982
VSO	13	13	3	3	7	7
Preço de Venda	**202.078**	**202.078**	**205.700**	**205.700**	**213.695**	**213.695**
Elasticidade	3,889%	3,889%	3,889%	3,889%	3,889%	3,889%
Preço de Venda Final	**209.936**	**209.936**	**213.699**	**213.699**	**222.005**	**222.005**
Preço Raso (R$)	**182.062**		**185.825**		**193.024**	
% de Raso	**86,72%**		**86,96%**		**86,95%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-		-	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Videira
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Vision**
Avaliação	209.765
Renda Inicial (VF)	2.424
Renda Final*	2.579

Tipo:	VF	R$
Ato	0,61	1.529
FGTS	0,24	628
Financiamento	94,61%	140.657
Subsídio	107,60%	26.651
Prazo de Pró-soluto	17	17
Pró-Soluto	109,01%	16.314
Preço Raso (RS)	185.778	185.778
TCD	116,35%	28.206
VSO	23	23
Preço de Venda	**205.662**	**205.662**
Elasticidade	3,889%	3,889%
Preço de Venda Final	**213.984**	**213.984**
Preço Raso (R$)	**185.778**	
% de Raso	**86,82%**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o Preço Vision, visto que, projetos da regional atuam em regiões semelhantes e capturam rendas equivalentes à estimada pelo Vision.

Além disso, conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", O projeto Gran Essence – MRV está localizado em uma região metropolitana, apresenta renda e preço acima do estimado para o Videira.

Abaixo segue o escalonamento da Regional:

	Preço Real					Preço Normalizado(17)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Média	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Estância Dourado I	**194.449**	**182.803**	**2.550**	**54**	**19**	**-1.900**	**180.903**
Videira	**209.765**	**185.778**	**2.579**	**23**	**17**	**-**	**185.778**

Videira

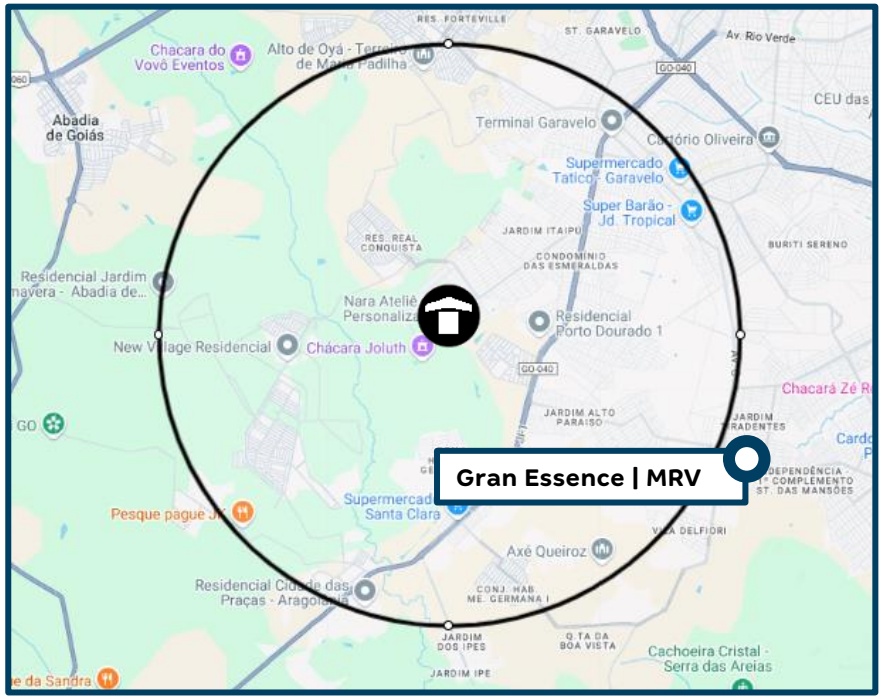

*São considerados apenas as unidades dos concorrentes que estão alinhadas com o produto Tenda

Análise de Riscos	Farol CF
Ciclo Financeiro avalia o Preço Referência como **factível.**	

1) O Ciclo Financeiro está de acordo com a precificação apontada por IM. No entanto, temos uma atenção em relação à avaliação estimada para o projeto. Estamos considerando que o ganho em relação aos itens de lazer irá suprir totalmente a redução pela tipologia modular.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Informações Gerais – VIDEIRA

Videira - GO - Goiânia Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	abr-25							
Videira c/ vaga carro		dez-26	jun-27	jun-28	6 meses	12 meses	dez-29	36 meses
Videira s/ vaga		dez-26	jun-27	jun-28	6 meses	12 meses	dez-29	36 meses
Videira c/ vaga moto		dez-26	jun-27	jun-28	6 meses	12 meses	dez-29	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	3,54 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	20.128 m²
Cash:	3,54 MM			**Custo de terreno m²:**	175,8
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,00 MM

Área Líquida do Terreno:	17.558 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	201,6
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	5,6% / 48,7%
CA Máx/Proj.	2,0 / 0,8
Incorridos de Incorporação:	0,08 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Videira c/ vaga carro	T+4	193.024	88	222.005	216.400	96,1%	108,7%	103,0%
Videira s/ vaga	T+4	182.062	172	209.936	206.600	94,0%	109,3%	123,0%
Videira c/ vaga moto	T+4	185.825	34	213.699	208.600	93,9%	108,7%	117,3%

Unidades Totais:	294	**Preço Médio:**	213.984	**Renda Média:**	2.424	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	7.743
Unidades Tenda:	294	**Avaliação Média:**	209.765	**Ato:**	1.481 (0,61 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	14.016
VSO:	23 Unidades	**VGV Total:**	62.911.302	**FGTS:**	593 (0,24 Salários)	**Preço Raso Médio:**	185.778
RET Médio:	2,0%	**VGV Tenda:**	62.911.302	**% em RET 1%:**	68%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	774

Construção

Custo Total Unit. | Corrigido:	92.205 | 91.732	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	31,99	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**8.504.424**	**LI:**	**21,36%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**12.141.942**	**Margem Bruta Econômica:**	**42,19%**
TIR:	**116,76%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**0**	**Margem Bruta REF:**	**44,49%**
Exposição de Caixa:	**17,78%**	**Δ LI:**	**1,36%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**(5.130.717)**	**Margem Rasa Econômica:**	**32,65%**
Payback Contingente (21 m):	**15 m/ (-6 m)**	**LI Resiliência:**	**16,13%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**18.979.472**	**Margem Rasa REF:**	**36,08%**
Payback Consolidado:	**15 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**28,87%**

DRE

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Videira		Videira c/ vaga carro		Videira s/ vaga		Videira c/ vaga moto	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	68.302	100,0%	21.155	100,0%	39.238	100,0%	7.908	100,0%
PIS/COFINS	(741)	1,1%	(290)	1,4%	(376)	1,0%	(76)	1,0%
Custo Total	(39.055)	57,8%	(11.687)	56,0%	(22.854)	58,8%	(4.515)	57,6%
Custo Terreno	(4.108)	6,1%	(1.230)	5,9%	(2.404)	6,2%	(475)	6,1%
Custo Relacionados a Terreno	(336)	0,5%	(101)	0,5%	(197)	0,5%	(39)	0,5%
Custos de Incorporação	(2.872)	4,3%	(856)	4,1%	(1.685)	4,3%	(330)	4,2%
Custo de Construção	(31.739)	47,0%	(9.500)	45,5%	(18.568)	47,8%	(3.670)	46,9%
Lucro Bruto Econômico	28.505	42,2%	9.179	44,0%	16.009	41,2%	3.318	42,4%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	28.505	42,2%	9.179	44,0%	16.009	41,2%	3.318	42,4%
Despesas de Selling	(7.428)	11,0%	(2.291)	11,0%	(4.280)	11,0%	(857)	10,9%
Contingência	(1.571)	2,3%	(487)	2,3%	(902)	2,3%	(182)	2,3%
Margem de Contribuição	19.506	28,9%	6.401	30,7%	10.826	27,9%	2.278	29,1%
IR e CSLL	(607)	0,9%	(237)	1,1%	(308)	0,8%	(62)	0,8%
Margem Líquida	18.899	28,0%	6.164	29,5%	10.519	27,1%	2.216	28,3%
Lucro Bruto REF Unit.	104.925	44,5%	114.282	46,5%	100.953	43,4%	104.831	44,4%
Lucro Raso REF Unit.	73.739	36,1%	82.249	38,5%	70.120	34,8%	74.047	36,0%

R$ Mil - VPL - Compra	Videira		Videira c/ vaga carro		Videira s/ vaga		Videira c/ vaga moto	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	39.805	100,0%	12.345	100,0%	22.846	100,0%	4.614	100,0%
PIS/COFINS	(426)	1,1%	(166)	1,3%	(216)	0,9%	(44)	0,9%
Custos e Despesas Totais	(30.875)	77,6%	(9.325)	75,5%	(17.982)	78,7%	(3.568)	77,3%
Custo Terreno	(2.299)	5,8%	(688)	5,6%	(1.345)	5,9%	(266)	5,8%
Custo Relacionados a Terreno	(281)	0,7%	(84)	0,7%	(165)	0,7%	(33)	0,7%
Custos de Incorporação	(2.179)	5,5%	(650)	5,3%	(1.278)	5,6%	(252)	5,5%
Custo de Construção	(20.193)	50,7%	(6.044)	49,0%	(11.814)	51,7%	(2.335)	50,6%
Despesas de Selling	(5.058)	12,7%	(1.563)	12,7%	(2.907)	12,7%	(588)	12,7%
Contingência	(517)	1,3%	(160)	1,3%	(297)	1,3%	(60)	1,3%
IR e CSLL	(348)	0,9%	(136)	1,1%	(176)	0,8%	(36)	0,8%
Lucro Imobiliário	8.504	21,4%	2.854	23,1%	4.649	20,3%	1.002	21,7%

Obrigado
