Tenda

sua próxima conquista

Book de Lançamento

Regional: RJ

Projeto: Porto Valência F2

Data Comitê: 28/11/2025 - Respostas

Questionamentos – Comitê digital 24/11

Nome	Porto Valência F2 - Lançamento	Observação - Porto Valência
Fabricio Quesiti Arrivabene	Aprovado	ok
Alejandro Octavio Abiusi	Discutir em Comitê	Qual seria a LI consolidada do projeto, considerando o estouro de custo ocorrido na urbanização?
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Discutir em Comitê	essa forte piora da LI da fase 2 teve quais impactos a mais, além do desvio de custo da urbanização?
Renan Barbosa Sanches	Discutir em Comitê	Informar em detalhes o desvio para o esperado da fase 2 quando do lançamento da fase 1. Oq precisamos fazer para buscar a rentabilidade esperada?
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Andre Luis Menegazzo Padilha	Aprovado	ok
Amanda da Silva Bezerra	Aprovado	ok
Rodrigo Osmo	Discutir em Comitê	(1) Queria entender quais foram as maiores variações na viabilidade desde o lançamento, que explicam uma perda tão substancial de LI

Perguntas sobre a queda da LI

O desvio do custo de urbanização está sendo considerado desde o comitê de lançamento da Fase 1, então ele não está interferindo na diferença de resultado.

As maiores variações na viabilidade foram o preço inflacionado; no comitê da fase 1 era mais alto do que o atual (230.772 x 215.712), ou seja, não estamos repassando a inflação para o preço, e ainda tivemos um aumento no custo de construção (87.396 x 90.225), por conta de dissídio e ajuste no preço de aço e concreto.

	Comitê lançamento F1 - jun/24	Comitê lançamento F2 - nov/25	Variação
Nominal inflacionado	230.772	215.712	-15.060
Raso inflacionado	201.373	194.241	-7.132
Custo de construção	87.396	90.225	2.829
LI	30,10%	21,25%	0

Questionamentos – Comitê digital 24/11

Para chegarmos na LI do último comitê, isolando as variáveis preço e custo, teríamos que OU subir 20k o preço raso OU reduzir o custo em 16k/uh. Desafios que não nos parecem factíveis dada evolução do projeto/orçamento e o histórico de vendas dos predecessores (Porto Barão e Porto Valencia F1).

Aumento de preço

Preço Nominal Unit.	252.661	**VSO**	11
Preço Raso Unit.	211.919	**Referência**	Porto Valência F1
Avaliação Unit.	203.600	**Renda (% em RET 1%)**	2.907 (20,0%)

LI (Régua):	**30,1% (30,1%)**	**Margem Bruta Econômica:**	54,7%
LI Marginal:	41,1%	**Margem Rasa Econômica:**	45,6%
Margem Bruta REF:	57,1%	**Margem Contribuição Econôn**	43,2%
Margem Rasa REF:	**49,0%**	**Exposição (% VGV):**	8.777 (24,9%)
TIR:	62,6%	**VGV Total:**	**35.372**
Payback Contingente (21 m) :	**14 m/ (-7 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(4.076)
Payback Consolidado:	14	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	12.253

Redução de custo

Custo Construção (%VGV)	10.392 (34,9%)	**Indireto Unit.**	20.694
Prazo da Obra (meses)	8	**Torre Unit.**	43.110
Custo Total Unit. (LPU):	74.225 (96)	**Infra Unit.**	16.252
Início de Obra	jun-26	**Fundação Unit.**	4.725

LI (Régua):	**30,1% (30,1%)**	**Margem Bruta Econômica:**	54,2%
LI Marginal:	42,9%	**Margem Rasa Econômica:**	48,8%
Margem Bruta REF:	57,0%	**Margem Contribuição Econôn**	42,3%
Margem Rasa REF:	**52,2%**	**Exposição (% VGV):**	7.273 (24,6%)
TIR:	61,5%	**VGV Total:**	**29.803**
Payback Contingente (21 m) :	**13 m/ (-8 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(2.754)
Payback Consolidado:	13	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	11.944

Questionamentos – Comitê digital 24/11

Alejandro Abiusi: Qual seria a LI consolidada do projeto, considerando o estouro do custo ocorrido na urbanização?

Abaixo temos os resultados da VF da época do lançamento da F1, com os parâmetros atuais para a F2.
Observamos que a queda de preço de fato afeta negativamente a LI, porém o aumento de custo, como foi menor do que a variação da inflação, não traz piora na LI.
Como a F2 é bem menor do que a fase 1 (160 x 340) o impacto na LI consolidada não é tão relevante como na isolada da fase 2.

Consolidado	LI	Delta
LI Partida	19,50%	
Preço Ajustado	18,41%	-1,1%
LI Custo Atualizado	19,18%	0,8%

One Page – Porto Valência F2

[1]

Cidade	Rio de Janeiro	Mancha de demanda	RJ - RZO3/4 - Campo Grande
Regional	RJ	Cluster MPR	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Aprovação	Tipo de Aprovação	Consolidado
Fase Anterior	Porto Valência	Aprovação Fase Anterior	Consolidado
Tipo de Comitê	Lançamento	Versão da VF	Versão 1.0: Nov

Unidades (Fases)	140 (1)	CA Máx | Proj	2,0 | 1,5
Unidades com Vaga (%)	28 (20%)	Escritura | Lançamento	fev/23 | dez/25
Unidades com Varandas (%)	0 (0%)	Tipologia	F2 - Concreto

[2]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	1.007 (3,4%)	Un. Perm. Fís (% Ter)	0 (0,0%)
Cash (Correção)	1.007 (N/A)	%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	100	VAR (%VGV)	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	12.632 (42,4%)	Indireto Unit.	20.694
Prazo da Obra (meses)	8	Torre Unit.	43.110
Custo Total Unit. (LPU):	90.225 (96)	Infra Unit.	16.252
Início de Obra	jun-26	Fundação Unit.	4.725

[3]

Preço Nominal Unit.	212.877	VSO	11
Preço Raso Unit.	191.657	Referência	Porto Valência F1
Avaliação Unit.	203.600	Renda (% em RET 1%)	2.907 (20,0%)



LI (Régua):	21,3% (30,1%)	Margem Bruta Econômica:	46,0%
LI Marginal:	34,0%	Margem Rasa Econômica:	39,6%
Margem Bruta REF:	49,1%	Margem Contribuição Econômica:	34,1%
Margem Rasa REF:	43,4%	Exposição (% VGV):	8.910 (30,1%)
TIR:	49,9%	VGV Total:	29.803
Payback Contingente (21 m) :	14 m/ (-7 m)	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(4.558)
Payback Consolidado:	14	Ger. Caixa 24 meses (R$):	9.560

*Valores em R$ '000

Destaques

[1] Informações
Terreno do Porto Valência é localizado na mancha RZO3/6, ao lado do empreendimento Porto Barão, próximo da Av. Brasil (principal via de acesso entre a Zona Central e Zona Oeste) e a Est. Do Mendanha (uma das principais vias de acesso de Campo Grande).

AGI da F1 prevista para dez/25.

[2] Terreno
ECV assinada em 09/02/23. Pagamento do terreno já incorrido. Valor do terreno proporcional as unidades da F2.

[3] Precificação
Precificação segue a regra de ouro para o cenário Aprovação. Preço Referência do Porto Valência F1.

No quadro abaixo, temos a LI do comitê da Fase 1, que teve sua aprovação com os resultados do Consolidado, em julho de 2024.

jul/24	Consolidado	P. Valência F2
LI da Fase	19,5%	30,10%
folga consolidada	0,0%	0,0%
LI (tirando a folga)		30,1%
Régua	20,0%	20,0%
Distância régua anterior:		10,10%
Lançamento Atual:		
LI atual:		21,25%
Régua atual:		20,00%
Distância régua atual:		1,25%
Distância Entre Réguas		-8,85%

One Page – Porto Valência F2

Cidade	Rio de Janeiro	**Mancha de demanda**	RJ - RZO3/4 - Campo Grande
Regional	RJ	**Cluster MPR**	1 - Vermelho
Cenário de Aprovação	Real	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Porto Valência	**Aprovação Fase Anterior**	Consolidado
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Nov

Unidades (Fases)	140 (1)	**CA Máx | Proj**	2,0 | 1,5
Unidades com Vaga (%)	28 (20%)	**Escritura | Lançamento**	fev/23 | dez/25
Unidades com Varandas (%)	0 (0%)	**Tipologia**	F2 - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	1.007 (3,6%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	1.007 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	0,0% (0,0%)
Valor R$/m²	100	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	12.632 (45,1%)	**Indireto Unit.**	20.694
Prazo da Obra (meses)	8	**Torre Unit.**	43.110
Custo Total Unit. (LPU):	90.225 (96)	**Infra Unit.**	16.252
Início de Obra	nov-26	**Fundação Unit.**	4.725

[1]

Preço Nominal Unit.	200.183	**VSO**	30
Preço Raso Unit.	180.863	**Referência**	Porto Valência F1
Avaliação Unit.	203.600	**Renda (% em RET 1%)**	2.907 (60,0%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	181.856
Preço Inf. Médio Unit.	201.187	**Margem Bruta REF (%)**	43,8%
Custo Inf. Médio Unit.	113.145	**Margem Rasa REF (%)**	37,8%



[2]

LI (Régua):	**18,4% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	41,9%
LI Marginal:	32,2%	**Margem Rasa Econômica:**	35,2%
Margem Bruta REF:	43,8%	**Margem Contribuição Econômica:**	30,2%
Margem Rasa REF:	**37,8%**	**Exposição (% VGV):**	5.135 (18,2%)
TIR:	45,1%	**VGV Total:**	**28.026**
Payback Contingente (21 m) :	**15 m/ (-6 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(1.931)
Payback Consolidado:	15	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	8.169

***Valores em R$ '000**

Destaques

[1] Precificação

Para precificação, consideramos o início de obra do PCP170 (nov26), e por isso estamos com um pró soluto maior.

Utilizamos o VSO do realizado dos últimos 3 meses da F1, pois entendemos que a visão real deve refletir uma continuidade do VSO da F1.

[2] Resultados financeiros

Esse produto carrega o custo proporcional da urbanização feita para a entrega do Porto Barão (terreno vizinho). Esta obra teve um custo de 3,7 milhões, incorrendo desde o início de 2023, sendo 780k de estouro (25%) com relação ao pré orçamento, onerando a lucratividade do produto. Mas olhando para o payback, a margem rasa e a LI marginal, constatamos que se trata de um bom produto.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Farol Pareceres – Porto Valência F2

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Compra e Venda em favor da Tenda devidamente registrada sob R-2 da Matrícula 59.938 em 24/02/2023. Registro do memorial de incorporação e afetação concluídos em 30/07/2024.	Ok	
Legalização	Licença da Fase 02 emitida; Licenciamento Ambiental válido; Habite-se da Fase 01 expedido.	Ok	
Produto	Não há.	Ok	
GETEC	Não há.	Ok	
Logística	Sem riscos associados.	Ok	
Contratação	Não há.	Ok	
Inteligência de mercado	Preço Vision como factível.	Ok	
Comercial/Ciclo	Ok.	Ok	
Estudos Econômicos	Projeto abaixo da régua de aprovação, conforme comparativo entre réguas	ok, com ressalvas	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA

- RZO 1/6 – Rio de Janeiro Oeste

Lançamento

1. Jardim Margarida | Peônia
2. Parque Iris | Hortênsia | Orquídea
3. Porto Barão | P. Valencia
4. Reserva Carioca

LandBank

5. Vista Senna
6. Porto Lima
7. Belo Oeste

Cluster MPR – (Comitê)
Cluster 1 - Vermelho

Região
Capital

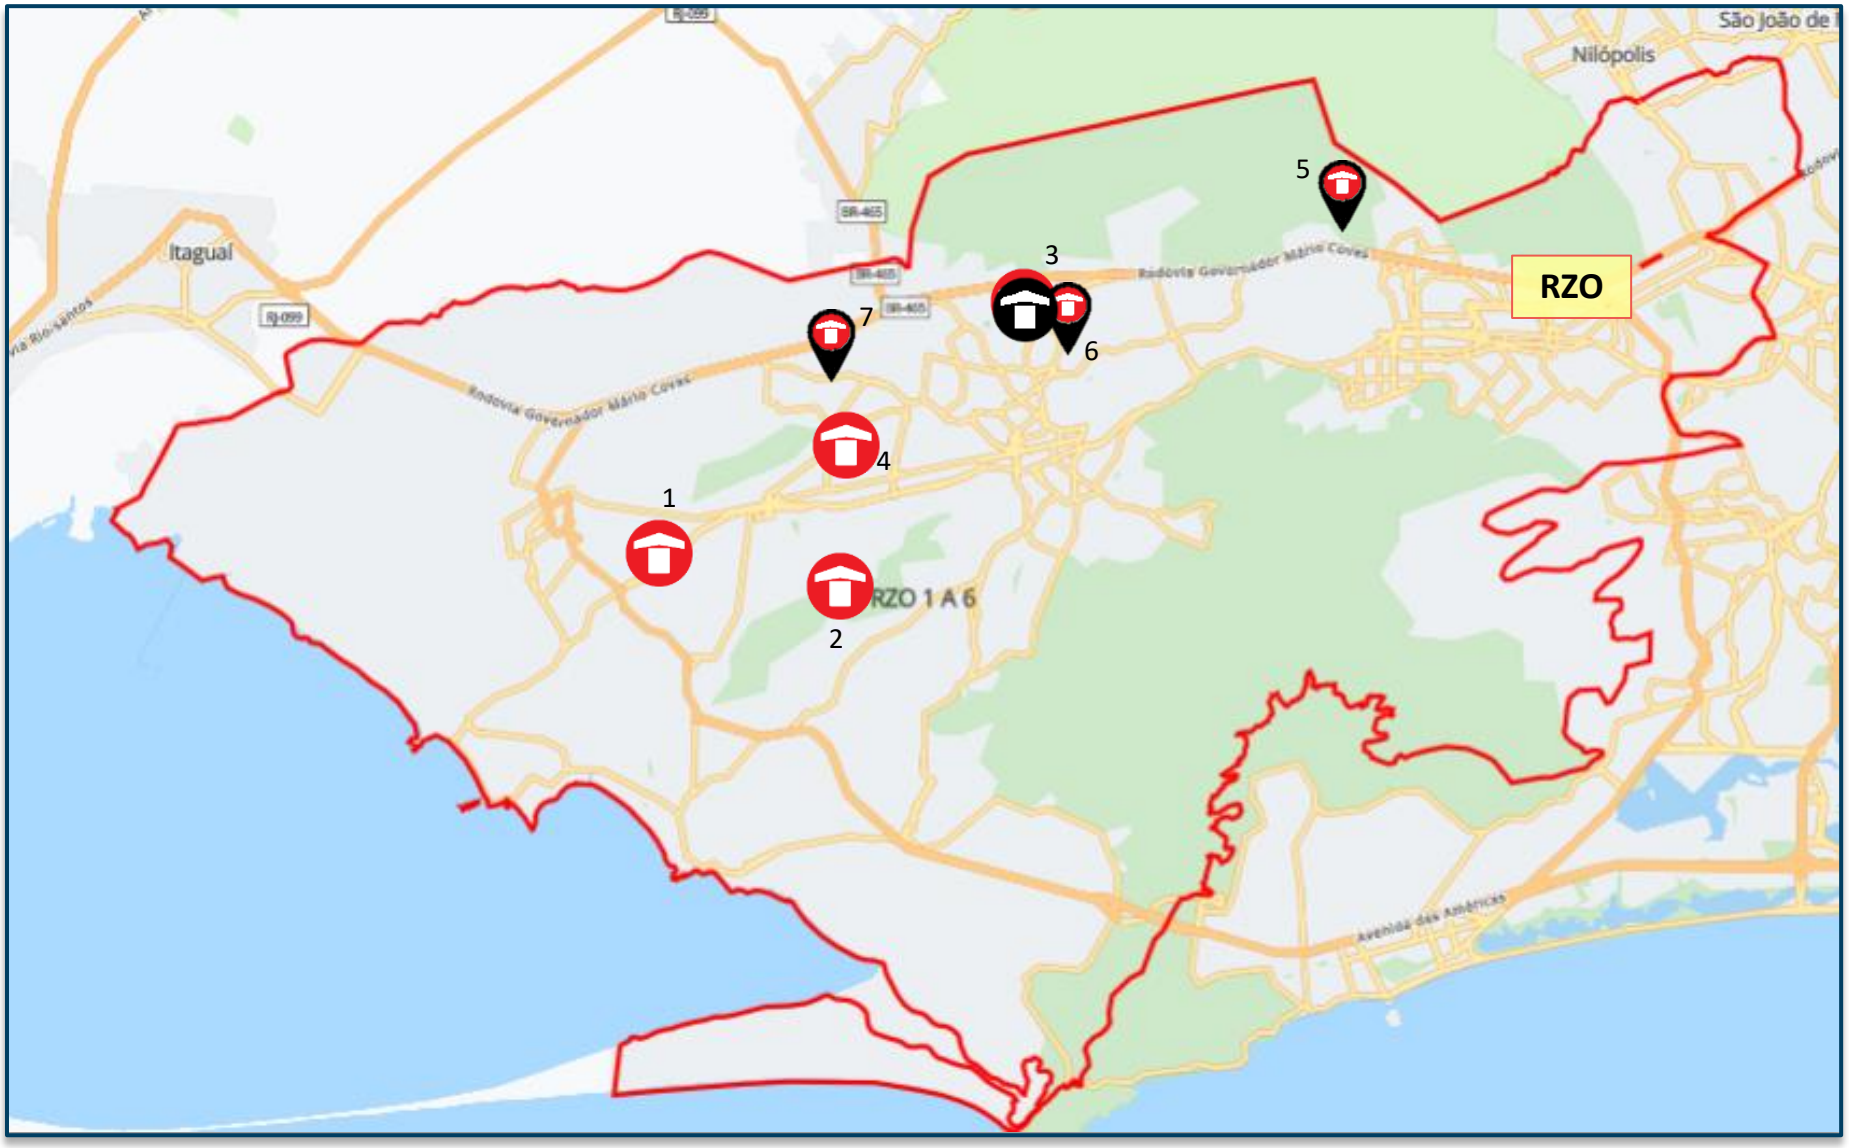

Lançados LandBank Comitê

PRODUTO

Empreendimento Porto Valência
Lançamento – Fase 2

Informações Gerais – Condomínio II		
Terreno	Área terreno	14.499,67m²
	Menor poligonal	14.499,67m²
	App/fna	FNA 499,625m²
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim/não
	Área liquida	14.000,045m²
Diretrizes Urbanísticas	Zoneamento	ZUPI
	Ca máximo Total	2,00
	Ca básico	1,00
	Ca liquido	1,50
	Ca projetado	1,45
	Gabarito máximo	T+4
Geral	Total uh	480
	Total de vagas exigido	0,00 (00%)
	Total de vagas projetado	96 (2,08%)
Tipologia	Tipologia	RJ-C- 6.0
	Gabarito	T+04
	Lâmina	01 04PP e 08PP
	Área privativa	40,54m²
Condomínio	Unidade pcd	15
	Unidade lazer|técnica	-
	Torre	14
	Fase	02
Lazer	Lazer Interno	-
	Lazer Externo	01-Salão de festas, 02-Play Kids, 03-Play Baby, 04- Praça dos Sabores, 05-Play Pet, 06- Fitness, 07- Espaço Relax

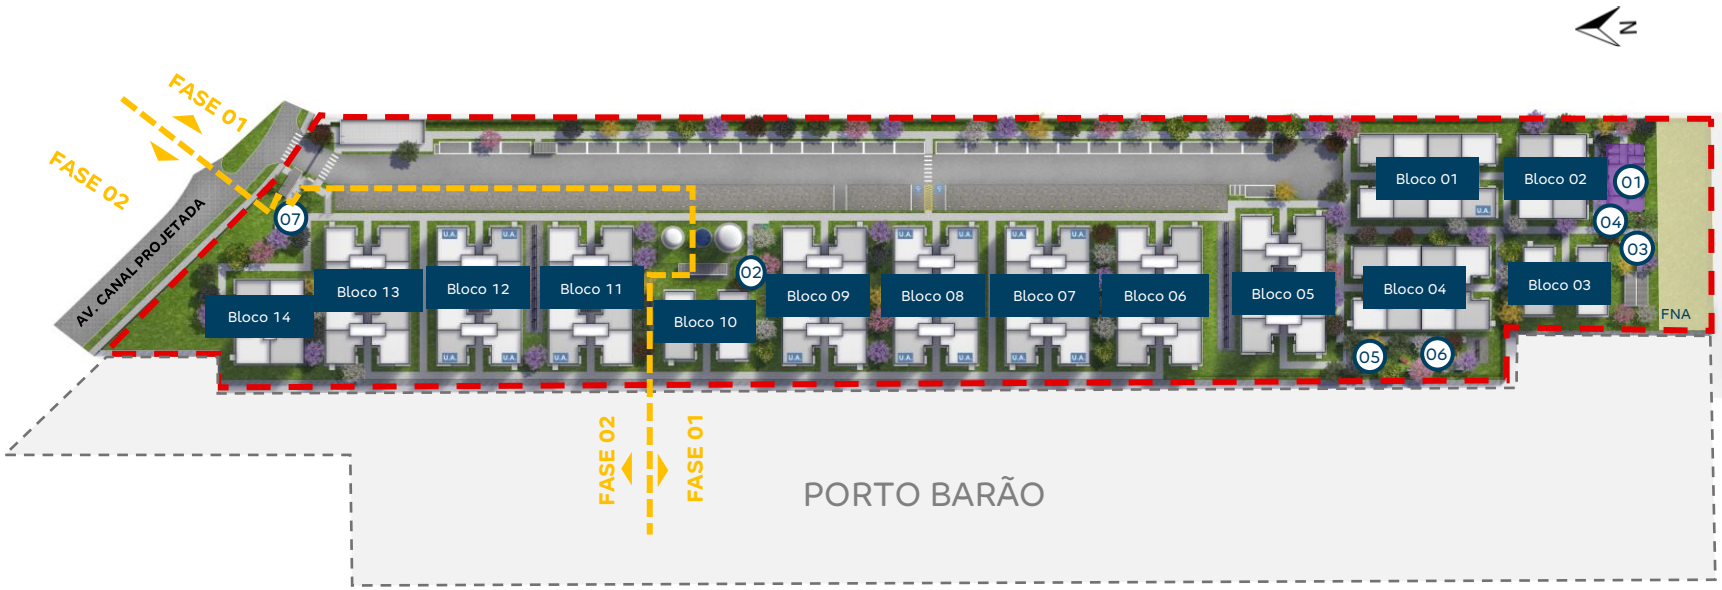

PRODUTO

Empreendimento Porto Valência
Lançamento – Fase 2

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	Acesso Empreendimento		
	Percurso do pedestre até torre		
Diferencial produto	Faixa de renda	2	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Não	
	Atributos Torre	Não	
	Edifício Garagem	Não	

Salão de Festas

Espaço Relax

Play Pet

Empreendimento Porto Valência
Lançamento – Fase 2

Fase 2: 140h – 28vagas				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 04	03 Blocos 8PP (T+4) 01 Bloco 4PP (T+4)	140 UH	28 vagas	Dos Lazeres, estão contemplados no módulo 4 o Play Kids e Espaço Relax.

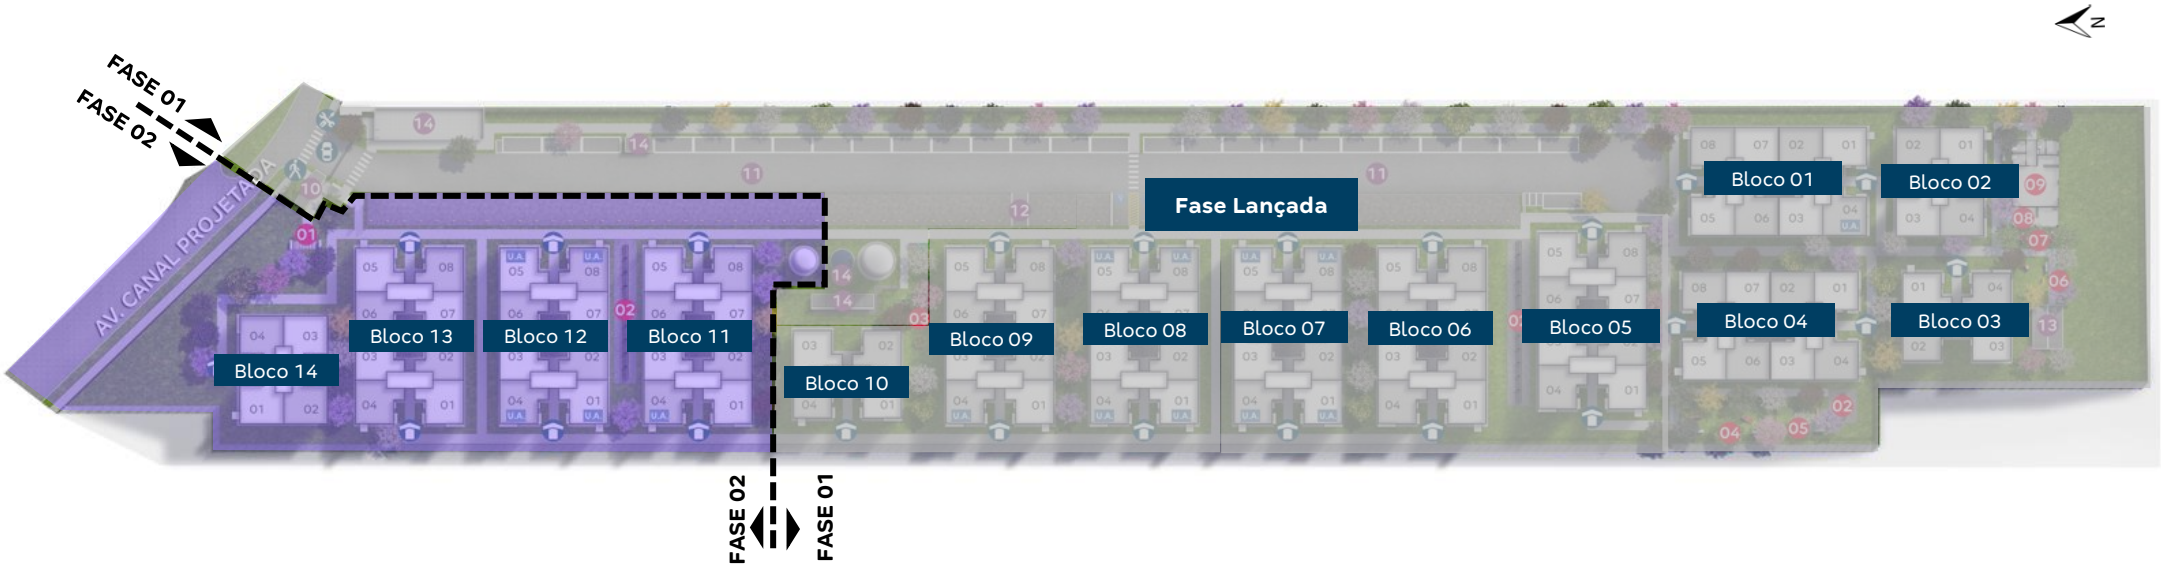

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Custo de Construção

	PORTO VALENCIA F2 R13	PORTO VALENCIA F2 R12	PORTO VALENCIA F2 BP 25	PORTO VALENCIA F1 LVS	SOLAR TRINDADE F2 R21
Torres	4	4	4	17	5
Unidades Construídas	140	140	140	340	180
Unidades Vendidas	140	140	140	340	180
Condomínios (qta.)	1	1	1	1	1
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ
Produto / Selo	F2	F2	F2	F1	F2
Tipologia	4 Torres | T+04 | 04PP	4 Torres | T+04 | 04PP	4 Torres | T+04 | 04PP	17 Torres | T+04 | 04PP	5 Torres | T+04 | 04PP
Projeto Infra	LO	LO			LO
Projeto Torre	LO	LO			LO
Mês Base	novembro-25	setembro-25	outubro-24	julho-24	setembro-25
Incc	1.218,747	1.210,471	1.141,398		1210
LVS	setembro-25	junho-25	agosto-24		45809
Indiretos	setembro-25	junho-25	agosto-24		45809
Base de Preço	LPU 96	LPU 94	LPU 83		LPU 94
Takt	2+2	2+2			2+2
Prazo (mês)	8	8	9	13	8
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 85.352	R$ / UND R$ 84.808	R$ / UND R$ 83.312	R$ / UND R$ 96.122	R$ / UND R$ 86.405
Indireto	R$ 20.694	R$ 20.518	R$ 18.263	R$ 19.138	R$ 20.258
Torre	R$ 43.110	R$ 43.060	R$ 42.549	R$ 44.135	R$ 42.497
Infra	R$ 16.252	R$ 15.920	R$ 17.904	R$ 19.412	R$ 13.838
Fundação	R$ 4.725	R$ 4.739	R$ 3.951	R$ 6.638	R$ 9.505
EEE				R$ 328	
ETE				R$ 1.896	
Contenção				R$ 240	
Terraplenagem	R$ 571	R$ 571	R$ 645	R$ 4.333	R$ 307
CUSTO TOTAL II	R$ 4.873	R$ 4.181	R$ 4.912	R$ 4.181	R$ 518
Urbanização	R$ 3.541	R$ 3.345	R$ 4.087	R$ 3.345	R$ 218
Drenagem					
Extensão de Rede Elétrica	R$ 496				
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 836	R$ 836	R$ 825	R$ 836	R$ 300
CUSTO TOTAL III					R$ 19.714
Incorridos					R$ 19.714
CUSTO TOTAL IV					
Aprendizado					
CUSTO TOTAL IV		R$ 608	R$ 6.899		
Atualização por INCC		R$ 608	R$ 6.899		
CUSTO TOTAL I+II	R$ 90.225	R$ 88.989	R$ 101.809	R$ 100.303	R$ 86.923
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 90.225	R$ 89.597	R$ 95.123	R$ 100.303	R$ 106.637

Custo de Construção

	PORTO VALENCIA F2 R13	PORTO VALENCIA F2 R12	
Torres	4	4	
Unidades Construídas	140	140	
Unidades Vendidas	140	140	
Condomínios (qta.)	1	1	
Cidade	Rio de Janeiro - RJ	Rio de Janeiro - RJ	
Produto / Selo	F2	F2	
Tipologia	4 Torres | T+04 | 04PP	4 Torres | T+04 | 04PP	
Projeto Infra	LO	LO	
Projeto Torre	LO	LO	
Mês Base	novembro-25	setembro-25	
Incc	1218,747	1210,471	
LVS	setembro-25	junho-25	
Indiretos	setembro-25	junho-25	
Base de Preço	LPU 96	LPU 94	
Takt	2+2	2+2	
Prazo (mês)	8	8	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 85.352	R$ / UND R$ 84.808	DIF R$ 544
Indireto	R$ 20.694	R$ 20.518	R$ 176
Torre	R$ 43.110	R$ 43.060	R$ 50
Infra	R$ 16.252	R$ 15.920	R$ 333
Fundação	R$ 4.725	R$ 4.739	-R$ 14
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Terraplenagem	R$ 571	R$ 571	R$ 0
CUSTO TOTAL II	R$ 4.873	R$ 4.181	R$ 692
Urbanização	R$ 3.541	R$ 3.345	R$ 196
Drenagem	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Elétrica	R$ 496	R$ 0	R$ 496
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 836	R$ 836	R$ 0
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 608	
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 608	-R$ 608
CUSTO TOTAL	R$ 90.225	R$ 89.597	R$ 628

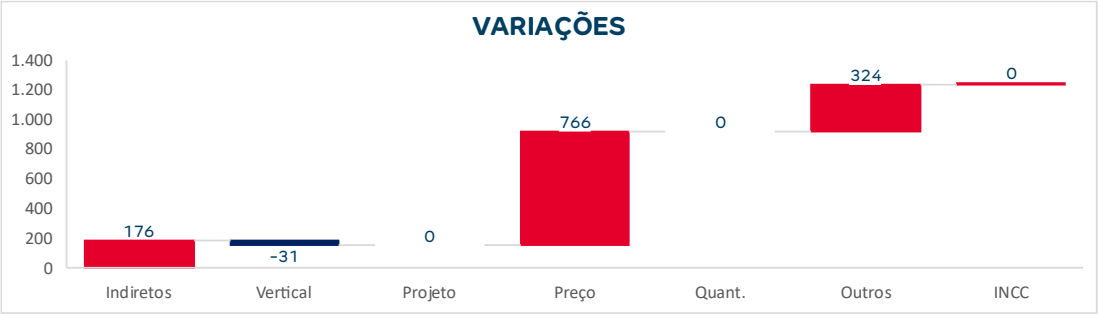

INDIRETOS
+39 | G14 Administração
+90 | G15 Implantação do Canteiro
+42 | G16 Equipamentos

VERTICAL
-31 | Retroalimentação

PREÇO
+81 | Estrutura Armação
+62 | Outras Instalações
-35 | Gesso Acartonado
+196 | Urbanização
+496 | Extensão de Rede Elétrica

OUTROS
+249 | Inst. Infra
+ 75 | Inst. Torre

INCC
- 608 | Atualização INCC

Logística

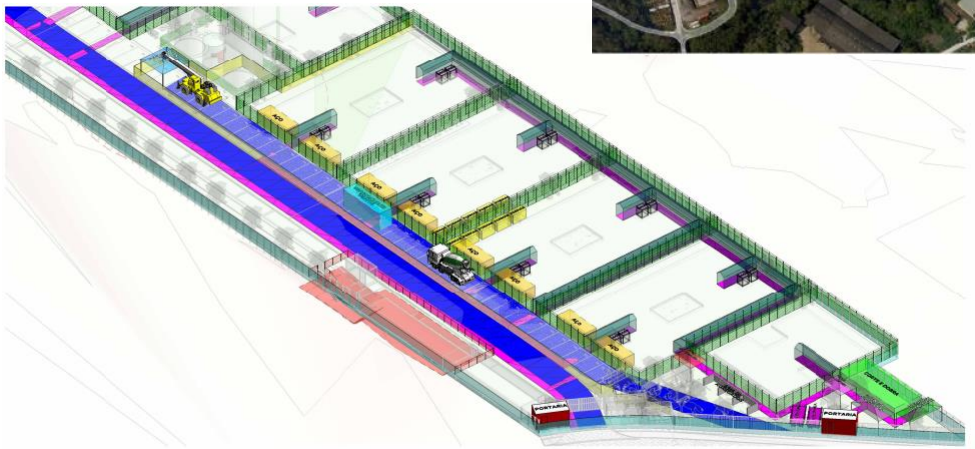

01.ÁREA OPERACIONAL

C000 - VIVÊNCIA		
VIVÊNCIA	QUANTIDADE	REF. CUSTO
_TENDA_ALMOXARIFADO (LOG): _TENDA_ALMOXARIFADO (LOG)	1	
_TENDA_BAGS (LOG): _TENDA_BAGS (LOG)	16	
_TENDA_BAIA DE AGREGADOS (LOG): _TENDA_BAIA DE AGREGADOS (LOG)	1	
_TENDA_CAÇAMBA (LOG): _TENDA_CAÇAMBA (LOG)	2	
_TENDA_PORTARIA (LOG): _TENDA_PORTARIA (LOG)	3	
_TENDA_VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG): _TENDA_VESTIÁRIO ACABAMENTO (LOG)	1	
_TENDA_VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG): _TENDA_VESTIÁRIO ESTRUTURA (LOG)	1	
_TENDA_VIVÊNCIA PADRÃO (LOG): _TENDA_VIVÊNCIA PADRÃO (LOG)	1	

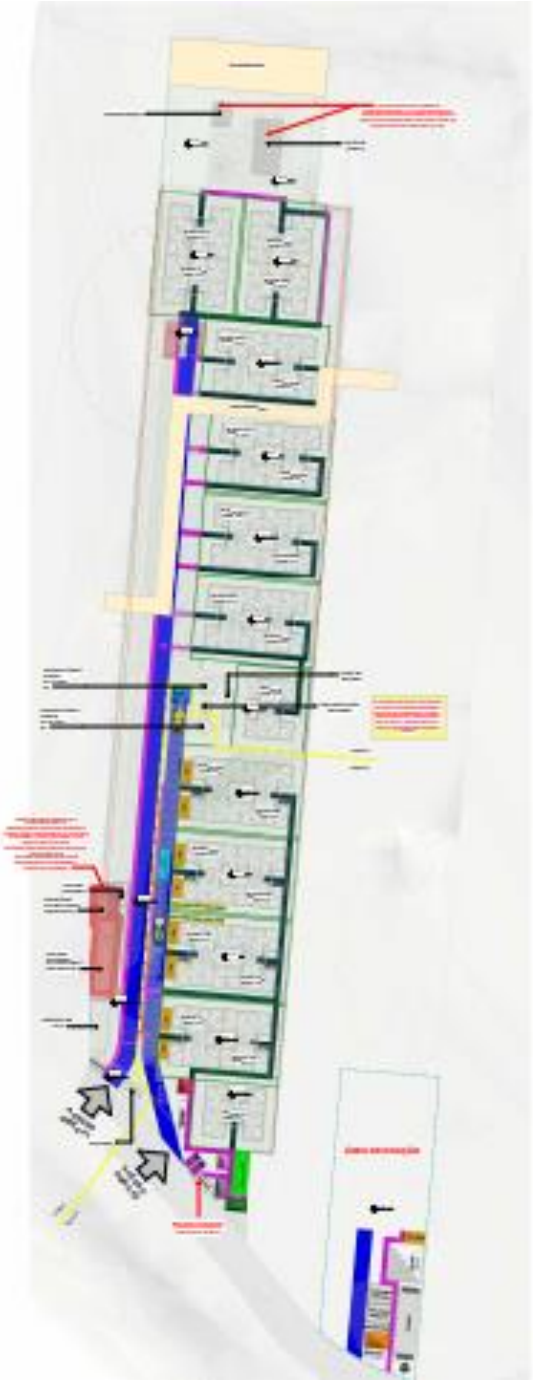

Operações

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Considerado extensão de água de 210 m na Av. Canal.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
foi alinhado com a Concessionária que essa rede de esgoto externa que pede na viabilidade seria para atender a rua e não o nosso condomínio, onde a solução é ETE com desague na rede pluvial.

SISTEMA DE DRENAGEM
Considerado extensão de drenagem de 154 m na Av. Canal.
FNA 534 m.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Já executado.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado 3197,89 m² de pavimentação.

Operações

Água	Nível 2
Esgoto	Nível 2
Drenagem	Nível 2
Elétrica	Nível 2
Gás	Nível 1
Urbanização	Nível 2

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:

- Projeto aprovado em 11/2021. Considerado extensão de esgoto de 210 m na Avenida Canal.

Esgoto:

- Projeto aprovado no porto barão.

Drenagem:

- Considerado extensão de drenagem de 154 m na Avenida Canal.

Elétrica:

- elétrica da fase 2 aprovado junto a Fase 1- 22/01/2025
- Iluminação pública com 18 postes no decorrer da Avenida Canal – Projeto aprovado.
- Apesar da viabilidade positiva para ligação, no pedido de ligação definitiva a concessionária pode vir a cobrar reformas necessárias, caso a infraestrutura existente não seja suficiente.

Gás:

- GLP.

Urbanização

- Projeto aprovado.

PCP 170

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI
Jardim Peônia (ex Jd Lirios VI)	out/24	460	2	A	18/12/24	13/06/25	21/06/25		28/10/25	31/10/25		abr/26
Porto Valência - F1	jul/24	340	2	C	07/01/25	03/05/25	06/06/25		26/08/25	01/09/25		jan/26
Reserva Carioca - F1	jul/24	340	2	C	10/05/25	27/08/25	02/09/25		02/12/25	19/12/25		jul/26
Reserva Carioca - F2	mar/25	160	2	C	04/10/25	03/12/25	20/12/25		21/01/26	07/02/26		jul/26
Parque Orquídea (ex R. Parque VI)	nov/24	400	2	A	30/06/25	29/10/25	01/11/25		02/03/26	05/03/26		ago/26
Elevato Bonsucesso	nov/24	504	2	C	09/09/25	22/01/26	08/02/26		28/06/26	15/07/26		abr/27
Parque Hortência (ex R. Parque VII)	set/25	355	2	A	27/11/25	03/03/26	06/03/26		21/06/26	24/06/26		out/26
Bosque Jacarepaguá	jul/25	414	3	A	03/03/26	22/06/26	25/06/26	25/07/26	16/09/26	19/09/26	02/11/26	mar/27
Estação Rio (Forja Rio)	set/25	493	2	C	01/03/26	29/06/26	16/07/26		29/11/26	16/12/26		abr/27
Solar Trindade - F2	set/25	180	2	C	25/09/26	30/11/26	17/12/26		25/01/27	11/02/27		jun/27
Soul Taquá Clube - F1	dez/25	362	3	A	19/06/26	17/09/26	20/09/26	03/11/26	01/12/26	04/12/26	17/01/27	jun/27
Elevato Carolina Machado	dez/25	480	3	A	11/07/26	02/12/26	05/12/26	18/01/27	11/03/27	14/03/27	27/04/27	dez/27
Porto Valência - F2	dez/25	140	2	C	27/11/26	26/01/27	12/02/27		10/03/27	27/03/27		ago/27

*

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lanç + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Rio de Janeiro Oeste 1/6	RZO 1/6	40%	1.664	139	1.997	166

Faixas MCMV	Empreendimento	Renda	Lançamento	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27
Faixa 2	Parque Hortênsia	2.950	set-25	33	33	33	33	33	33	33	33	14													
Faixa 2	**Porto Valência - F2**	**2.907**	**dez-25**		**30**	**30**	**30**	**30**	**20**																
Faixa 1	Porto Lima I F1	2.550	jun-26									21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	3
Faixa 1	Porto Lima I F2	2.534	jul-26									12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2
Total de Vendas Lançados				**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank				**33**	**63**	**63**	**63**	**63**	**53**	**33**	**33**	**47**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**5**
Total Mancha | Faixa 1				*1%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*70%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
Total Mancha | Faixa 2				*99%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*30%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*
Total Mancha | Faixa 3				*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Porto Valência – F2 | Mapa Concorrência

		Porto Valência – F2	Varandas Mendanha
		TENDA	Engefic
	Distância Tenda (km)		1,44
Região 1 Km	População	7.617	23.260
	Dens. Demográfica	2.440	7.451
	Renda (R$)	5.409	6.832
	Classe Social	C1 (de R$ 3.1K a 5.4K)	B2 (de R$ 5.4K a 9.8K)
	PEA Dia	7.160	11.801
Quantitativo	Lançamento	dez/25	jul/25
	Unidades	140	320
	Estoque	140	129
	VSO	30	64
	Stockout	5	2
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	-	6
	Gabarito	T + 4	T + 4
	Plantas (m²)	40,54	44,50 | 74,04
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Garden
	Varanda	Não	Sim
	Vagas	20%	40%* rotativas
	Lazer	Salão de Festas com churrasqueira, Espaço cultivo, Play Kids e Play Baby, Play Pet, Fitness Externo, Funcional Externo, Bicicletários	Pet Place, Playground, Brinquedoteca, Espaço Fitness Externo, Quadra, Espaço Conveniência, Salão de Festas, Churrasqueira, Piscina, Bicicletário, Mini Market

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- A concorrência possui target de preço e renda acima ao previsto para o Porto Valência.

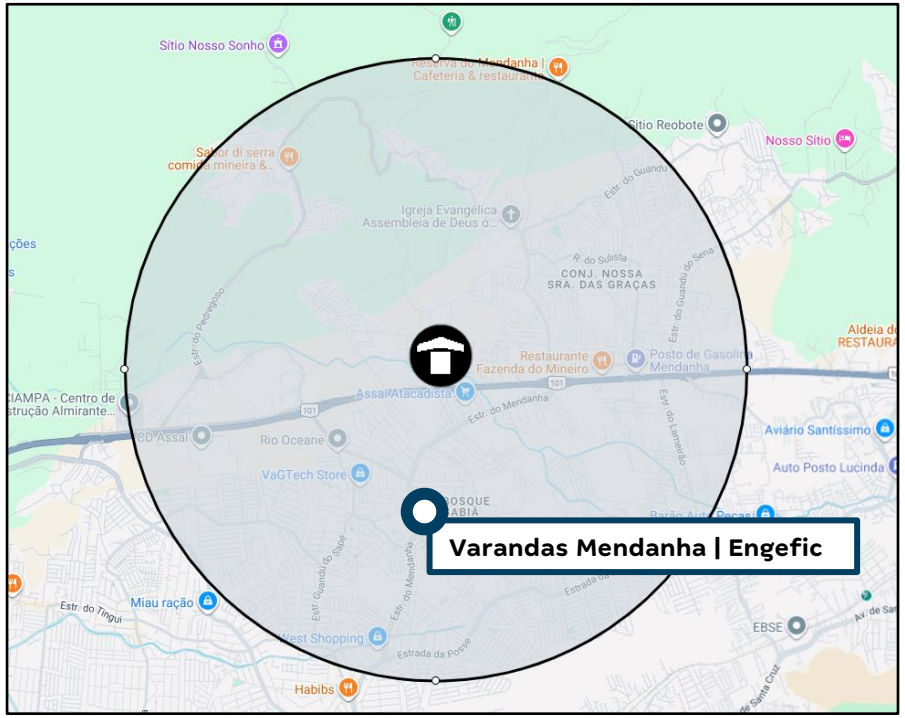

-	Porto Valência – F2					Varandas Mendanha					
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	Dif	Farol
Uh Tipo	201.000	197.402	163.335	2.543	80%						-
C/ Vaga	214.000	211.305	172.394	4.361	20%						-
Varanda						264.000	241.000	211.200		-	●
Garden						291.000	291.000	232.800		-	●

Informações Viabilidade

Projeto:	Porto Valência - F2			
Tipo:	**Uh Tipo**		**Uh Tipo**	
Método	**Ref - Porto Valência - F1**		**Vision**	
Avaliação	201.000		201.000	
Renda Inicial (VF)	2.543		2.497	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		75%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,42	1.039	0,44	1.064
FGTS	0,35	870	0,37	893
Financiamento	95,30%	142.165	95,69%	140.540
Subsídio	107,05%	20.300	97,80%	19.957
Prazo de Pró-soluto	18	18	18	18
Pró-Soluto	83,76%	13.931	87,46%	14.282
Preço Raso (RS)	178.305	178.305	176.735	176.735
TCD	74,50%	19.097	73,86%	18.591
VSO	26	26	26	26
Preço de Venda	**202.597**	**202.597**	**200.466**	**200.466**
Elasticidade	-2,564%	-2,564%	-2,564%	-2,564%
Preço de Venda Final	**197.402**	**197.402**	**195.326**	**195.326**
Preço Raso (R$)	**178.305**		**176.735**	
% de Raso	**90,33%**		**90,48%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**0**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**0**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Porto Valência - F2			
Tipo:	C/ Vaga		C/ Vaga	
Método	**Ref - Porto Valência - F1**		**Vision**	
Avaliação	214.000		214.000	
Renda Inicial (VF)	4.361		4.354	
Renda Final*	-		-	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	VF	R$	VF	R$
Ato	0,26	1.085	0,27	1.149
FGTS	0,60	2.528	0,62	2.646
Financiamento	100,00%	166.810	99,37%	165.731
Subsídio	251,44%	3.055	156,50%	1.903
Prazo de Pró-soluto	18	18	18	18
Pró-Soluto	61,76%	17.615	62,29%	17.738
Preço Raso (RS)	191.093	191.093	189.167	189.167
TCD	45,98%	20.212	44,02%	19.319
VSO	4	4	4	4
Preço de Venda	**216.866**	**216.866**	**213.972**	**213.972**
Elasticidade	-2,564%	-2,564%	-2,564%	-2,564%
Preço de Venda Final	**211.305**	**211.305**	**208.485**	**208.485**
Preço Raso (R$)	**191.093**		**189.167**	
% de Raso	**90,43%**		**90,73%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**0**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**0**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Porto Valência - F2
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Ref - Porto Valência - F1**
Avaliação	203.600
Renda Inicial (VF)	2.907
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,39	1.048
FGTS	0,40	1.201
Financiamento	96,24%	147.094
Subsídio	135,93%	16.851
Prazo de Pró-soluto	18	18
Pró-Soluto	79,36%	14.668
Preço Raso (RS)	180.863	180.863
TCD	68,79%	19.320
VSO	30	30
Preço de Venda	**205.316**	**205.316**
Elasticidade	-2,564%	-2,564%
Preço de Venda Final	**200.183**	**200.183**
Preço Raso (R$)	**180.863**	
% de Raso	**90,35%**	
Raso Todas as Fases	**180.863**	
Nominal Todas as Fases	**200.183**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Vision como **factível**.	

1) O preço referência está alinhado à performance da fase anterior, sendo ajustado apenas conforme os novos parâmetros definidos para a fase atual.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes da região vendem em um target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda.

	Preço Real					Preço Normalizado (18m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Mediana	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Jardim Peônia	198.446	172.090	2.369	43	9	7.389	179.478
Porto Valência - F2	203.600	180.863	2.907	30	18	-	180.863
Parque Hortênsia	196.071	183.787	2.400	12	21	-2.892	180.895
Porto Valência - F1	201.655	173.853	2.546	26	6	9.675	183.528
Reserva Carioca	214.044	181.947	2.549	40	12	4.988	186.935
Parque Orquídea	210.405	181.133	2.557	26	6	10.591	191.723

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Informações Viabilidade

Projeto:	Porto Valência - F2			
Tipo:	Uh Tipo		Uh Tipo	
Método	Ref - Porto Valência - F1		Vision	
Avaliação	201.000		201.000	
Renda Inicial (VF)	2.543		2.497	
Renda Final*	3.293		3.187	
% RET1	25%		50%	
Tipo:	VF	R$	VF	R$
Ato	0,42	1.141	0,44	1.169
FGTS	0,35	955	0,37	980
Financiamento	95,73%	156.145	96,17%	154.360
Subsídio	107,05%	22.296	97,80%	21.919
Prazo de Pró-soluto	13	13	13	13
Pró-Soluto	92,00%	11.051	96,06%	11.329
Preço Raso (RS)	191.589	191.589	189.757	189.757
TCD	81,82%	20.975	81,12%	20.419
VSO	9	9	9	9
Preço de Venda	**198.626**	**198.626**	**196.394**	**196.394**
Elasticidade	7,018%	7,018%	7,018%	7,018%
Preço de Venda Final	**212.564**	**212.564**	**210.176**	**210.176**
Preço Raso (R$)	**191.589**		**189.757**	
% de Raso	**90,13%**		**90,28%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**0**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**0**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Porto Valência - F2			
Tipo:	**C/ Vaga**		**C/ Vaga**	
Método	**Ref - Porto Valência - F1**		**Vision**	
Avaliação	214.000		214.000	
Renda Inicial (VF)	4.361		4.354	
Renda Final*	5.211		5.134	
% RET1	0%		0%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,26	1.191	0,27	1.262
FGTS	0,60	2.777	0,62	2.907
Financiamento	99,61%	170.632	100,51%	170.544
Subsídio	251,44%	3.356	156,50%	2.090
Prazo de Pró-soluto	13	13	13	13
Pró-Soluto	67,83%	13.973	68,42%	14.070
Preço Raso (RS)	191.929	191.929	190.873	190.873
TCD	50,50%	22.200	48,35%	21.218
VSO	2	2	2	2
Preço de Venda	**200.087**	**200.087**	**198.184**	**198.184**
Elasticidade	7,018%	7,018%	7,018%	7,018%
Preço de Venda Final	**214.129**	**214.129**	**212.091**	**212.091**
Preço Raso (R$)	**191.929**		**190.873**	
% de Raso	**89,63%**		**90,00%**	
BP25 - Não Inflacionado	**0**		**0**	
BP25 - Inflacionado	**0**		**0**	

Concorrência no Entorno:

PARECER DE CICLO.

PARECER: Ciclo avalia como factível preço referência da Fase1.

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Informações Gerais – Consolidado

Porto Valência F2 – RJ – Rio de Janeiro Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	nov-20							
Porto Valência F2 s/ vaga		dez-25	jun-26	fev-27	6 meses	8 meses	dez-28	36 meses
Porto Valência F2 c/ vaga		dez-25	jun-26	fev-27	6 meses	8 meses	dez-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	1,01 MM	Incorrido Terreno:	1,01 MM	Área do Terreno (100%):	14.500 m²	Área Líquida do Terreno:	10.080 m²
Cash:	1,01 MM	Nº de Parcelas Cash :	21	Custo de terreno m²:	69,4	Custo de terreno m² Área Líquida:	99,9
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			VaR 25 (R$ mil):	0	Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	3,4% / 45,8%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			VaR 26 (R$ mil):	0	CA Máx/Proj.	2,0 / 1,5
Ato / %VGV:	0,51 MM / 1,7%			Incorrido de Construção:	0,68 MM	Incorridos de Incorporação:	0,38 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Porto Valência F2 s/ vaga	T+4	191.589	112	212.564	201.000	95,7%	92,0%	81,8%
Porto Valência F2 c/ vaga	T+4	191.929	28	214.129	214.000	99,6%	67,8%	50,5%

Unidades Totais:	140	Preço Médio:	212.877	Renda Média:	2.907	ITBI+Emol. Unit. Médio:	3.661
Unidades Tenda:	140	Avaliação Média:	203.600	Ato:	1.123 (0,39 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	14.676
VSO:	11 Unidades	VGV Total:	29.802.786	FGTS:	1.162 (0,4 Salários)	Preço Raso Médio:	191.657
RET Médio:	3,4%	VGV Tenda:	29.802.786	% em RET 1%:	20%	Adc. Tx. de Aceleração Médio:	750

Construção

Custo Total Unit.:	90.225	Eventuais:	2,00%	Área priv (m²):	40,54	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	4.934.101	LI:	21,25%	Exposição de Caixa (R$):	8.909.859	Margem Bruta Econômica:	45,96%
TIR:	49,90%	LI Aprovação:	20,00%	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(4.557.764)	Margem Bruta REF:	49,06%
Exposição de Caixa:	30,12%	Δ LI:	1,25%	Ger. Caixa 24 meses (R$):	9.559.969	Margem Rasa Econômica:	39,58%
Payback Contingente (21 m):	14 m/ (-7 m)	LI Marginal:	34,02%	Ger. Caixa Marginal (R$):	11.519.754	Margem Rasa REF:	43,43%
Payback Consolidado:	14 meses					Margem de Contribuição Econômica:	34,11%

DRE (Consolidado)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Porto Valência F2		Porto Valência F2 s/ vaga		Porto Valência F2 c/ vaga	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	29.578	100,0%	23.666	100,0%	5.912	100,0%
PIS/COFINS	(551)	1,9%	(421)	1,8%	(129)	2,2%
Custo Total	(15.688)	54,0%	(12.544)	54,0%	(3.143)	54,4%
Custo Terreno	(1.007)	3,5%	(805)	3,5%	(201)	3,5%
Custo Relacionados a Terreno	(485)	1,7%	(388)	1,7%	(97)	1,7%
Custos de Incorporação	(705)	2,4%	(558)	2,4%	(147)	2,5%
Custo de Construção	(13.491)	46,5%	(10.793)	46,4%	(2.698)	46,7%
Lucro Bruto Econômico	13.340	46,0%	10.701	46,0%	2.639	45,6%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	13.340	46,0%	10.701	46,0%	2.639	45,6%
Despesas de Selling	(2.759)	9,5%	(2.204)	9,5%	(555)	9,6%
Contingência	(680)	2,3%	(544)	2,3%	(136)	2,4%
Margem de Contribuição	9.901	34,1%	7.953	34,2%	1.948	33,7%
IR e CSLL	(450)	1,5%	(345)	1,5%	(106)	1,8%
Margem Líquida	9.450	32,6%	7.608	32,7%	1.842	31,9%
Lucro Bruto REF Unit.	105.832	49,1%	105.449	49,0%	107.363	49,4%
Lucro Raso REF Unit.	84.361	43,4%	84.231	43,4%	84.879	43,6%

R$ Mil - VPL - Compra	Porto Valência F2		Porto Valência F2 s/ vaga		Porto Valência F2 c/ vaga	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	23.216	100,0%	18.679	100,0%	4.537	100,0%
PIS/COFINS	(425)	1,8%	(327)	1,8%	(98)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(17.857)	76,9%	(14.270)	76,4%	(3.586)	79,0%
Custo Terreno	(1.484)	6,4%	(1.188)	6,4%	(297)	6,5%
Custo Relacionados a Terreno	(589)	2,5%	(472)	2,5%	(118)	2,6%
Custos de Incorporação	(678)	2,9%	(536)	2,9%	(142)	3,1%
Custo de Construção	(11.994)	51,7%	(9.595)	51,4%	(2.399)	52,9%
Despesas de Selling	(2.454)	10,6%	(1.965)	10,5%	(489)	10,8%
Contingência	(308)	1,3%	(247)	1,3%	(62)	1,4%
IR e CSLL	(348)	1,5%	(268)	1,4%	(80)	1,8%
Lucro Imobiliário	4.934	21,3%	4.081	21,8%	853	18,8%

Comparativo EE

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Lançamento Anterior	BP - 2025	Atual	Atual vs Lançamento Anterior	Δ%
Data Estudo:	julho-24	setembro-24	novembro-25	16 Meses	N/A
Lançamento:	agosto-25	dezembro-25	dezembro-25	4 Meses	N/A
Uhs:	140	140	140	-	0,0%
Preço Nominal:	215.777	216.199	212.877	(2.900)	-1,5%
Preço Raso:	188.288	192.123	191.657	3.369	-0,2%
Preço Nominal Inflacionado:	230.772	237.286	215.712	(15.060)	-9,1%
Preço Raso Inflacionado:	201.373	210.888	194.241	(7.132)	-7,9%
Renda Média:	2.278	2.284	2.907	629	27,2%
RET Médio:	n/a	2,50%	3,40%	N/A	36,0%
% em RET 1%:	n/a	50,00%	20,00%	N/A	-60,0%
Ato:	0,5	0,5	0,4	(0,1)	-17,7%
FGTS:	0,6	0,0	0,4	-0,2	
VSO:	11	11	11	-	0,0%
VSO2:	11	11	11	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)[2]:	3.612	3.904	4.436	824	13,6%
Avaliação:	198.800	199.385	203.600	4.800	2,1%
Cond. Financiamento:	95,7%	121,3%	96,5%	0,8 p.p.	-20,4%
Subsídio Utilizado:	94,9%	0,0%	135,9%	41,0 p.p.	
Percentual Pró-Soluto:	100,1%	80,7%	87,2%	-12,9 p.p.	7,9%
Percentual utilização TCD:	119,8%	104,6%	75,6%	-44,2 p.p.	-27,7%
Prazo construção F1:	8	11	8	-	-27,3%
Prazo de Pró-Soluto F1:	13	16	13	-	-18,8%
Custo Total Inf (Unit):	109.501	111.707	112.054	2.553	0,3%
Custo Construção (Unit):	87.396	88.224	90.225	2.829	2,3%
Custo Construção Corrigido:	87.396	87.659	90.225	2.829	2,9%
Fração de construção:	41%	41%	42,4%	1,9 p.p.	4,5%
INCC Folha Rosto:	1.110,89	1.161,58	1.218,75	108	4,9%
Custo Terreno Inf:	1.010.956	1.044.147	1.006.838	(4.117)	-3,6%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	1.591	1.318	3.462	1.871	162,6%
Fração do Terreno[1]:	3,49%	3,4% / 44,3%	3,4% / 45,8%	0,0 p.p.	0,0%
Custo de Incorp. por uh:	4.468	2.031	5.037	569	148,0%
ITBI/Emol. Inf (Total)[2]:	505.638	546.562	620.989	115.351	13,6%
Custo do Ciclo (Unit):	14.139	14.905	14.676	537	-1,5%
Lucro Imobiliário:	30,1%	29,3%	21,3%	-8,9 p.p.	-27,5%
LI Marginal:	37,1%	39,2%	34,0%	-3,0 p.p.	-13,2%
Exposição de caixa:	34,7%	18,1%	30,1%	-4,6 p.p.	66,4%
TIR:	68,0%	64,7%	49,9%	-18,1 p.p.	-22,9%
Margem Bruta REF:	n/a	53,6%	49,1%	N/A	-8,4%
Margem Bruta Econômica:	50,4%	51,7%	46,0%	-4,4 p.p.	-11,1%
Margem Rasa REF:	n/a	47,7%	43,4%	N/A	-9,0%
Margem Rasa Econômica:	43,0%	45,2%	39,6%	-3,4 p.p.	-12,4%
Margem Contribuição Econômica:	40,9%	40,2%	34,1%	-6,8 p.p.	-15,2%
Payback Contingente (Régua 21 m):	n/a	14 m/ (-7 m)	14 m/ (-7 m)	N/A	
Payback Consolidado:	26 meses	14 Meses	14 Meses	N/A	0,0%

[1] Valor do terreno contratual

[2] ITBI com taxa de Aceleração

Informações Gerais – Consolidado

Porto Valência F2 – RJ – Rio de Janeiro Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	nov-20							
Porto Valência F2 s/ vaga		dez-25	nov-26	jul-27	11 meses	8 meses	dez-28	36 meses
Porto Valência F2 c/ vaga		dez-25	nov-26	jul-27	11 meses	8 meses	dez-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	1,01 MM	Incorrido Terreno:	1,01 MM	Área do Terreno (100%):	14.500 m²	Área Líquida do Terreno:	10.080 m²
Cash:	1,01 MM	Nº de Parcelas Cash :	21	Custo de terreno m²:	69,4	Custo de terreno m² Área Líquida:	99,9
Permuta Financeira:	0,00 MM (0,00%)			VaR 25 (R$ mil):	0	Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	3,6% / 48,7%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			VaR 26 (R$ mil):	0	CA Máx/Proj.	2,0 / 1,5
Ato / %VGV:	0,51 MM / 1,8%			Incorrido de Construção:	0,68 MM	Incorridos de Incorporação:	0,38 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Porto Valência F2 s/ vaga	T+4	178.305	112	197.402	201.000	95,3%	83,8%	74,5%
Porto Valência F2 c/ vaga	T+4	191.093	28	211.305	214.000	100,0%	61,8%	46,0%

Unidades Totais:	140	Preço Médio:	200.183	Renda Média:	2.907	ITBI+Emol. Unit. Médio:	3.661
Unidades Tenda:	140	Avaliação Média:	203.600	Ato:	1.123 (0,39 Salários)	Custo do Ciclo Unit.:	13.801
VSO:	30 Unidades	VGV Total:	28.025.623	FGTS:	1.162 (0,4 Salários)	Preço Raso Médio:	180.863
RET Médio:	2,2%	VGV Tenda:	28.025.623	% em RET 1%:	60%	Adc. Tx. de Aceleração Médio:	750

Construção

Custo Total Unit.:	90.225	Eventuais:	2,00%	Área priv (m²):	40,54	Gape / Mês Unit.:	11,08

Resultado

LI (R$):	3.958.397	LI:	18,41%	Exposição de Caixa (R$):	5.134.646	Margem Bruta Econômica:	41,93%
TIR:	45,11%	LI Aprovação:	20,00%	Ger. Caixa 12 meses (R$):	(1.931.037)	Margem Bruta REF:	43,76%
Exposição de Caixa:	18,24%	Δ LI:	-1,59%	Ger. Caixa 24 meses (R$):	8.168.907	Margem Rasa Econômica:	35,22%
Payback Contingente (21 m):	15 m/ (-6 m)	LI Marginal:	32,20%	Ger. Caixa Marginal (R$):	10.179.854	Margem Rasa REF:	37,78%
Payback Consolidado:	15 meses					Margem de Contribuição Econômica:	30,18%

DRE (Consolidado)

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Porto Valência F2		Porto Valência F2 s/ vaga		Porto Valência F2 c/ vaga	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	28.145	100,0%	22.228	100,0%	5.918	100,0%
PIS/COFINS	(343)	1,2%	(213)	1,0%	(130)	2,2%
Custo Total	(16.145)	58,1%	(12.910)	58,6%	(3.235)	55,9%
Custo Terreno	(1.007)	3,6%	(805)	3,7%	(201)	3,5%
Custo Relacionados a Terreno	(676)	2,4%	(541)	2,5%	(135)	2,3%
Custos de Incorporação	(710)	2,6%	(562)	2,6%	(148)	2,6%
Custo de Construção	(13.752)	49,5%	(11.002)	50,0%	(2.750)	47,5%
Lucro Bruto Econômico	11.658	41,9%	9.105	41,4%	2.553	44,1%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	11.658	41,9%	9.105	41,4%	2.553	44,1%
Despesas de Selling	(2.620)	9,4%	(2.073)	9,4%	(547)	9,5%
Contingência	(647)	2,3%	(511)	2,3%	(136)	2,4%
Margem de Contribuição	8.390	30,2%	6.521	29,6%	1.870	32,3%
IR e CSLL	(280)	1,0%	(174)	0,8%	(106)	1,8%
Margem Líquida	8.110	29,2%	6.346	28,8%	1.764	30,5%
Lucro Bruto REF Unit.	88.042	43,8%	85.130	42,9%	99.689	46,8%
Lucro Raso REF Unit.	68.711	37,8%	66.038	36,9%	79.401	41,2%

R$ Mil - VPL - Compra	Porto Valência F2		Porto Valência F2 s/ vaga		Porto Valência F2 c/ vaga	
	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	21.497	100,0%	16.983	100,0%	4.514	100,0%
PIS/COFINS	(258)	1,2%	(160)	0,9%	(97)	2,2%
Custos e Despesas Totais	(17.281)	80,4%	(13.764)	81,0%	(3.517)	77,9%
Custo Terreno	(1.484)	6,9%	(1.188)	7,0%	(297)	6,6%
Custo Relacionados a Terreno	(757)	3,5%	(606)	3,6%	(151)	3,4%
Custos de Incorporação	(667)	3,1%	(527)	3,1%	(140)	3,1%
Custo de Construção	(11.428)	53,2%	(9.143)	53,8%	(2.286)	50,6%
Despesas de Selling	(2.460)	11,4%	(1.954)	11,5%	(506)	11,2%
Contingência	(273)	1,3%	(216)	1,3%	(57)	1,3%
IR e CSLL	(211)	1,0%	(131)	0,8%	(80)	1,8%
Lucro Imobiliário	3.958	18,4%	3.059	18,0%	899	19,9%

Obrigado!
