Tenda

sua próxima conquista

Book de Lançamento

Regional: GO

Projeto: Estância Dourados II

Data Comitê: 17.10.2025

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Comitê 30.09.2025	Comitê 17.10.2025	Comitê 17.10.2025 vs Comitê 30.09.2025	Δ%
Data Estudo:	setembro-25	outubro-25	1 Meses	N/A
Lançamento:	outubro-25	outubro-25	0 Meses	N/A
Preço Nominal:	209.704	212.750	3.047	1,5%
Preço Raso:	183.476	186.523	3.047	1,7%
Preço Nominal Inflacionado:	212.686	215.777	3.090	1,5%
Preço Raso Inflacionado:	186.105	189.195	3.090	1,7%
Prazo construção F1:	15	18	3	20,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	20	23	3	15,0%
Custo Total Inf (Unit):	115.083	116.428	1.345	1,2%
Custo Construção (Unit):	86.900	87.360	460	0,5%
Custo Construção Corrigido:	86.456	87.360	904	1,0%
Custo Terreno Inf:	7.961.718	8.091.481	129.763	1,6%
Custo de Incorp. por uh:	2.634	2.470	(164)	-6,2%
ITBI/Emol. Inf (Total)²:	3.823.993	3.829.975	5.982	0,2%
Custo do Ciclo (Unit):	13.735	13.935	200	1,5%
Lucro Imobiliário:	24,7%	24,8%	0,1 p.p.	0,5%
LI Marginal:	25,2%	25,6%	0,3 p.p.	1,3%
Exposição de caixa:	9,1%	8,3%	-0,9 p.p.	-9,3%
TIR:	228,1%	208,3%	-19,8 p.p.	-8,7%
Margem Bruta Econômica:	44,1%	44,4%	0,3 p.p.	0,6%
Margem Rasa REF:	39,0%	39,1%	0,1 p.p.	0,2%
Margem Rasa Econômica:	35,3%	35,6%	0,4 p.p.	1,0%
Margem Contribuição Econômica:	30,7%	31,0%	0,3 p.p.	1,1%
Payback Consolidado:	15 Meses	15 Meses	0 Meses	0,0%

Data de estudo atualizada; prazo de obras prolongado, de 15 meses para 18 meses; preço atualizado.

Comitê Digital 29.09.2025 – Questionamentos

Nome	Estância Dourados II - Lançamento	Observação - Estância Dourado II
Fabricio Quesiti Arrivabene	Discutir em comitê	Como está a conversa com a CEF sobre melhora da avaliação? A proposta é termos um nominal 17k acima da avaliação atual?
Alejandro Octavio Abiusi	Aprovado	ok
Alexandre Regis de Oliveira	Aprovado	ok
Renan Barbosa Sanches	Aprovado	Ok
Rodrigo Osmo	Discutir em comitê	(1) Como está a negociação com a Equatorial para anteciparem a entrega da energia? Qual seria o Plano B caso a conversa não prospere?; (2) Por que a CEF baixou nossa avaliação com relação ao ED1 (R$20K a menos)?
Luiz Mauricio de Garcia Paula	Aprovado	Ok

Questionamentos

Pergunta Osmo (2): Por que a CEF baixou nossa avaliação com relação ao Estância Dourados I (R$ 20k a menos)

Pergunta Fabrício: Como está a conversa com a CEF sobre a melhora na avaliação? A proposta é termos um nominal R$ 17k acima da avaliação?

R: A avaliação ainda está em análise pela CEF, com previsão de retorno até o fim de outubro. Por este motivo, consideramos neste material a mesma premissa adotada pela CEF quando da avaliação do Parque dos Sonhos IV, onde comparativamente com seu predecessor, o Estância Dourados I, houve uma redução de avalição em função da diminuição da área do apartamento.
No Parque III, tipologia H, tínhamos 42m² e passamos no Parque IV para tipologia modular com 32m². Neste momento, o preço nominal fica sim superior a avalição, mas na solicitação de avaliação do Estancia Dourados II já incluímos a argumentação demonstrada sobre a Performance de vendas do Parque dos Sonhos IV em comparação à avaliação maior do Parque dos Sonhos III. Seguindo a estratégia que tem se mostrado de sucesso, caso a primeira avalição continue sendo impactada pela metragem, a performance servirá de base para novo pleito.

Questionamentos

Pergunta Osmo (1): Como está a negociação com a Equatorial para anteciparem a entrega de energia? Qual seria o plano B caso a conversa não prospere?

R: 1. Recebemos na última semana negativa para nosso pleito de antecipação de energização do empreendimento. Apesar de até o momento não termos nenhum caso em que foi necessária antecipação e a concessionária não tenha atendido, a Equatorial não fechou a porta para este pedido, porém solicitou que refizéssemos o pleito após o avanço das nossas obras. Dado a negativa momentânea, como plano B estamos considerando um aumento do custo de obra com um prazo de pós-forma à maior de 3 meses, que cobre o prazo ora sinalizado para energização do empreendimento. Também incluímos 3 meses de pró soluto. O custo adicional de indiretos, nesta fase onde entendemos que só ocorre a manutenção do canteiro, está orçado em R$ 56K/mês.

Na sequência, apresentamos o One Page das visões Aprovação e Real atualizados com essas premissas.

One Page – Cenário Aprovação (atualizado)

Cidade	Goiânia	**Mancha de demanda**	;OS - Goiânia Sul + Aparecida de G
Regional	GO	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Estância Dourados I	**Aprovação Fase Anterior**	Fase
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Out

Unidades (Fases)	451 (1)	**CA Máx | Proj**	2,0 | 1,1
Unidades com Vaga (%)	150 (33%)	**Escritura | Lançamento**	set/25 | out/25
Unidades com Varandas (%)	0 (0%)	**Tipologia**	F2 - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	8.125 (8,5%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	8,5% (100,0%)
Valor R$/m²	547	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	39.399 (41,1%)	**Indireto Unit.**	17.343
Prazo da Obra (meses)	18	**Torre Unit.**	39.824
Custo Total Unit. (LPU):	87.360 (94)	**Infra Unit.**	18.448
Início de Obra	abr-26	**Fundação Unit.**	5.853

Preço Nominal Unit.	212.750	**VSO**	35
Preço Raso Unit.	186.523	**Referência**	Referência
Avaliação Unit.	191.417	**Renda (% em RET 1%)**	2.780 (60,9%)



LI (Régua):	**24,8% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	44,4%
LI Marginal:	25,6%	**Margem Rasa Econômica:**	35,6%
Margem Bruta REF:	46,6%	**Margem Contribuição Econômica:**	31,0%
Margem Rasa REF:	**39,1%**	**Exposição (% VGV):**	7.918 (8,3%)
TIR:	208,3%	**VGV Total:**	**95.950**
Payback Contingente (21 m) :	**15 m/ (-6 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(7.383)
Payback Consolidado:	15	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	17.470

One Page – Cenário Real (atualizado)

Cidade	Goiânia	**Mancha de demanda**	;OS - Goiânia Sul + Aparecida de G
Regional	GO	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Estância Dourados I	**Aprovação Fase Anterior**	Fase
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Out

Unidades (Fases)	451 (1)	**CA Máx | Proj**	2,0 | 1,1
Unidades com Vaga (%)	150 (33%)	**Escritura | Lançamento**	set/25 | out/25
Unidades com Varandas (%)	0 (0%)	**Tipologia**	F2 - Concreto

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	8.086 (8,5%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (N/A)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	8,5% (100,0%)
Valor R$/m²	544	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

Custo Construção (%VGV)	39.399 (41,3%)	**Indireto Unit.**	17.343
Prazo da Obra (meses)	18	**Torre Unit.**	39.824
Custo Total Unit. (LPU):	87.360 (94)	**Infra Unit.**	18.448
Início de Obra	mar-26	**Fundação Unit.**	5.853

Preço Nominal Unit.	211.735	**VSO**	35
Preço Raso Unit.	185.507	**Referência**	Referência
Avaliação Unit.	191.417	**Renda (% em RET 1%)**	2.780 (60,9%)

Fase de Lançamento - Uso exclusivo para o Ciclo Financeiro		**Preço Raso Inf. Médio Unit.**	188.165
Preço Inf. Médio Unit.	214.746	**Margem Bruta REF (%)**	46,6%
Custo Inf. Médio Unit.	114.746	**Margem Rasa REF (%)**	39,0%



LI (Régua):	**24,6% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	44,3%
LI Marginal:	25,4%	**Margem Rasa Econômica:**	35,6%
Margem Bruta REF:	46,6%	**Margem Contribuição Econômica:**	31,0%
Margem Rasa REF:	**39,0%**	**Exposição (% VGV):**	8.686 (9,1%)
TIR:	201,4%	**VGV Total:**	**95.492**
Payback Contingente (21 m) :	**15 m/ (-6 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(7.721)
Payback Consolidado:	15	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	21.274

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Farol Pareceres – Estância Dourados II

Área	Riscos Associados	Parecer	Criticidade
Jurídico	Escritura de Novação e Escritura de Compra e Venda lavradas em 22/09/2025. A ECV encontra-se em fase de registro, com previsão de conclusão em 06/10/2025. O Memorial de Incorporação também está em fase de registro, com previsão de conclusão em 10/10/2025, contudo encontra-se pendente a emissão do alvará de construção.	Com ressalvas	
Legalização	Terreno com desmembramento aprovado e registrado. Parcelamento do IPTU finalizado. Área Pública Municipal (APM) referente à doação dos 15% já está em nome do município. Uso do solo emitido. Alvará previsto para setembro/2025. Não foram identificado riscos.	Ok	
Produto	Sem riscos associados	Ok	
GETEC	A ligação de energia pela Equatorial prevista para Julho/27 e entrega pelo PCP previsto para Maio/27. Negócios está envolvido e em negociação com a gerente da Equatorial. Não temos laudo acústico dispónivel.	Com ressalvas	
Logística	Ok, sem riscos associados.	Ok	
Contratação	**Laudo de Engenharia:** Pendentes **Risco:** Pendente a emissão da LAE **Jurídico:** Pendente a emissão do RI - Previsão 10.10.2025	Ok	
Inteligência de mercado	Ok, IM avalia o preço referência como factível	Ok	
Comercial/Ciclo	Ok, Ciclo Financeiro avalia o Preço Referência como factível.	Ok	
Estudos Econômicos	Ok, sem riscos associados.	Ok	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Mancha de Demanda

MANCHAS DE DEMANDA
Goiânia Sul + Aparecida

Lançamento
1. Sonho Dourado
2. Estância Dourados II

LandBank
3. Novos Ares - Aurora
4. Faiçalville

Cluster MPR – (Comitê)

- Cluster 3 – Verde

Região

Capital

Lançados *LandBank* *Comitê*

PRODUTO

Empreendimento Estância Dourados II
Parecer de Escritura

Informações Gerais – Todos os Condomínios		
Terreno	**Área terreno**	Cond.01: 22.630,50m² Cond.02: 16.394,76m²
	Área de APM	11.997,02m²
	Menor poligonal	Cond.01: 22.589,20m² Cond.02: 16.365,20 m²
	APP/FNA	Não
	Reserva de calçada/ melhoramento víario	Sim (70,86m²)
	Área liquida	Cond.01: 22.589,20 m² Cond.02: 16.365,20 m²
	Fração	AOS- 180 | AEIS III - 30
	Zoneamento	Cond.01: AEIS III Cond.02: AEIS/AOS
	CA máximo	Cond.01: 2,00 Cond.02: 1,00 (AOS) e 2,00(AEIS)
	CA projetado	Cond.01: 0,71 Cond.02: 1,07
	Gabarito máximo	Cond. 01: T+2 e T+3 Cond. 02: T+4 e T+3
Geral	**Total UH**	827
	Total de vagas	377

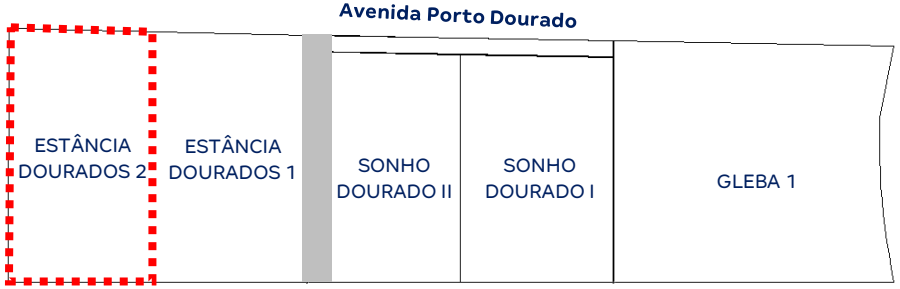

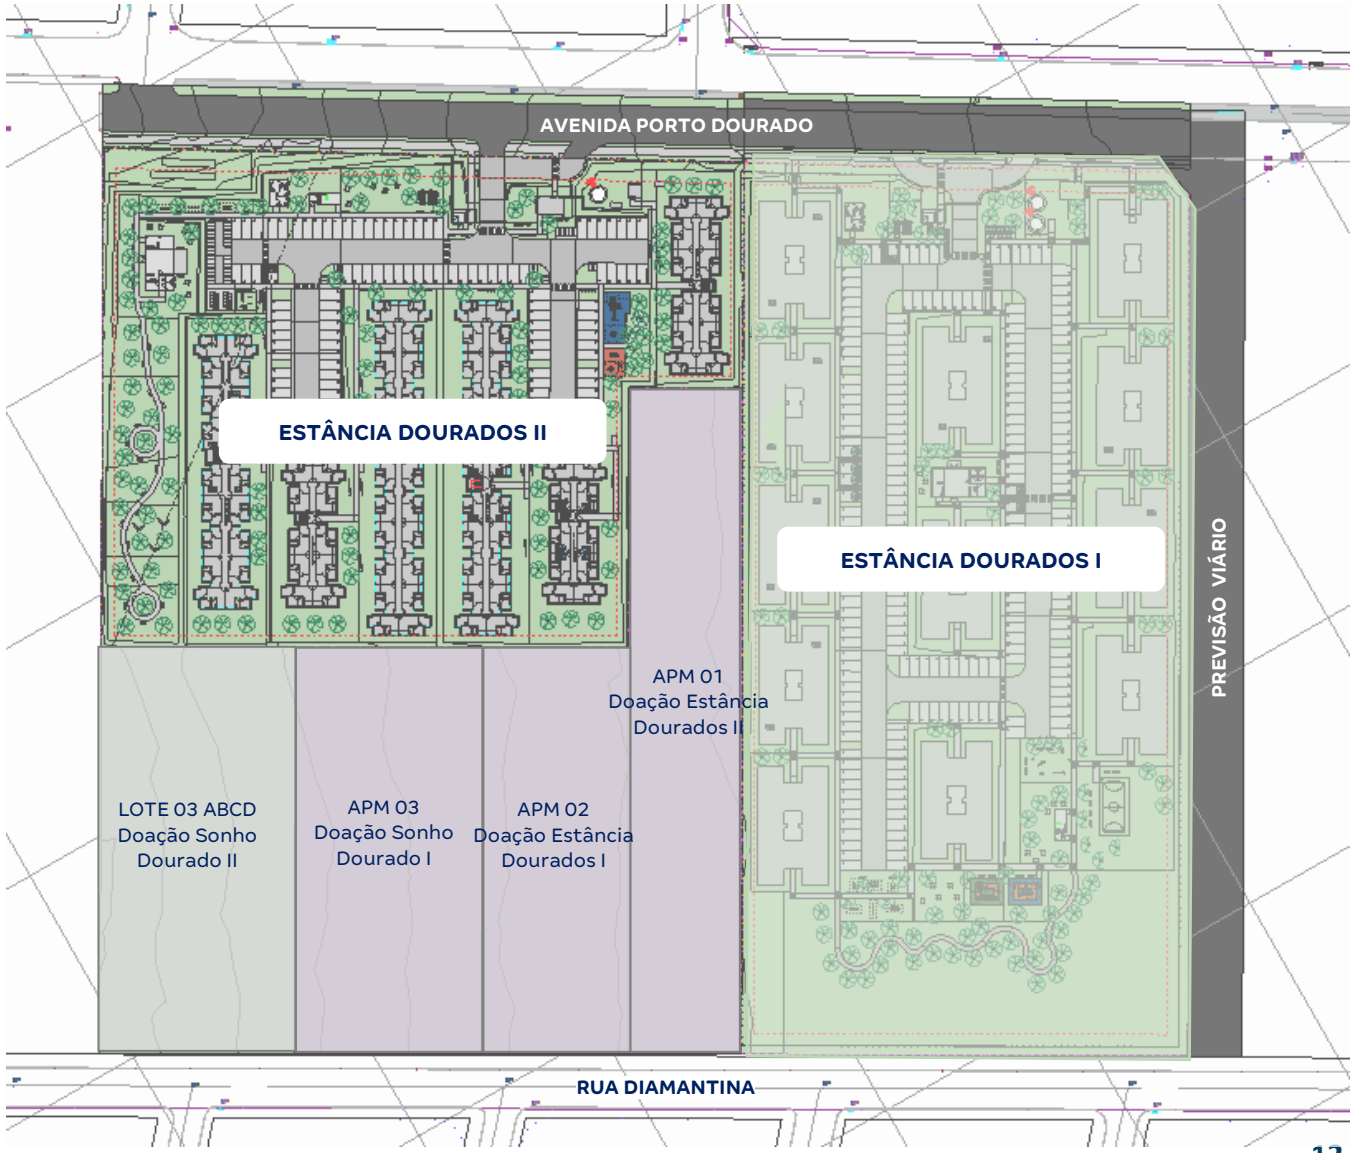

PRODUTO

Empreendimento Estância Dourados II
Parecer de Escritura

Informações Gerais – Condomínio Único		
Terreno	**Área terreno**	16.394,77m²
	Menor poligonal	16.365,20m²
	APP/FNA	Não
	Doação para viário	Sim (29,57m²)
	Área liquida	16.365,20
	Zoneamento	AOS | AEIS III
	Ca máximo	1,00 (AOS) e 2,00(AEIS III)
	Fração	AOS - 180 (18Uh) | AEIS III- 30 (435Uh)
	Fração projetada	AOS - 180 (16Uh) | AEIS III - 30 (435Uh)
	Ca projetado	1,07
	Gabarito máximo	T+3 e T+4
Geral	**Total uh**	451
	Total de vagas exigidas	1 vaga a cada 3 UH, sendo que destas, 30% podem ser destinadas à motos
	Total de vagas projetadas	113 - 25%, sendo 03 PCD, 01 PCD Visitante, 03 Visitantes, 01 Carga e Descarga e 46(10%) de motos
Tipologia	**Tipologia**	Modular PCT sem elevador
	Gabarito	T+4 e T+3
	Lâmina	03 torres 12PP | 01 torre 18PP | 02 torres 20PP
	Área privativa	32m²
	Varanda	Não
	Garden	Não
Condomínio	**Unidade PCD**	14 (3%), Térreo
	Unidade lazer|técnica	01 Lazer
	Torre	06
	Fase	Única
Lazer	**Lazer Interno**	01-Salão de festas gourmet
	Lazer Externo	02 –Salão de festas com churrasqueira, 03 – Quadra de areia, 04-Churrasqueira gourmet com banheiro e previsão de geladeira, 05-PlayKids, 06- Praça de Jogos, 07-Praça de Chegada, 08-PlayBaby, 09-PlayPet, 10-Múltipla estação, 11-Praça de convívio, 12- Piscinas adulto e infantil,

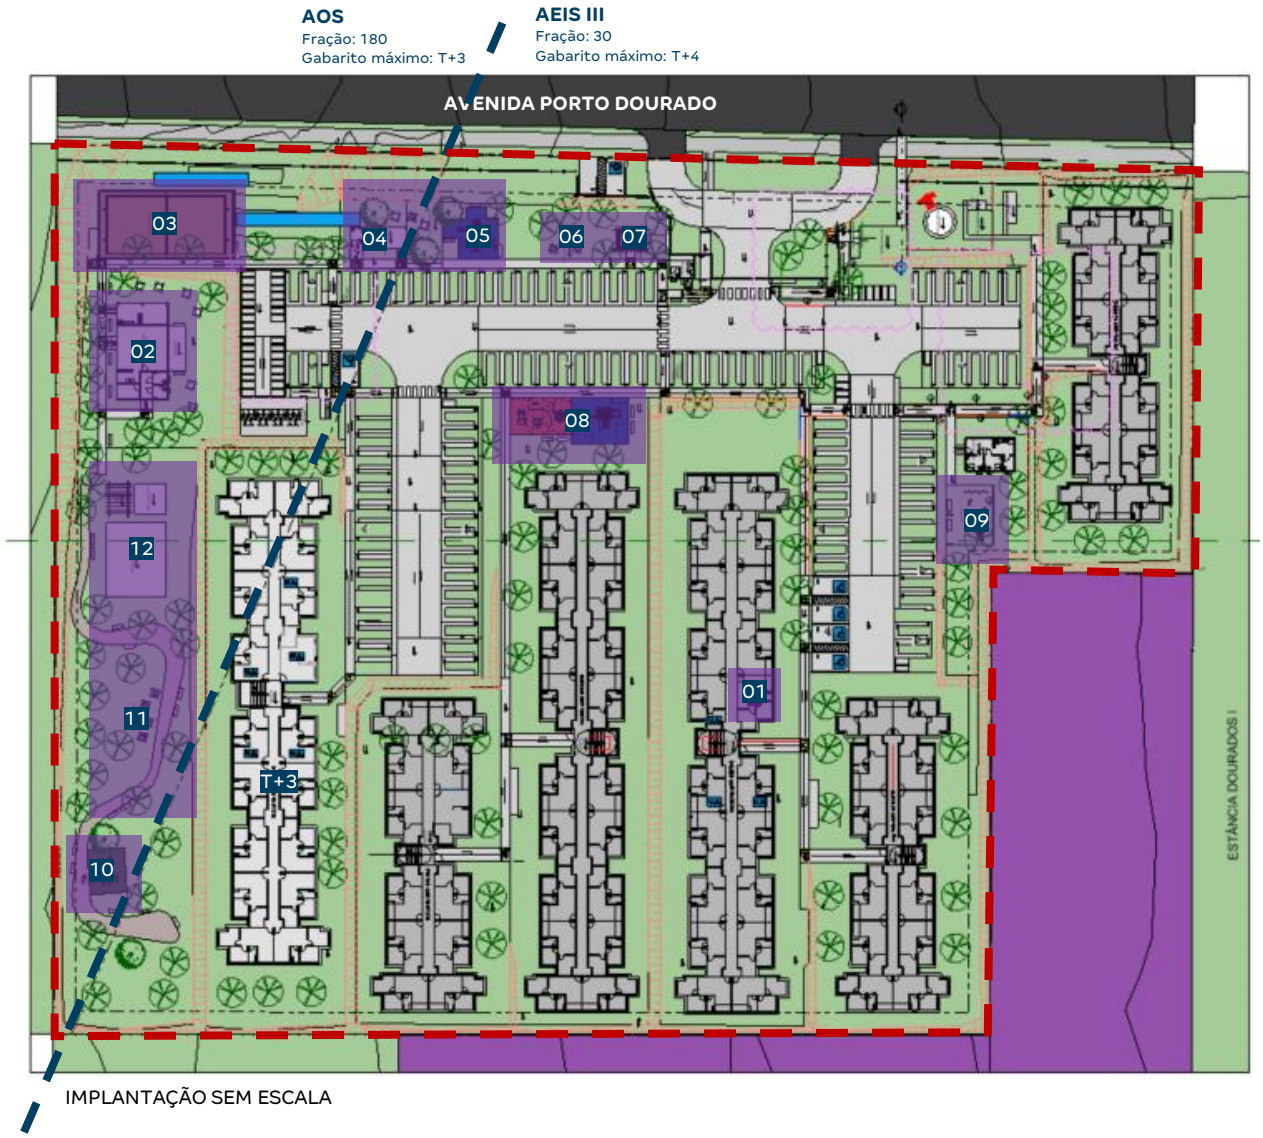

IMPLANTAÇÃO SEM ESCALA

	Descrição	Criticidade	Observação
Usabilidade	Acesso Empreendimento	🟢	
	Percurso do pedestre até torre	🟢	
Diferencial produto	Faixa de renda	2	
	Prime	Não	
	Supercondomínio	Não	
	Atributos Infra	Sim	Quadra de Areia, Piscinas
	Atributos Torre	Não	
	Edifício Garagem	Não	

Quadra de Areia (imagem ref.)

Piscinas (imagem ref.)

Churrasqueira gourmet com banheiro e previsão de geladeira (imagem ref.)

Empreendimento Estância Dourados II
Parecer de Escritura

Fase Única: 451 UH - 150 vagas (sendo 02 PCD, 04 visitantes, 46 de motos, 1 carga/descarga)				
Módulo	**Blocos**	**UH**	**Vagas**	**Parecer**
Módulo 01	02 Blocos (T+4)	120 Uh	86 vagas, sendo 3 PCD. 1 PCD visitante, 3 visitantes + 45 motos	Dos Lazeres, estão contemplados Quadra de areia, salão de festas com churrasqueira, churrasqueira gourmet com banheiro, playpet, , playkids, praça de chegada, praça de jogos. Demais lazeres que não estão contemplados neste módulo, necessário inclusão dessa informação no RI e material de vendas.
Módulo 02	01 Bloco (T+4)	99 UH		
Módulo 03	01 Bloco (T+4)	100 UH	15 vagas + 01 vaga de moto	Dos Lazeres, está contemplado PlayBaby
Módulo 04	02 Blocos (T+4)	132UH	12 vagas comuns	Dos Lazeres, estão contemplados as piscinas, praça de convívio e múltipla estação

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Implantação | Google Earth

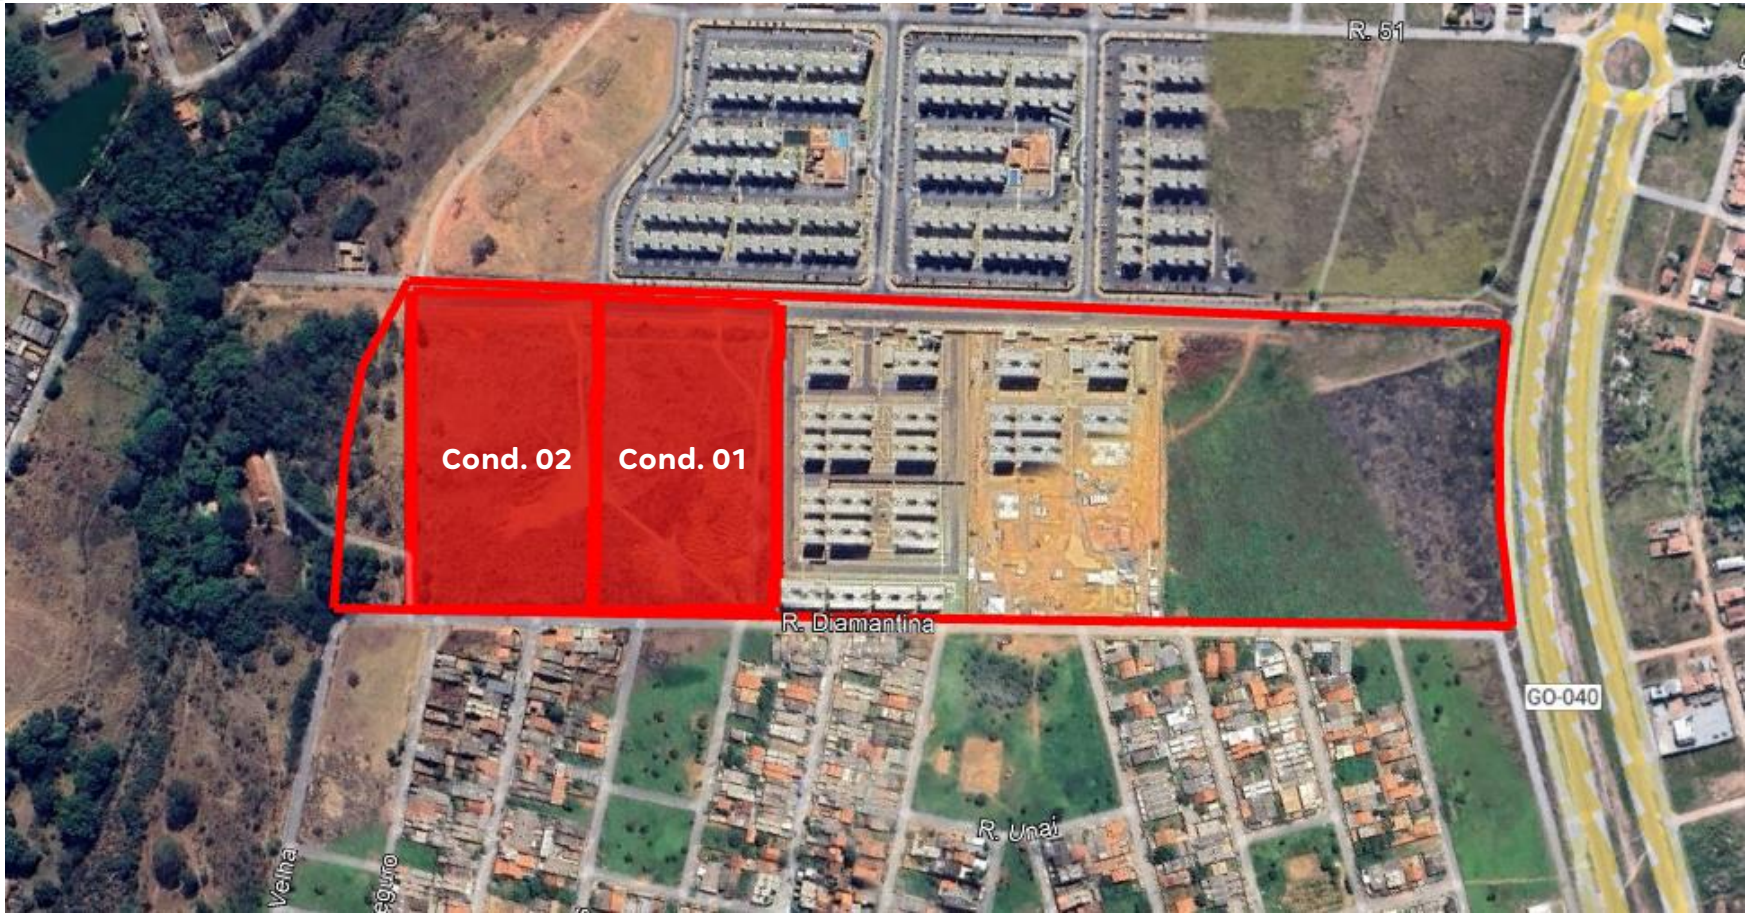

ESTÂNCIA DOURADOS
II
Goiânia
451 UH

Custo de Construção

	ESTÂNCIA DOURADOS II REV 08	ESTÂNCIA DOURADOS II REV 07 | Escritura	CAMPOS COND 1 CEN 01 | REV 00	LVS ESTÂNCIA DOURADOS I	PARQUE DOS SONHOS 4 | LANÇAMENTO
Torres	6	6	6	24	6
Unidades Construídas	452	452	490	376	490
Unidades Vendidas	451	451	489	376	490
Condomínios (qta.)	2	2	1	2	4
Cidade	Goiânia - GO	Goiânia - GO	Goiânia - GO	Goiânia - GO	Goiânia - GO
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	F2 MODULAR	F2	F2 MODULAR
Tipologia	3 Torres | T+04 | 12PP | C1A	3 Torres | T+04 | 10PP | C1A	1 Torre | T+04 | 10PP | CS1A	22 Torres 04PP | T+3	2 Torres | T+04 | 18PP
Tipologia	1 Torre | T+03 | 18PP | C1A	1 Torre | T+03 | 18PP | C1A	1 Torre | T+04 | 12PP | CS1A	02 Torres 04PP | T+2	2 Torres | T+04 | 12PP
	2 Torres | T+04 | 20PP | C1A	2 Torres | T+04 | 22PP | C1A	1 Torre | T+04 | 16PP | CS1A		1 Torre | T+04 | 16PP
Tipologia	-	-	-	-	1 Torre | T+04 | 22PP
Atributos	Pisicina | Quadra de Areia		Pisicina | Varanda | Garden	-	Piscina | Quadra de Streetball
Projeto Infra	AP	AP	AP	-	AP
Projeto Torre	AP	AP	AP	-	AP
Mês Base	setembro-25	setembro-25	setembro-25	-	julho-25
Incc	1.216,706	1.216,706	1.216,706	-	1.199,509
LVS	agosto-25	junho-25	junho-25	agosto-25	maio-25
Indiretos	agosto-25	agosto-25	agosto-25	-	maio-25
Base de Preço	LPU 94	LPU 94	LPU 94	-	LPU 93
Takt	2x2	2x2	2x2	-	2x2
Prazo (mês)	15	15	14	-	14
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 82.133	R$ / UND R$ 83.052	R$ / UND R$ 83.114	R$ / UND R$ 88.807	R$ / UND R$ 76.383
Indireto	R$ 16.831	R$ 16.176	R$ 15.252	R$ 17.089	R$ 15.258
Torre	R$ 39.875	R$ 39.484	R$ 39.231	R$ 44.888	R$ 39.088
Infra	R$ 18.448	R$ 19.205	R$ 18.805	R$ 20.252	R$ 16.565
Fundação	R$ 5.853	R$ 7.536	R$ 4.327	R$ 5.525	R$ 4.240
EEE			R$ 527		
ETE			R$ 1.460		
Contenção	R$ 106		R$ 299	R$ 21	
Terraplenagem	R$ 1.020	R$ 650	R$ 3.213	R$ 1.031	R$ 1.231
CUSTO TOTAL II	R$ 4.767	R$ 5.448	R$ 1.914	R$ 5.747	R$ 218
Urbanização	R$ 121	R$ 121		R$ 128	R$ 36
Drenagem					
Extensão de Rede Elétrica	R$ 399	R$ 399			
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 4.247	R$ 4.928	R$ 1.914	R$ 5.619	R$ 182
CUSTO TOTAL III					R$ 13
Incorridos					R$ 13
CUSTO TOTAL IV					
Aprendizado					
CUSTO TOTAL V					R$ 1.098
Atualização por INCC					R$ 1.098
CUSTO TOTAL I+II	R$ 86.900	R$ 88.500	R$ 85.028	R$ 94.554	R$ 76.601
CUSTO TOTAL I AO IV	R$ 86.900	R$ 88.500	R$ 85.028	R$ 94.554	R$ 77.712

Custo de Construção

	ESTÂNCIA DOURADOS II REV 08	ESTÂNCIA DOURADOS II REV 07 | Escritura	
Torres	6	6	
Unidades Construídas	452	452	
Unidades Vendidas	451	451	
Condomínios (qta.)	2	2	
Cidade	Goiânia - GO	Goiânia - GO	
Produto / Selo	F2 MODULAR	F2 MODULAR	
Tipologia	3 Torres | T+04 | 12PP | C1A	3 Torres | T+04 | 10PP | C1A	
Tipologia	1 Torre | T+03 | 18PP | C1A	1 Torre | T+03 | 18PP | C1A	
Tipologia	2 Torres | T+04 | 20PP | C1A	2 Torres | T+04 | 22PP | C1A	
Atributos	Pisicina | Quadra de Areia		
Projeto Infra	AP	AP	
Projeto Torre	AP	AP	
Mês Base	setembro-25	setembro-25	
Incc	1216,706	1216,706	
LVS	agosto-25	junho-25	
Indiretos	agosto-25	agosto-25	
Base de Preço	LPU 94	LPU 94	
Takt	2x2	2x2	
Prazo (mês)	15	15	
CUSTO TOTAL I	R$ / UND R$ 82.133	R$ / UND R$ 83.052	DIF -R$ 920
Indireto	R$ 16.831	R$ 16.176	**R$ 655**
Torre	R$ 39.875	R$ 39.484	R$ 391
Infra	R$ 18.448	R$ 19.205	-R$ 758
Fundação	R$ 5.853	R$ 7.536	-R$ 1.683
EEE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
ETE	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Contenção	R$ 106	R$ 0	R$ 106
Terrapplenagem	R$ 1.020	R$ 650	R$ 370
CUSTO TOTAL II	R$ 4.767	R$ 5.448	-R$ 681
Urbanização	R$ 121	R$ 121	R$ 0
Drenagem	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Extensão de Rede Eletrica	R$ 399	R$ 399	R$ 0
Extensão de Rede Hidráulica	R$ 4.247	R$ 4.928	-R$ 681
CUSTO TOTAL III	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Incorridos	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL IV	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Aprendizado	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL V	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Atualização por INCC	R$ 0	R$ 0	R$ 0
CUSTO TOTAL	R$ 86.900	R$ 88.500	-R$ 1.601

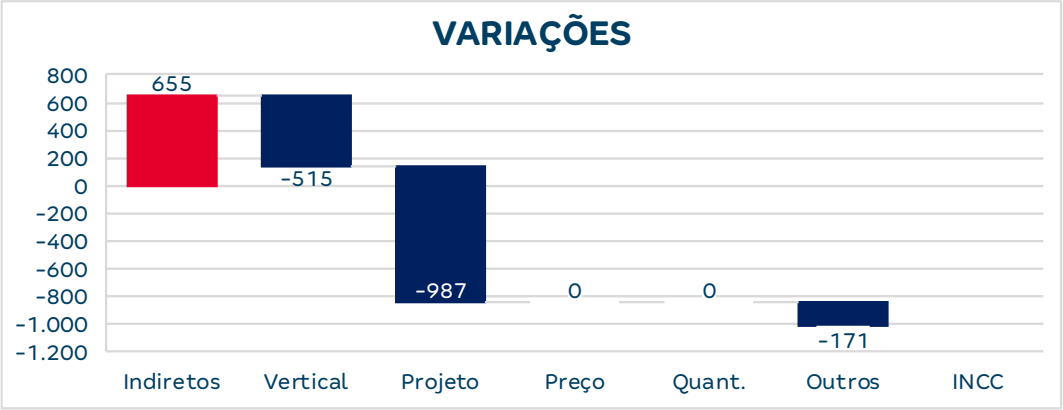

INDIRETOS
+ 112 | Grupo 11
+ 175 | Administração
+ 185 | Equipamentos

Vertical
- 515 | Retroalimentação

Projeto
- 927 | Reservatório Metálico
- 1.683 | Fundação
+ 106 | Contenção
+ 370 | Terraplenagem (Recompactação das torres + anexos)
+ 1.043 | Estrutura Torre
- 106 | Gesso Acartonado

Outros
- 171 | Inst. Torre

Operações

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Existe viabilidade técnica para abastecimento de água e esgoto. A rede antes projetada para abastecer o complexo Sonho Dourado foi desmembrada. O trecho a ser executado para o Estância Dourados I e II é o trecho em verde, contemplando a segunda etapa do Termo de Compromisso. Tratam-se de 3.649m de extensão de esgoto sanitário. Será necessária também uma melhoria na EEE existente. As obras de esgoto já foram iniciadas e o prazo para finalização é 31/12/2025. Para o Estância Dourados II elas já terão sido entregues à concessionária.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A ligação do Estância Dourados II será feita na porta do empreendimento, não sendo necessária a provação de projeto.

SISTEMA DE DRENAGEM
Rede de drenagem já executada para o Sonho Dourado I e II, vamos apenas interligar o Estância I e II à rede.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS
Abastecimento por GLP.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO
Existe viabilidade técnica.

TERRENO

URBANIZAÇÃO
Considerado melhoramento do viário na testada do empreendimento.

Operações

Matriz Risco Concessionária	
Água	Nível 2
Esgoto	Nível 2
Drenagem	Nível 3
Elétrica	Nível 3
Gás	NA
Urbanização	NA

LEGENDA		
Nível	Tipo	Status
1	Com Diretriz	Conclusiva
2		Conclusiva com projeto aprovado
3		Conclusiva sem projeto aprovado
4		Não Conclusiva
5	Sem Diretriz	-
NA	-	Não aplicável

Água:
- Na última AVTO (1546/2020) considerando 453 unidades a Concessionária dispensou a reapresentação de projeto de extensão de agua.

Esgoto:
- Na última AVTO (1546/2020) considerando 453 unidades a Concessionária dispensou a reapresentação de projeto de extensão de esgoto.

Drenagem:
- Ligação na Rede existente, será necessária aprovação de Projeto.

Elétrica:
• BT: Projeto será protocolado ainda , está em desenvolvimento devido a mudança de cenário.
• MT: Será protocolado depois da aprovação da BT
• Orçamento de Conexão: Assinado em 13/03/2025 com restrição de 1050dias. Ligação de energia pela Equatorial prevista para Julho|2027. PCP 168 previsto para Maio|2027.

Gás:
- Empreendimento com GLP.

Urbanização:
- Considerado calçada na testada do empreendimento.

Logística

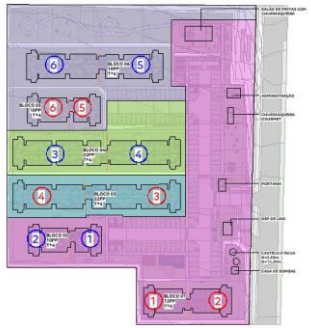

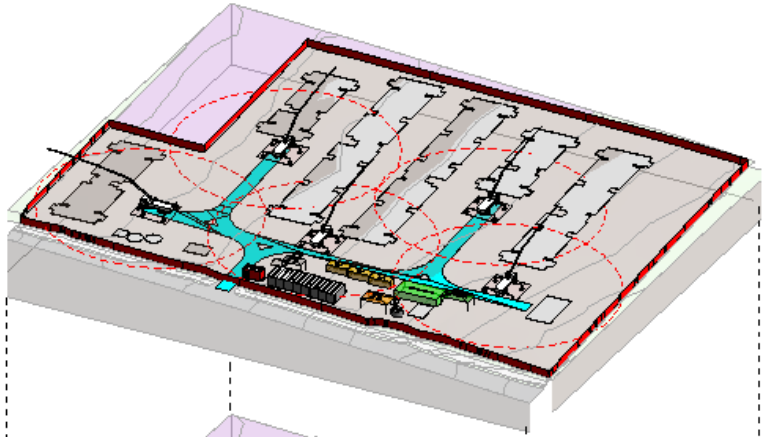

VISTA 3D - PRÉ FORMA

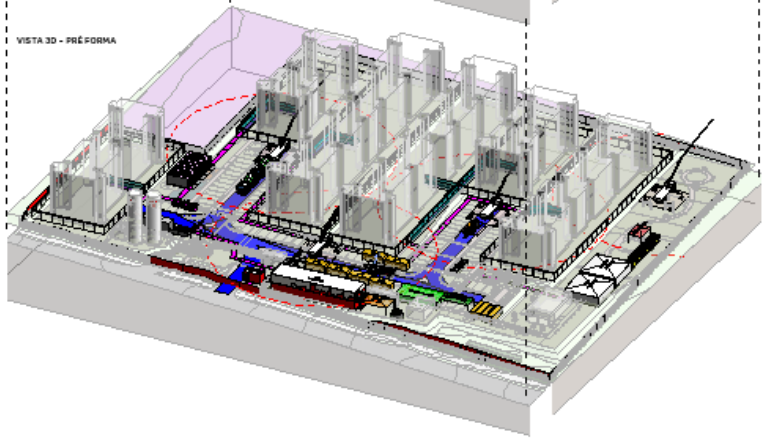

VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO

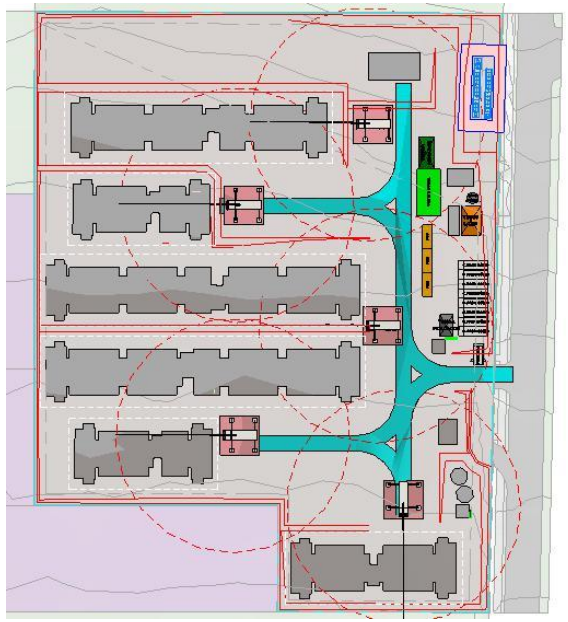

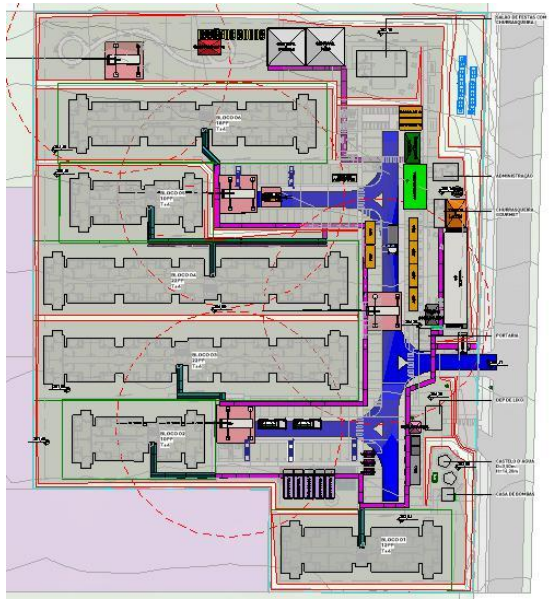

TENDAS_PERÍODOS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA	COMPRIMENTO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_DESMOLDANTE (LOG)	1	4,00	6,00	-	TODO PERIODO	-	UNICA
_TENDA_INFLAMÁVEIS (LOG)	1	3,00	3,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	UNICA
_TENDA_TENDA ARMADOR (LOG)	1	4,00	8,00	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	UNICA
_TENDA_TENDA CENTRAL DE KITS (LOG)	1	10,00	10,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	UNICA
_TENDA_TENDA CENTRAL DE PORTAS (LOG)	1	10,00	10,00	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	UNICA
_TENDA_TENDA LAZER (LOG)	1	7,50	5,04	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	UNICA
_TENDA_TENDA MOLDADOR (LOG)	1	5,53	3,37	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	UNICA

VIVENCIA - CONTAINERS							
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_CONTAINER PORTARIA (LOG)	1 MODULO COM SANITARIO	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERIODO	UTILIZAR A DEFINITIVA	-	UNICA
_TENDA_CONTAINER PROVISÓRIO (LOG)	8 MODULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERIODO	-	-	UNICA
_TENDA_CONTAINER TERCEIROS (LOG)	8 MODULOS DE CONTAINER	1 MOB	1 DESMOB	TODO PERIODO	-	-	UNICA
_TENDA_CONTAINER VIVÊNCIA PADRÃO GO (LOG)	10 CONTAINERS EMBAIXO, 10 CONTAINERS EM CIMA (T+1)	1 MOB	1 DESMOB	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	UNICA

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	PRÉ FORMA	ESTRUTURA	ACABAMENTO	FASE
_TENDA_BETONEIRA (LOG)	VARIAVEL	-	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	UNICA
_TENDA_BOMBA LANÇA (LOG)	VARIAVEL	-	-	TODO PERIODO	TODO PERIODO	-	UNICA
_TENDA_CAMINHAO MUNK (LOG)	1 UNIDADE	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	CONSIDERAR 1/2 PERIODO DE ESTRUTURA	-	UNICA
_TENDA_SKYTRAK (LOG)	1 UNIDADE	1 MOBILIZAÇÃO	1 DESMOBILIZAÇÃO	-	TODO PERIODO	CONSIDERAR 15 DIAS DO PERÍODO DE ACABAMENTO	UNICA

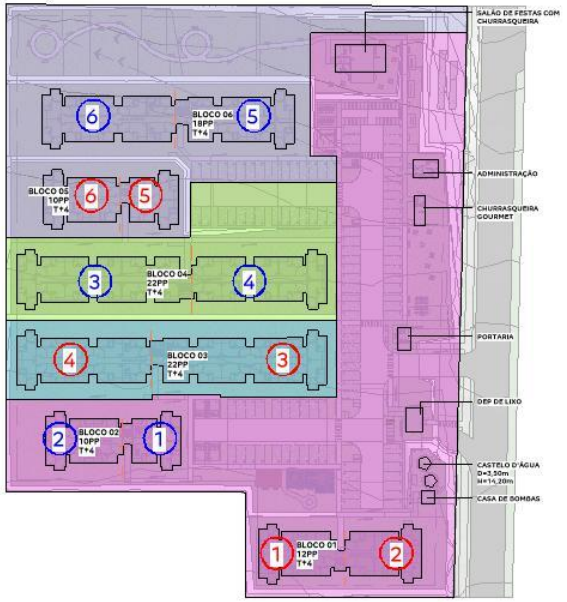
SALÃO DE FESTAS COM CHURRASQUEIRA
BLOCO 06 18PP T+4
BLOCO 05 10PP T+4
BLOCO 04 22PP T+4
BLOCO 03 22PP T+4
BLOCO 02 10PP T+4
BLOCO 01 12PP T+4
ADMINISTRAÇÃO
CHURRASQUEIRA GOURMET
PORTARIA
DEP DE LIXO
CASTELO D'ÁGUA D=3,50m H=14,20m
CASA DE BOMBAS

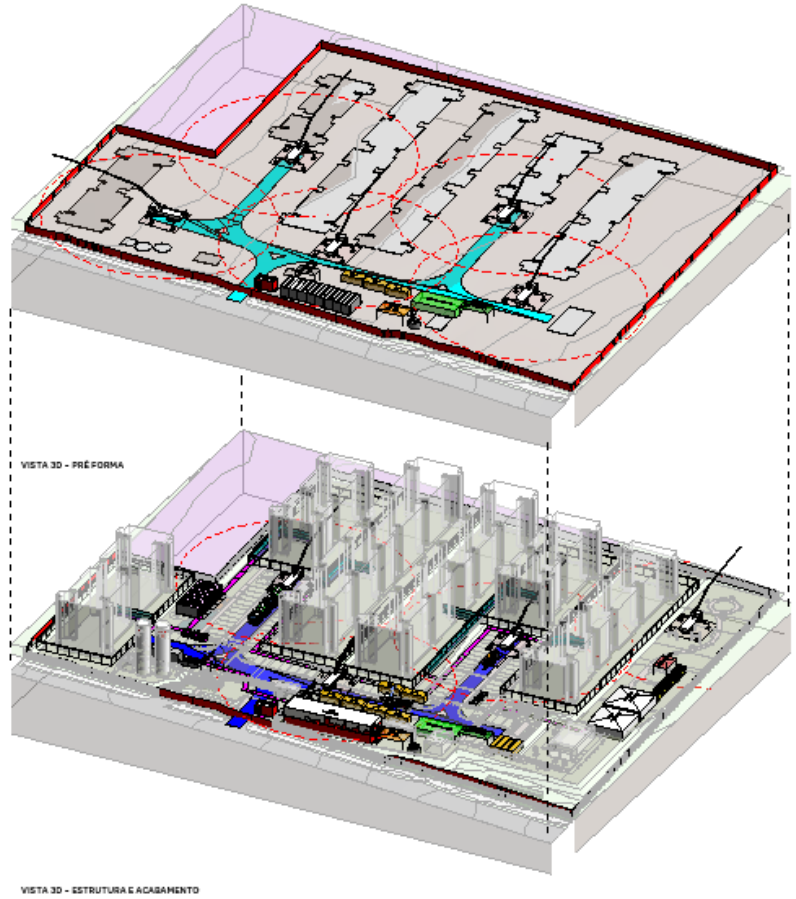
VISTA 3D - PRÉ FORMA
VISTA 3D - ESTRUTURA E ACABAMENTO

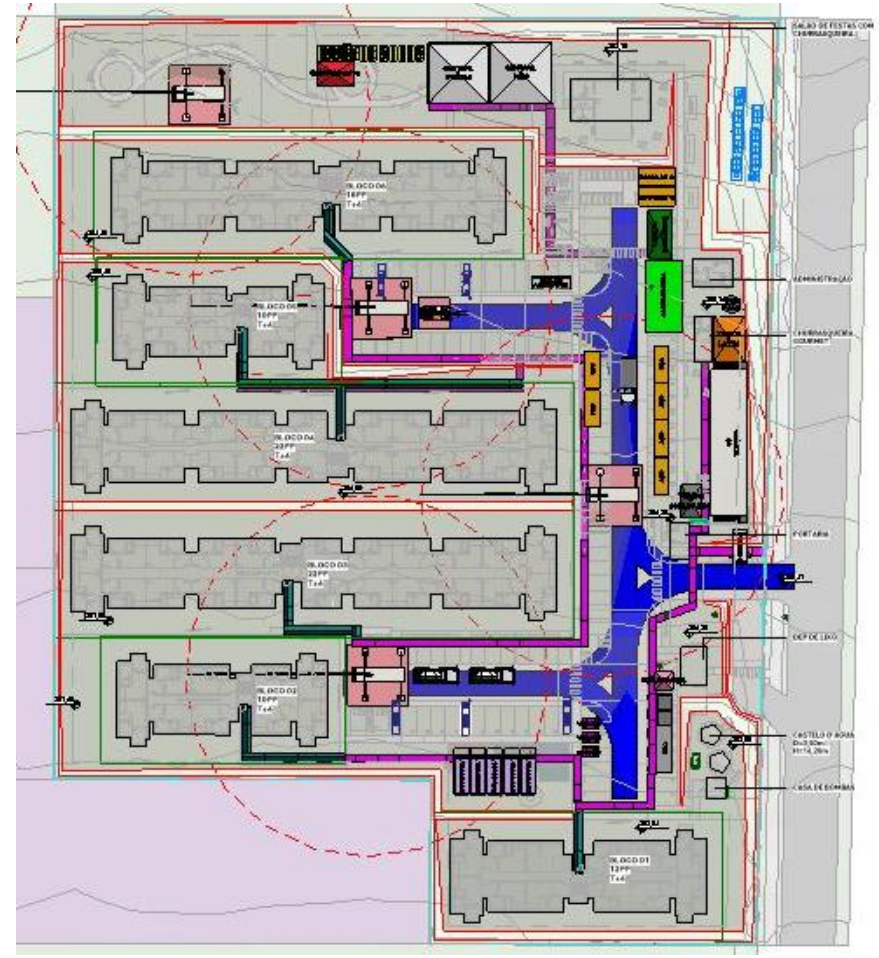

Logística

ITENS A SEREM CONSIDERADOS:

➢ **LEGALIZAÇÃO**	EXISTE A POSSIBILIDADE DE UTILIZAR A ÁREA DE DOAÇÃO INSTITUCIONAL OU O CONDOMÍNIO VIZINHO (CONDOMÍNIO 2 – GRAN COSTEIRA) PARA LOCAR A ÁREA OPERACIONAL (CONTAINERS E MATERIAIS), FACILITANDO O ANDAMENTO DA OBRA. VERIFICAR DURANTE O INÍCIO DE EP A VIABILIDADE OU NÃO DESSA ESTRATÉGIA.
➢ **NEGÓCIOS**	EXECUÇÃO DOS MÓDULOS OCORRERÁ DE FORMA CONCOMITANTE.
➢ **CUSTOS / OBRA**	PREVER CAMADA DE SACRIFÍCIO, PARA QUE O ACESSO DE CAMINHÕES SEJA POSSÍVEL EM PERÍODOS CHUVOSOS, POIS O VIÁRIO EXTERNO NÃO POSSUI ASFALTO (CALÇAMENTO E SOLO NATURAL). PREVER CUSTO DE ESCADA PROVISÓRIA PARA ACESSAR A COTA DE FUNDO DOS ENTERRADOS E EXECUTAR A ESTRUTURA.

PCP 168

Empreendimento	Lançto.	Unidades	# jogos	Equipes de forma	Início Obra	Início Forma 1	Início Forma 2	Início Forma 3	Término Forma 1	Término Forma 2	Término Forma 3	Previsão AGI	Folga Inicio
Lago Azul II	ago/24	156	2	A	23/09/24	06/05/25	13/05/25		18/06/25	25/06/25		nov/25	1,30
Parque dos Sonhos III	dez/24	444	2	A	30/03/25	19/06/25	26/06/25		29/10/25	04/11/25		mar/26	3,50
Estância Dourados I	mar/25	376	2	A	02/08/25	30/10/25	05/11/25		23/02/26	01/03/26		jul/26	4,67
Parque dos Sonhos IV	ago/25	490	2	A	24/10/25	24/02/26	02/03/26		26/07/26	01/08/26		dez/26	2,36
Estância Dourados II	out/25	451	2	A	08/03/26	27/07/26	02/08/26		15/12/26	21/12/26		mai/27	4,83
Faiçalville	set/25	501	3	A	28/06/26	16/12/26	22/12/26	06/01/27	29/03/27	04/04/27	04/05/27	fev/28	9,54
Estação das Fontes III - F1+F2	mai/26	520	3	A	30/12/26	30/03/27	05/04/27	05/05/27	16/07/27	22/07/27	20/08/27	jan/28	7,66
Jardins do Cerrado - F1	jun/26	319	3	A	13/03/27	17/07/27	23/07/27	21/08/27	22/09/27	28/09/27	25/10/27	mar/28	9,06

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Prospecção

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

Demanda e Distribuição da Mancha

Potencial de Demanda			Lançados		Lançados + Landbank	
Mancha	CÓD.	Shr.	ANO	MÊS	ANO	MÊS
Goiânia Sul + Aparecida	GOS	36%	1.805	150	2.165	180

Empreendimento	Renda	Lançamento	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27
Estância Dourados I	**3.538**	**mar-25**	**46**																					
Estância Dourados II	**2.780**	**out-25**			**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**31**							
FaiçalVille	3.351	out-25			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	25		
Santa Rita	2.463	nov-25						23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	18	
Videira	2.424	dez-26																	23	23	23	23	23	23
Total de Vendas Lançados			**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total de Vendas Lançados + Landbank			**46**	**0**	**63**	**63**	**63**	**86**	**86**	**86**	**86**	**86**	**86**	**86**	**86**	**86**	**82**	**51**	**74**	**74**	**74**	**71**	**41**	**23**

Parecer de I.M sobre a mancha:

O projeto analisado em comitê está em linha com o potencial teórico de demanda calculado para a mancha. (Total Lançados)

Canibalização:

Sem Risco de Canibalização

Estância Dourados II | Mapa Concorrência

		Estância Dourados II	Gran Essence
		TENDA	MRV
	Distância Tenda (km)		4,66 Km
Região 1 Km	População	12.333	13.239
	Dens. Demográfica	3.951	4.241
	Renda (R$)	5.169	3.500
	Classe Social	C1 (2.7k a 4.6k)	C1 - (De 2.7k até 4.6k)
	PEA Dia	4.803	4.990
Quantitativo	Lançamento	set/25	jun/24
	Unidades	451	592
	Estoque	451	38
	VSO	35	43
	Stockout	13	0
Qualitativo	Condomínios	1	1
	Torres	6	37
	Gabarito	T+3 | T+4	T+3
	Plantas (m²)	32m²	41,35m² e 47,84m²
	Tipologia	2 Dorms	2 Dorms
	Opções	Não	Não
	Varanda	Não	Sim
	Vagas	33%	100% de Vagas
	Lazer	Lazer padrão + piscina, quadra e multipla estação	Playground, Churrasqueira, Garrafão De Basquete, Gazebo, Redário, Bicicletário E Praça De Convivência.

Farol Renda
Acima de 300
Entre 0 e 300
Abaixo de 0

Diagnóstico Concorrência

- O projeto Gran Essence – MRV, está situado em uma região metropolitana que atrai um perfil de clientes diferentes, capturando renda e target de preço acima do previsto para o produto Tenda.

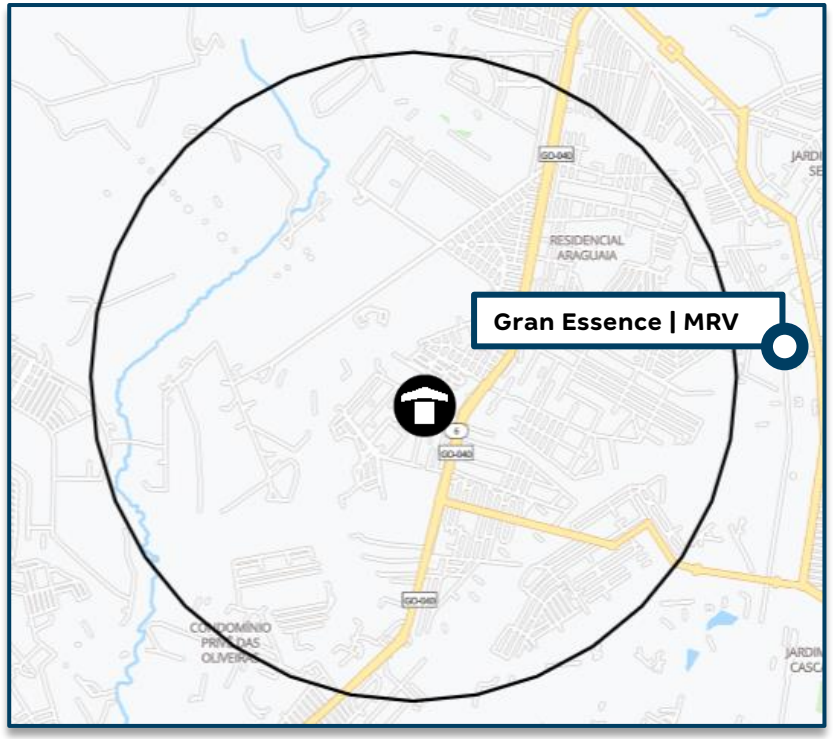

-	Estância Dourados II					Gran Essence					
Tipologias	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Avaliação	Preço Nominal	CEF	Renda	% Unidades	Farol
Sem Vaga	185.200	205.631	159.152	2.550	67%	-	-	-	-	-	-
Vaga Moto	193.160	207.760	161.133	2.777	10%	-	-	-	-	-	-
Vaga Carro	208.490	217.851	168.477	3.442	23%	230.010	239.990	191.992	3.800	68%	●
Varanda - Carro	-	-	-	-	-	241.660	242.990	194.392	3.950	32%	●

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II			
Tipo:	**Sem Vaga**		**Sem Vaga**	
Método	**Ref. Est. Dourados I**		**Vision**	
Avaliação	185.200		185.200	
Renda Inicial (VF)	2.550		2.585	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		75%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,64	1.623	0,64	1.646
FGTS	0,23	594	0,24	626
Financiamento	98,86%	145.366	98,92%	145.889
Subsídio	68,98%	13.192	70,03%	12.646
Prazo de Pró-soluto	22	22	22	22
Pró-Soluto	106,31%	21.670	105,09%	21.714
Preço Raso (RS)	182.445	182.445	182.521	182.521
TCD	101,70%	26.141	100,83%	26.273
VSO	23	23	23	23
Preço de Venda	**208.586**	**208.586**	**208.794**	**208.794**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**208.586**	**208.586**	**208.794**	**208.794**
Preço Raso (R$)	**182.445**		**182.521**	
% de Raso	**87,47%**		**87,42%**	
BP25 - Não Inflacionado	**176.509**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**186.642**		**-**	

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II			
Tipo:	**Vaga Moto**		**Vaga Moto**	
Método	**Ref. Est. Dourados I**		**Vision**	
Avaliação	193.160		193.160	
Renda Inicial (VF)	2.777		2.832	
Renda Final*	-		-	
% RET1	50%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,73	2.019	0,72	2.042
FGTS	0,32	894	0,33	930
Financiamento	97,34%	150.420	97,69%	150.951
Subsídio	75,75%	9.819	79,41%	9.273
Prazo de Pró-soluto	22	22	22	22
Pró-Soluto	96,33%	21.383	94,76%	21.450
Preço Raso (RS)	184.535	184.535	184.646	184.646
TCD	93,39%	26.141	91,93%	26.242
VSO	4	4	4	4
Preço de Venda	**210.675**	**210.675**	**210.887**	**210.887**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**210.675**	**210.675**	**210.887**	**210.887**
Preço Raso (R$)	**184.535**		**184.646**	
% de Raso	**87,59%**		**87,56%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II			
Tipo:	**Vaga Carro**		**Vaga Carro**	
Método	**Ref. Est. Dourados I**		**Vision**	
Avaliação	208.490		208.490	
Renda Inicial (VF)	3.442		3.473	
Renda Final*	-		-	
% RET1	25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,45	1.541	0,45	1.564
FGTS	0,47	1.625	0,48	1.656
Financiamento	95,92%	159.988	96,40%	160.786
Subsídio	219,34%	6.863	214,62%	6.317
Prazo de Pró-soluto	22	22	22	22
Pró-Soluto	89,72%	24.684	89,08%	24.728
Preço Raso (RS)	194.702	194.702	195.052	195.052
TCD	76,42%	26.514	76,32%	26.716
VSO	8	8	8	8
Preço de Venda	**221.217**	**221.217**	**221.769**	**221.769**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**221.217**	**221.217**	**221.769**	**221.769**
Preço Raso (R$)	**194.702**		**195.052**	
% de Raso	**88,01%**		**87,95%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Ref. Est. Dourados I**
Avaliação	191.417
Renda Inicial (VF)	2.780
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,60	1.644
FGTS	0,30	864
Financiamento	98,02%	149.274
Subsídio	104,66%	11.382
Prazo de Pró-soluto	22	22
Pró-Soluto	101,45%	22.343
Preço Raso (RS)	185.507	185.507
TCD	94,98%	26.228
VSO	35	35
Preço de Venda	**211.735**	**211.735**
Elasticidade	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**211.735**	**211.735**
Preço Raso (R$)	**185.507**	
% de Raso	**87,61%**	
Raso Todas as Fases	**185.507**	
Nominal Todas as Fases	**211.735**	

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Referência como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço referência, tendo em vista que, esse preço reflete a performance da fase anterior ajustando o preço apenas conforme os novos parâmetros da fase atual. Houve uma redução de avaliação CEF frente a fase anterior, conforme evidenciado no escalonamento abaixo, essa redução impactou o preço final da fase atual. Destacamos que para a manutenção do preço estimado, é necessário manter esse patamar de avaliação simulado em comitê.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes da região vendem em um target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda.

	Preço Real					Preço Normalizado (22m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda Mediana	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Estância Dourados I	215.194	190.587	2.999	42	15	7.287	197.874
Estância Dourados II	191.417	185.507	2.780	35	22	-	185.507

Estância Dourados II

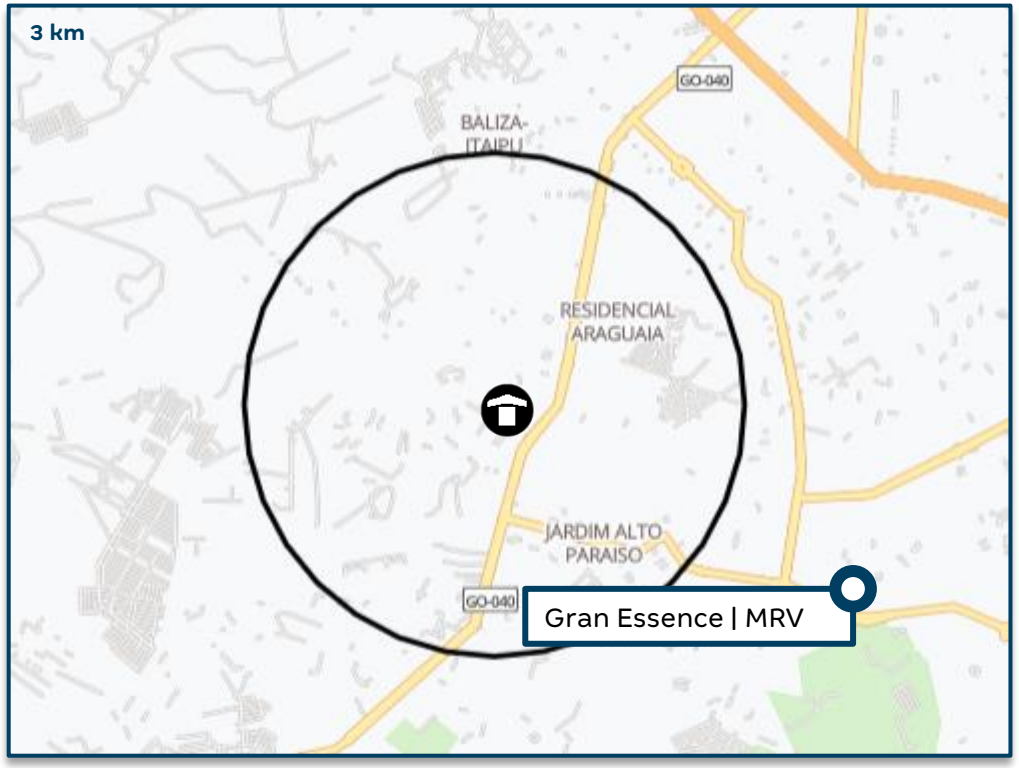

*São considerados apenas as unidades dos concorrentes que estão alinhadas com o produto Tenda

Análise de Riscos	Farol CF
Ciclo Financeiro avalia o Preço Referência como **factível.**	

1) O Ciclo Financeiro segue a precificação apresentada, que ajusta o preço da fase anterior conforme os novos parâmetros. Houve redução na avaliação CEF em relação à fase anterior, impactando o preço final atual.

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II			
Tipo:	**Sem Vaga**		**Sem Vaga**	
Método	**Ref. Est. Dourados I**		**Vision**	
Avaliação	185.200		185.200	
Renda Inicial (VF)	2.550		2.585	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		75%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,64	1.623	0,64	1.646
FGTS	0,23	594	0,24	626
Financiamento	98,86%	145.366	98,92%	145.889
Subsídio	68,98%	13.192	70,03%	12.646
Prazo de Pró-soluto	23	23	23	23
Pró-Soluto	106,31%	22.655	105,09%	22.701
Preço Raso (RS)	183.430	183.430	183.508	183.508
TCD	101,70%	26.141	100,83%	26.273
VSO	23	23	23	23
Preço de Venda	**208.586**	**208.586**	**208.794**	**208.794**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**209.571**	**209.571**	**209.781**	**209.781**
Preço Raso (R$)	**183.430**		**183.508**	
% de Raso	**87,53%**		**87,48%**	
BP25 - Não Inflacionado	**177.108**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**187.241**		**-**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II			
Tipo:	**Vaga Moto**		**Vaga Moto**	
Método	**Ref. Est. Dourados I**		**Vision**	
Avaliação	193.160		193.160	
Renda Inicial (VF)	2.777		2.832	
Renda Final*	-		-	
% RET1	50%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,73	2.019	0,72	2.042
FGTS	0,32	894	0,33	930
Financiamento	97,34%	150.420	97,69%	150.951
Subsídio	75,75%	9.819	79,41%	9.273
Prazo de Pró-soluto	23	23	23	23
Pró-Soluto	96,33%	22.355	94,76%	22.425
Preço Raso (RS)	185.507	185.507	185.621	185.621
TCD	93,39%	26.141	91,93%	26.242
VSO	4	4	4	4
Preço de Venda	**210.675**	**210.675**	**210.887**	**210.887**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**211.647**	**211.647**	**211.862**	**211.862**
Preço Raso (R$)	**185.507**		**185.621**	
% de Raso	**87,65%**		**87,61%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II			
Tipo:	**Vaga Carro**		**Vaga Carro**	
Método	**Ref. Est. Dourados I**		**Vision**	
Avaliação	208.490		208.490	
Renda Inicial (VF)	3.442		3.473	
Renda Final*	-		-	
% RET1	25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,45	1.541	0,45	1.564
FGTS	0,47	1.625	0,48	1.656
Financiamento	95,92%	159.988	96,40%	160.786
Subsídio	219,34%	6.863	214,62%	6.317
Prazo de Pró-soluto	23	23	23	23
Pró-Soluto	89,72%	25.806	89,08%	25.852
Preço Raso (RS)	195.824	195.824	196.176	196.176
TCD	76,42%	26.514	76,32%	26.716
VSO	8	8	8	8
Preço de Venda	**221.217**	**221.217**	**221.769**	**221.769**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**222.339**	**222.339**	**222.893**	**222.893**
Preço Raso (R$)	**195.824**		**196.176**	
% de Raso	**88,07%**		**88,01%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexo

Informações Gerais – Cenário Aprovação

Estância II – Aprovação – GO – Goiânia Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	nov-19							
stância Dourados II - Sem Vaga		out-25	abr-26	out-27	6 meses	18 meses	out-28	36 meses
tância Dourados II - Vaga Moto		out-25	abr-26	out-27	6 meses	18 meses	out-28	36 meses
tância Dourados II - Vaga Carro		out-25	abr-26	out-27	6 meses	18 meses	out-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	8,96 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	16.395 m²
Cash:	0,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	0	**Custo de terreno m²:**	546,6
Permuta Financeira:	8,96 MM (9,34%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,13 MM

Área Líquida do Terreno:	16.395 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	546,6
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	9,3% / 50,4%
CA Máx/Proj.	2,0 / 1,1
Incorridos de Incorporação:	0,35 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
stância Dourados II - Sem Vaga	T+4	183.430	301	209.571	185.200	98,9%	106,3%	101,7%
tância Dourados II - Vaga Moto	T+4	185.507	45	211.647	193.160	97,3%	96,3%	93,4%
tância Dourados II - Vaga Carro	T+4	195.824	105	222.339	208.490	95,9%	89,7%	76,4%

Unidades Totais:	451	**Preço Médio:**	212.750	**Renda Média:**	2.780	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	7.718
Unidades Tenda:	451	**Avaliação Média:**	191.417	**Ato:**	1.673 (0,6 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	13.935
VSO:	35 Unidades	**VGV Total:**	95.950.443	**FGTS:**	827 (0,3 Salários)	**Preço Raso Médio:**	186.523
RET Médio:	2,2%	**VGV Tenda:**	95.950.443	**% em RET 1%:**	61%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	774

Construção

Custo Total Unit.:	87.360	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	32,00	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**17.546.233**	**LI:**	**24,84%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**7.918.294**	**Margem Bruta Econômica:**	**44,38%**
TIR:	**208,26%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(7.383.179)**	**Margem Bruta REF:**	**46,59%**
Exposição de Caixa:	**8,29%**	**Δ LI:**	**4,84%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**17.470.340**	**Margem Rasa Econômica:**	**35,65%**
Payback Contingente (21 m):	**15 m/ (-6 m)**	**LI Marginal:**	**25,56%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**28.843.392**	**Margem Rasa REF:**	**39,09%**
Payback Consolidado:	**15 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**31,04%**

*Valores em R$ '000

DRE – Cenário Aprovação

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Estância II - Aprovação		Estância Dourados II - Sem Vaga		Estância Dourados II - Vaga Moto		Estância Dourados II - Vaga Carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	95.553	100,0%	62.837	100,0%	9.521	100,0%	23.195	100,0%
PIS/COFINS	(1.145)	1,2%	(602)	1,0%	(130)	1,4%	(413)	1,8%
Custo Total	(52.509)	55,6%	(34.998)	56,2%	(5.213)	55,5%	(12.299)	54,0%
Custo Terreno	(8.091)	8,6%	(5.321)	8,5%	(806)	8,6%	(1.964)	8,6%
Custo Relacionados a Terreno	(85)	0,1%	(57)	0,1%	(8)	0,1%	(20)	0,1%
Custos de Incorporação	(1.114)	1,2%	(776)	1,2%	(86)	0,9%	(253)	1,1%
Custo de Construção	(43.219)	45,8%	(28.845)	46,3%	(4.312)	45,9%	(10.062)	44,2%
Lucro Bruto Econômico	41.899	44,4%	27.237	43,8%	4.178	44,5%	10.484	46,0%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	41.899	44,4%	27.237	43,8%	4.178	44,5%	10.484	46,0%
Despesas de Selling	(10.396)	11,0%	(6.854)	11,0%	(1.032)	11,0%	(2.510)	11,0%
Contingência	(2.198)	2,3%	(1.445)	2,3%	(219)	2,3%	(533)	2,3%
Margem de Contribuição	29.305	31,0%	18.937	30,4%	2.927	31,2%	7.441	32,7%
IR e CSLL	(937)	1,0%	(493)	0,8%	(107)	1,1%	(338)	1,5%
Margem Líquida	28.368	30,0%	18.444	29,6%	2.820	30,0%	7.103	31,2%
Lucro Bruto REF Unit.	100.538	46,6%	97.596	45,9%	99.111	46,3%	109.584	48,6%
Lucro Raso REF Unit.	73.957	39,1%	71.095	38,2%	72.670	38,7%	82.711	41,6%

R$ Mil - VPL - Compra	Estância II - Aprovação		Estância Dourados II - Sem Vaga		Estância Dourados II - Vaga Moto		Estância Dourados II - Vaga Carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	70.641	100,0%	46.406	100,0%	7.063	100,0%	17.172	100,0%
PIS/COFINS	(834)	1,2%	(438)	0,9%	(95)	1,3%	(301)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(52.260)	74,0%	(34.661)	74,7%	(5.207)	73,7%	(12.392)	72,2%
Custo Terreno	(5.726)	8,1%	(3.761)	8,1%	(573)	8,1%	(1.392)	8,1%
Custo Relacionados a Terreno	(92)	0,1%	(61)	0,1%	(9)	0,1%	(21)	0,1%
Custos de Incorporação	(1.051)	1,5%	(730)	1,6%	(82)	1,2%	(239)	1,4%
Custo de Construção	(34.515)	48,9%	(23.035)	49,6%	(3.444)	48,8%	(8.036)	46,8%
Despesas de Selling	(9.321)	13,2%	(6.139)	13,2%	(935)	13,2%	(2.247)	13,1%
Contingência	(874)	1,2%	(575)	1,2%	(87)	1,2%	(212)	1,2%
IR e CSLL	(682)	1,0%	(358)	0,8%	(78)	1,1%	(246)	1,4%
Lucro Imobiliário	17.546	24,8%	11.307	24,4%	1.761	24,9%	4.478	26,1%

*Valores em R$ '000

DRE – Cenário Aprovação

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Estância II - Aprovação		Primeira Fase	
	Nominal	%	Nominal	%
Receita	95.553	100,0%	95.553	100,0%
PIS/COFINS	(1.145)	1,2%	(1.145)	1,2%
Custo Total	(52.509)	55,6%	(52.509)	55,6%
Custo Terreno	(8.091)	8,6%	(8.091)	8,6%
Custo Relacionados a Terreno	(85)	0,1%	(85)	0,1%
Custos de Incorporação	(1.114)	1,2%	(1.114)	1,2%
Custo de Construção	(43.219)	45,8%	(43.219)	45,8%
Lucro Bruto Econômico	41.899	44,4%	41.899	44,4%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	41.899	44,4%	41.899	44,4%
Despesas de Selling	(10.396)	11,0%	(10.396)	11,0%
Contingência	(2.198)	2,3%	(2.198)	2,3%
Margem de Contribuição	29.305	31,0%	29.305	31,0%
IR e CSLL	(937)	1,0%	(937)	1,0%
Margem Líquida	28.368	30,0%	28.368	30,0%
Lucro Bruto REF Unit.	100.538	46,6%	100.538	46,6%
Lucro Raso REF Unit.	73.957	39,1%	73.957	39,1%

R$ Mil - VPL - Compra	Estância II - Aprovação		Primeira Fase	
	VP	%	VP	%
Receitas	70.641	100,0%	70.641	100,0%
PIS/COFINS	(834)	1,2%	(834)	1,2%
Custos e Despesas Totais	(52.260)	74,0%	(52.260)	74,0%
Custo Terreno	(5.726)	8,1%	(5.726)	8,1%
Custo Relacionados a Terreno	(92)	0,1%	(92)	0,1%
Custos de Incorporação	(1.051)	1,5%	(1.051)	1,5%
Custo de Construção	(34.515)	48,9%	(34.515)	48,9%
Despesas de Selling	(9.321)	13,2%	(9.321)	13,2%
Contingência	(874)	1,2%	(874)	1,2%
IR e CSLL	(682)	1,0%	(682)	1,0%
Lucro Imobiliário	17.546	24,8%	17.546	24,8%

*Valores em R$ '000

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Anterior	Atual	Atual vs Anterior	Δ%
Data Estudo:	setembro-25	outubro-25	1 Meses	N/A
Lançamento:	outubro-25	outubro-25	0 Meses	N/A
Uhs:	451	451	-	0,0%
Preço Nominal:	209.704	212.750	3.047	1,5%
Preço Raso:	183.476	186.523	3.047	1,7%
Preço Nominal Inflacionado:	212.686	215.777	3.090	1,5%
Preço Raso Inflacionado:	186.105	189.195	3.090	1,7%
Renda Média:	2.780	2.780	-	0,0%
RET Médio:	2,17%	2,17%	0,0 p.p.	0,0%
% em RET 1%:	60,86%	60,86%	0,0 p.p.	0,0%
VSO:	35	35	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)²:	8.479	8.492	13	0,2%
Avaliação:	191.417	191.417	-	0,0%
Prazo construção F1:	15	18	3	20,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	20	23	3	15,0%
Custo Total Inf (Unit):	115.083	116.428	1.345	1,2%
Custo Construção (Unit):	86.900	87.360	460	0,5%
Custo Construção Corrigido:	86.456	87.360	904	1,0%
Fração de construção:	41,2%	41,1%	-0,2 p.p.	-0,4%
INCC Folha Rosto:	1.216,71	1.216,71	(0)	0,0%
Custo Terreno Inf:	7.961.718	8.091.481	129.763	1,6%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	0	188	188	
Fração do Terreno¹:	9,3% / 50,8%	9,3% / 50,4%	0,0 p.p.	0,0%
Custo de Incorp. por uh:	2.634	2.470	(164)	-6,2%
ITBI/Emol. Inf (Total)²:	3.823.993	3.829.975	5.982	0,2%
Custo do Ciclo (Unit):	13.735	13.935	200	1,5%
Lucro Imobiliário:	24,7%	24,8%	0,1 p.p.	0,5%
LI Marginal:	25,2%	25,6%	0,3 p.p.	1,3%
Exposição de caixa:	9,1%	8,3%	-0,9 p.p.	-9,3%
TIR:	228,1%	208,3%	-19,8 p.p.	-8,7%
Margem Bruta REF:	46,6%	46,6%	0,0 p.p.	-0,1%
Margem Bruta Econômica:	44,1%	44,4%	0,3 p.p.	0,6%
Margem Rasa REF:	39,0%	39,1%	0,1 p.p.	0,2%
Margem Rasa Econômica:	35,3%	35,6%	0,4 p.p.	1,0%
Margem Contribuição Econômica:	30,7%	31,0%	0,3 p.p.	1,1%
Payback Contingente (Régua 21 m):	15 m/ (-6 m)	15 m/ (-6 m)	0	0,0%
Payback Consolidado:	15 Meses	15 Meses	0 Meses	0,0%

Informações Gerais – Cenário Real

Estância II – Real – GO – Goiânia Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	nov-19							
stância Dourados II - Sem Vaga		out-25	mar-26	set-27	5 meses	18 meses	out-28	36 meses
tância Dourados II - Vaga Moto		out-25	mar-26	set-27	5 meses	18 meses	out-28	36 meses
tância Dourados II - Vaga Carro		out-25	mar-26	set-27	5 meses	18 meses	out-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	8,92 MM	**Incorrido Terreno:** 0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	16.395 m²	**Área Líquida do Terreno:** 16.395 m²
Cash:	0,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :** 0	**Custo de terreno m²:**	544,0	**Custo de terreno m² Área Líquida:** 544,0
Permuta Financeira:	8,92 MM (9,34%)		**VaR 25 (R$ mil):**	0	**Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):** 9,3% / 50,6%
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)		**VaR 26 (R$ mil):**	0	**CA Máx/Proj.** 2,0 / 1,1
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%		**Incorrido de Construção:**	0,13 MM	**Incorridos de Incorporação:** 0,35 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
stância Dourados II - Sem Vaga	T+4	182.445	301	208.586	185.200	98,9%	106,3%	101,7%
tância Dourados II - Vaga Moto	T+4	184.535	45	210.675	193.160	97,3%	96,3%	93,4%
tância Dourados II - Vaga Carro	T+4	194.702	105	221.217	208.490	95,9%	89,7%	76,4%

Unidades Totais:	451	**Preço Médio:**	211.735	**Renda Média:**	2.780	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	7.698
Unidades Tenda:	451	**Avaliação Média:**	191.417	**Ato:**	1.673 (0,6 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	13.868
VSO:	35 Unidades	**VGV Total:**	95.492.410	**FGTS:**	827 (0,3 Salários)	**Preço Raso Médio:**	185.507
RET Médio:	2,2%	**VGV Tenda:**	95.492.410	**% em RET 1%:**	61%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	774

Construção

Custo Total Unit.:	87.360	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	32,00	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**17.488.198**	**LI:**	**24,65%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**8.685.701**	**Margem Bruta Econômica:**	**44,31%**
TIR:	**201,38%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(7.720.704)**	**Margem Bruta REF:**	**46,57%**
Exposição de Caixa:	**9,14%**	**Δ LI:**	**4,65%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**21.274.155**	**Margem Rasa Econômica:**	**35,55%**
Payback Contingente (21 m):	**15 m/ (-6 m)**	**LI Marginal:**	**25,37%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**28.607.508**	**Margem Rasa REF:**	**39,02%**
Payback Consolidado:	**15 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,95%**

DRE – Cenário Real

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Estância II - Real		Estância Dourados II - Sem Vaga		Estância Dourados II - Vaga Moto		Estância Dourados II - Vaga Carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	95.031	100,0%	62.498	100,0%	9.471	100,0%	23.062	100,0%
PIS/COFINS	(1.139)	1,2%	(599)	1,0%	(130)	1,4%	(410)	1,8%
Custo Total	(52.287)	55,7%	(34.851)	56,3%	(5.191)	55,6%	(12.246)	54,1%
Custo Terreno	(8.047)	8,6%	(5.292)	8,5%	(802)	8,6%	(1.953)	8,6%
Custo Relacionados a Terreno	(85)	0,1%	(57)	0,1%	(8)	0,1%	(20)	0,1%
Custos de Incorporação	(1.110)	1,2%	(773)	1,2%	(85)	0,9%	(252)	1,1%
Custo de Construção	(43.045)	45,8%	(28.729)	46,4%	(4.295)	46,0%	(10.022)	44,2%
Lucro Bruto Econômico	41.605	44,3%	27.049	43,7%	4.150	44,4%	10.406	45,9%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	41.605	44,3%	27.049	43,7%	4.150	44,4%	10.406	45,9%
Despesas de Selling	(10.355)	11,0%	(6.828)	11,0%	(1.028)	11,0%	(2.499)	11,0%
Contingência	(2.186)	2,3%	(1.437)	2,3%	(218)	2,3%	(530)	2,3%
Margem de Contribuição	29.064	31,0%	18.783	30,3%	2.905	31,1%	7.376	32,6%
IR e CSLL	(932)	1,0%	(490)	0,8%	(106)	1,1%	(336)	1,5%
Margem Líquida	28.132	30,0%	18.293	29,6%	2.799	30,0%	7.041	31,1%
Lucro Bruto REF Unit.	100.000	46,6%	97.086	45,9%	98.616	46,2%	108.947	48,5%
Lucro Raso REF Unit.	73.419	39,0%	70.586	38,1%	72.175	38,6%	82.074	41,5%

R$ Mil - VPL - Compra	Estância II - Real		Estância Dourados II - Sem Vaga		Estância Dourados II - Vaga Moto		Estância Dourados II - Vaga Carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	70.950	100,0%	46.612	100,0%	7.098	100,0%	17.240	100,0%
PIS/COFINS	(838)	1,2%	(440)	0,9%	(96)	1,3%	(302)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(52.624)	74,2%	(34.904)	74,9%	(5.244)	73,9%	(12.476)	72,4%
Custo Terreno	(5.751)	8,1%	(3.778)	8,1%	(575)	8,1%	(1.397)	8,1%
Custo Relacionados a Terreno	(92)	0,1%	(61)	0,1%	(9)	0,1%	(21)	0,1%
Custos de Incorporação	(1.051)	1,5%	(730)	1,6%	(82)	1,2%	(239)	1,4%
Custo de Construção	(34.878)	49,2%	(23.278)	49,9%	(3.480)	49,0%	(8.120)	47,1%
Despesas de Selling	(9.285)	13,1%	(6.116)	13,1%	(931)	13,1%	(2.238)	13,0%
Contingência	(882)	1,2%	(580)	1,2%	(88)	1,2%	(214)	1,2%
IR e CSLL	(685)	1,0%	(360)	0,8%	(78)	1,1%	(247)	1,4%
Lucro Imobiliário	17.488	24,6%	11.268	24,2%	1.758	24,8%	4.462	25,9%

Pareceres

Análise da Mancha e Implantação

Operações

Inteligência de Mercado

Financeiro

Anexos

One Page – Estância Dourados II – Cenário Aprovação

[1]	**Cidade**	Goiânia	**Mancha de demanda**	GO - GOS - Goiânia Sul + Aparecida de Goiânia
	Regional	GO	**Cluster MPR**	3 - Verde
	Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
	Fase Anterior	Estância Dourados I	**Aprovação Fase Anterior**	Fase
	Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Set
	Unidades (Fases)	451 (1)	**CA Máx | Proj**	2,0 | 1,1
	Unidades com Vaga (%)	150 (33%)	**Escritura | Lançamento**	set/25 | out/25
	Unidades com Varandas (%)	0 (0,0%)	**Tipologia**	F2 - Concreto
[2]	**Valor Líquido do Terreno (% VGV)**	8.011 (8,5%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
	Cash (Correção)	0 (NA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	8,5% (100,0%)
	Valor R$/m²	539	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)
[3]	**Custo Construção (%VGV)**	39.192 (41,4%)	**Indireto Unit.**	16.831
	Prazo da Obra (meses)	15	**Torre Unit.**	39.875
	Custo Total Unit. | Corrigido (LPU):	86.900 | 86.456 (94)	**Infra Unit.**	18.448
	Início de Obra	abr-26	**Fundação Unit.**	5.853
	Preço Nominal Unit.	209.704	**VSO**	35
	Preço Raso Unit.	183.476	**Referência**	Referência
	Avaliação Unit.	191.417	**Renda (% em RET 1%)**	2.780 (60,9%)

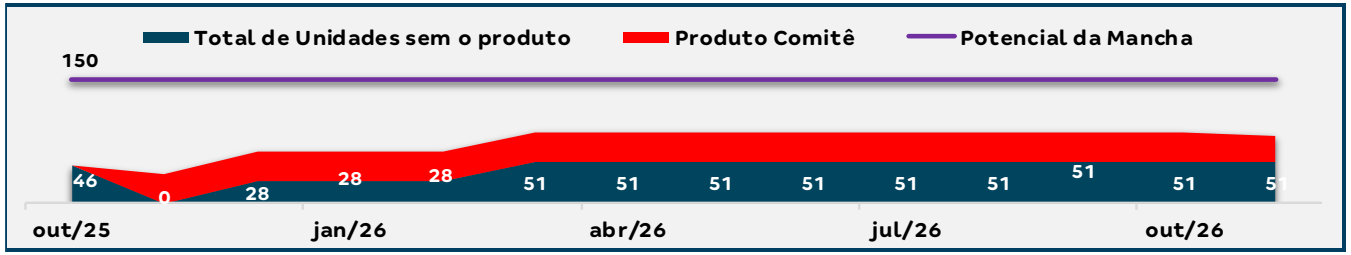

[4]	**LI (Régua):**	**24,7% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	44,1%
	LI Marginal:	25,2%	**Margem Rasa Econômica:**	35,3%
	Margem Bruta REF:	46,6%	**Margem Contribuição Econômica:**	30,7%
	Margem Rasa REF:	**39,0%**	**Exposição (% VGV):**	8.592 (9,1%)
	TIR:	228,1%	**VGV Total:**	**94.576**
	Payback Contingente (21 m) :	**15 m/ (-6 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(7.424)
	Payback Consolidado:	15	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	19.999

Destaques

[1] Apresentação em Comitê de lançamento o empreendimento Estância Dourados II, sucessor do Estância Dourados I, cujo estoque se encerra em outubro/25. Este lançamento representa a etapa final do complexo Sonho Dourado, consolidando um ciclo de projetos que entregaram resultados expressivos e consistentes para a Regional GO.

[2] O terreno foi 100% negociado em permuta financeira, correspondente a 9,34% do VGV do empreendimento. O valor da permuta líquida é de 8,5%.

[3] Em relação o comitê de escritura, houve uma redução de R$1600/UH, com custo ligeiramente abaixo do previsto em BP.

[4] Projeto no cenário aprovação atinge LI de 24,7% e MB de 46,6%, fortalecendo o bom desempenho do complexo na regional GO.

*Valores em R$ '000

One Page – Estância Dourados II – Cenário Real

[1]

Cidade	Goiânia	**Mancha de demanda**	GO - GOS - Goiânia Sul + Aparecida de Goiânia
Regional	GO	**Cluster MPR**	3 - Verde
Cenário de Aprovação	Aprovação	**Tipo de Aprovação**	Consolidado
Fase Anterior	Estância Dourados I	**Aprovação Fase Anterior**	Fase
Tipo de Comitê	Lançamento	**Versão da VF**	Versão 1.0: Set

Unidades (Fases)	451 (1)	**CA Máx | Proj**	2,0 | 1,1
Unidades com Vaga (%)	150 (33%)	**Escritura | Lançamento**	set/25 | out/25
Unidades com Varandas (%)	0 (0,0%)	**Tipologia**	F2 - Concreto

[2]

Valor Líquido do Terreno (% VGV)	7.970 (8,5%)	**Un. Perm. Fís (% Ter)**	0 (0,0%)
Cash (Correção)	0 (NA)	**%VGV Perm Fin Líquida (% Ter)**	8,5% (100,0%)
Valor R$/m²	536	**VAR (%VGV)**	000 (0,0%)

[3]

Custo Construção (%VGV)	39.192 (41,6%)	**Indireto Unit.**	16.831
Prazo da Obra (meses)	15	**Torre Unit.**	39.875
Custo Total Unit. | Corrigido (LPU):	86.900 | 86.456 (94)	**Infra Unit.**	18.448
Início de Obra	mar-26	**Fundação Unit.**	5.853

Preço Nominal Unit.	208.688	**VSO**	35
Preço Raso Unit.	182.461	**Referência**	Referência
Avaliação Unit.	191.417	**Renda (% em RET 1%)**	2.780 (60,9%)

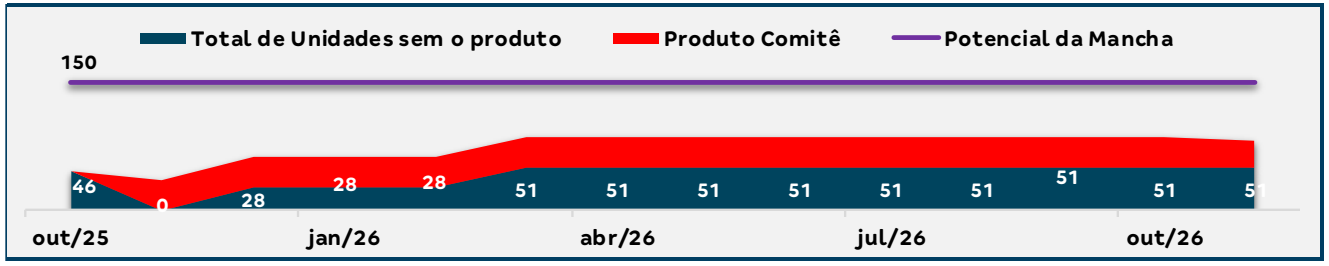

[4]

LI (Régua):	**24,5% (20,0%)**	**Margem Bruta Econômica:**	44,1%
LI Marginal:	25,0%	**Margem Rasa Econômica:**	35,2%
Margem Bruta REF:	46,6%	**Margem Contribuição Econômica:**	30,6%
Margem Rasa REF:	**38,9%**	**Exposição (% VGV):**	9.463 (10,1%)
TIR:	218,0%	**VGV Total:**	**94.118**
Payback Contingente (21 m) :	**15 m/ (-6 m)**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	(9.131)
Payback Consolidado:	15	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	19.510

Destaques

[1] Apresentação em Comitê de lançamento o empreendimento Estância Dourados II, sucessor do Estância Dourados I, cujo estoque se encerra em outubro/25. Este lançamento representa a etapa final do complexo Sonho Dourado, consolidando um ciclo de projetos que entregaram resultados expressivos e consistentes para a Regional GO.

[2] O terreno foi 100% negociado em permuta financeira, correspondente a 9,34% do VGV do empreendimento. O valor da permuta líquida é de 8,5%.

[3] Em relação o comitê de escritura, houve uma redução de R$1600/UH, com custo ligeiramente abaixo do previsto em BP.

[4] Projeto no cenário real atinge LI de 24,5% e MB de 46,6%, fortalecendo o bom desempenho do complexo na regional GO.

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II			
Tipo:	**Sem Vaga**		**Sem Vaga**	
Método	**Ref. Est. Dourados I**		**Vision**	
Avaliação	185.200		185.200	
Renda Inicial (VF)	2.550		2.585	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		75%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,64	1.623	0,64	1.646
FGTS	0,23	594	0,24	626
Financiamento	98,86%	145.366	98,92%	145.889
Subsídio	68,98%	13.192	70,03%	12.646
Prazo de Pró-soluto	19	19	19	19
Pró-Soluto	106,31%	18.715	105,09%	18.753
Preço Raso (RS)	179.490	179.490	179.560	179.560
TCD	101,70%	26.141	100,83%	26.273
VSO	23	23	23	23
Preço de Venda	**205.631**	**205.631**	**205.833**	**205.833**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**205.631**	**205.631**	**205.833**	**205.833**
Preço Raso (R$)	**179.490**		**179.560**	
% de Raso	**87,29%**		**87,24%**	
BP25 - Não Inflacionado	**174.712**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**183.807**		**-**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II			
Tipo:	**Vaga Moto**		**Vaga Moto**	
Método	**Ref. Est. Dourados I**		**Vision**	
Avaliação	193.160		193.160	
Renda Inicial (VF)	2.777		2.832	
Renda Final*	-		-	
% RET1	50%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,73	2.019	0,72	2.042
FGTS	0,32	894	0,33	930
Financiamento	97,34%	150.420	97,69%	150.951
Subsídio	75,75%	9.819	79,41%	9.273
Prazo de Pró-soluto	19	19	19	19
Pró-Soluto	96,33%	18.467	94,76%	18.525
Preço Raso (RS)	181.619	181.619	181.721	181.721
TCD	93,39%	26.141	91,93%	26.242
VSO	4	4	4	4
Preço de Venda	**207.760**	**207.760**	**207.962**	**207.962**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**207.760**	**207.760**	**207.962**	**207.962**
Preço Raso (R$)	**181.619**		**181.721**	
% de Raso	**87,42%**		**87,38%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II			
Tipo:	**Vaga Carro**		**Vaga Carro**	
Método	**Ref. Est. Dourados I**		**Vision**	
Avaliação	208.490		208.490	
Renda Inicial (VF)	3.442		3.473	
Renda Final*	-		-	
% RET1	25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,45	1.541	0,45	1.564
FGTS	0,47	1.625	0,48	1.656
Financiamento	95,92%	159.988	96,40%	160.786
Subsídio	219,34%	6.863	214,62%	6.317
Prazo de Pró-soluto	19	19	19	19
Pró-Soluto	89,72%	21.318	89,08%	21.356
Preço Raso (RS)	191.336	191.336	191.680	191.680
TCD	76,42%	26.514	76,32%	26.716
VSO	8	8	8	8
Preço de Venda	**217.851**	**217.851**	**218.397**	**218.397**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**217.851**	**217.851**	**218.397**	**218.397**
Preço Raso (R$)	**191.336**		**191.680**	
% de Raso	**87,83%**		**87,77%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Análise de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II
Tipo:	**Faixa 2**
Método	**Ref. Est. Dourados I**
Avaliação	191.417
Renda Inicial (VF)	2.780
Renda Final*	-

Tipo:	VF	R$
Ato	0,60	1.644
FGTS	0,30	864
Financiamento	98,02%	149.274
Subsídio	104,66%	11.382
Prazo de Pró-soluto	19	19
Pró-Soluto	101,45%	19.296
Preço Raso (RS)	182.461	182.461
TCD	94,98%	26.228
VSO	35	35
Preço de Venda	**208.688**	**208.688**
Elasticidade	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**208.688**	**208.688**

Preço Raso (R$)	**182.461**
% de Raso	**87,43%**
Raso Todas as Fases	**182.461**
Nominal Todas as Fases	**208.688**

1

Análise de Riscos	Farol IM
IM avalia o Preço Referência como **factível**.	

1) I.M está de acordo com o preço referência, tendo em vista que, esse preço reflete a performance da fase anterior ajustando o preço apenas conforme os novos parâmetros da fase atual. Houve uma redução de avaliação CEF frente a fase anterior, conforme evidenciado no escalonamento abaixo, essa redução impactou o preço final da fase atual.
Destacamos que para a manutenção do preço estimado, é necessário manter esse patamar de avaliação simulado em comitê.

Conforme consta no slide "Panorama de Concorrência", os concorrentes da região vendem em um target de preço e renda acima do previsto para o Produto Tenda.

	Preço Real					Preço Normalizado (19m)	
	Avaliação	Preço Raso	Renda MED	VSO	PSOL	Δ PSOL	Preço Raso
Estância Dourados I	213.091	190.250	2.799	47	16	3.172	193.421
Estância Dourados II	191.417	182.461	2.780	35	19	-	182.461

Tenda

sua próxima conquista

Cenário Aprovação

Simulação de Preço

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II			
Tipo:	**Sem Vaga**		**Sem Vaga**	
Método	**Ref. Est. Dourados I**		**Vision**	
Avaliação	185.200		185.200	
Renda Inicial (VF)	2.550		2.585	
Renda Final*	-		-	
% RET1	75%		75%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,64	1.623	0,64	1.646
FGTS	0,23	594	0,24	626
Financiamento	98,86%	145.366	98,92%	145.889
Subsídio	68,98%	13.192	70,03%	12.646
Prazo de Pró-soluto	20	20	20	20
Pró-Soluto	106,31%	19.700	105,04%	19.732
Preço Raso (RS)	180.475	180.475	180.539	180.539
TCD	101,70%	26.141	100,83%	26.273
VSO	23	23	23	23
Preço de Venda	**206.616**	**206.616**	**206.812**	**206.812**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**206.616**	**206.616**	**206.812**	**206.812**
Preço Raso (R$)	**180.475**		**180.539**	
% de Raso	**87,35%**		**87,30%**	
BP25 - Não Inflacionado	**175.311**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**184.405**		**-**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II			
Tipo:	**Vaga Moto**		**Vaga Moto**	
Método	**Ref. Est. Dourados I**		**Vision**	
Avaliação	193.160		193.160	
Renda Inicial (VF)	2.777		2.832	
Renda Final*	-		-	
% RET1	50%		50%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,73	2.019	0,72	2.042
FGTS	0,32	894	0,33	930
Financiamento	97,34%	150.420	97,69%	150.951
Subsídio	75,75%	9.819	79,41%	9.273
Prazo de Pró-soluto	20	20	20	20
Pró-Soluto	96,33%	19.439	94,71%	19.491
Preço Raso (RS)	182.591	182.591	182.687	182.687
TCD	93,39%	26.141	91,93%	26.242
VSO	4	4	4	4
Preço de Venda	**208.731**	**208.731**	**208.928**	**208.928**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**208.731**	**208.731**	**208.928**	**208.928**
Preço Raso (R$)	**182.591**		**182.687**	
% de Raso	**87,48%**		**87,44%**	
BP25 - Não Inflacionado	**-**		**-**	
BP25 - Inflacionado	**-**		**-**	

Informações Viabilidade

Projeto:	Estância Dourados II			
Tipo:	**Vaga Carro**		**Vaga Carro**	
Método	**Ref. Est. Dourados I**		**Vision**	
Avaliação	208.490		208.490	
Renda Inicial (VF)	3.442		3.473	
Renda Final*	-		-	
% RET1	25%		25%	
Tipo:	**VF**	**R$**	**VF**	**R$**
Ato	0,45	1.541	0,45	1.564
FGTS	0,47	1.625	0,48	1.656
Financiamento	95,92%	159.988	96,40%	160.786
Subsídio	219,34%	6.863	214,62%	6.317
Prazo de Pró-soluto	20	20	20	20
Pró-Soluto	89,72%	22.440	89,08%	22.482
Preço Raso (RS)	192.458	192.458	192.806	192.806
TCD	76,42%	26.514	76,32%	26.716
VSO	8	8	8	8
Preço de Venda	**218.973**	**218.973**	**219.523**	**219.523**
Elasticidade	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Preço de Venda Final	**218.973**	**218.973**	**219.523**	**219.523**
Preço Raso (R$)	**192.458**		**192.806**	
% de Raso	**87,89%**		**87,83%**	
BP25 - Não Inflacionado	-		-	
BP25 - Inflacionado	-		-	

Informações Gerais – Cenário Aprovação

Estância Dourados II - GO - Goiânia Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	nov-19							
Estância II - Sem Vaga		out-25	abr-26	jul-27	6 meses	15 meses	out-28	36 meses
Estância II - Vaga Moto		out-25	abr-26	jul-27	6 meses	15 meses	out-28	36 meses
Estância II - Vaga Carro		out-25	abr-26	jul-27	6 meses	15 meses	out-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	8,83 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	16.395 m²
Cash:	0,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	0	**Custo de terreno m²:**	538,8
Permuta Financeira:	8,83 MM (9,34%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,12 MM

Área Líquida do Terreno:	16.395 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	538,8
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	9,3% / 50,8%
CA Máx/Proj.	2,0 / 1,1
Incorridos de Incorporação:	0,21 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Estância II - Sem Vaga	T+4	180.475	301	206.616	185.200	98,9%	106,3%	101,7%
Estância II - Vaga Moto	T+4	182.591	45	208.731	193.160	97,3%	96,3%	93,4%
Estância II - Vaga Carro	T+4	192.458	105	218.973	208.490	95,9%	89,7%	76,4%

Unidades Totais:	451	**Preço Médio:**	209.704	**Renda Média:**	2.780	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	7.657
Unidades Tenda:	451	**Avaliação Média:**	191.417	**Ato:**	1.673 (0,6 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	13.735
VSO:	35 Unidades	**VGV Total:**	94.576.344	**FGTS:**	827 (0,3 Salários)	**Preço Raso Médio:**	183.476
RET Médio:	2,2%	**VGV Tenda:**	94.576.344	**% em RET 1%:**	61%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	774

Construção

Custo Total Unit. | Corrigido:	86.900 | 86.456	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	32,00	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**17.278.372**	**LI:**	**24,71%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**8.592.075**	**Margem Bruta Econômica:**	**44,11%**
TIR:	**228,06%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(7.423.680)**	**Margem Bruta REF:**	**46,63%**
Exposição de Caixa:	**9,14%**	**Δ LI:**	**4,71%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**19.999.046**	**Margem Rasa Econômica:**	**35,29%**
Payback Contingente (21 m):	**15 m/ (-6 m)**	**LI Marginal:**	**25,23%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**27.917.353**	**Margem Rasa REF:**	**39,01%**
Payback Consolidado:	**15 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,70%**

*Valores em R$ '000

DRE – Cenário Aprovação

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Estância Dourados II		Estância II - Sem Vaga		Estância II - Vaga Moto		Estância II - Vaga Carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	93.994	100,0%	61.825	100,0%	9.371	100,0%	22.798	100,0%
PIS/COFINS	(1.126)	1,2%	(592)	1,0%	(128)	1,4%	(406)	1,8%
Custo Total	(51.903)	55,9%	(34.492)	56,3%	(5.276)	57,1%	(12.134)	54,2%
Custo Terreno	(7.962)	8,6%	(5.237)	8,6%	(794)	8,6%	(1.931)	8,6%
Custo Relacionados a Terreno	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Custos de Incorporação	(1.188)	1,3%	(722)	1,2%	(217)	2,3%	(250)	1,1%
Custo de Construção	(42.753)	46,0%	(28.534)	46,6%	(4.266)	46,2%	(9.954)	44,5%
Lucro Bruto Econômico	40.965	44,1%	26.740	43,7%	3.967	42,9%	10.258	45,8%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	40.965	44,1%	26.740	43,7%	3.967	42,9%	10.258	45,8%
Despesas de Selling	(10.296)	11,1%	(6.790)	11,1%	(1.022)	11,1%	(2.483)	11,1%
Contingência	(2.162)	2,3%	(1.422)	2,3%	(216)	2,3%	(524)	2,3%
Margem de Contribuição	28.507	30,7%	18.528	30,3%	2.729	29,5%	7.250	32,4%
IR e CSLL	(922)	1,0%	(485)	0,8%	(105)	1,1%	(332)	1,5%
Margem Líquida	27.585	29,7%	18.044	29,5%	2.624	28,4%	6.918	30,9%
Lucro Bruto REF Unit.	99.173	46,6%	96.316	46,0%	97.874	46,3%	107.923	48,6%
Lucro Raso REF Unit.	72.592	39,0%	69.815	38,1%	71.433	38,6%	81.050	41,5%

R$ Mil - VPL - Compra	Estância Dourados II		Estância II - Sem Vaga		Estância II - Vaga Moto		Estância II - Vaga Carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	69.916	100,0%	45.941	100,0%	6.997	100,0%	16.978	100,0%
PIS/COFINS	(825)	1,2%	(434)	0,9%	(94)	1,3%	(298)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(51.813)	74,1%	(34.281)	74,6%	(5.265)	75,2%	(12.267)	72,3%
Custo Terreno	(5.669)	8,1%	(3.725)	8,1%	(567)	8,1%	(1.377)	8,1%
Custo Relacionados a Terreno	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Custos de Incorporação	(1.110)	1,6%	(683)	1,5%	(189)	2,7%	(238)	1,4%
Custo de Construção	(34.372)	49,2%	(22.940)	49,9%	(3.430)	49,0%	(8.002)	47,1%
Despesas de Selling	(9.100)	13,0%	(5.995)	13,1%	(913)	13,0%	(2.192)	12,9%
Contingência	(885)	1,3%	(582)	1,3%	(88)	1,3%	(215)	1,3%
IR e CSLL	(675)	1,0%	(355)	0,8%	(77)	1,1%	(243)	1,4%
Lucro Imobiliário	17.278	24,7%	11.227	24,4%	1.638	23,4%	4.414	26,0%

*Valores em R$ '000

DRE – Cenário Aprovação

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Estância Dourados II		Primeira Fase	
	Nominal	%	Nominal	%
Receita	93.994	100,0%	93.994	100,0%
PIS/COFINS	(1.126)	1,2%	(1.126)	1,2%
Custo Total	(51.903)	55,9%	(51.903)	55,9%
Custo Terreno	(7.962)	8,6%	(7.962)	8,6%
Custo Relacionados a Terreno	-	0,0%	-	0,0%
Custos de Incorporação	(1.188)	1,3%	(1.188)	1,3%
Custo de Construção	(42.753)	46,0%	(42.753)	46,0%
Lucro Bruto Econômico	40.965	44,1%	40.965	44,1%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	40.965	44,1%	40.965	44,1%
Despesas de Selling	(10.296)	11,1%	(10.296)	11,1%
Contingência	(2.162)	2,3%	(2.162)	2,3%
Margem de Contribuição	28.507	30,7%	28.507	30,7%
IR e CSLL	(922)	1,0%	(922)	1,0%
Margem Líquida	27.585	29,7%	27.585	29,7%
Lucro Bruto REF Unit.	99.173	46,6%	99.173	46,6%
Lucro Raso REF Unit.	72.592	39,0%	72.592	39,0%

R$ Mil - VPL - Compra	Estância Dourados II		Primeira Fase	
	VP	%	VP	%
Receitas	69.916	100,0%	69.916	100,0%
PIS/COFINS	(825)	1,2%	(825)	1,2%
Custos e Despesas Totais	(51.813)	74,1%	(51.813)	74,1%
Custo Terreno	(5.669)	8,1%	(5.669)	8,1%
Custo Relacionados a Terreno	-	0,0%	-	0,0%
Custos de Incorporação	(1.110)	1,6%	(1.110)	1,6%
Custo de Construção	(34.372)	49,2%	(34.372)	49,2%
Despesas de Selling	(9.100)	13,0%	(9.100)	13,0%
Contingência	(885)	1,3%	(885)	1,3%
IR e CSLL	(675)	1,0%	(675)	1,0%
Lucro Imobiliário	17.278	24,7%	17.278	24,7%

*Valores em R$ '000

Comparativo

Comparativo dos Estudos - Consolidado	Escritura	Atual	Atual vs Escritura	Δ%
Data Estudo:	setembro-25	setembro-25	0 Meses	N/A
Lançamento:	setembro-25	outubro-25	1 Meses	N/A
Uhs:	451	451	-	0,0%
Preço Nominal:	209.704	209.704	-	0,0%
Preço Raso:	183.476	183.476	-	0,0%
Preço Nominal Inflacionado:	212.839	212.686	(153)	-0,1%
Preço Raso Inflacionado:	186.240	186.105	(135)	-0,1%
Renda Média:	2.780	2.780	-	0,0%
RET Médio:	2,17%	2,17%	0,0 p.p.	0,0%
% em RET 1%:	60,86%	60,86%	0,0 p.p.	0,0%
VSO:	35	35	-	0,0%
ITBI/Emol. Inf (Unit)²:	8.431	8.479	48	0,6%
Avaliação:	191.417	191.417	-	0,0%
Prazo construção F1:	15	15	-	0,0%
Prazo de Pró-Soluto F1:	20	20	-	0,0%
Custo Total Inf (Unit):	116.757	115.083	(1.673)	-1,4%
Custo Construção (Unit):	88.500	86.900	(1.600)	-1,8%
Fração de construção:	42,2%	41,2%	-1,0 p.p.	-2,3%
INCC Folha Rosto:	1.210,47	1.216,71	6	0,5%
Custo Terreno Inf:	7.967.754	7.961.718	(6.036)	-0,1%
Custo Relacionados a Terreno (Unit):	0	0	-	
Fração do Terreno¹:	9,3% / 51,5%	9,3% / 50,8%	0,0 p.p.	0,0%
Custo de Incorp. por uh:	2.457	2.634	176	7,2%
ITBI/Emol. Inf (Total)²:	3.802.493	3.823.993	21.500	0,6%
Custo do Ciclo (Unit):	13.735	13.735	-	0,0%
Lucro Imobiliário:	24,0%	24,7%	0,8 p.p.	3,2%
LI Marginal:	24,5%	25,2%	0,8 p.p.	3,1%
Exposição de caixa:	9,3%	9,1%	-0,1 p.p.	-1,5%
TIR:	227,2%	228,1%	0,8 p.p.	0,4%
Margem Bruta REF:	45,8%	46,6%	0,8 p.p.	1,8%
Margem Bruta Econômica:	43,3%	44,1%	0,8 p.p.	1,8%
Margem Rasa REF:	38,1%	39,0%	0,9 p.p.	2,5%
Margem Rasa Econômica:	34,4%	35,3%	0,9 p.p.	2,6%
Margem Contribuição Econômica:	30,0%	30,7%	0,7 p.p.	2,5%
Payback Contingente (Régua 21 m):	15 m/ (-6 m)	15 m/ (-6 m)	0	0,0%
Payback Consolidado:	15 Meses	15 Meses	0 Meses	0,0%

Informações Gerais – Cenário Real

Estância Dourados II - GO - Goiânia Capital

Datas e Prazos

	Compra	Lançamento	Início Obra	Término Obra	LÇTO até IO	IO até TO	Chaves	LÇTO até Chaves
Consolidado	nov-19							
Estância II - Sem Vaga		out-25	mar-26	jun-27	5 meses	15 meses	out-28	36 meses
Estância II - Vaga Moto		out-25	mar-26	jun-27	5 meses	15 meses	out-28	36 meses
Estância II - Vaga Carro		out-25	mar-26	jun-27	5 meses	15 meses	out-28	36 meses

Terreno e Incorridos

TOTAL (R$ + Perm.):	8,79 MM	**Incorrido Terreno:**	0,00 MM	**Área do Terreno (100%):**	16.395 m²
Cash:	0,00 MM	**Nº de Parcelas Cash :**	0	**Custo de terreno m²:**	536,2
Permuta Financeira:	8,79 MM (9,34%)			**VaR 25 (R$ mil):**	0
Permuta Física:	0,00 MM (0,00%)			**VaR 26 (R$ mil):**	0
Ato / %VGV:	0,00 MM / 0,0%			**Incorrido de Construção:**	0,12 MM

Área Líquida do Terreno:	16.395 m²
Custo de terreno m² Área Líquida:	536,2
Fração Terreno/Terreno + Custo Obra (%VGV):	9,3% / 51,0%
CA Máx/Proj.	2,0 / 1,1
Incorridos de Incorporação:	0,21 MM

Vendas

Fases	Nº Pavimentos	Preço Raso Unit.	Qtde	Preço Unit.	Aval. CEF	Cond. Parcela	% Pró-soluto	% TCD
Estância II - Sem Vaga	T+4	179.490	301	205.631	185.200	98,9%	106,3%	101,7%
Estância II - Vaga Moto	T+4	181.619	45	207.760	193.160	97,3%	96,3%	93,4%
Estância II - Vaga Carro	T+4	191.336	105	217.851	208.490	95,9%	89,7%	76,4%

Unidades Totais:	451	**Preço Médio:**	208.688	**Renda Média:**	2.780	**ITBI+Emol. Unit. Médio:**	7.637
Unidades Tenda:	451	**Avaliação Média:**	191.417	**Ato:**	1.673 (0,6 Salários)	**Custo do Ciclo Unit.:**	13.669
VSO:	35 Unidades	**VGV Total:**	94.118.312	**FGTS:**	827 (0,3 Salários)	**Preço Raso Médio:**	182.461
RET Médio:	2,2%	**VGV Tenda:**	94.118.312	**% em RET 1%:**	61%	**Adc. Tx. de Aceleração Médio:**	774

Construção

Custo Total Unit. | Corrigido:	86.900 | 86.456	**Eventuais:**	2,00%	**Área priv (m²):**	32,00	**Gape / Mês Unit.:**	11,08

Resultado

LI (R$):	**17.193.852**	**LI:**	**24,50%**	**Exposição de Caixa (R$):**	**9.462.862**	**Margem Bruta Econômica:**	**44,05%**
TIR:	**217,96%**	**LI Aprovação:**	**20,00%**	**Ger. Caixa 12 meses (R$):**	**(9.131.003)**	**Margem Bruta REF:**	**46,60%**
Exposição de Caixa:	**10,12%**	**Δ LI:**	**4,50%**	**Ger. Caixa 24 meses (R$):**	**19.509.571**	**Margem Rasa Econômica:**	**35,21%**
Payback Contingente (21 m):	**15 m/ (-6 m)**	**LI Marginal:**	**25,01%**	**Ger. Caixa Marginal (R$):**	**27.694.651**	**Margem Rasa REF:**	**38,93%**
Payback Consolidado:	**15 meses**					**Margem de Contribuição Econômica:**	**30,62%**

DRE – Cenário Real

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Estância Dourados II		Estância II - Sem Vaga		Estância II - Vaga Moto		Estância II - Vaga Carro	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Receita	93.478	100,0%	61.490	100,0%	9.322	100,0%	22.666	100,0%
PIS/COFINS	(1.120)	1,2%	(589)	1,0%	(128)	1,4%	(403)	1,8%
Custo Total	(51.674)	55,9%	(34.345)	56,4%	(5.247)	57,1%	(12.082)	54,3%
Custo Terreno	(7.916)	8,6%	(5.207)	8,5%	(789)	8,6%	(1.919)	8,6%
Custo Relacionados a Terreno	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Custos de Incorporação	(1.176)	1,3%	(719)	1,2%	(209)	2,3%	(249)	1,1%
Custo de Construção	(42.581)	46,1%	(28.419)	46,7%	(4.249)	46,2%	(9.914)	44,5%
Lucro Bruto Econômico	40.685	44,1%	26.556	43,6%	3.947	42,9%	10.181	45,7%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	40.685	44,1%	26.556	43,6%	3.947	42,9%	10.181	45,7%
Despesas de Selling	(10.255)	11,1%	(6.764)	11,1%	(1.018)	11,1%	(2.473)	11,1%
Contingência	(2.150)	2,3%	(1.414)	2,3%	(214)	2,3%	(521)	2,3%
Margem de Contribuição	28.279	30,6%	18.378	30,2%	2.714	29,5%	7.187	32,3%
IR e CSLL	(917)	1,0%	(482)	0,8%	(104)	1,1%	(330)	1,5%
Margem Líquida	27.363	29,6%	17.896	29,4%	2.610	28,4%	6.857	30,8%
Lucro Bruto REF Unit.	98.635	46,6%	95.806	45,9%	97.378	46,3%	107.286	48,5%
Lucro Raso REF Unit.	72.054	38,9%	69.305	38,1%	70.937	38,6%	80.413	41,4%

R$ Mil - VPL - Compra	Estância Dourados II		Estância II - Sem Vaga		Estância II - Vaga Moto		Estância II - Vaga Carro	
	VP	%	VP	%	VP	%	VP	%
Receitas	70.188	100,0%	46.121	100,0%	7.029	100,0%	17.037	100,0%
PIS/COFINS	(829)	1,2%	(435)	0,9%	(95)	1,3%	(299)	1,8%
Custos e Despesas Totais	(52.165)	74,3%	(34.520)	74,8%	(5.297)	75,4%	(12.349)	72,5%
Custo Terreno	(5.689)	8,1%	(3.738)	8,1%	(570)	8,1%	(1.381)	8,1%
Custo Relacionados a Terreno	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Custos de Incorporação	(1.105)	1,6%	(683)	1,5%	(185)	2,6%	(238)	1,4%
Custo de Construção	(34.734)	49,5%	(23.182)	50,3%	(3.466)	49,3%	(8.087)	47,5%
Despesas de Selling	(9.065)	12,9%	(5.973)	13,0%	(910)	12,9%	(2.183)	12,8%
Contingência	(893)	1,3%	(588)	1,3%	(89)	1,3%	(217)	1,3%
IR e CSLL	(678)	1,0%	(356)	0,8%	(78)	1,1%	(244)	1,4%
Lucro Imobiliário	17.194	24,5%	11.167	24,2%	1.638	23,3%	4.390	25,8%

DRE – Cenário Real

R$ Mil - Valores Nominais - Compra	Estância Dourados II		Primeira Fase	
	Nominal	%	Nominal	%
Receita	93.478	100,0%	93.478	100,0%
PIS/COFINS	(1.120)	1,2%	(1.120)	1,2%
Custo Total	(51.674)	55,9%	(51.674)	55,9%
Custo Terreno	(7.916)	8,6%	(7.916)	8,6%
Custo Relacionados a Terreno	-	0,0%	-	0,0%
Custos de Incorporação	(1.176)	1,3%	(1.176)	1,3%
Custo de Construção	(42.581)	46,1%	(42.581)	46,1%
Lucro Bruto Econômico	40.685	44,1%	40.685	44,1%
Custo para Rateio	-	0,0%	-	0,0%
Lucro Bruto Contábil	40.685	44,1%	40.685	44,1%
Despesas de Selling	(10.255)	11,1%	(10.255)	11,1%
Contingência	(2.150)	2,3%	(2.150)	2,3%
Margem de Contribuição	28.279	30,6%	28.279	30,6%
IR e CSLL	(917)	1,0%	(917)	1,0%
Margem Líquida	27.363	29,6%	27.363	29,6%
Lucro Bruto REF Unit.	98.635	46,6%	98.635	46,6%
Lucro Raso REF Unit.	72.054	38,9%	72.054	38,9%

R$ Mil - VPL - Compra	Estância Dourados II		Primeira Fase	
	VP	%	VP	%
Receitas	70.188	100,0%	70.188	100,0%
PIS/COFINS	(829)	1,2%	(829)	1,2%
Custos e Despesas Totais	(52.165)	74,3%	(52.165)	74,3%
Custo Terreno	(5.689)	8,1%	(5.689)	8,1%
Custo Relacionados a Terreno	-	0,0%	-	0,0%
Custos de Incorporação	(1.105)	1,6%	(1.105)	1,6%
Custo de Construção	(34.734)	49,5%	(34.734)	49,5%
Despesas de Selling	(9.065)	12,9%	(9.065)	12,9%
Contingência	(893)	1,3%	(893)	1,3%
IR e CSLL	(678)	1,0%	(678)	1,0%
Lucro Imobiliário	17.194	24,5%	17.194	24,5%

Obrigado
